



Operation Number: **BR-L1084**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**
Last Update: **6/4/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **06/12/2014**
Division Chief validation date: **06/24/2014**
Country Representative validation date: **07/10/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa Integrado de Desarrollo Urbano e Inclusión Social de Aracaju	Loan Number:	2258/OC-BR
Executing Agency (EA):	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		
Team Leader:	Hobbs,Jason Anthony	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1084	\$30,250,000.00	\$30,250,000.00	\$30,250,000.00	\$0.00	\$60,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1084	\$30,250,000.00	\$19,112,278.47	63.18%	\$11,137,721.53


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	El ejecutor tiene realizado un gran esfuerzo para mantener el equipo de gestion involucrado y participante en las actividades de gestion del Programa. Se ha avanzado en la ejecucion fisica de obras. Pero, los temas del pos-reasentamiento se encuentran todavia pendientes. Las actividades para apoyar en la recomposicon economica del pos-reasentamiento no fueron todavia definidas. El acompanamiento diario y semanal de las obras por parte del especialista ambiental de la UGP necesita ser cumplido.

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

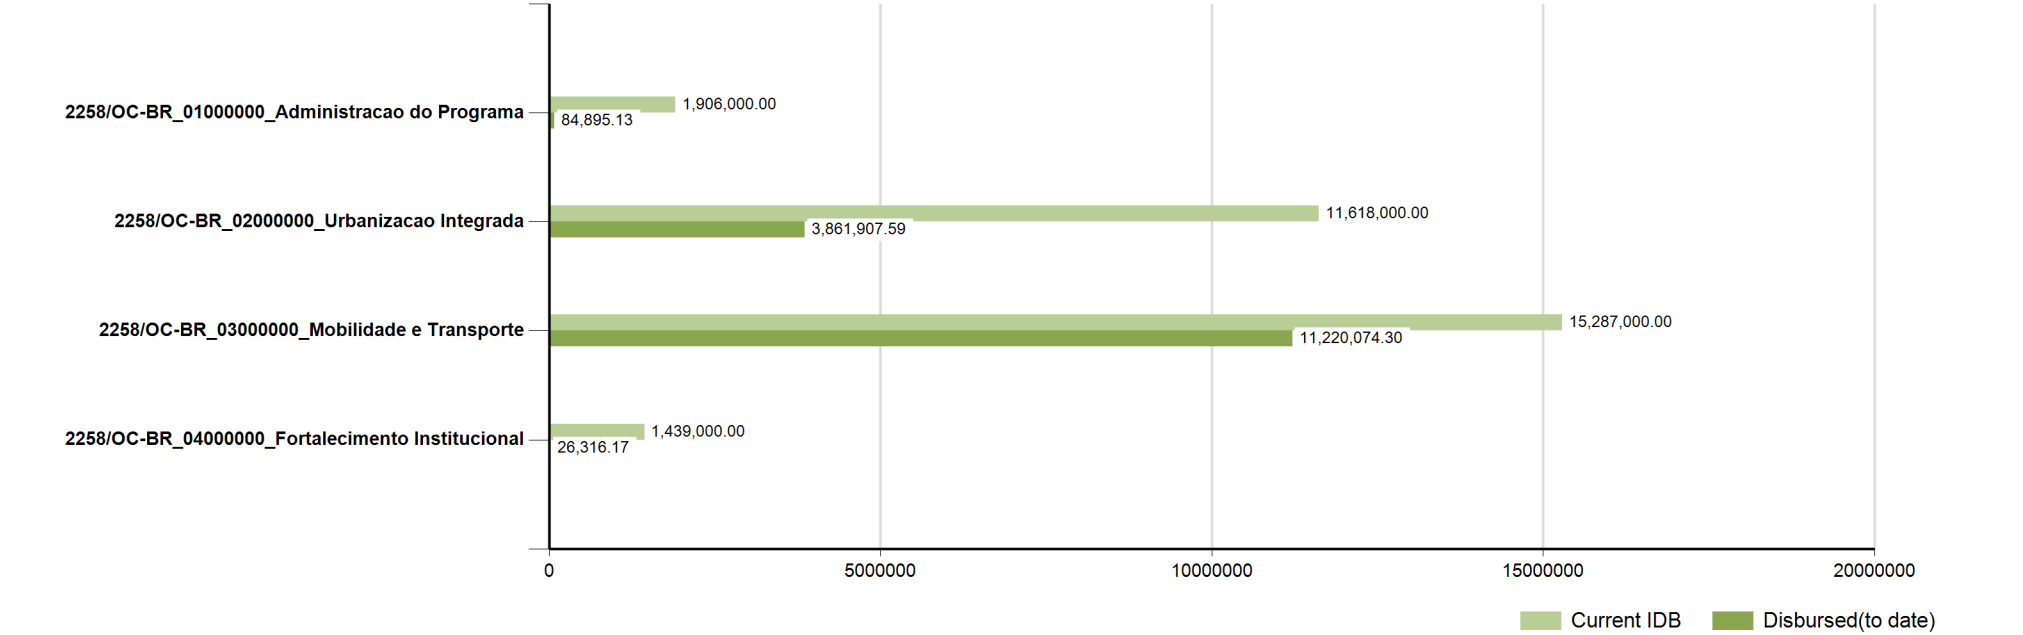

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Valor da propriedade imobiliária (terreno) na zona diretamente atingida pelo Programa aumentada								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Valor da propriedade imobiliária.		R\$/m2	49.00	2009	Secretaria Municipal de Finanças e Equipe de Avaliação de Imóveis EMURB.		P	63.00	
							P(a)	63.00	
							A		
Outcome:	2 Redução de famílias morando em áreas de risco ambiental na cidade.								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Número de famílias morando em áreas de risco ambiental na cidade.		Famílias	3,054.00	2009	SEPLAN.		P	1,506.00	
							P(a)	1,506.00	
							A		
Outcome:	3 Aumento na cobertura de serviços de assistência social básica no município.								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Número de famílias cobertas pelos serviços de assistência social.		Famílias	70,000.00	2009	SEMASC.		P	80,000.00	
							P(a)	80,000.00	
							A		
Outcome:	4 Tempo de viagem de automóvel na rota sul-centro reduzido								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
4.1 Tempo de viagem da Escola Estadual no Canal 3 até o viaduto do DIA na Av.Tancredo Neves.		Minutos	9.60	2009	SMTT.		P(a)	6.00
							A	
4.2 Tempo de viagem da Igreja Bom Jesus dos Navegantes até o viaduto do DIA (via Av. Beira Mar e Av.Tancredo Neves).		Minutos	12.50	2009	SMTT.		P	10.00
							P(a)	10.00
							A	

Outcome:	5 Custos médio de operação de automóvel reduzidos
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
5.1 Custo Operacional do automóvel (trecho Escola Estadual até viaduto do DIA).		Lt/Km	0.17	2009	SMTT		P(a)	0.13
							A	
5.2 Custo Operacional do automóvel (Igreja Bom Jesus dos Navegantes até o viaduto do DIA).		Lt/Km	0.16	2009	SMTT		P	0.14
							P(a)	0.14
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Urbanización		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Escolas de Educação Fundamental e Educação Infantil contruídas no Bairro 17 de março	escolas	P		2.00	P		1,446,957.00
		P(a)		2.00	P(a)	500,000.00	1,884,765.00
		A			A		
Edifícios do Centro Histórico recuperados ou adquiridos	edificios	P		4.00	P	1,849,616.00	2,890,627.00
		P(a)		4.00	P(a)	849,616.00	2,134,726.79
		A			A	688,912.00	1,326,812.05
Intervenções de urbanização e desenvolvimento comunitário implementadas	areas	P	1.00	7.00	P	6,588,753.00	30,965,453.40
		P(a)	1.00	7.00	P(a)	3,953,779.00	25,651,503.68
		A		3.00	A	434,449.00	14,032,339.96
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) construídos em Bairro Novo de Santa Maria e em Coqueiral	edificios	P	2.00	2.00	P	229,512.00	433,042.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	203,530.16	464,692.00
		A			A		
Escola de Educação Fundamental reformada (Nova Liberdade)	escola	P		1.00	P		1,550,206.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,385,195.02
		A		1.00	A		1,385,195.02
Escola de Educação Infantil construído (Coqueiral)	escola	P		1.00	P		795,139.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,062,446.00
		A			A		
Movilidad y transporte		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Trecho dos Corredores de interconexão viária construído	km	P		3.50	P	8,038,437.00	16,076,874.00
		P(a)		3.50	P(a)	2,622,623.76	17,287,000.00
		A		3.50	A	10,082,183.14	15,220,276.18
Ponte sobre o rio Poxim construída	metros	P	180.00	180.00	P		5,843,125.00
		P(a)		180.00	P(a)		8,361,617.98
		A		180.00	A	818,891.00	8,361,617.98
Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Sistemas de Informações georeferenciadas implantados	sistema	P	1.00	1.00	P		187,500.00
		P(a)		1.00	P(a)		136,364.00
		A			A		
Funcionarios da FUNDAT capacitados	funcionarios	P		40.00	P	65,625.00	131,250.00
		P(a)		40.00	P(a)		0.00
		A			A		
Escolas de Governo Construídos	escola	P		1.00	P		1,112,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A			A		
Sistema de Obras	Unidade	P			P		
		P(a)		1.00	P(a)		59,484.10
		A			A		29,969.90
Aquisição de Imagens Satélites para Atualização Cadastral do Geoprocessamento	Unidade	P			P		
		P(a)		1.00	P(a)		9,091.00
		A			A		
Sistema de Ponto Eletrônico	Unidade	P			P		
		P(a)		1.00	P(a)		43,477.43
		A			A		24,704.57

Sistema de Compras - Módulo por Dispensa de Valor	Unidade	P			P		
		P(a)		1.00	P(a)		45,455.00
		A			A		
Módulo de Gestão de Catálogos e Fornecedores	Unidade	P			P		
		P(a)		1.00	P(a)		27,273.00
		A			A		
Módulo de Gestão de Contratos de Registro de Pontos	Unidade	P			P		
		P(a)		1.00	P(a)		40,909.00
		A			A		
Administracao do Programa							

Other Cost			2013	Cost
ADMINISTRAÇÃO	P		\$596,813.00	\$1,906,000.00
	P(a)		\$350,000.00	\$1,906,000.00
	A		\$154,176.19	\$154,176.19
Total Cost			2013	Total Cost
	P		\$17,368,756.00	\$63,338,173.40
	P(a)		\$8,479,548.92	\$40,535,091.85
	A		\$12,178,611.33	\$40,535,091.85

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
