
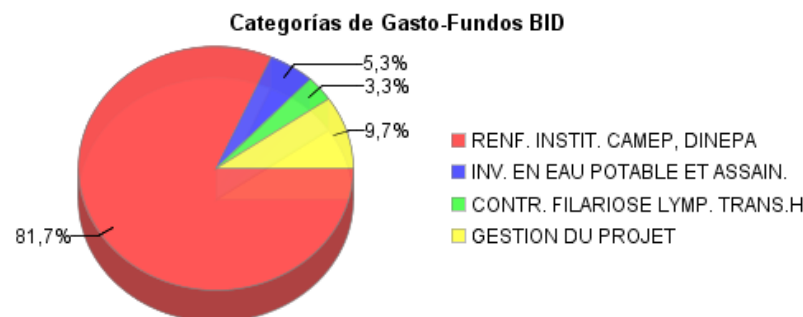
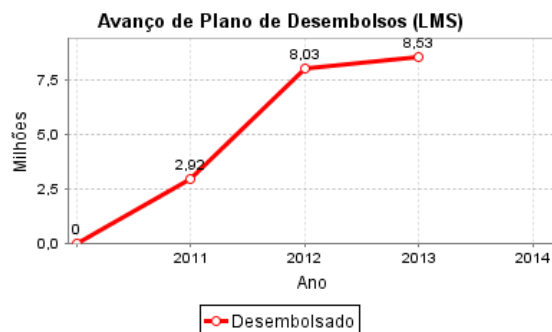



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ENERGIE ET COMMUNICATIONS				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Número da Operação:	2351/GR-HA	Atual:	15.000.000,00	Original BID:	15.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	8.532.515,16	Corrente BID:	15.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	56,88	Pari-passu:	100,00
Operação Relacionada:	HA-T1103, HA-X1021, HA-L1062, HA-L1075	Saldo:	6.467.484,84	Cofinanciamento/País:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	15.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 21-mar-2013 Validado pelo Representante do País: 28-mar-2013

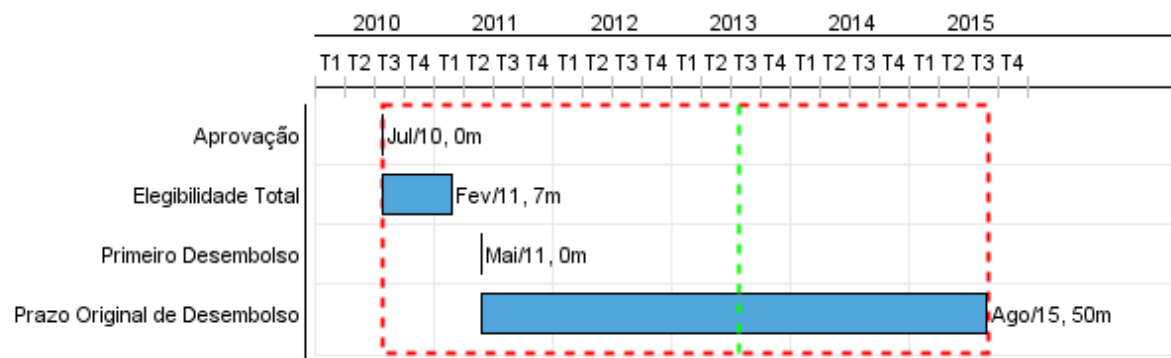

Progresso Acumulado até 2012

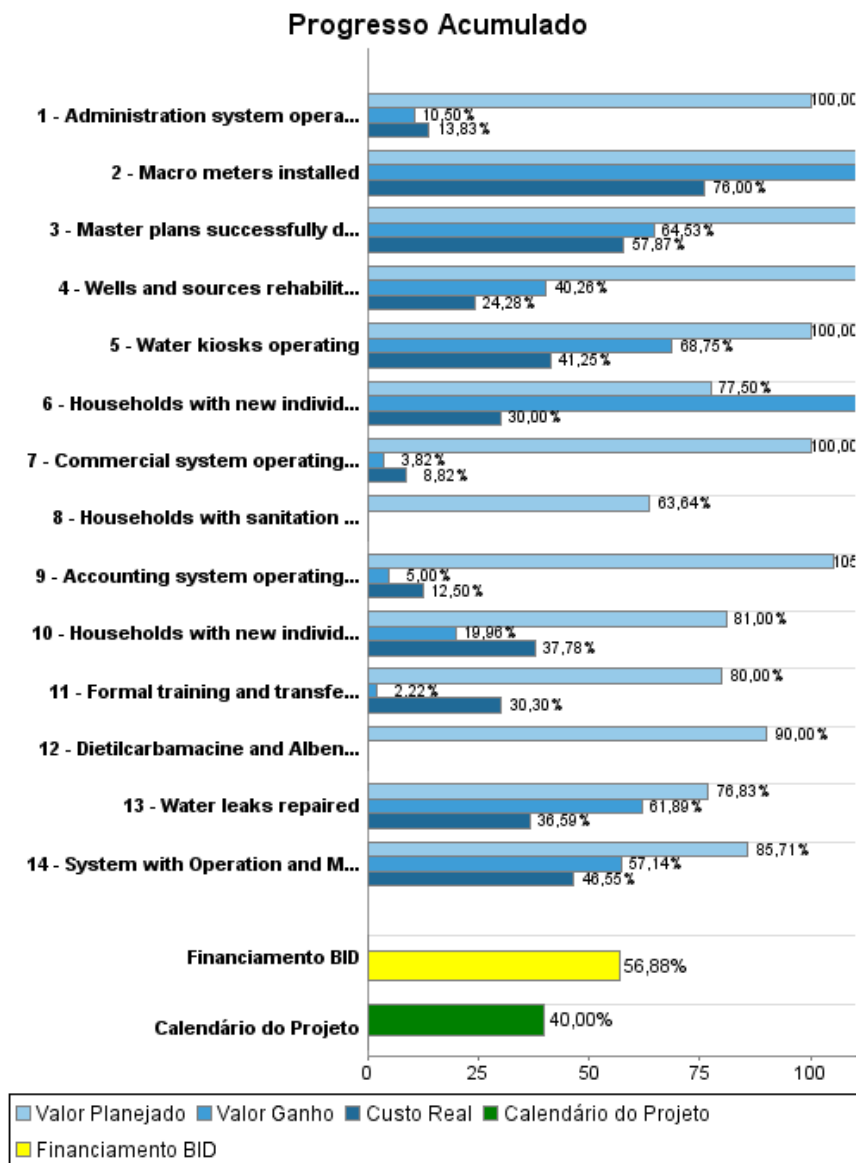

Resultados

Resultado: Financial performance of the operator improved

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Total annual operational revenues/Total annual operating costs	ratio		2010	P	0,20	0,70	1,00
				A	0,61	0,80	

Resultado: Revenue collection of the operator improved

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Collection rate (percentage of people paying their water bills)	percentage	42,00	2010	P	45,00	60,00	70,00
				A	70,00	73,00	

Resultado: Labor costs decreased

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Personnel costs as a percentage of annual operational costs	Percentage	50,00	2010	P	50,00	50,00	30,00
				A	48,00	44,00	
Staff per thousand connections	Employees/ 1,000 connections	21,00	2010	P	21,00	20,00	10,00
				A	19,60	15,74	

Resultado: Quality of water service improved

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Existing households with continuous access to quality water	households		2010	P	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				A	2.000,00	35.000,00	

Resultado: Sanitation solutions implemented

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
New households using hygienic sanitation facilities	Households		2010	P	120,00		1.700,00
				A			

Resultado: Geo-helminths in Port-au-Prince controlled

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Prevalence of the Geo-helminths in Port-au-Prince	%	25,00	2010	P	25,00	25,00	10,00
				A	25,00		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Institutional Strengthening of CAMEP and DINEPA									
Administration system operating according to standards specified in guidelines/manuals	system	1,00				1.100.000,00	100.000,00		3.000.000,00
Commercial system operating according to standards specified in guidelines/manuals	system	1,00				1.750.000,00	200.000,00		4.000.000,00
Master plans successfully developed	Master plans	1,00	1,00		2,00	1.500.000,00	1.300.000,00		3.000.000,00
Formal training and transfer of knowledge of CAMEP staff completed	Hours	120.000,00	8.115,00		22.292,00	300.000,00	220.000,00		1.000.000,00
Accounting system operating according to standards specified in guidelines/manuals	system	1,00				500.000,00	150.000,00		2.000.000,00
System with Operation and Maintenance performed	system	1,00	1,00		1,00	2.000.000,00	2.400.000,00		7.000.000,00
Potable water and sanitation investments									
Wells and sources rehabilitated	Wells and sources	11,00	3,00		25,00	1.050.000,00	550.000,00		2.450.000,00
Water kiosks operating	water kiosks	50,00	60,00		410,00	500.000,00	660.000,00		1.600.000,00
Households with new individual water connections installed in Port-au-Prince	Hogares	2.000,00	5.966,00		14.466,00	3.550.000,00	3.600.000,00		12.000.000,00
Households with sanitation solutions installed	Hogares	6,00			30,00	250.000,00			1.100.000,00
Macro meters installed	Macro meters	78,00	173,00		407,00	150.000,00	190.000,00		250.000,00
Water leaks repaired	Water leaks	100,00	175,00		1.620,00	1.450.000,00	1.500.000,00		4.100.000,00
Households with new individual water connections installed in Ouanaminthe	Hogares	4.600,00	768,00		768,00	1.250.000,00	1.100.000,00		5.000.000,00
Control of soil transmitted helminthes									
Dietilcarbamacine and Albendazol distributed	Dosages	50.000,00			200.000,00	150.000,00			500.000,00
Other									
Project administration expenses	N/A					725.000,00	650.000,00		3.000.000,00
TOTAL						16.225.000,00	12.620.000,00		50.000.000,00
