
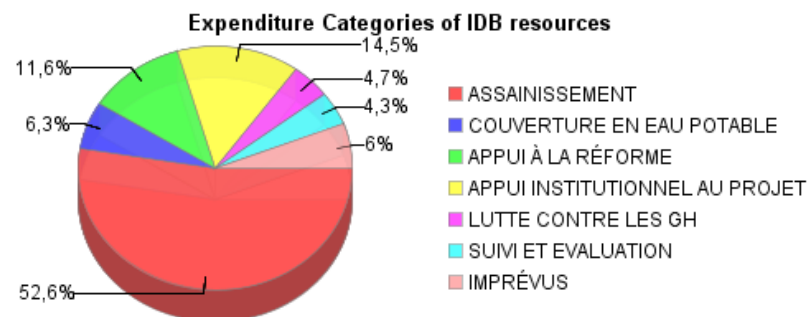
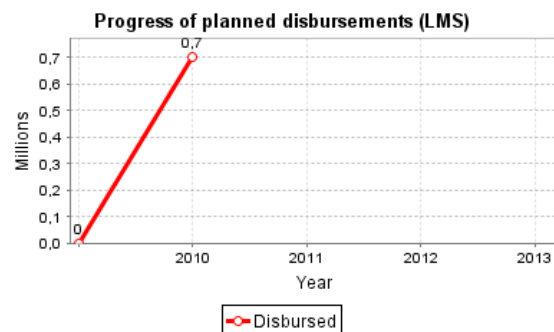



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement				
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Loan Number(s):	2190/GR-HA	Current Approved Amount:	19.000.000,00	Original IDB:	19.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	703.608,42	Current IDB:	19.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	3,70	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	HA-X1013	Balance:	18.296.391,58	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	19.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 21, 2011 Validated by Country Representative: Mar 30, 2011

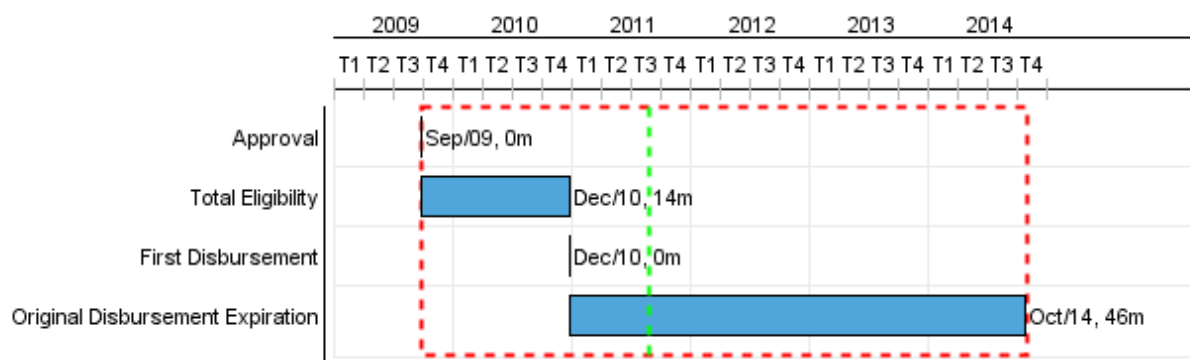

Accumulated Progress as of 2010

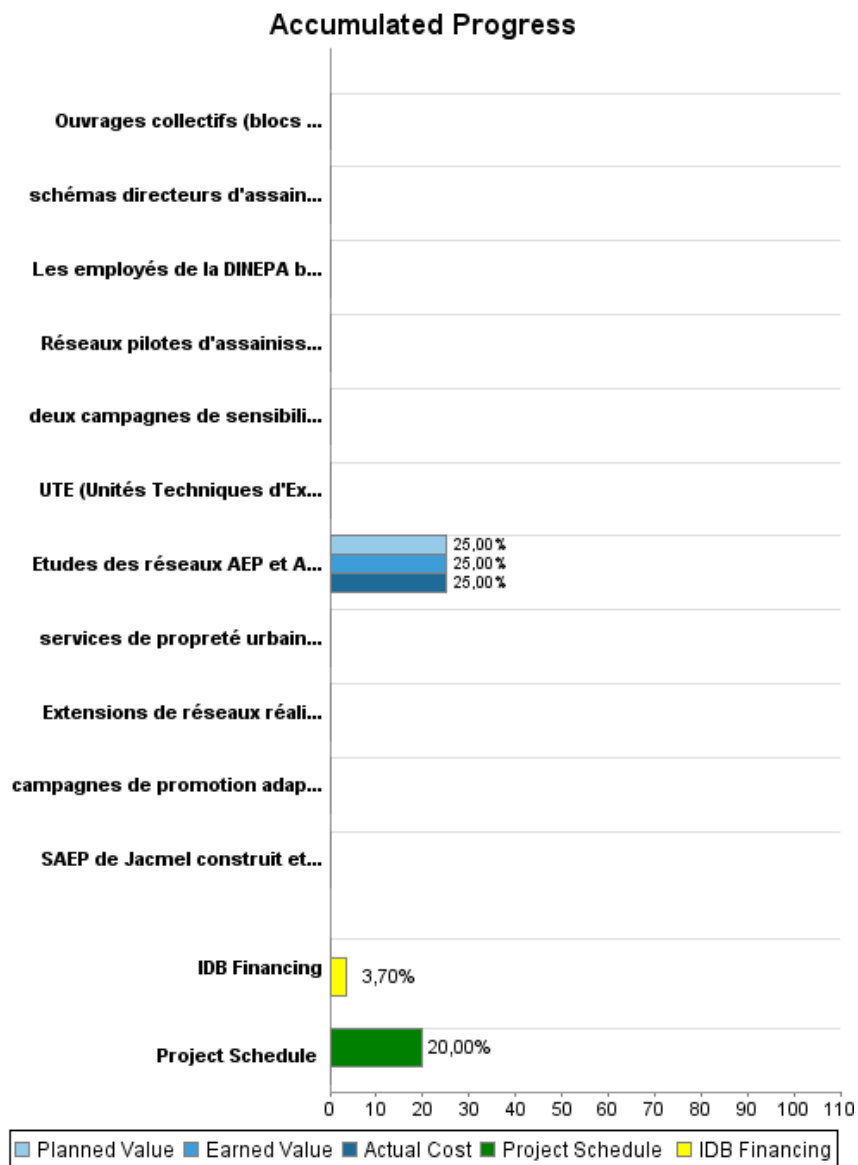

Outcomes

Outcome:	La population ayant accès à un service public ou privé d'eau potable, géré par une structure agréée dans 6 villes intermédiaires, a augmenté
Suppositions:	le processus de décentralisation des services est mis en place selon le calendrier prévu

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Population (moyenne dans les 6 villes) ayant accès au service d'eau potable	%	42,00	2010	P	90,00
				A	

Outcome:	Augmentation de la population ayant accès à un lieu d'aisance salubre privatif ou collectif
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Population ayant accès à un lieu d'aisance salubre individuel ou collectif (moyenne dans les 6 villes)	%	61,00	2010	P	70,00
				A	

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Comp. 1 : Assainissement									
schémas directeurs d'assainissement pour 5 villes effectués	nombre de schémas directeurs finalisés				5,00				2.545.000,00
services de propreté urbaine mise en place	nombre de services de propreté urbaine mis en place				4,00				3.100.000,00
Réseaux pilotes d'assainissement (eaux usées) construits à St Marc et Jacmel	nombre de réseaux pilotes construits				2,00				7.901.000,00
Ouvrages collectifs (blocs sanitaires publiques) construits dans les 6 villes	nombre d'ouvrages collectifs construits				30,00				1.200.000,00
campagnes de promotion adaptées pour la mise en place de latrines familiales dans les 6 villes	nombre de campagnes réalisées				6,00				1.892.600,00
Comp. 2 : Couverture en Eau Potable									
SAEP de Jacmel construit et gestion (UTE) mise en place	nombre de SAEP finalisé				1,00				11.660.000,00
UTE (Unités Techniques d'Exploitation) en fonction dans les villes de Ouanaminthe, Port-de-Paix et les Cayes	nombre d'UTE en place				3,00				1.352.982,00
Etudes des réseaux AEP et Assainissement de Cap Haïtien réalisées	nombre d'études réalisées				1,00	375.000,00	375.000,00		1.500.000,00
Extensions de réseaux réalisées dans les 5 villes zones périphériques	km				35,00				1.920.000,00
Comp. 5 : Lutte contre les Géo-Helminthes									
deux campagnes de sensibilisation aux maladies hydriques réalisées / ville	nombre de campagnes réalisées				12,00				890.000,00
Comp. 3, 4, 6 & 7 : renforcement institutionnel et administration									
Les employés de la DINEPA bénéficient d'un contrat, d'une fiche de poste et d'un plan de travail	personnes/an	35,00	35,00		35,00				5.038.418,00
TOTAL						375.000,00	375.000,00		39.000.000,00
