

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID |                                                                                   | WBS                      | Nombre de tarea                                                                                            | Prede     | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 0  |  |                          | <b>PROGRAMA RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO EN ECUADOR</b> |           |                                |           | <b>768 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>   | <b>Thu 1/2/20</b>   |
| 1  |                                                                                   | <b>1</b>                 | <b>PROGRAMA RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO EN ECUADOR</b> |           |                                |           | <b>768 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>   | <b>Thu 1/2/20</b>   |
| 2  |                                                                                   | <b>1.1</b>               | <b>PROGRAMA RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO EN ECUADOR</b> |           | <b>53</b>                      |           | <b>768 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>   | <b>Thu 1/2/20</b>   |
| 3  |                                                                                   | <b>1.1.1</b>             | <b>CI.1 Plan de Reconstrucción Integral del Sistema de Subtransmisión Eléctrica</b>                        |           | <b>27</b>                      |           | <b>595 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>   | <b>Mon 5/6/19</b>   |
| 4  |                                                                                   | <b>1.1.1.1</b>           | <b>CNEL EP- UN Esmeraldas 7 Proyectos de Subtransmisión fiscalizados y energizados</b>                     |           | <b>7</b>                       |           | <b>373 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>   | <b>Thu 6/28/18</b>  |
| 5  |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1</b>         | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción subestación Atacames</b>                                           |           | <b>1</b>                       |           | <b>247 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Thu 6/28/18</b>  |
| 6  |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1</b>       | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción subestación Atacames</b>                                     |           |                                |           | <b>247 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Thu 6/28/18</b>  |
| 7  |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1</b>     | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                          |           |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 8  |  | <b>1.1.1.1.1.1.1.1</b>   | Designar Comisión Técnica                                                                                  |           |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 9  |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.2</b>   | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                             | 8         |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 10 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.3</b>   | No objeción DDLs                                                                                           | 9         |                                |           | 5 days          | Fri 7/7/17          | Thu 7/13/17         |
| 11 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.4</b>   | Resolución de Inicio de proceso                                                                            | 10        |                                |           | 2 days          | Fri 7/14/17         | Mon 7/17/17         |
| 12 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.5</b>   | Publicar convocatoria en UNDB, prensa nacional y/o Compras Públicas                                        | 11        |                                |           | 1 day           | Tue 7/18/17         | Tue 7/18/17         |
| 13 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.6</b>   | Presentar de ofertas                                                                                       | 12        |                                |           | 38 days         | Wed 7/19/17         | Mon 9/11/17         |
| 14 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.7</b>   | Acta de apertura de ofertas                                                                                | 13        |                                |           | 0 days          | Mon 9/11/17         | Mon 9/11/17         |
| 15 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.8</b>   | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                               | 14        |                                |           | 10 days         | Tue 9/12/17         | Mon 9/25/17         |
| 16 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.9</b>   | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                  | 15        |                                |           | 5 days          | Tue 9/26/17         | Mon 10/2/17         |
| 17 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.10</b>  | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                         | 16        |                                |           | 2 days          | Tue 10/3/17         | Wed 10/4/17         |
| 18 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.11</b>  | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                 | 17        |                                |           | 20 days         | Thu 10/5/17         | Mon 11/6/17         |
| 19 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.12</b>  | Contrato Suscrito                                                                                          | 18        |                                |           | 0 days          | Mon 11/6/17         | Mon 11/6/17         |
| 20 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.13</b>  | Trámitar y pagar anticipo                                                                                  | 19        |                                |           | 5 days          | Tue 11/7/17         | Mon 11/13/17        |
| 21 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.1.14</b>  | Pago de anticipo 50%                                                                                       | 20        |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 22 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.2</b>     | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                   | <b>21</b> |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Tue 11/14/17</b> | <b>Wed 6/20/18</b>  |
| 23 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.2.1</b>   | <b>Construcción</b>                                                                                        |           |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Tue 11/14/17</b> | <b>Wed 6/20/18</b>  |
| 24 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.2.1.1</b> | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                      | 21        |                                |           | 60 days         | Tue 11/14/17        | Thu 2/8/18          |
| 25 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.2.1.2</b> | Replanteo                                                                                                  | 24        |                                |           | 10 days         | Fri 2/9/18          | Mon 2/26/18         |
| 26 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.2.1.3</b> | Obras Civiles                                                                                              | 25        |                                |           | 20 days         | Tue 2/27/18         | Mon 3/26/18         |
| 27 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.1.2.1.4</b> | Montaje Electromecánico                                                                                    | 26        |                                |           | 20 days         | Tue 3/27/18         | Tue 4/24/18         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID |                                                                                   | WBS                | Nombre de tarea                                                                | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| 28 |  | 1.1.1.1.1.2.1.5    | Tendido de Conductores                                                         | 26    |                                |           | 20 days         | Tue 3/27/18        | Tue 4/24/18         |  |
| 29 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.2.1.6    | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                               | 28    |                                |           | 20 days         | Wed 4/25/18        | Wed 5/23/18         |  |
| 30 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.2.1.7    | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                   | 29    |                                |           | 10 days         | Thu 5/24/18        | Thu 6/7/18          |  |
| 31 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.2.1.8    | Energizar redes                                                                | 30    |                                |           | 2 days          | Fri 6/8/18         | Mon 6/11/18         |  |
| 32 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.2.1.9    | Pruebas                                                                        | 31    |                                |           | 7 days          | Tue 6/12/18        | Wed 6/20/18         |  |
| 33 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.2.1.10   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                  | 32    |                                |           | 0 days          | Wed 6/20/18        | Wed 6/20/18         |  |
| 34 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.3</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                    |       |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Wed 4/25/18</b> | <b>Mon 6/18/18</b>  |  |
| 35 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.3.1      | Pago Planilla 1_20%                                                            | 28    |                                |           | 5 days          | Wed 4/25/18        | Wed 5/2/18          |  |
| 36 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.3.2      | Pago Planilla 2_20%                                                            | 31    |                                |           | 5 days          | Tue 6/12/18        | Mon 6/18/18         |  |
| 37 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                    |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 6/21/18</b> | <b>Thu 6/28/18</b>  |  |
| 38 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.4.1      | Registro Contable                                                              | 32    |                                |           | 2 days          | Thu 6/21/18        | Fri 6/22/18         |  |
| 39 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.4.2      | Liquidación Técnica Contable                                                   | 38    |                                |           | 3 days          | Mon 6/25/18        | Wed 6/27/18         |  |
| 40 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.4.3      | Registro de Activos                                                            | 39    |                                |           | 1 day           | Thu 6/28/18        | Thu 6/28/18         |  |
| 41 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.4.4      | Acta de Entrega Recepción                                                      | 40    |                                |           | 0 days          | Thu 6/28/18        | Thu 6/28/18         |  |
| 42 |                                                                                   | 1.1.1.1.1.4.5      | Pago Planilla final 10%                                                        | 41    |                                |           | 0 days          | Thu 6/28/18        | Thu 6/28/18         |  |
| 43 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción subestación Atacames</b> |       |                                |           | <b>203 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Thu 6/28/18</b>  |  |
| 44 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.2.1</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                   |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 45 |  | 1.1.1.1.2.1.1      | Designar Comisión Técnica                                                      |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |  |
| 46 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.2      | Elaborar Solicitud de Propuestas                                               | 45    |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |  |
| 47 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.3      | Resolución de Inicio de proceso                                                | 46    |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |  |
| 48 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.4      | Convocar a Expresiones de Interés                                              | 47    |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |  |
| 49 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.5      | Conformación de Lista Corta                                                    | 48    |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |  |
| 50 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.6      | Invitación a empresas de Lista Corta                                           | 49    |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |  |
| 51 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.7      | Elaborar ofertas                                                               | 50    |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |  |
| 52 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.8      | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                   | 51    |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |  |
| 53 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.9      | Publicar resultados y notificación de adjudicación                             | 52    |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |  |
| 54 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.10     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                     | 53    |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 55 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.11     | Contrato Suscrito                                                              | 54    |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 56 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.12     | Trámitar y pagar anticipo                                                      | 55    |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 57 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.13     | Pago de anticipo 20%                                                           | 56    |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 58 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                    |       |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Wed 5/2/18</b>  | <b>Thu 6/28/18</b>  |  |
| 59 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1      | Pago Planilla 1_35%                                                            | 35    |                                |           | 0 days          | Wed 5/2/18         | Wed 5/2/18          |  |
| 60 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.2      | Pago Planilla 2_35%                                                            | 36    |                                |           | 0 days          | Mon 6/18/18        | Mon 6/18/18         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID |  | WBS                    | Nombre de tarea                                                                        | Prede     | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|----|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 61 |  | 1.1.1.1.1.2.2.3        | Pago Planilla Final_10%                                                                | 42        |                                |           | 0 days          | Thu 6/28/18         | Thu 6/28/18         |
| 62 |  | <b>1.1.1.1.2</b>       | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción subestaciones Rocafuerte y Quininde 1</b>      |           | <b>1</b>                       |           | <b>184 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 63 |  | <b>1.1.1.1.2.1</b>     | <b>OBRASCNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción subestaciones Rocafuerte y Quininde 1</b> |           |                                |           | <b>184 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 64 |  | <b>1.1.1.1.2.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                      |           |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 65 |  | 1.1.1.1.2.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                              |           |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 66 |  | 1.1.1.1.2.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                         | 65        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 67 |  | 1.1.1.1.2.1.1.17       | No objeción DDLs                                                                       | 66        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 68 |  | 1.1.1.1.2.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                        | 67        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 69 |  | 1.1.1.1.2.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                          | 68        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 70 |  | 1.1.1.1.2.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                   | 69        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 71 |  | 1.1.1.1.2.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                            | 70        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 72 |  | 1.1.1.1.2.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                           | 71        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 73 |  | 1.1.1.1.2.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación              | 72        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 74 |  | 1.1.1.1.2.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                     | 73        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 75 |  | 1.1.1.1.2.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                             | 74        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 76 |  | 1.1.1.1.2.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                      | 75        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 77 |  | 1.1.1.1.2.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                              | 76        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 78 |  | 1.1.1.1.2.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                   | 77        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 79 |  | <b>1.1.1.1.2.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                               | <b>78</b> |                                |           | <b>104 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/20/18</b>  |
| 80 |  | <b>1.1.1.1.2.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                    |           |                                |           | <b>104 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/20/18</b>  |
| 81 |  | 1.1.1.1.2.1.2.2.10     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                  | 78        |                                |           | 30 days         | Tue 10/17/17        | Wed 11/29/17        |
| 82 |  | 1.1.1.1.2.1.2.2.11     | Replanteo                                                                              | 81        |                                |           | 10 days         | Thu 11/30/17        | Thu 12/14/17        |
| 83 |  | 1.1.1.1.2.1.2.2.12     | Obras Civiles                                                                          | 82        |                                |           | 15 days         | Fri 12/15/17        | Mon 1/8/18          |
| 84 |  | 1.1.1.1.2.1.2.2.13     | Montaje Electromecánico                                                                | 83        |                                |           | 15 days         | Tue 1/9/18          | Mon 1/29/18         |
| 85 |  | 1.1.1.1.2.1.2.2.14     | Tendido de Conductores                                                                 | 83        |                                |           | 15 days         | Tue 1/9/18          | Mon 1/29/18         |
| 86 |  | 1.1.1.1.2.1.2.2.15     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                       | 85        |                                |           | 15 days         | Tue 1/30/18         | Wed 2/21/18         |
| 87 |  | 1.1.1.1.2.1.2.2.16     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                           | 86        |                                |           | 10 days         | Thu 2/22/18         | Wed 3/7/18          |
| 88 |  | 1.1.1.1.2.1.2.2.17     | Energizar redes                                                                        | 87        |                                |           | 2 days          | Thu 3/8/18          | Fri 3/9/18          |
| 89 |  | 1.1.1.1.2.1.2.2.18     | Pruebas                                                                                | 88        |                                |           | 7 days          | Mon 3/12/18         | Tue 3/20/18         |
| 90 |  | 1.1.1.1.2.1.2.2.19     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                          | 89        |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18         | Tue 3/20/18         |
| 91 |  | <b>1.1.1.1.2.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                            |           |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Tue 1/30/18</b>  | <b>Fri 3/16/18</b>  |
| 92 |  | 1.1.1.1.2.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                    | 85        |                                |           | 5 days          | Tue 1/30/18         | Mon 2/5/18          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                                      | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 93  |  | 1.1.1.1.2.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                                                  | 88    |                                |           | 5 days          | Mon 3/12/18        | Fri 3/16/18         |
| 94  |                                                                                   | <b>1.1.1.1.2.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                          |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Wed 3/21/18</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 95  |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.4.6      | Registro Contable                                                                                    | 89    |                                |           | 2 days          | Wed 3/21/18        | Thu 3/22/18         |
| 96  |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                                                         | 95    |                                |           | 3 days          | Fri 3/23/18        | Tue 3/27/18         |
| 97  |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.4.8      | Registro de Activos                                                                                  | 96    |                                |           | 1 day           | Wed 3/28/18        | Wed 3/28/18         |
| 98  |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                                                            | 97    |                                |           | 0 days          | Wed 3/28/18        | Wed 3/28/18         |
| 99  |                                                                                   | 1.1.1.1.2.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                                              | 98    |                                |           | 0 days          | Wed 3/28/18        | Wed 3/28/18         |
| 100 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.2.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción subestaciones Rocafuerte y Quinde 1</b>        |       |                                |           | <b>140 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 101 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.2.2.1</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                         |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 102 |  | 1.1.1.1.2.2.1.1      | Designar Comisión Técnica                                                                            |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |
| 103 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.2      | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                     | 102   |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |
| 104 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.3      | Resolución de Inicio de proceso                                                                      | 103   |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |
| 105 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.4      | Convocar a Expresiones de Interés                                                                    | 104   |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |
| 106 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.5      | Conformación de Lista Corta                                                                          | 105   |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |
| 107 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.6      | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                 | 106   |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |
| 108 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.7      | Elaborar ofertas                                                                                     | 107   |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |
| 109 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.8      | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                         | 108   |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 110 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.9      | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                   | 109   |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 111 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.10     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                           | 110   |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 112 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.11     | Contrato Suscrito                                                                                    | 111   |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 113 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.12     | Trámitar y pagar anticipo                                                                            | 112   |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 114 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.1.13     | Pago de anticipo 20%                                                                                 | 113   |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 115 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.2.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                          |       |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Mon 2/5/18</b>  | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 116 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.2.1      | Pago Planilla 1_35%                                                                                  | 92    |                                |           | 0 days          | Mon 2/5/18         | Mon 2/5/18          |
| 117 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.2.2      | Pago Planilla 2_35%                                                                                  | 93    |                                |           | 0 days          | Fri 3/16/18        | Fri 3/16/18         |
| 118 |                                                                                   | 1.1.1.1.2.2.2.3      | Pago Planilla Final_10%                                                                              | 99    |                                |           | 0 days          | Wed 3/28/18        | Wed 3/28/18         |
| 119 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.3</b>     | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción Línea de Subtransmisión Santas Vainas - Las Palmas</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>184 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/21/17</b>  |
| 120 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.3.1</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción Línea de Subtransmisión Santas Vainas - Las Palmas</b> |       |                                |           | <b>184 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/21/17</b>  |
| 121 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.3.1.1</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                   |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 122 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.15     | Designar Comisión Técnica                                                                            |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17          |
| 123 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.16     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                       | 122   |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17          |
| 124 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.17     | No objeción DDLs                                                                                     | 123   |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17          |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                              | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| 125 |  | 1.1.1.1.3.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                                              | 124        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |  |
| 126 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                | 125        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17        |  |
| 127 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                                         | 126        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17        |  |
| 128 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                                                  | 127        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17        |  |
| 129 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                 | 128        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17         |  |
| 130 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                    | 129        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17         |  |
| 131 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                           | 130        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17        |  |
| 132 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                   | 131        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17        |  |
| 133 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                            | 132        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |  |
| 134 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                    | 133        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |  |
| 135 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                                         | 134        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |  |
| 136 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.3.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                     | <b>135</b> |                                |           | <b>104 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/13/17</b> |  |
| 137 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.3.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                                          |            |                                |           | <b>104 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/13/17</b> |  |
| 138 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                        | 135        |                                |           | 30 days         | Wed 4/19/17        | Wed 5/31/17        |  |
| 139 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                                    | 138        |                                |           | 10 days         | Thu 6/1/17         | Wed 6/14/17        |  |
| 140 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                                                | 139        |                                |           | 15 days         | Thu 6/15/17        | Wed 7/5/17         |  |
| 141 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                                                      | 140        |                                |           | 15 days         | Thu 7/6/17         | Wed 7/26/17        |  |
| 142 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                                                       | 140        |                                |           | 15 days         | Thu 7/6/17         | Wed 7/26/17        |  |
| 143 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                             | 142        |                                |           | 15 days         | Thu 7/27/17        | Thu 8/17/17        |  |
| 144 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                 | 143        |                                |           | 10 days         | Fri 8/18/17        | Thu 8/31/17        |  |
| 145 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.2.2.18     | Energizar redes                                                                                              | 144        |                                |           | 2 days          | Fri 9/1/17         | Mon 9/4/17         |  |
| 146 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.2.2.19     | Pruebas                                                                                                      | 145        |                                |           | 7 days          | Tue 9/5/17         | Wed 9/13/17        |  |
| 147 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                | 146        |                                |           | 0 days          | Wed 9/13/17        | Wed 9/13/17        |  |
| 148 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.3.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                  |            |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Thu 7/27/17</b> | <b>Mon 9/11/17</b> |  |
| 149 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                                          | 142        |                                |           | 5 days          | Thu 7/27/17        | Wed 8/2/17         |  |
| 150 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                                                          | 145        |                                |           | 5 days          | Tue 9/5/17         | Mon 9/11/17        |  |
| 151 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.3.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                  |            |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 9/14/17</b> | <b>Thu 9/21/17</b> |  |
| 152 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.4.6        | Registro Contable                                                                                            | 146        |                                |           | 2 days          | Thu 9/14/17        | Fri 9/15/17        |  |
| 153 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                                                                 | 152        |                                |           | 3 days          | Mon 9/18/17        | Wed 9/20/17        |  |
| 154 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.4.8        | Registro de Activos                                                                                          | 153        |                                |           | 1 day           | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17        |  |
| 155 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                                                    | 154        |                                |           | 0 days          | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17        |  |
| 156 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                                                      | 155        |                                |           | 0 days          | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17        |  |
| 157 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.3.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción Línea de Subtransmisión Santas Vainas - Las Palmas</b> |            |                                |           | <b>143 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Thu 9/21/17</b> |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                            | Prede    | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start             | Finish              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 158 |  | <b>1.1.1.1.3.2.5</b> | <b>Etapla Precontractual</b>                                                               |          |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b> | <b>Wed 5/17/17</b>  |
| 159 |  | 1.1.1.1.3.2.5.40     | Designar Comisión Técnica                                                                  |          |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17        | Fri 3/3/17          |
| 160 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.41     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                           | 159      |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17        | Tue 3/7/17          |
| 161 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.42     | Resolución de Inicio de proceso                                                            | 160      |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17        | Thu 3/9/17          |
| 162 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.43     | Convocar a Expresiones de Interés                                                          | 161      |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17       | Mon 3/20/17         |
| 163 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.44     | Conformación de Lista Corta                                                                | 162      |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17       | Thu 3/23/17         |
| 164 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.45     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                       | 163      |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17       | Fri 3/24/17         |
| 165 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.46     | Elaborar ofertas                                                                           | 164      |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17       | Tue 4/4/17          |
| 166 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.47     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                               | 165      |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17        | Thu 4/6/17          |
| 167 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.48     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                         | 166      |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17        | Mon 4/10/17         |
| 168 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.49     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                 | 167      |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17       | Wed 5/10/17         |
| 169 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.50     | Contrato Suscrito                                                                          | 168      |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17       | Wed 5/10/17         |
| 170 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.51     | Trámitar y pagar anticipo                                                                  | 169      |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17       | Wed 5/17/17         |
| 171 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.5.52     | Pago de anticipo 20%                                                                       | 170      |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17       | Wed 5/17/17         |
| 172 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.3.2.6</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                |          |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Wed 8/2/17</b> | <b>Thu 9/21/17</b>  |
| 173 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.6.13     | Pago Planilla 1_35%                                                                        | 149      |                                |           | 0 days          | Wed 8/2/17        | Wed 8/2/17          |
| 174 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.6.14     | Pago Planilla 2_35%                                                                        | 150      |                                |           | 0 days          | Mon 9/11/17       | Mon 9/11/17         |
| 175 |                                                                                   | 1.1.1.1.3.2.6.15     | Pago Planilla Final_10%                                                                    | 156      |                                |           | 0 days          | Thu 9/21/17       | Thu 9/21/17         |
| 176 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.4</b>     | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción Línea Subtransmisión Borbon 1 - Borbon 2</b>       | <b>1</b> |                                |           | <b>184 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 177 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.4.1</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción Línea Subtransmisión Borbon 1 - Borbon 2</b> |          |                                |           | <b>184 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 178 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.4.1.1</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapla Precontractual)</b>                                         |          |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 179 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.15     | Designar Comisión Técnica                                                                  |          |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17        | Tue 7/4/17          |
| 180 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.16     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                             | 179      |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17        | Thu 7/6/17          |
| 181 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.17     | No objeción DDLs                                                                           | 180      |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17        | Thu 7/6/17          |
| 182 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.18     | Resolución de Inicio de proceso                                                            | 181      |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17        | Mon 7/10/17         |
| 183 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.19     | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                              | 182      |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17       | Tue 7/11/17         |
| 184 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.20     | Presentar de ofertas                                                                       | 183      |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17       | Wed 8/23/17         |
| 185 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.21     | Acta de apertura de ofertas                                                                | 184      |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17       | Wed 8/23/17         |
| 186 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.22     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                               | 185      |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17       | Wed 9/6/17          |
| 187 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.23     | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                  | 186      |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17        | Wed 9/6/17          |
| 188 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.24     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                         | 187      |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17        | Fri 9/8/17          |
| 189 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.1.1.25     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                 | 188      |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17       | Fri 10/6/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                     | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                    | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 190 |    | 1.1.1.1.4.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                  | 189        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 191 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                          | 190        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 192 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                               | 191        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 193 |                                                                                     | <b>1.1.1.1.4.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                           | <b>192</b> |                                |           | <b>104 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/20/18</b>  |
| 194 |                                                                                     | <b>1.1.1.1.4.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                                |            |                                |           | <b>104 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/20/18</b>  |
| 195 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                              | 192        |                                |           | 30 days         | Tue 10/17/17        | Wed 11/29/17        |
| 196 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                          | 195        |                                |           | 10 days         | Thu 11/30/17        | Thu 12/14/17        |
| 197 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                                      | 196        |                                |           | 15 days         | Fri 12/15/17        | Mon 1/8/18          |
| 198 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                                            | 197        |                                |           | 15 days         | Tue 1/9/18          | Mon 1/29/18         |
| 199 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                                             | 197        |                                |           | 15 days         | Tue 1/9/18          | Mon 1/29/18         |
| 200 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                   | 199        |                                |           | 15 days         | Tue 1/30/18         | Wed 2/21/18         |
| 201 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                       | 200        |                                |           | 10 days         | Thu 2/22/18         | Wed 3/7/18          |
| 202 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.2.2.18     | Energizar redes                                                                                    | 201        |                                |           | 2 days          | Thu 3/8/18          | Fri 3/9/18          |
| 203 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.2.2.19     | Pruebas                                                                                            | 202        |                                |           | 7 days          | Mon 3/12/18         | Tue 3/20/18         |
| 204 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                      | 203        |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18         | Tue 3/20/18         |
| 205 |                                                                                     | <b>1.1.1.1.4.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                        |            |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Tue 1/30/18</b>  | <b>Fri 3/16/18</b>  |
| 206 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                                | 199        |                                |           | 5 days          | Tue 1/30/18         | Mon 2/5/18          |
| 207 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                                                | 202        |                                |           | 5 days          | Mon 3/12/18         | Fri 3/16/18         |
| 208 |                                                                                     | <b>1.1.1.1.4.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                        |            |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Wed 3/21/18</b>  | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 209 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.4.6        | Registro Contable                                                                                  | 203        |                                |           | 2 days          | Wed 3/21/18         | Thu 3/22/18         |
| 210 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                                                       | 209        |                                |           | 3 days          | Fri 3/23/18         | Tue 3/27/18         |
| 211 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.4.8        | Registro de Activos                                                                                | 210        |                                |           | 1 day           | Wed 3/28/18         | Wed 3/28/18         |
| 212 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                                          | 211        |                                |           | 0 days          | Wed 3/28/18         | Wed 3/28/18         |
| 213 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                                            | 212        |                                |           | 0 days          | Wed 3/28/18         | Wed 3/28/18         |
| 214 |                                                                                     | <b>1.1.1.1.4.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción Línea Subtransmisión Borbon 1 - Borbon 2</b> |            |                                |           | <b>140 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 215 |                                                                                     | <b>1.1.1.1.4.2.1</b>   | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                       |            |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 216 |  | 1.1.1.1.4.2.1.14       | Designar Comisión Técnica                                                                          |            |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |
| 217 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.2.1.15       | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                   | 216        |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |
| 218 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.2.1.16       | Resolución de Inicio de proceso                                                                    | 217        |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17          | Mon 9/11/17         |
| 219 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.2.1.17       | Convocar a Expresiones de Interés                                                                  | 218        |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17         | Wed 9/20/17         |
| 220 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.2.1.18       | Conformación de Lista Corta                                                                        | 219        |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17         | Mon 9/25/17         |
| 221 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.2.1.19       | Invitación a empresas de Lista Corta                                                               | 220        |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17         | Tue 9/26/17         |
| 222 |                                                                                     | 1.1.1.1.4.2.1.20       | Elaborar ofertas                                                                                   | 221        |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17         | Thu 10/5/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                               | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| 223 |  | 1.1.1.1.4.2.1.21       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                  | 222        |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17       |  |
| 224 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.2.1.22       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                            | 223        |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17       |  |
| 225 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.2.1.23       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                    | 224        |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17       |  |
| 226 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.2.1.24       | Contrato Suscrito                                                             | 225        |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17       |  |
| 227 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.2.1.25       | Trámitar y pagar anticipo                                                     | 226        |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17       |  |
| 228 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.2.1.26       | Pago de anticipo 20%                                                          | 227        |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17       |  |
| 229 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.4.2.2</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                   |            |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Mon 2/5/18</b>  | <b>Wed 3/28/18</b> |  |
| 230 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.2.2.4        | Pago Planilla 1_35%                                                           | 206        |                                |           | 0 days          | Mon 2/5/18         | Mon 2/5/18         |  |
| 231 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.2.2.5        | Pago Planilla 2_35%                                                           | 207        |                                |           | 0 days          | Fri 3/16/18        | Fri 3/16/18        |  |
| 232 |                                                                                   | 1.1.1.1.4.2.2.6        | Pago Planilla Final_10%                                                       | 213        |                                |           | 0 days          | Wed 3/28/18        | Wed 3/28/18        |  |
| 233 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.5</b>       | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reforzamiento Subsistema El Salto-Atacames</b>       | <b>1</b>   |                                |           | <b>184 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/21/17</b> |  |
| 234 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.5.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Reforzamiento Subsistema El Salto-Atacames</b> |            |                                |           | <b>184 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/21/17</b> |  |
| 235 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.5.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                             |            |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b> |  |
| 236 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                     |            |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17         |  |
| 237 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                | 236        |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17         |  |
| 238 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.17       | No objeción DDLs                                                              | 237        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17         |  |
| 239 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                               | 238        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |  |
| 240 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                 | 239        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17        |  |
| 241 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                          | 240        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17        |  |
| 242 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                   | 241        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17        |  |
| 243 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                  | 242        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17         |  |
| 244 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación     | 243        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17         |  |
| 245 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                            | 244        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17        |  |
| 246 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                    | 245        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17        |  |
| 247 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                             | 246        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |  |
| 248 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                     | 247        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |  |
| 249 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                          | 248        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |  |
| 250 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.5.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                      | <b>249</b> |                                |           | <b>104 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/13/17</b> |  |
| 251 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.5.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                           |            |                                |           | <b>104 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/13/17</b> |  |
| 252 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                         | 249        |                                |           | 30 days         | Wed 4/19/17        | Wed 5/31/17        |  |
| 253 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.2.2.12     | Replanteo                                                                     | 252        |                                |           | 10 days         | Thu 6/1/17         | Wed 6/14/17        |  |
| 254 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                 | 253        |                                |           | 15 days         | Thu 6/15/17        | Wed 7/5/17         |  |
| 255 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                       | 254        |                                |           | 15 days         | Thu 7/6/17         | Wed 7/26/17        |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                       | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| 256 |  | 1.1.1.1.5.1.2.2.15   | Tendido de Conductores                                                                | 254   |                                |           | 15 days         | Thu 7/6/17         | Wed 7/26/17        |  |
| 257 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.2.2.16   | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                      | 256   |                                |           | 15 days         | Thu 7/27/17        | Thu 8/17/17        |  |
| 258 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.2.2.17   | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                          | 257   |                                |           | 10 days         | Fri 8/18/17        | Thu 8/31/17        |  |
| 259 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.2.2.18   | Energizar redes                                                                       | 258   |                                |           | 2 days          | Fri 9/1/17         | Mon 9/4/17         |  |
| 260 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.2.2.19   | Pruebas                                                                               | 259   |                                |           | 7 days          | Tue 9/5/17         | Wed 9/13/17        |  |
| 261 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.2.2.20   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                         | 260   |                                |           | 0 days          | Wed 9/13/17        | Wed 9/13/17        |  |
| 262 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.5.1.3</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                           |       |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Thu 7/27/17</b> | <b>Mon 9/11/17</b> |  |
| 263 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.3.3      | Pago Planilla 1_20%                                                                   | 256   |                                |           | 5 days          | Thu 7/27/17        | Wed 8/2/17         |  |
| 264 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                                   | 259   |                                |           | 5 days          | Tue 9/5/17         | Mon 9/11/17        |  |
| 265 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.5.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                           |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 9/14/17</b> | <b>Thu 9/21/17</b> |  |
| 266 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.4.6      | Registro Contable                                                                     | 260   |                                |           | 2 days          | Thu 9/14/17        | Fri 9/15/17        |  |
| 267 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                                          | 266   |                                |           | 3 days          | Mon 9/18/17        | Wed 9/20/17        |  |
| 268 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.4.8      | Registro de Activos                                                                   | 267   |                                |           | 1 day           | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17        |  |
| 269 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                                             | 268   |                                |           | 0 days          | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17        |  |
| 270 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                               | 269   |                                |           | 0 days          | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17        |  |
| 271 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.5.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reforzamiento Subsistema El Salto-Atacames</b> |       |                                |           | <b>143 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Thu 9/21/17</b> |  |
| 272 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.5.2.3</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                          |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |  |
| 273 |  | 1.1.1.1.5.2.3.27     | Designar Comisión Técnica                                                             |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |  |
| 274 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.28     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                      | 273   |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |  |
| 275 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.29     | Resolución de Inicio de proceso                                                       | 274   |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |  |
| 276 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.30     | Convocar a Expresiones de Interés                                                     | 275   |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |  |
| 277 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.31     | Conformación de Lista Corta                                                           | 276   |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |  |
| 278 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.32     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                  | 277   |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |  |
| 279 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.33     | Elaborar ofertas                                                                      | 278   |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |  |
| 280 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.34     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                          | 279   |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17         |  |
| 281 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.35     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                    | 280   |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17        |  |
| 282 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.36     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                            | 281   |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17        |  |
| 283 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.37     | Contrato Suscrito                                                                     | 282   |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17        |  |
| 284 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.38     | Trámitar y pagar anticipo                                                             | 283   |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17        |  |
| 285 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.3.39     | Pago de anticipo 20%                                                                  | 284   |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17        |  |
| 286 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.5.2.4</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                           |       |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Wed 8/2/17</b>  | <b>Thu 9/21/17</b> |  |
| 287 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.4.7      | Pago Planilla 1_35%                                                                   | 263   |                                |           | 0 days          | Wed 8/2/17         | Wed 8/2/17         |  |
| 288 |                                                                                   | 1.1.1.1.5.2.4.8      | Pago Planilla 2_35%                                                                   | 264   |                                |           | 0 days          | Mon 9/11/17        | Mon 9/11/17        |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                     | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 289 |  | 1.1.1.1.5.2.4.9        | Pago Planilla Final_10%                                                                             | 270        |                                |           | 0 days          | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17         |
| 290 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.6</b>       | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de la Línea de Subtransmisión Propicia - Atacames</b>       |            | <b>1</b>                       |           | <b>224 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 11/21/17</b> |
| 291 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.6.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de la Línea de Subtransmisión Propicia - Atacames</b> |            |                                |           | <b>224 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 11/21/17</b> |
| 292 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.6.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                   |            |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 293 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                                           |            |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17          |
| 294 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                      | 293        |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17          |
| 295 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.17       | No objeción DDLs                                                                                    | 294        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17          |
| 296 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                                     | 295        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17          |
| 297 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                       | 296        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17         |
| 298 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                                | 297        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17         |
| 299 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                                         | 298        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17         |
| 300 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                        | 299        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17          |
| 301 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                           | 300        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17          |
| 302 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                  | 301        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17         |
| 303 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                          | 302        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17         |
| 304 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                   | 303        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17         |
| 305 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                           | 304        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17         |
| 306 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                                | 305        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17         |
| 307 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.6.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                            | <b>306</b> |                                |           | <b>144 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 308 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.6.1.2.3</b> | <b>Construcción</b>                                                                                 |            |                                |           | <b>144 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 309 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.2.3.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                               | 306        |                                |           | 40 days         | Wed 4/19/17        | Wed 6/14/17         |
| 310 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.2.3.12     | Replanteo                                                                                           | 309        |                                |           | 20 days         | Thu 6/15/17        | Wed 7/12/17         |
| 311 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.2.3.13     | Obras Civiles                                                                                       | 310        |                                |           | 20 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/9/17          |
| 312 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.2.3.14     | Montaje Electromecánico                                                                             | 311        |                                |           | 20 days         | Thu 8/10/17        | Thu 9/7/17          |
| 313 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.2.3.15     | Tendido de Conductores                                                                              | 311        |                                |           | 20 days         | Thu 8/10/17        | Thu 9/7/17          |
| 314 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.2.3.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                    | 313        |                                |           | 20 days         | Fri 9/8/17         | Thu 10/5/17         |
| 315 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.2.3.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                        | 314        |                                |           | 15 days         | Fri 10/6/17        | Fri 10/27/17        |
| 316 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.2.3.18     | Energizar redes                                                                                     | 315        |                                |           | 2 days          | Mon 10/30/17       | Tue 10/31/17        |
| 317 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.2.3.19     | Pruebas                                                                                             | 316        |                                |           | 7 days          | Wed 11/1/17        | Mon 11/13/17        |
| 318 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.2.3.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                       | 317        |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 319 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.6.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                         |            |                                |           | <b>42 days</b>  | <b>Fri 9/8/17</b>  | <b>Thu 11/9/17</b>  |
| 320 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                                 | 313        |                                |           | 5 days          | Fri 9/8/17         | Thu 9/14/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                                             | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| 321 |  | 1.1.1.1.6.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                                                         | 316   |                                |           | 5 days          | Wed 11/1/17         | Thu 11/9/17         |  |
| 322 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.6.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                 |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Tue 11/14/17</b> | <b>Tue 11/21/17</b> |  |
| 323 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.4.6      | Registro Contable                                                                                           | 317   |                                |           | 2 days          | Tue 11/14/17        | Wed 11/15/17        |  |
| 324 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                                                                | 323   |                                |           | 3 days          | Thu 11/16/17        | Mon 11/20/17        |  |
| 325 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.4.8      | Registro de Activos                                                                                         | 324   |                                |           | 1 day           | Tue 11/21/17        | Tue 11/21/17        |  |
| 326 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                                                                   | 325   |                                |           | 0 days          | Tue 11/21/17        | Tue 11/21/17        |  |
| 327 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                                                     | 326   |                                |           | 0 days          | Tue 11/21/17        | Tue 11/21/17        |  |
| 328 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.6.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de la Línea de Subtransmisión Propicia - Atacames</b> |       |                                |           | <b>183 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>   | <b>Tue 11/21/17</b> |  |
| 329 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.6.2.1</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>   | <b>Wed 5/17/17</b>  |  |
| 330 |  | 1.1.1.1.6.2.1.40     | Designar Comisión Técnica                                                                                   |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17          | Fri 3/3/17          |  |
| 331 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.41     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                            | 330   |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17          | Tue 3/7/17          |  |
| 332 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.42     | Resolución de Inicio de proceso                                                                             | 331   |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17          | Thu 3/9/17          |  |
| 333 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.43     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                           | 332   |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17         | Mon 3/20/17         |  |
| 334 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.44     | Conformación de Lista Corta                                                                                 | 333   |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17         | Thu 3/23/17         |  |
| 335 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.45     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                        | 334   |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17         | Fri 3/24/17         |  |
| 336 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.46     | Elaborar ofertas                                                                                            | 335   |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17         | Tue 4/4/17          |  |
| 337 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.47     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                | 336   |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17          | Thu 4/6/17          |  |
| 338 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.48     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                          | 337   |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17          | Mon 4/10/17         |  |
| 339 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.49     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                  | 338   |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17         | Wed 5/10/17         |  |
| 340 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.50     | Contrato Suscrito                                                                                           | 339   |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17         | Wed 5/10/17         |  |
| 341 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.51     | Trámitar y pagar anticipo                                                                                   | 340   |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17         | Wed 5/17/17         |  |
| 342 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.1.52     | Pago de anticipo 20%                                                                                        | 341   |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17         | Wed 5/17/17         |  |
| 343 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.6.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                 |       |                                |           | <b>45 days</b>  | <b>Thu 9/14/17</b>  | <b>Tue 11/21/17</b> |  |
| 344 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.2.10     | Pago Planilla 1_35%                                                                                         | 320   |                                |           | 0 days          | Thu 9/14/17         | Thu 9/14/17         |  |
| 345 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.2.11     | Pago Planilla 2_35%                                                                                         | 321   |                                |           | 0 days          | Thu 11/9/17         | Thu 11/9/17         |  |
| 346 |                                                                                   | 1.1.1.1.6.2.2.12     | Pago Planilla Final_10%                                                                                     | 327   |                                |           | 0 days          | Tue 11/21/17        | Tue 11/21/17        |  |
| 347 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.7</b>     | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Repotenciamiento subsistema Propicia - Atacames (incluye S/E Tonsupa)</b>          |       | <b>1</b>                       |           | <b>224 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 5/28/18</b>  |  |
| 348 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.7.3</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Repotenciamiento subsistema Propicia - Atacames (incluye S/E Tonsupa)</b>    |       |                                |           | <b>224 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 5/28/18</b>  |  |
| 349 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.7.3.5</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                          |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |  |
| 350 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.29     | Designar Comisión Técnica                                                                                   |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |  |
| 351 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.30     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                              | 350   |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |  |
| 352 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.31     | No objeción DDLs                                                                                            | 351   |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |  |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                  | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 353 |  | 1.1.1.1.7.3.5.32       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                  | 352        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17        |
| 354 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.33       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                    | 353        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17        |
| 355 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.34       | Presentar de ofertas                                                                                             | 354        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17        |
| 356 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.35       | Acta de apertura de ofertas                                                                                      | 355        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17        |
| 357 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.36       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                     | 356        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17         |
| 358 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.37       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                        | 357        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17         |
| 359 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.38       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                               | 358        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17         |
| 360 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.39       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                       | 359        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17        |
| 361 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.40       | Contrato Suscrito                                                                                                | 360        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17        |
| 362 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.41       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                        | 361        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17       |
| 363 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.5.42       | Pago de anticipo 50%                                                                                             | 362        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17       |
| 364 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.7.3.6</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                         | <b>363</b> |                                |           | <b>144 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Thu 5/17/18</b> |
| 365 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.7.3.6.4</b> | <b>Construcción</b>                                                                                              |            |                                |           | <b>144 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Thu 5/17/18</b> |
| 366 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.6.4.21     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                            | 363        |                                |           | 40 days         | Tue 10/17/17        | Thu 12/14/17       |
| 367 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.6.4.22     | Replanteo                                                                                                        | 366        |                                |           | 20 days         | Fri 12/15/17        | Mon 1/15/18        |
| 368 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.6.4.23     | Obras Civiles                                                                                                    | 367        |                                |           | 20 days         | Tue 1/16/18         | Wed 2/14/18        |
| 369 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.6.4.24     | Montaje Electromecánico                                                                                          | 368        |                                |           | 20 days         | Thu 2/15/18         | Wed 3/14/18        |
| 370 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.6.4.25     | Tendido de Conductores                                                                                           | 368        |                                |           | 20 days         | Thu 2/15/18         | Wed 3/14/18        |
| 371 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.6.4.26     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                 | 370        |                                |           | 20 days         | Thu 3/15/18         | Thu 4/12/18        |
| 372 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.6.4.27     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                     | 371        |                                |           | 15 days         | Fri 4/13/18         | Fri 5/4/18         |
| 373 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.6.4.28     | Energizar redes                                                                                                  | 372        |                                |           | 2 days          | Mon 5/7/18          | Tue 5/8/18         |
| 374 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.6.4.29     | Pruebas                                                                                                          | 373        |                                |           | 7 days          | Wed 5/9/18          | Thu 5/17/18        |
| 375 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.6.4.30     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                    | 374        |                                |           | 0 days          | Thu 5/17/18         | Thu 5/17/18        |
| 376 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.7.3.7</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                      |            |                                |           | <b>42 days</b>  | <b>Thu 3/15/18</b>  | <b>Tue 5/15/18</b> |
| 377 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.7.5        | Pago Planilla 1_20%                                                                                              | 370        |                                |           | 5 days          | Thu 3/15/18         | Wed 3/21/18        |
| 378 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.7.6        | Pago Planilla 2_20%                                                                                              | 373        |                                |           | 5 days          | Wed 5/9/18          | Tue 5/15/18        |
| 379 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.7.3.8</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                      |            |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Fri 5/18/18</b>  | <b>Mon 5/28/18</b> |
| 380 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.8.11       | Registro Contable                                                                                                | 374        |                                |           | 2 days          | Fri 5/18/18         | Mon 5/21/18        |
| 381 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.8.12       | Liquidación Técnica Contable                                                                                     | 380        |                                |           | 3 days          | Tue 5/22/18         | Thu 5/24/18        |
| 382 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.8.13       | Registro de Activos                                                                                              | 381        |                                |           | 1 day           | Mon 5/28/18         | Mon 5/28/18        |
| 383 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.8.14       | Acta de Entrega Recepción                                                                                        | 382        |                                |           | 0 days          | Mon 5/28/18         | Mon 5/28/18        |
| 384 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.3.8.15       | Pago Planilla final 10%                                                                                          | 383        |                                |           | 0 days          | Mon 5/28/18         | Mon 5/28/18        |
| 385 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.7.4</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Repotenciamiento subsistema Propicia - Atacames (incluye S/E Tonsupa)</b> |            |                                |           | <b>180 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 5/28/18</b> |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                     | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 386 |  | <b>1.1.1.1.7.4.3</b> | <b>Etapla Precontractual</b>                                                        |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 387 |  | 1.1.1.1.7.4.3.53     | Designar Comisión Técnica                                                           |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |
| 388 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.54     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                    | 387   |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |
| 389 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.55     | Resolución de Inicio de proceso                                                     | 388   |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |
| 390 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.56     | Convocar a Expresiones de Interés                                                   | 389   |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |
| 391 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.57     | Conformación de Lista Corta                                                         | 390   |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |
| 392 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.58     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                | 391   |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |
| 393 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.59     | Elaborar ofertas                                                                    | 392   |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |
| 394 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.60     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                        | 393   |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 395 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.61     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                  | 394   |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 396 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.62     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                          | 395   |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 397 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.63     | Contrato Suscrito                                                                   | 396   |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 398 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.64     | Trámitar y pagar anticipo                                                           | 397   |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 399 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.3.65     | Pago de anticipo 20%                                                                | 398   |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 400 |                                                                                   | <b>1.1.1.1.7.4.4</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                         |       |                                |           | <b>45 days</b>  | <b>Wed 3/21/18</b> | <b>Mon 5/28/18</b>  |
| 401 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.4.13     | Pago Planilla 1_35%                                                                 | 377   |                                |           | 0 days          | Wed 3/21/18        | Wed 3/21/18         |
| 402 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.4.14     | Pago Planilla 2_35%                                                                 | 378   |                                |           | 0 days          | Tue 5/15/18        | Tue 5/15/18         |
| 403 |                                                                                   | 1.1.1.1.7.4.4.15     | Pago Planilla Final_10%                                                             | 384   |                                |           | 0 days          | Mon 5/28/18        | Mon 5/28/18         |
| 404 |                                                                                   | <b>1.1.1.2</b>       | <b>CNEL EP- UN Manabí 12 Proyectos de Subtransmisión fiscalizados y energizados</b> |       | <b>12</b>                      |           | <b>595 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/6/19</b>   |
| 405 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.1</b>     | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Subestación Calceta</b>                         |       | <b>1</b>                       |           | <b>309 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 3/27/18</b>  |
| 406 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.1.1</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Subestación Calceta</b>                   |       |                                |           | <b>309 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 3/27/18</b>  |
| 407 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.1.1.1</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapla Precontractual)</b>                                  |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 408 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.15     | Designar Comisión Técnica                                                           |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17          |
| 409 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.16     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                      | 408   |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17          |
| 410 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.17     | No objeción DDLs                                                                    | 409   |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17          |
| 411 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.18     | Resolución de Inicio de proceso                                                     | 410   |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17          |
| 412 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.19     | Publicar convocatoria prensa nacional y/o Compras Públicas                          | 411   |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17         |
| 413 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.20     | Presentar de ofertas                                                                | 412   |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17         |
| 414 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.21     | Acta de apertura de ofertas                                                         | 413   |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17         |
| 415 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.22     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                        | 414   |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17          |
| 416 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.23     | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación           | 415   |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17          |
| 417 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.24     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                  | 416   |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17         |
| 418 |                                                                                   | 1.1.1.2.1.1.1.25     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                          | 417   |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                     | WBS                    | Nombre de tarea                                                           | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| 419 |    | 1.1.1.2.1.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                         | 418        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |  |
| 420 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 419        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |  |
| 421 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                      | 420        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |  |
| 422 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.1.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>421</b> |                                |           | <b>229 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 3/19/18</b> |  |
| 423 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.1.1.2.3</b> | <b>Construcción</b>                                                       |            |                                |           | <b>229 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 3/19/18</b> |  |
| 424 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.2.3.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 421        |                                |           | 120 days        | Wed 4/19/17        | Thu 10/5/17        |  |
| 425 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.2.3.12     | Replanteo                                                                 | 424        |                                |           | 20 days         | Fri 10/6/17        | Tue 11/7/17        |  |
| 426 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.2.3.13     | Obras Civiles                                                             | 425        |                                |           | 30 days         | Wed 11/8/17        | Wed 12/20/17       |  |
| 427 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.2.3.14     | Montaje Electromecánico                                                   | 426        |                                |           | 30 days         | Thu 12/21/17       | Fri 2/2/18         |  |
| 428 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.2.3.15     | Tendido de Conductores                                                    | 426        |                                |           | 20 days         | Thu 12/21/17       | Fri 1/19/18        |  |
| 429 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.2.3.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                          | 428        |                                |           | 20 days         | Mon 1/22/18        | Tue 2/20/18        |  |
| 430 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.2.3.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones              | 429        |                                |           | 10 days         | Wed 2/21/18        | Tue 3/6/18         |  |
| 431 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.2.3.18     | Energizar redes                                                           | 430        |                                |           | 2 days          | Wed 3/7/18         | Thu 3/8/18         |  |
| 432 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.2.3.19     | Pruebas                                                                   | 431        |                                |           | 7 days          | Fri 3/9/18         | Mon 3/19/18        |  |
| 433 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.2.3.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                             | 432        |                                |           | 0 days          | Mon 3/19/18        | Mon 3/19/18        |  |
| 434 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.1.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |            |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Mon 1/22/18</b> | <b>Thu 3/15/18</b> |  |
| 435 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                       | 428        |                                |           | 5 days          | Mon 1/22/18        | Fri 1/26/18        |  |
| 436 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                       | 431        |                                |           | 5 days          | Fri 3/9/18         | Thu 3/15/18        |  |
| 437 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.1.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                               |            |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Tue 3/20/18</b> | <b>Tue 3/27/18</b> |  |
| 438 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.4.6        | Registro Contable                                                         | 432        |                                |           | 2 days          | Tue 3/20/18        | Wed 3/21/18        |  |
| 439 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                              | 438        |                                |           | 3 days          | Thu 3/22/18        | Mon 3/26/18        |  |
| 440 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.4.8        | Registro de Activos                                                       | 439        |                                |           | 1 day           | Tue 3/27/18        | Tue 3/27/18        |  |
| 441 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                 | 440        |                                |           | 0 days          | Tue 3/27/18        | Tue 3/27/18        |  |
| 442 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                   | 441        |                                |           | 0 days          | Tue 3/27/18        | Tue 3/27/18        |  |
| 443 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.1.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Subestación Calceta</b> |            |                                |           | <b>268 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Tue 3/27/18</b> |  |
| 444 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.1.2.1</b>   | <b>Etapas Precontractual</b>                                              |            |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |  |
| 445 |  | 1.1.1.2.1.2.1.53       | Designar Comisión Técnica                                                 |            |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |  |
| 446 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.2.1.54       | Elaborar Solicitud de Propuestas                                          | 445        |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |  |
| 447 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.2.1.55       | Resolución de Inicio de proceso                                           | 446        |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |  |
| 448 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.2.1.56       | Convocar a Expresiones de Interés                                         | 447        |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |  |
| 449 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.2.1.57       | Conformación de Lista Corta                                               | 448        |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |  |
| 450 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.2.1.58       | Invitación a empresas de Lista Corta                                      | 449        |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |  |
| 451 |                                                                                     | 1.1.1.2.1.2.1.59       | Elaborar ofertas                                                          | 450        |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |  | WBS                    | Nombre de tarea                                                           | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|-----|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 452 |  | 1.1.1.2.1.2.1.60       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 451        |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17         |
| 453 |  | 1.1.1.2.1.2.1.61       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 452        |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17        |
| 454 |  | 1.1.1.2.1.2.1.62       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 453        |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17        |
| 455 |  | 1.1.1.2.1.2.1.63       | Contrato Suscrito                                                         | 454        |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17        |
| 456 |  | 1.1.1.2.1.2.1.64       | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 455        |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17        |
| 457 |  | 1.1.1.2.1.2.1.65       | Pago de anticipo 20%                                                      | 456        |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17        |
| 458 |  | <b>1.1.1.2.1.2.2</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |            |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Fri 1/26/18</b> | <b>Tue 3/27/18</b> |
| 459 |  | 1.1.1.2.1.2.2.13       | Pago Planilla 1_35%                                                       | 435        |                                |           | 0 days          | Fri 1/26/18        | Fri 1/26/18        |
| 460 |  | 1.1.1.2.1.2.2.14       | Pago Planilla 2_35%                                                       | 436        |                                |           | 0 days          | Thu 3/15/18        | Thu 3/15/18        |
| 461 |  | 1.1.1.2.1.2.2.15       | Pago Planilla Final_10%                                                   | 442        |                                |           | 0 days          | Tue 3/27/18        | Tue 3/27/18        |
| 462 |  | <b>1.1.1.2.2</b>       | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Subestación San Vicente</b>           |            | <b>1</b>                       |           | <b>304 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 3/20/18</b> |
| 463 |  | <b>1.1.1.2.2.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Subestación San Vicente</b>     |            |                                |           | <b>304 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 3/20/18</b> |
| 464 |  | <b>1.1.1.2.2.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                         |            |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b> |
| 465 |  | 1.1.1.2.2.1.1.29       | Designar Comisión Técnica                                                 |            |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17         |
| 466 |  | 1.1.1.2.2.1.1.30       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                            | 465        |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17         |
| 467 |  | 1.1.1.2.2.1.1.31       | No objeción DDLs                                                          | 466        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17         |
| 468 |  | 1.1.1.2.2.1.1.32       | Resolución de Inicio de proceso                                           | 467        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |
| 469 |  | 1.1.1.2.2.1.1.33       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas             | 468        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17        |
| 470 |  | 1.1.1.2.2.1.1.34       | Presentar de ofertas                                                      | 469        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17        |
| 471 |  | 1.1.1.2.2.1.1.35       | Acta de apertura de ofertas                                               | 470        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17        |
| 472 |  | 1.1.1.2.2.1.1.36       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 471        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17         |
| 473 |  | 1.1.1.2.2.1.1.37       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 472        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17         |
| 474 |  | 1.1.1.2.2.1.1.38       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 473        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17        |
| 475 |  | 1.1.1.2.2.1.1.39       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 474        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17        |
| 476 |  | 1.1.1.2.2.1.1.40       | Contrato Suscrito                                                         | 475        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |
| 477 |  | 1.1.1.2.2.1.1.41       | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 476        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |
| 478 |  | 1.1.1.2.2.1.1.42       | Pago de anticipo 50%                                                      | 477        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |
| 479 |  | <b>1.1.1.2.2.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>478</b> |                                |           | <b>224 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 3/12/18</b> |
| 480 |  | <b>1.1.1.2.2.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                       |            |                                |           | <b>224 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 3/12/18</b> |
| 481 |  | 1.1.1.2.2.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 478        |                                |           | 120 days        | Wed 4/19/17        | Thu 10/5/17        |
| 482 |  | 1.1.1.2.2.1.2.2.12     | Replanteo                                                                 | 481        |                                |           | 20 days         | Fri 10/6/17        | Tue 11/7/17        |
| 483 |  | 1.1.1.2.2.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                             | 482        |                                |           | 30 days         | Wed 11/8/17        | Wed 12/20/17       |
| 484 |  | 1.1.1.2.2.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                   | 483        |                                |           | 30 days         | Thu 12/21/17       | Fri 2/2/18         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                               | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| 485 |  | 1.1.1.2.2.1.2.2.15   | Tendido de Conductores                                                        | 483   |                                |           | 20 days         | Thu 12/21/17       | Fri 1/19/18        |  |
| 486 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.2.2.16   | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                              | 485   |                                |           | 15 days         | Mon 1/22/18        | Fri 2/9/18         |  |
| 487 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.2.2.17   | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                  | 486   |                                |           | 10 days         | Wed 2/14/18        | Tue 2/27/18        |  |
| 488 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.2.2.18   | Energizar redes                                                               | 487   |                                |           | 2 days          | Wed 2/28/18        | Thu 3/1/18         |  |
| 489 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.2.2.19   | Pruebas                                                                       | 488   |                                |           | 7 days          | Fri 3/2/18         | Mon 3/12/18        |  |
| 490 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.2.2.20   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                 | 489   |                                |           | 0 days          | Mon 3/12/18        | Mon 3/12/18        |  |
| 491 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.2.1.3</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                   |       |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Mon 1/22/18</b> | <b>Thu 3/8/18</b>  |  |
| 492 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.3.3      | Pago Planilla 1_20%                                                           | 485   |                                |           | 5 days          | Mon 1/22/18        | Fri 1/26/18        |  |
| 493 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                           | 488   |                                |           | 5 days          | Fri 3/2/18         | Thu 3/8/18         |  |
| 494 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.2.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                   |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Tue 3/13/18</b> | <b>Tue 3/20/18</b> |  |
| 495 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.4.6      | Registro Contable                                                             | 489   |                                |           | 2 days          | Tue 3/13/18        | Wed 3/14/18        |  |
| 496 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                                  | 495   |                                |           | 3 days          | Thu 3/15/18        | Mon 3/19/18        |  |
| 497 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.4.8      | Registro de Activos                                                           | 496   |                                |           | 1 day           | Tue 3/20/18        | Tue 3/20/18        |  |
| 498 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                                     | 497   |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18        | Tue 3/20/18        |  |
| 499 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                       | 498   |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18        | Tue 3/20/18        |  |
| 500 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.2.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Subestación San Vicente</b> |       |                                |           | <b>263 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Tue 3/20/18</b> |  |
| 501 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.2.2.1</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                  |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |  |
| 502 |  | 1.1.1.2.2.2.1.66     | Designar Comisión Técnica                                                     |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |  |
| 503 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.67     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                              | 502   |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |  |
| 504 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.68     | Resolución de Inicio de proceso                                               | 503   |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |  |
| 505 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.69     | Convocar a Expresiones de Interés                                             | 504   |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |  |
| 506 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.70     | Conformación de Lista Corta                                                   | 505   |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |  |
| 507 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.71     | Invitación a empresas de Lista Corta                                          | 506   |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |  |
| 508 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.72     | Elaborar ofertas                                                              | 507   |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |  |
| 509 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.73     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                  | 508   |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17         |  |
| 510 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.74     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                            | 509   |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17        |  |
| 511 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.75     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                    | 510   |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17        |  |
| 512 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.76     | Contrato Suscrito                                                             | 511   |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17        |  |
| 513 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.77     | Trámitar y pagar anticipo                                                     | 512   |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17        |  |
| 514 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.1.78     | Pago de anticipo 20%                                                          | 513   |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17        |  |
| 515 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.2.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                   |       |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Fri 1/26/18</b> | <b>Tue 3/20/18</b> |  |
| 516 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.2.16     | Pago Planilla 1_35%                                                           | 492   |                                |           | 0 days          | Fri 1/26/18        | Fri 1/26/18        |  |
| 517 |                                                                                   | 1.1.1.2.2.2.2.17     | Pago Planilla 2_35%                                                           | 493   |                                |           | 0 days          | Thu 3/8/18         | Thu 3/8/18         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |  | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                            | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|-----|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 518 |  | 1.1.1.2.2.2.18         | Pago Planilla Final_10%                                                                                                    | 499        |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18         | Tue 3/20/18         |
| 519 |  | <b>1.1.1.2.3</b>       | <b>CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Rocafuerte y construcción línea simple circuito San Gregorio-Rocafuerte</b>       |            | <b>1</b>                       |           | <b>369 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 12/17/18</b> |
| 520 |  | <b>1.1.1.2.3.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Rocafuerte y construcción línea simple circuito San Gregorio-Rocafuerte</b> |            |                                |           | <b>369 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 12/17/18</b> |
| 521 |  | <b>1.1.1.2.3.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                                          |            |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 522 |  | 1.1.1.2.3.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                                                                  |            |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 523 |  | 1.1.1.2.3.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                             | 522        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 524 |  | 1.1.1.2.3.1.1.17       | No objeción DDLs                                                                                                           | 523        |                                |           | 5 days          | Fri 7/7/17          | Thu 7/13/17         |
| 525 |  | 1.1.1.2.3.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                            | 524        |                                |           | 2 days          | Fri 7/14/17         | Mon 7/17/17         |
| 526 |  | 1.1.1.2.3.1.1.19       | Publicar convocatoria en UNDB, prensa nacional y/o Compras Públicas                                                        | 525        |                                |           | 3 days          | Tue 7/18/17         | Thu 7/20/17         |
| 527 |  | 1.1.1.2.3.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                                                       | 526        |                                |           | 38 days         | Fri 7/21/17         | Wed 9/13/17         |
| 528 |  | 1.1.1.2.3.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                                                                | 527        |                                |           | 0 days          | Wed 9/13/17         | Wed 9/13/17         |
| 529 |  | 1.1.1.2.3.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                               | 528        |                                |           | 10 days         | Thu 9/14/17         | Wed 9/27/17         |
| 530 |  | 1.1.1.2.3.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                                  | 529        |                                |           | 5 days          | Thu 9/28/17         | Wed 10/4/17         |
| 531 |  | 1.1.1.2.3.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                         | 530        |                                |           | 2 days          | Thu 10/5/17         | Fri 10/6/17         |
| 532 |  | 1.1.1.2.3.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                 | 531        |                                |           | 20 days         | Tue 10/10/17        | Wed 11/8/17         |
| 533 |  | 1.1.1.2.3.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                                          | 532        |                                |           | 0 days          | Wed 11/8/17         | Wed 11/8/17         |
| 534 |  | 1.1.1.2.3.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                  | 533        |                                |           | 5 days          | Thu 11/9/17         | Wed 11/15/17        |
| 535 |  | 1.1.1.2.3.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                                                       | 534        |                                |           | 0 days          | Wed 11/15/17        | Wed 11/15/17        |
| 536 |  | <b>1.1.1.2.3.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                                   | <b>535</b> |                                |           | <b>269 days</b> | <b>Thu 11/16/17</b> | <b>Fri 12/7/18</b>  |
| 537 |  | <b>1.1.1.2.3.1.2.3</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                        |            |                                |           | <b>269 days</b> | <b>Thu 11/16/17</b> | <b>Fri 12/7/18</b>  |
| 538 |  | 1.1.1.2.3.1.2.3.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                      | 535        |                                |           | 150 days        | Thu 11/16/17        | Mon 6/25/18         |
| 539 |  | 1.1.1.2.3.1.2.3.12     | Replanteo                                                                                                                  | 538        |                                |           | 20 days         | Tue 6/26/18         | Mon 7/23/18         |
| 540 |  | 1.1.1.2.3.1.2.3.13     | Obras Civiles                                                                                                              | 539        |                                |           | 30 days         | Tue 7/24/18         | Mon 9/3/18          |
| 541 |  | 1.1.1.2.3.1.2.3.14     | Montaje Electromecánico                                                                                                    | 540        |                                |           | 30 days         | Tue 9/4/18          | Mon 10/15/18        |
| 542 |  | 1.1.1.2.3.1.2.3.15     | Tendido de Conductores                                                                                                     | 540        |                                |           | 30 days         | Tue 9/4/18          | Mon 10/15/18        |
| 543 |  | 1.1.1.2.3.1.2.3.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                           | 542        |                                |           | 15 days         | Tue 10/16/18        | Mon 11/5/18         |
| 544 |  | 1.1.1.2.3.1.2.3.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                               | 543        |                                |           | 15 days         | Tue 11/6/18         | Mon 11/26/18        |
| 545 |  | 1.1.1.2.3.1.2.3.18     | Energizar redes                                                                                                            | 544        |                                |           | 2 days          | Tue 11/27/18        | Wed 11/28/18        |
| 546 |  | 1.1.1.2.3.1.2.3.19     | Pruebas                                                                                                                    | 545        |                                |           | 7 days          | Thu 11/29/18        | Fri 12/7/18         |
| 547 |  | 1.1.1.2.3.1.2.3.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                              | 546        |                                |           | 0 days          | Fri 12/7/18         | Fri 12/7/18         |
| 548 |  | <b>1.1.1.2.3.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                |            |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Tue 10/16/18</b> | <b>Wed 12/5/18</b>  |
| 549 |  | 1.1.1.2.3.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                                                        | 542        |                                |           | 5 days          | Tue 10/16/18        | Mon 10/22/18        |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                     | WBS                  | Nombre de tarea                                                                                                                    | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 550 |    | 1.1.1.2.3.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                                                                                | 545   |                                |           | 5 days          | Thu 11/29/18        | Wed 12/5/18         |
| 551 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.3.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                        |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 12/10/18</b> | <b>Mon 12/17/18</b> |
| 552 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.1.4.6      | Registro Contable                                                                                                                  | 546   |                                |           | 2 days          | Mon 12/10/18        | Tue 12/11/18        |
| 553 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                                                                                       | 552   |                                |           | 3 days          | Wed 12/12/18        | Fri 12/14/18        |
| 554 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.1.4.8      | Registro de Activos                                                                                                                | 553   |                                |           | 1 day           | Mon 12/17/18        | Mon 12/17/18        |
| 555 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                                                                                          | 554   |                                |           | 0 days          | Mon 12/17/18        | Mon 12/17/18        |
| 556 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                                                                            | 555   |                                |           | 0 days          | Mon 12/17/18        | Mon 12/17/18        |
| 557 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.3.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Rocafuerte y construcción línea simple circuito San Gregorio-Rocafuerte</b> |       |                                |           | <b>325 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 12/17/18</b> |
| 558 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.3.2.1</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                       |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 559 |    | 1.1.1.2.3.2.1.79     | Designar Comisión Técnica                                                                                                          |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |
| 560 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.80     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                   | 559   |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |
| 561 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.81     | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                    | 560   |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17          | Mon 9/11/17         |
| 562 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.82     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                                  | 561   |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17         | Wed 9/20/17         |
| 563 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.83     | Conformación de Lista Corta                                                                                                        | 562   |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17         | Mon 9/25/17         |
| 564 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.84     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                               | 563   |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17         | Tue 9/26/17         |
| 565 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.85     | Elaborar ofertas                                                                                                                   | 564   |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17         | Thu 10/5/17         |
| 566 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.86     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                       | 565   |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17         | Tue 10/10/17        |
| 567 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.87     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                 | 566   |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17        | Thu 10/12/17        |
| 568 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.88     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                         | 567   |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 569 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.89     | Contrato Suscrito                                                                                                                  | 568   |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 570 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.90     | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                          | 569   |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17        | Mon 11/20/17        |
| 571 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.1.91     | Pago de anticipo 20%                                                                                                               | 570   |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17        | Mon 11/20/17        |
| 572 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.3.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                        |       |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Mon 10/22/18</b> | <b>Mon 12/17/18</b> |
| 573 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.2.19     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                                | 549   |                                |           | 0 days          | Mon 10/22/18        | Mon 10/22/18        |
| 574 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.2.20     | Pago Planilla 2_35%                                                                                                                | 550   |                                |           | 0 days          | Wed 12/5/18         | Wed 12/5/18         |
| 575 |                                                                                     | 1.1.1.2.3.2.2.21     | Pago Planilla Final_10%                                                                                                            | 556   |                                |           | 0 days          | Mon 12/17/18        | Mon 12/17/18        |
| 576 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.4</b>     | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción y reubicación Línea de Subtransmisión Rocafuerte - Tosagua</b>                                 |       | <b>1</b>                       |           | <b>369 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 12/17/18</b> |
| 577 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.4.1</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción y reubicación Línea de Subtransmisión Rocafuerte - Tosagua</b>                           |       |                                |           | <b>369 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 12/17/18</b> |
| 578 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.4.1.1</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                                                 |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 579 |  | 1.1.1.2.4.1.1.15     | Designar Comisión Técnica                                                                                                          |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 580 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.1.1.16     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                                     | 579   |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 581 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.1.1.17     | No objeción DDLs                                                                                                                   | 580   |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                  | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| 582 |  | 1.1.1.2.4.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                  | 581        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |  |
| 583 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                    | 582        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |  |
| 584 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                                             | 583        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |  |
| 585 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                                                      | 584        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |  |
| 586 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                     | 585        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |  |
| 587 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                        | 586        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |  |
| 588 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                               | 587        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |  |
| 589 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                       | 588        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |  |
| 590 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                                | 589        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |  |
| 591 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                        | 590        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |  |
| 592 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                                             | 591        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |  |
| 593 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.4.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                         | <b>592</b> |                                |           | <b>289 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 12/7/18</b>  |  |
| 594 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.4.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                                              |            |                                |           | <b>289 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 12/7/18</b>  |  |
| 595 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                            | 592        |                                |           | 150 days        | Tue 10/17/17        | Mon 5/28/18         |  |
| 596 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                                        | 595        |                                |           | 30 days         | Tue 5/29/18         | Mon 7/9/18          |  |
| 597 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                                                    | 596        |                                |           | 30 days         | Tue 7/10/18         | Mon 8/20/18         |  |
| 598 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                                                          | 597        |                                |           | 30 days         | Tue 8/21/18         | Mon 10/1/18         |  |
| 599 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                                                           | 597        |                                |           | 30 days         | Tue 8/21/18         | Mon 10/1/18         |  |
| 600 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                 | 599        |                                |           | 30 days         | Tue 10/2/18         | Mon 11/12/18        |  |
| 601 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                     | 600        |                                |           | 10 days         | Tue 11/13/18        | Mon 11/26/18        |  |
| 602 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.2.2.18     | Energizar redes                                                                                                  | 601        |                                |           | 2 days          | Tue 11/27/18        | Wed 11/28/18        |  |
| 603 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.2.2.19     | Pruebas                                                                                                          | 602        |                                |           | 7 days          | Thu 11/29/18        | Fri 12/7/18         |  |
| 604 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                    | 603        |                                |           | 0 days          | Fri 12/7/18         | Fri 12/7/18         |  |
| 605 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.4.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                      |            |                                |           | <b>47 days</b>  | <b>Tue 10/2/18</b>  | <b>Wed 12/5/18</b>  |  |
| 606 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                                              | 599        |                                |           | 5 days          | Tue 10/2/18         | Mon 10/8/18         |  |
| 607 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                                                              | 602        |                                |           | 5 days          | Thu 11/29/18        | Wed 12/5/18         |  |
| 608 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.4.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                      |            |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 12/10/18</b> | <b>Mon 12/17/18</b> |  |
| 609 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.4.6        | Registro Contable                                                                                                | 603        |                                |           | 2 days          | Mon 12/10/18        | Tue 12/11/18        |  |
| 610 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                                                                     | 609        |                                |           | 3 days          | Wed 12/12/18        | Fri 12/14/18        |  |
| 611 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.4.8        | Registro de Activos                                                                                              | 610        |                                |           | 1 day           | Mon 12/17/18        | Mon 12/17/18        |  |
| 612 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                                                        | 611        |                                |           | 0 days          | Mon 12/17/18        | Mon 12/17/18        |  |
| 613 |                                                                                   | 1.1.1.2.4.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                                                          | 612        |                                |           | 0 days          | Mon 12/17/18        | Mon 12/17/18        |  |
| 614 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.4.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción y reubicación Línea de Subtransmisión Rocafuerte - Tosagua</b> |            |                                |           | <b>325 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 12/17/18</b> |  |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                     | WBS                  | Nombre de tarea                                                                                         | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 615 |    | <b>1.1.1.2.4.2.1</b> | <b>Etapla Precontractual</b>                                                                            |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 616 |    | 1.1.1.2.4.2.1.92     | Designar Comisión Técnica                                                                               |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |
| 617 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.93     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                        | 616   |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |
| 618 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.94     | Resolución de Inicio de proceso                                                                         | 617   |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |
| 619 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.95     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                       | 618   |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |
| 620 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.96     | Conformación de Lista Corta                                                                             | 619   |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |
| 621 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.97     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                    | 620   |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |
| 622 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.98     | Elaborar ofertas                                                                                        | 621   |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |
| 623 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.99     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                            | 622   |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 624 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.100    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                      | 623   |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 625 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.101    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                              | 624   |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 626 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.102    | Contrato Suscrito                                                                                       | 625   |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 627 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.103    | Trámitar y pagar anticipo                                                                               | 626   |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 628 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.1.104    | Pago de anticipo 20%                                                                                    | 627   |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 629 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.4.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                             |       |                                |           | <b>50 days</b>  | <b>Mon 10/8/18</b> | <b>Mon 12/17/18</b> |
| 630 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.2.22     | Pago Planilla 1_35%                                                                                     | 606   |                                |           | 0 days          | Mon 10/8/18        | Mon 10/8/18         |
| 631 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.2.23     | Pago Planilla 2_35%                                                                                     | 607   |                                |           | 0 days          | Wed 12/5/18        | Wed 12/5/18         |
| 632 |                                                                                     | 1.1.1.2.4.2.2.24     | Pago Planilla Final_10%                                                                                 | 613   |                                |           | 0 days          | Mon 12/17/18       | Mon 12/17/18        |
| 633 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.5</b>     | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción y reubicación Línea de Subtransmisión Tosagua-San Vicente</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>377 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Thu 12/27/18</b> |
| 634 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.5.1</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción y reubicación Línea de Subtransmisión Tosagua-San Vicente</b> |       |                                |           | <b>377 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Thu 12/27/18</b> |
| 635 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.5.1.1</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapla Precontractual)</b>                                                      |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 636 |  | 1.1.1.2.5.1.1.15     | Designar Comisión Técnica                                                                               |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17         | Tue 7/4/17          |
| 637 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.16     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                          | 636   |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17         | Thu 7/6/17          |
| 638 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.17     | No objeción DDLs                                                                                        | 637   |                                |           | 5 days          | Fri 7/7/17         | Thu 7/13/17         |
| 639 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.18     | Resolución de Inicio de proceso                                                                         | 638   |                                |           | 2 days          | Fri 7/14/17        | Mon 7/17/17         |
| 640 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.19     | Publicar convocatoria en UNDB, prensa nacional y/o Compras Públicas                                     | 639   |                                |           | 1 day           | Tue 7/18/17        | Tue 7/18/17         |
| 641 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.20     | Presentar de ofertas                                                                                    | 640   |                                |           | 38 days         | Wed 7/19/17        | Mon 9/11/17         |
| 642 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.21     | Acta de apertura de ofertas                                                                             | 641   |                                |           | 0 days          | Mon 9/11/17        | Mon 9/11/17         |
| 643 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.22     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                            | 642   |                                |           | 10 days         | Tue 9/12/17        | Mon 9/25/17         |
| 644 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.23     | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                               | 643   |                                |           | 5 days          | Tue 9/26/17        | Mon 10/2/17         |
| 645 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.24     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                      | 644   |                                |           | 2 days          | Tue 10/3/17        | Wed 10/4/17         |
| 646 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.25     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                              | 645   |                                |           | 20 days         | Thu 10/5/17        | Mon 11/6/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                     | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                 | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| 647 |    | 1.1.1.2.5.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                               | 646        |                                |           | 0 days          | Mon 11/6/17         | Mon 11/6/17         |  |
| 648 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                       | 647        |                                |           | 5 days          | Tue 11/7/17         | Mon 11/13/17        |  |
| 649 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                                            | 648        |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17        | Mon 11/13/17        |  |
| 650 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.5.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                        | <b>649</b> |                                |           | <b>279 days</b> | <b>Tue 11/14/17</b> | <b>Wed 12/19/18</b> |  |
| 651 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.5.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                                             |            |                                |           | <b>279 days</b> | <b>Tue 11/14/17</b> | <b>Wed 12/19/18</b> |  |
| 652 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                           | 649        |                                |           | 90 days         | Tue 11/14/17        | Mon 3/26/18         |  |
| 653 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                                       | 652        |                                |           | 30 days         | Tue 3/27/18         | Wed 5/9/18          |  |
| 654 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                                                   | 653        |                                |           | 40 days         | Thu 5/10/18         | Thu 7/5/18          |  |
| 655 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                                                         | 654        |                                |           | 40 days         | Fri 7/6/18          | Thu 8/30/18         |  |
| 656 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                                                          | 654        |                                |           | 40 days         | Fri 7/6/18          | Thu 8/30/18         |  |
| 657 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                | 656        |                                |           | 40 days         | Fri 8/31/18         | Thu 10/25/18        |  |
| 658 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                    | 657        |                                |           | 30 days         | Fri 10/26/18        | Thu 12/6/18         |  |
| 659 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.2.2.18     | Energizar redes                                                                                                 | 658        |                                |           | 2 days          | Fri 12/7/18         | Mon 12/10/18        |  |
| 660 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.2.2.19     | Pruebas                                                                                                         | 659        |                                |           | 7 days          | Tue 12/11/18        | Wed 12/19/18        |  |
| 661 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                   | 660        |                                |           | 0 days          | Wed 12/19/18        | Wed 12/19/18        |  |
| 662 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.5.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                     |            |                                |           | <b>77 days</b>  | <b>Fri 8/31/18</b>  | <b>Mon 12/17/18</b> |  |
| 663 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                                             | 656        |                                |           | 5 days          | Fri 8/31/18         | Thu 9/6/18          |  |
| 664 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                                                             | 659        |                                |           | 5 days          | Tue 12/11/18        | Mon 12/17/18        |  |
| 665 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.5.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                     |            |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 12/20/18</b> | <b>Thu 12/27/18</b> |  |
| 666 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.4.6        | Registro Contable                                                                                               | 660        |                                |           | 2 days          | Thu 12/20/18        | Fri 12/21/18        |  |
| 667 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                                                                    | 666        |                                |           | 3 days          | Mon 12/24/18        | Wed 12/26/18        |  |
| 668 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.4.8        | Registro de Activos                                                                                             | 667        |                                |           | 1 day           | Thu 12/27/18        | Thu 12/27/18        |  |
| 669 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                                                       | 668        |                                |           | 0 days          | Thu 12/27/18        | Thu 12/27/18        |  |
| 670 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                                                         | 669        |                                |           | 0 days          | Thu 12/27/18        | Thu 12/27/18        |  |
| 671 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.5.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción y reubicación Línea de Subtransmisión Tosagua-San Vicente</b> |            |                                |           | <b>333 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Thu 12/27/18</b> |  |
| 672 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.5.2.3</b>   | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                    |            |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 673 |  | 1.1.1.2.5.2.3.105      | Designar Comisión Técnica                                                                                       |            |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |  |
| 674 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.2.3.106      | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                | 673        |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |  |
| 675 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.2.3.107      | Resolución de Inicio de proceso                                                                                 | 674        |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17          | Mon 9/11/17         |  |
| 676 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.2.3.108      | Convocar a Expresiones de Interés                                                                               | 675        |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17         | Wed 9/20/17         |  |
| 677 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.2.3.109      | Conformación de Lista Corta                                                                                     | 676        |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17         | Mon 9/25/17         |  |
| 678 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.2.3.110      | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                            | 677        |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17         | Tue 9/26/17         |  |
| 679 |                                                                                     | 1.1.1.2.5.2.3.111      | Elaborar ofertas                                                                                                | 678        |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17         | Thu 10/5/17         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |  | WBS                    | Nombre de tarea                                                           | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|-----|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 680 |  | 1.1.1.2.5.2.3.112      | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 679        |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 681 |  | 1.1.1.2.5.2.3.113      | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 680        |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 682 |  | 1.1.1.2.5.2.3.114      | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 681        |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 683 |  | 1.1.1.2.5.2.3.115      | Contrato Suscrito                                                         | 682        |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 684 |  | 1.1.1.2.5.2.3.116      | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 683        |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 685 |  | 1.1.1.2.5.2.3.117      | Pago de anticipo 20%                                                      | 684        |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 686 |  | <b>1.1.1.2.5.2.4</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |            |                                |           | <b>80 days</b>  | <b>Thu 9/6/18</b>  | <b>Thu 12/27/18</b> |
| 687 |  | 1.1.1.2.5.2.4.25       | Pago Planilla 1_35%                                                       | 663        |                                |           | 0 days          | Thu 9/6/18         | Thu 9/6/18          |
| 688 |  | 1.1.1.2.5.2.4.26       | Pago Planilla 2_35%                                                       | 664        |                                |           | 0 days          | Mon 12/17/18       | Mon 12/17/18        |
| 689 |  | 1.1.1.2.5.2.4.27       | Pago Planilla Final_10%                                                   | 670        |                                |           | 0 days          | Thu 12/27/18       | Thu 12/27/18        |
| 690 |  | <b>1.1.1.2.6</b>       | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Subestación Bahia</b>                 |            | <b>1</b>                       |           | <b>304 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 3/20/18</b>  |
| 691 |  | <b>1.1.1.2.6.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Subestación Bahia</b>           |            |                                |           | <b>304 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 3/20/18</b>  |
| 692 |  | <b>1.1.1.2.6.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                         |            |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 693 |  | 1.1.1.2.6.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                 |            |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17          |
| 694 |  | 1.1.1.2.6.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                            | 693        |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17          |
| 695 |  | 1.1.1.2.6.1.1.17       | No objeción DDLs                                                          | 694        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17          |
| 696 |  | 1.1.1.2.6.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                           | 695        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17          |
| 697 |  | 1.1.1.2.6.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas             | 696        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17         |
| 698 |  | 1.1.1.2.6.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                      | 697        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17         |
| 699 |  | 1.1.1.2.6.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                               | 698        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17         |
| 700 |  | 1.1.1.2.6.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 699        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17          |
| 701 |  | 1.1.1.2.6.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 700        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17          |
| 702 |  | 1.1.1.2.6.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 701        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17         |
| 703 |  | 1.1.1.2.6.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 702        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17         |
| 704 |  | 1.1.1.2.6.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                         | 703        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17         |
| 705 |  | 1.1.1.2.6.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 704        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17         |
| 706 |  | 1.1.1.2.6.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                      | 705        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17         |
| 707 |  | <b>1.1.1.2.6.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>706</b> |                                |           | <b>224 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 3/12/18</b>  |
| 708 |  | <b>1.1.1.2.6.1.2.4</b> | <b>Construcción</b>                                                       |            |                                |           | <b>224 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 3/12/18</b>  |
| 709 |  | 1.1.1.2.6.1.2.4.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 706        |                                |           | 120 days        | Wed 4/19/17        | Thu 10/5/17         |
| 710 |  | 1.1.1.2.6.1.2.4.12     | Replanteo                                                                 | 709        |                                |           | 20 days         | Fri 10/6/17        | Tue 11/7/17         |
| 711 |  | 1.1.1.2.6.1.2.4.13     | Obras Civiles                                                             | 710        |                                |           | 20 days         | Wed 11/8/17        | Tue 12/5/17         |
| 712 |  | 1.1.1.2.6.1.2.4.14     | Montaje Electromecánico                                                   | 711        |                                |           | 20 days         | Thu 12/7/17        | Fri 1/5/18          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                         | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| 713 |  | 1.1.1.2.6.1.2.4.15   | Tendido de Conductores                                                  | 711   |                                |           | 20 days         | Thu 12/7/17        | Fri 1/5/18         |  |
| 714 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.2.4.16   | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                        | 713   |                                |           | 20 days         | Mon 1/8/18         | Fri 2/2/18         |  |
| 715 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.2.4.17   | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones            | 714   |                                |           | 15 days         | Mon 2/5/18         | Tue 2/27/18        |  |
| 716 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.2.4.18   | Energizar redes                                                         | 715   |                                |           | 2 days          | Wed 2/28/18        | Thu 3/1/18         |  |
| 717 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.2.4.19   | Pruebas                                                                 | 716   |                                |           | 7 days          | Fri 3/2/18         | Mon 3/12/18        |  |
| 718 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.2.4.20   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                           | 717   |                                |           | 0 days          | Mon 3/12/18        | Mon 3/12/18        |  |
| 719 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.6.1.3</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                             |       |                                |           | <b>42 days</b>  | <b>Mon 1/8/18</b>  | <b>Thu 3/8/18</b>  |  |
| 720 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.3.3      | Pago Planilla 1_20%                                                     | 713   |                                |           | 5 days          | Mon 1/8/18         | Fri 1/12/18        |  |
| 721 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                     | 716   |                                |           | 5 days          | Fri 3/2/18         | Thu 3/8/18         |  |
| 722 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.6.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                             |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Tue 3/13/18</b> | <b>Tue 3/20/18</b> |  |
| 723 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.4.6      | Registro Contable                                                       | 717   |                                |           | 2 days          | Tue 3/13/18        | Wed 3/14/18        |  |
| 724 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                            | 723   |                                |           | 3 days          | Thu 3/15/18        | Mon 3/19/18        |  |
| 725 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.4.8      | Registro de Activos                                                     | 724   |                                |           | 1 day           | Tue 3/20/18        | Tue 3/20/18        |  |
| 726 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                               | 725   |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18        | Tue 3/20/18        |  |
| 727 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                 | 726   |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18        | Tue 3/20/18        |  |
| 728 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.6.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Subestación Bahia</b> |       |                                |           | <b>263 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Tue 3/20/18</b> |  |
| 729 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.6.2.5</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                            |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |  |
| 730 |  | 1.1.1.2.6.2.5.118    | Designar Comisión Técnica                                               |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |  |
| 731 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.119    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                        | 730   |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |  |
| 732 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.120    | Resolución de Inicio de proceso                                         | 731   |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |  |
| 733 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.121    | Convocar a Expresiones de Interés                                       | 732   |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |  |
| 734 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.122    | Conformación de Lista Corta                                             | 733   |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |  |
| 735 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.123    | Invitación a empresas de Lista Corta                                    | 734   |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |  |
| 736 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.124    | Elaborar ofertas                                                        | 735   |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |  |
| 737 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.125    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas            | 736   |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17         |  |
| 738 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.126    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                      | 737   |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17        |  |
| 739 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.127    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                              | 738   |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17        |  |
| 740 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.128    | Contrato Suscrito                                                       | 739   |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17        |  |
| 741 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.129    | Trámitar y pagar anticipo                                               | 740   |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17        |  |
| 742 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.5.130    | Pago de anticipo 20%                                                    | 741   |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17        |  |
| 743 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.6.2.6</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                             |       |                                |           | <b>45 days</b>  | <b>Fri 1/12/18</b> | <b>Tue 3/20/18</b> |  |
| 744 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.6.28     | Pago Planilla 1_35%                                                     | 720   |                                |           | 0 days          | Fri 1/12/18        | Fri 1/12/18        |  |
| 745 |                                                                                   | 1.1.1.2.6.2.6.29     | Pago Planilla 2_35%                                                     | 721   |                                |           | 0 days          | Thu 3/8/18         | Thu 3/8/18         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |  | WBS                    | Nombre de tarea                                                                   | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|-----|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 746 |  | 1.1.1.2.6.2.6.30       | Pago Planilla Final_10%                                                           | 727        |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18         | Tue 3/20/18         |
| 747 |  | <b>1.1.1.2.7</b>       | <b>CNEL EP-UN Manabí Reforzamiento subsistema a 69 kV Bahía-San Vicente</b>       |            | <b>1</b>                       |           | <b>264 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 7/23/18</b>  |
| 748 |  | <b>1.1.1.2.7.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reforzamiento subsistema a 69 Kv Bahía-San Vicente</b> |            |                                |           | <b>264 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 7/23/18</b>  |
| 749 |  | <b>1.1.1.2.7.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                 |            |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 750 |  | 1.1.1.2.7.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                         |            |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 751 |  | 1.1.1.2.7.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                    | 750        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 752 |  | 1.1.1.2.7.1.1.17       | No objeción DDLs                                                                  | 751        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 753 |  | 1.1.1.2.7.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                   | 752        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 754 |  | 1.1.1.2.7.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                     | 753        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 755 |  | 1.1.1.2.7.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                              | 754        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 756 |  | 1.1.1.2.7.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                       | 755        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 757 |  | 1.1.1.2.7.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                      | 756        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 758 |  | 1.1.1.2.7.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación         | 757        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 759 |  | 1.1.1.2.7.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                | 758        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 760 |  | 1.1.1.2.7.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                        | 759        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 761 |  | 1.1.1.2.7.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                 | 760        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 762 |  | 1.1.1.2.7.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                         | 761        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 763 |  | 1.1.1.2.7.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                              | 762        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 764 |  | <b>1.1.1.2.7.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                          | <b>763</b> |                                |           | <b>184 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 7/13/18</b>  |
| 765 |  | <b>1.1.1.2.7.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                               |            |                                |           | <b>184 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 7/13/18</b>  |
| 766 |  | 1.1.1.2.7.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                             | 763        |                                |           | 40 days         | Tue 10/17/17        | Thu 12/14/17        |
| 767 |  | 1.1.1.2.7.1.2.2.12     | Replanteo                                                                         | 766        |                                |           | 30 days         | Fri 12/15/17        | Mon 1/29/18         |
| 768 |  | 1.1.1.2.7.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                     | 767        |                                |           | 30 days         | Tue 1/30/18         | Wed 3/14/18         |
| 769 |  | 1.1.1.2.7.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                           | 768        |                                |           | 30 days         | Thu 3/15/18         | Thu 4/26/18         |
| 770 |  | 1.1.1.2.7.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                            | 768        |                                |           | 30 days         | Thu 3/15/18         | Thu 4/26/18         |
| 771 |  | 1.1.1.2.7.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                  | 770        |                                |           | 30 days         | Fri 4/27/18         | Mon 6/11/18         |
| 772 |  | 1.1.1.2.7.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                      | 771        |                                |           | 15 days         | Tue 6/12/18         | Mon 7/2/18          |
| 773 |  | 1.1.1.2.7.1.2.2.18     | Energizar redes                                                                   | 772        |                                |           | 2 days          | Tue 7/3/18          | Wed 7/4/18          |
| 774 |  | 1.1.1.2.7.1.2.2.19     | Pruebas                                                                           | 773        |                                |           | 7 days          | Thu 7/5/18          | Fri 7/13/18         |
| 775 |  | 1.1.1.2.7.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                     | 774        |                                |           | 0 days          | Fri 7/13/18         | Fri 7/13/18         |
| 776 |  | <b>1.1.1.2.7.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                       |            |                                |           | <b>52 days</b>  | <b>Fri 4/27/18</b>  | <b>Wed 7/11/18</b>  |
| 777 |  | 1.1.1.2.7.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                               | 770        |                                |           | 5 days          | Fri 4/27/18         | Fri 5/4/18          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                   | Nombre de tarea                                                                                                                | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 778 |  | 1.1.1.2.7.1.3.4       | Pago Planilla 2_20%                                                                                                            | 773   |                                |           | 5 days          | Thu 7/5/18         | Wed 7/11/18         |
| 779 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.7.1.4</b>  | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                    |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 7/16/18</b> | <b>Mon 7/23/18</b>  |
| 780 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.1.4.6       | Registro Contable                                                                                                              | 774   |                                |           | 2 days          | Mon 7/16/18        | Tue 7/17/18         |
| 781 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.1.4.7       | Liquidación Técnica Contable                                                                                                   | 780   |                                |           | 3 days          | Wed 7/18/18        | Fri 7/20/18         |
| 782 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.1.4.8       | Registro de Activos                                                                                                            | 781   |                                |           | 1 day           | Mon 7/23/18        | Mon 7/23/18         |
| 783 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.1.4.9       | Acta de Entrega Recepción                                                                                                      | 782   |                                |           | 0 days          | Mon 7/23/18        | Mon 7/23/18         |
| 784 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.1.4.10      | Pago Planilla final 10%                                                                                                        | 783   |                                |           | 0 days          | Mon 7/23/18        | Mon 7/23/18         |
| 785 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.7.2</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reforzamiento subsistema a 69 Kv Bahía-San Vicente</b>                                      |       |                                |           | <b>220 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 7/23/18</b>  |
| 786 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.7.2.1</b>  | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                   |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 787 |  | 1.1.1.2.7.2.1.144     | Designar Comisión Técnica                                                                                                      |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |
| 788 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.145     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                               | 787   |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |
| 789 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.146     | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                | 788   |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |
| 790 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.147     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                              | 789   |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |
| 791 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.148     | Conformación de Lista Corta                                                                                                    | 790   |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |
| 792 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.149     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                           | 791   |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |
| 793 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.150     | Elaborar ofertas                                                                                                               | 792   |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |
| 794 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.151     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                   | 793   |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 795 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.152     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                             | 794   |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 796 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.153     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                     | 795   |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 797 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.154     | Contrato Suscrito                                                                                                              | 796   |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 798 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.155     | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                      | 797   |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 799 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.1.156     | Pago de anticipo 20%                                                                                                           | 798   |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 800 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.7.2.2</b>  | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                    |       |                                |           | <b>55 days</b>  | <b>Fri 5/4/18</b>  | <b>Mon 7/23/18</b>  |
| 801 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.2.37      | Pago Planilla 1_35%                                                                                                            | 777   |                                |           | 0 days          | Fri 5/4/18         | Fri 5/4/18          |
| 802 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.2.38      | Pago Planilla 2_35%                                                                                                            | 778   |                                |           | 0 days          | Wed 7/11/18        | Wed 7/11/18         |
| 803 |                                                                                   | 1.1.1.2.7.2.2.39      | Pago Planilla Final_10%                                                                                                        | 784   |                                |           | 0 days          | Mon 7/23/18        | Mon 7/23/18         |
| 804 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.15</b>     | <b>CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Portoviejo 1 y construcción línea simple circuito San Gregorio-Portoviejo 1</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>374 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 12/24/18</b> |
| 805 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.15.3</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Portoviejo 1 y construcción línea simple circuito San Gregorio-Portoviejo 1</b> |       |                                |           | <b>374 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 12/24/18</b> |
| 806 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.15.3.6</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                                             |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 807 |                                                                                   | 1.1.1.2.15.3.6.29     | Designar Comisión Técnica                                                                                                      |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17         | Tue 7/4/17          |
| 808 |                                                                                   | 1.1.1.2.15.3.6.30     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                                 | 807   |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17         | Thu 7/6/17          |
| 809 |                                                                                   | 1.1.1.2.15.3.6.31     | No objeción DDLs                                                                                                               | 808   |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17         | Thu 7/6/17          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |  | WBS                     | Nombre de tarea                                                                                                                        | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|-----|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 810 |  | 1.1.1.2.15.3.6.32       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                        | 809        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 811 |  | 1.1.1.2.15.3.6.33       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                                          | 810        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 812 |  | 1.1.1.2.15.3.6.34       | Presentar de ofertas                                                                                                                   | 811        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 813 |  | 1.1.1.2.15.3.6.35       | Acta de apertura de ofertas                                                                                                            | 812        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 814 |  | 1.1.1.2.15.3.6.36       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                           | 813        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 815 |  | 1.1.1.2.15.3.6.37       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                                              | 814        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 816 |  | 1.1.1.2.15.3.6.38       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                     | 815        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 817 |  | 1.1.1.2.15.3.6.39       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                             | 816        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 818 |  | 1.1.1.2.15.3.6.40       | Contrato Suscrito                                                                                                                      | 817        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 819 |  | 1.1.1.2.15.3.6.41       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                              | 818        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 820 |  | 1.1.1.2.15.3.6.42       | Pago de anticipo 50%                                                                                                                   | 819        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 821 |  | <b>1.1.1.2.15.3.7</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                                               | <b>820</b> |                                |           | <b>294 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 12/14/18</b> |
| 822 |  | <b>1.1.1.2.15.3.7.3</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                                    |            |                                |           | <b>294 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 12/14/18</b> |
| 823 |  | 1.1.1.2.15.3.7.3.21     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                                  | 820        |                                |           | 150 days        | Tue 10/17/17        | Mon 5/28/18         |
| 824 |  | 1.1.1.2.15.3.7.3.22     | Replanteo                                                                                                                              | 823        |                                |           | 30 days         | Tue 5/29/18         | Mon 7/9/18          |
| 825 |  | 1.1.1.2.15.3.7.3.23     | Obras Civiles                                                                                                                          | 824        |                                |           | 30 days         | Tue 7/10/18         | Mon 8/20/18         |
| 826 |  | 1.1.1.2.15.3.7.3.24     | Montaje Electromecánico                                                                                                                | 825        |                                |           | 30 days         | Tue 8/21/18         | Mon 10/1/18         |
| 827 |  | 1.1.1.2.15.3.7.3.25     | Tendido de Conductores                                                                                                                 | 825        |                                |           | 30 days         | Tue 8/21/18         | Mon 10/1/18         |
| 828 |  | 1.1.1.2.15.3.7.3.26     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                                       | 827        |                                |           | 30 days         | Tue 10/2/18         | Mon 11/12/18        |
| 829 |  | 1.1.1.2.15.3.7.3.27     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                                           | 828        |                                |           | 15 days         | Tue 11/13/18        | Mon 12/3/18         |
| 830 |  | 1.1.1.2.15.3.7.3.28     | Energizar redes                                                                                                                        | 829        |                                |           | 2 days          | Tue 12/4/18         | Wed 12/5/18         |
| 831 |  | 1.1.1.2.15.3.7.3.29     | Pruebas                                                                                                                                | 830        |                                |           | 7 days          | Thu 12/6/18         | Fri 12/14/18        |
| 832 |  | 1.1.1.2.15.3.7.3.30     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                                          | 831        |                                |           | 0 days          | Fri 12/14/18        | Fri 12/14/18        |
| 833 |  | <b>1.1.1.2.15.3.8</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                            |            |                                |           | <b>52 days</b>  | <b>Tue 10/2/18</b>  | <b>Wed 12/12/18</b> |
| 834 |  | 1.1.1.2.15.3.8.5        | Pago Planilla 1_20%                                                                                                                    | 827        |                                |           | 5 days          | Tue 10/2/18         | Mon 10/8/18         |
| 835 |  | 1.1.1.2.15.3.8.6        | Pago Planilla 2_20%                                                                                                                    | 830        |                                |           | 5 days          | Thu 12/6/18         | Wed 12/12/18        |
| 836 |  | <b>1.1.1.2.15.3.9</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                            |            |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 12/17/18</b> | <b>Mon 12/24/18</b> |
| 837 |  | 1.1.1.2.15.3.9.11       | Registro Contable                                                                                                                      | 831        |                                |           | 2 days          | Mon 12/17/18        | Tue 12/18/18        |
| 838 |  | 1.1.1.2.15.3.9.12       | Liquidación Técnica Contable                                                                                                           | 837        |                                |           | 3 days          | Wed 12/19/18        | Fri 12/21/18        |
| 839 |  | 1.1.1.2.15.3.9.13       | Registro de Activos                                                                                                                    | 838        |                                |           | 1 day           | Mon 12/24/18        | Mon 12/24/18        |
| 840 |  | 1.1.1.2.15.3.9.14       | Acta de Entrega Recepción                                                                                                              | 839        |                                |           | 0 days          | Mon 12/24/18        | Mon 12/24/18        |
| 841 |  | 1.1.1.2.15.3.9.15       | Pago Planilla final 10%                                                                                                                | 840        |                                |           | 0 days          | Mon 12/24/18        | Mon 12/24/18        |
| 842 |  | <b>1.1.1.2.15.4</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Portoviejo 1 y construcción línea simple circuito San Gregorio-Portoviejo 1</b> |            |                                |           | <b>330 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 12/24/18</b> |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                     | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                                | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 843 |    | <b>1.1.1.2.15.4.6</b>  | <b>Etapla Precontractual</b>                                                                                                   |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 844 |    | 1.1.1.2.15.4.6.157     | Designar Comisión Técnica                                                                                                      |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |
| 845 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.158     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                               | 844   |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |
| 846 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.159     | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                | 845   |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |
| 847 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.160     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                              | 846   |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |
| 848 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.161     | Conformación de Lista Corta                                                                                                    | 847   |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |
| 849 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.162     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                           | 848   |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |
| 850 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.163     | Elaborar ofertas                                                                                                               | 849   |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |
| 851 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.164     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                   | 850   |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 852 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.165     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                             | 851   |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 853 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.166     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                     | 852   |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 854 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.167     | Contrato Suscrito                                                                                                              | 853   |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 855 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.168     | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                      | 854   |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 856 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.6.169     | Pago de anticipo 20%                                                                                                           | 855   |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 857 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.15.4.7</b>  | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                    |       |                                |           | <b>55 days</b>  | <b>Mon 10/8/18</b> | <b>Mon 12/24/18</b> |
| 858 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.7.40      | Pago Planilla 1_35%                                                                                                            | 834   |                                |           | 0 days          | Mon 10/8/18        | Mon 10/8/18         |
| 859 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.7.41      | Pago Planilla 2_35%                                                                                                            | 835   |                                |           | 0 days          | Wed 12/12/18       | Wed 12/12/18        |
| 860 |                                                                                     | 1.1.1.2.15.4.7.42      | Pago Planilla Final_10%                                                                                                        | 841   |                                |           | 0 days          | Mon 12/24/18       | Mon 12/24/18        |
| 861 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.16</b>      | <b>CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Portoviejo 2 y construcción línea simple circuito San Gregorio-Portoviejo 2</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>284 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 8/20/18</b>  |
| 862 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.16.5</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Portoviejo 2 y construcción línea simple circuito San Gregorio-Portoviejo 2</b> |       |                                |           | <b>284 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 8/20/18</b>  |
| 863 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.16.5.10</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapla Precontractual)</b>                                                                             |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 864 |  | 1.1.1.2.16.5.10.43     | Designar Comisión Técnica                                                                                                      |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17         | Tue 7/4/17          |
| 865 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.44     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                                 | 864   |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17         | Thu 7/6/17          |
| 866 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.45     | No objeción DDLs                                                                                                               | 865   |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17         | Thu 7/6/17          |
| 867 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.46     | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                | 866   |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17         | Mon 7/10/17         |
| 868 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.47     | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                                  | 867   |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17        | Tue 7/11/17         |
| 869 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.48     | Presentar de ofertas                                                                                                           | 868   |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17        | Wed 8/23/17         |
| 870 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.49     | Acta de apertura de ofertas                                                                                                    | 869   |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17        | Wed 8/23/17         |
| 871 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.50     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                   | 870   |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17        | Wed 9/6/17          |
| 872 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.51     | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                                      | 871   |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17         | Wed 9/6/17          |
| 873 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.52     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                             | 872   |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17         | Fri 9/8/17          |
| 874 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.53     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                     | 873   |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17        | Fri 10/6/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                     | WBS                      | Nombre de tarea                                                                                                                        | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 875 |    | 1.1.1.2.16.5.10.54       | Contrato Suscrito                                                                                                                      | 874        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 876 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.55       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                              | 875        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 877 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.10.56       | Pago de anticipo 50%                                                                                                                   | 876        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 878 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.16.5.11</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                                               | <b>877</b> |                                |           | <b>204 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 8/10/18</b>  |
| 879 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.16.5.11.4</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                                    |            |                                |           | <b>204 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 8/10/18</b>  |
| 880 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.11.4.31     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                                  | 877        |                                |           | 60 days         | Tue 10/17/17        | Mon 1/15/18         |
| 881 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.11.4.32     | Replanteo                                                                                                                              | 880        |                                |           | 30 days         | Tue 1/16/18         | Wed 2/28/18         |
| 882 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.11.4.33     | Obras Civiles                                                                                                                          | 881        |                                |           | 30 days         | Thu 3/1/18          | Thu 4/12/18         |
| 883 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.11.4.34     | Montaje Electromecánico                                                                                                                | 882        |                                |           | 30 days         | Fri 4/13/18         | Mon 5/28/18         |
| 884 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.11.4.35     | Tendido de Conductores                                                                                                                 | 882        |                                |           | 30 days         | Fri 4/13/18         | Mon 5/28/18         |
| 885 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.11.4.36     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                                       | 884        |                                |           | 30 days         | Tue 5/29/18         | Mon 7/9/18          |
| 886 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.11.4.37     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                                           | 885        |                                |           | 15 days         | Tue 7/10/18         | Mon 7/30/18         |
| 887 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.11.4.38     | Energizar redes                                                                                                                        | 886        |                                |           | 2 days          | Tue 7/31/18         | Wed 8/1/18          |
| 888 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.11.4.39     | Pruebas                                                                                                                                | 887        |                                |           | 7 days          | Thu 8/2/18          | Fri 8/10/18         |
| 889 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.11.4.40     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                                          | 888        |                                |           | 0 days          | Fri 8/10/18         | Fri 8/10/18         |
| 890 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.16.5.12</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                            |            |                                |           | <b>52 days</b>  | <b>Tue 5/29/18</b>  | <b>Wed 8/8/18</b>   |
| 891 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.12.7        | Pago Planilla 1_20%                                                                                                                    | 884        |                                |           | 5 days          | Tue 5/29/18         | Mon 6/4/18          |
| 892 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.12.8        | Pago Planilla 2_20%                                                                                                                    | 887        |                                |           | 5 days          | Thu 8/2/18          | Wed 8/8/18          |
| 893 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.16.5.13</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                            |            |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 8/13/18</b>  | <b>Mon 8/20/18</b>  |
| 894 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.13.16       | Registro Contable                                                                                                                      | 888        |                                |           | 2 days          | Mon 8/13/18         | Tue 8/14/18         |
| 895 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.13.17       | Liquidación Técnica Contable                                                                                                           | 894        |                                |           | 3 days          | Wed 8/15/18         | Fri 8/17/18         |
| 896 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.13.18       | Registro de Activos                                                                                                                    | 895        |                                |           | 1 day           | Mon 8/20/18         | Mon 8/20/18         |
| 897 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.13.19       | Acta de Entrega Recepción                                                                                                              | 896        |                                |           | 0 days          | Mon 8/20/18         | Mon 8/20/18         |
| 898 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.5.13.20       | Pago Planilla final 10%                                                                                                                | 897        |                                |           | 0 days          | Mon 8/20/18         | Mon 8/20/18         |
| 899 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.16.6</b>      | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Portoviejo 2 y construcción línea simple circuito San Gregorio-Portoviejo 2</b> |            |                                |           | <b>240 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 8/20/18</b>  |
| 900 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.16.6.8</b>    | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                           |            |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 901 |  | 1.1.1.2.16.6.8.170       | Designar Comisión Técnica                                                                                                              |            |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |
| 902 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.6.8.171       | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                       | 901        |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |
| 903 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.6.8.172       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                        | 902        |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17          | Mon 9/11/17         |
| 904 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.6.8.173       | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                                      | 903        |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17         | Wed 9/20/17         |
| 905 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.6.8.174       | Conformación de Lista Corta                                                                                                            | 904        |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17         | Mon 9/25/17         |
| 906 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.6.8.175       | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                                   | 905        |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17         | Tue 9/26/17         |
| 907 |                                                                                     | 1.1.1.2.16.6.8.176       | Elaborar ofertas                                                                                                                       | 906        |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17         | Thu 10/5/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                      | Nombre de tarea                                                                                                                | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 908 |  | 1.1.1.2.16.6.8.177       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                   | 907        |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17         | Tue 10/10/17        |
| 909 |                                                                                   | 1.1.1.2.16.6.8.178       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                             | 908        |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17        | Thu 10/12/17        |
| 910 |                                                                                   | 1.1.1.2.16.6.8.179       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                     | 909        |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 911 |                                                                                   | 1.1.1.2.16.6.8.180       | Contrato Suscrito                                                                                                              | 910        |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 912 |                                                                                   | 1.1.1.2.16.6.8.181       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                      | 911        |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17        | Mon 11/20/17        |
| 913 |                                                                                   | 1.1.1.2.16.6.8.182       | Pago de anticipo 20%                                                                                                           | 912        |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17        | Mon 11/20/17        |
| 914 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.16.6.9</b>    | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                    |            |                                |           | <b>55 days</b>  | <b>Mon 6/4/18</b>   | <b>Mon 8/20/18</b>  |
| 915 |                                                                                   | 1.1.1.2.16.6.9.43        | Pago Planilla 1_35%                                                                                                            | 891        |                                |           | 0 days          | Mon 6/4/18          | Mon 6/4/18          |
| 916 |                                                                                   | 1.1.1.2.16.6.9.44        | Pago Planilla 2_35%                                                                                                            | 892        |                                |           | 0 days          | Wed 8/8/18          | Wed 8/8/18          |
| 917 |                                                                                   | 1.1.1.2.16.6.9.45        | Pago Planilla Final_10%                                                                                                        | 898        |                                |           | 0 days          | Mon 8/20/18         | Mon 8/20/18         |
| 918 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.17</b>        | <b>CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Playa Prieta y construcción línea simple circuito Portoviejo 2-Playa Prieta</b>       |            | <b>1</b>                       |           | <b>344 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/12/18</b> |
| 919 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.17.7</b>      | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Playa Prieta y construcción línea simple circuito Portoviejo 2-Playa Prieta</b> |            |                                |           | <b>344 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/12/18</b> |
| 920 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.17.7.14</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                                              |            |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 921 |  | 1.1.1.2.17.7.14.57       | Designar Comisión Técnica                                                                                                      |            |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 922 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.58       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                                 | 921        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 923 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.59       | No objeción DDLs                                                                                                               | 922        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 924 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.60       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                | 923        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 925 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.61       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                                  | 924        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 926 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.62       | Presentar de ofertas                                                                                                           | 925        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 927 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.63       | Acta de apertura de ofertas                                                                                                    | 926        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 928 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.64       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                   | 927        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 929 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.65       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                                      | 928        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 930 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.66       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                             | 929        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 931 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.67       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                     | 930        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 932 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.68       | Contrato Suscrito                                                                                                              | 931        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 933 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.69       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                      | 932        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 934 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.14.70       | Pago de anticipo 50%                                                                                                           | 933        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 935 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.17.7.15</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                                       | <b>934</b> |                                |           | <b>264 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 11/2/18</b>  |
| 936 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.17.7.15.5</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                            |            |                                |           | <b>264 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 11/2/18</b>  |
| 937 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.15.5.41     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                          | 934        |                                |           | 120 days        | Tue 10/17/17        | Thu 4/12/18         |
| 938 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.15.5.42     | Replanteo                                                                                                                      | 937        |                                |           | 30 days         | Fri 4/13/18         | Mon 5/28/18         |
| 939 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.15.5.43     | Obras Civiles                                                                                                                  | 938        |                                |           | 30 days         | Tue 5/29/18         | Mon 7/9/18          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID  |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                                        | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 940 |  | 1.1.1.2.17.7.15.5.44   | Montaje Electromecánico                                                                                                                | 939   |                                |           | 30 days         | Tue 7/10/18        | Mon 8/20/18         |
| 941 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.15.5.45   | Tendido de Conductores                                                                                                                 | 939   |                                |           | 30 days         | Tue 7/10/18        | Mon 8/20/18         |
| 942 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.15.5.46   | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                                       | 941   |                                |           | 30 days         | Tue 8/21/18        | Mon 10/1/18         |
| 943 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.15.5.47   | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                                           | 942   |                                |           | 15 days         | Tue 10/2/18        | Mon 10/22/18        |
| 944 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.15.5.48   | Energizar redes                                                                                                                        | 943   |                                |           | 2 days          | Tue 10/23/18       | Wed 10/24/18        |
| 945 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.15.5.49   | Pruebas                                                                                                                                | 944   |                                |           | 7 days          | Thu 10/25/18       | Fri 11/2/18         |
| 946 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.15.5.50   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                                          | 945   |                                |           | 0 days          | Fri 11/2/18        | Fri 11/2/18         |
| 947 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.17.7.16</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                            |       |                                |           | <b>52 days</b>  | <b>Tue 8/21/18</b> | <b>Wed 10/31/18</b> |
| 948 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.16.9      | Pago Planilla 1_20%                                                                                                                    | 941   |                                |           | 5 days          | Tue 8/21/18        | Mon 8/27/18         |
| 949 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.16.10     | Pago Planilla 2_20%                                                                                                                    | 944   |                                |           | 5 days          | Thu 10/25/18       | Wed 10/31/18        |
| 950 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.17.7.17</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                            |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 11/5/18</b> | <b>Mon 11/12/18</b> |
| 951 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.17.21     | Registro Contable                                                                                                                      | 945   |                                |           | 2 days          | Mon 11/5/18        | Tue 11/6/18         |
| 952 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.17.22     | Liquidación Técnica Contable                                                                                                           | 951   |                                |           | 3 days          | Wed 11/7/18        | Fri 11/9/18         |
| 953 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.17.23     | Registro de Activos                                                                                                                    | 952   |                                |           | 1 day           | Mon 11/12/18       | Mon 11/12/18        |
| 954 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.17.24     | Acta de Entrega Recepción                                                                                                              | 953   |                                |           | 0 days          | Mon 11/12/18       | Mon 11/12/18        |
| 955 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.7.17.25     | Pago Planilla final 10%                                                                                                                | 954   |                                |           | 0 days          | Mon 11/12/18       | Mon 11/12/18        |
| 956 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.17.8</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Remodelación de S/E Playa Prieta y construcción línea simple circuito Portoviejo 2-Playa Prieta</b> |       |                                |           | <b>300 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/12/18</b> |
| 957 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.17.8.10</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                           |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 958 |  | 1.1.1.2.17.8.10.183    | Designar Comisión Técnica                                                                                                              |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |
| 959 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.184    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                       | 958   |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |
| 960 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.185    | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                        | 959   |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |
| 961 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.186    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                                      | 960   |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |
| 962 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.187    | Conformación de Lista Corta                                                                                                            | 961   |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |
| 963 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.188    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                                   | 962   |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |
| 964 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.189    | Elaborar ofertas                                                                                                                       | 963   |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |
| 965 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.190    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                           | 964   |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 966 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.191    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                     | 965   |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 967 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.192    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                             | 966   |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 968 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.193    | Contrato Suscrito                                                                                                                      | 967   |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 969 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.194    | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                              | 968   |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 970 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.10.195    | Pago de anticipo 20%                                                                                                                   | 969   |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 971 |                                                                                   | <b>1.1.1.2.17.8.11</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                            |       |                                |           | <b>55 days</b>  | <b>Mon 8/27/18</b> | <b>Mon 11/12/18</b> |
| 972 |                                                                                   | 1.1.1.2.17.8.11.46     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                                    | 948   |                                |           | 0 days          | Mon 8/27/18        | Mon 8/27/18         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                      | Nombre de tarea                                                           | Prede      | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 973  |  | 1.1.1.2.17.8.11.47       | Pago Planilla 2_35%                                                       | 949        |                                |           | 0 days          | Wed 10/31/18        | Wed 10/31/18        |
| 974  |  | 1.1.1.2.17.8.11.48       | Pago Planilla Final_10%                                                   | 955        |                                |           | 0 days          | Mon 11/12/18        | Mon 11/12/18        |
| 975  |  | <b>1.1.1.2.18</b>        | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de S/E Playa Prieta</b>               |            | <b>1</b>                       |           | <b>469 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 5/6/19</b>   |
| 976  |  | <b>1.1.1.2.18.9</b>      | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de S/E Playa Prieta</b>         |            |                                |           | <b>469 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 5/6/19</b>   |
| 977  |  | <b>1.1.1.2.18.9.18</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                         |            |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 978  |  | 1.1.1.2.18.9.18.71       | Designar Comisión Técnica                                                 |            |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 979  |  | 1.1.1.2.18.9.18.72       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                            | 978        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 980  |  | 1.1.1.2.18.9.18.73       | No objeción DDLs                                                          | 979        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 981  |  | 1.1.1.2.18.9.18.74       | Resolución de Inicio de proceso                                           | 980        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 982  |  | 1.1.1.2.18.9.18.75       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas             | 981        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 983  |  | 1.1.1.2.18.9.18.76       | Presentar de ofertas                                                      | 982        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 984  |  | 1.1.1.2.18.9.18.77       | Acta de apertura de ofertas                                               | 983        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 985  |  | 1.1.1.2.18.9.18.78       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 984        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 986  |  | 1.1.1.2.18.9.18.79       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 985        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 987  |  | 1.1.1.2.18.9.18.80       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 986        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 988  |  | 1.1.1.2.18.9.18.81       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 987        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 989  |  | 1.1.1.2.18.9.18.82       | Contrato Suscrito                                                         | 988        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 990  |  | 1.1.1.2.18.9.18.83       | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 989        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 991  |  | 1.1.1.2.18.9.18.84       | Pago de anticipo 50%                                                      | 990        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 992  |  | <b>1.1.1.2.18.9.19</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>991</b> |                                |           | <b>389 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 4/26/19</b>  |
| 993  |  | <b>1.1.1.2.18.9.19.6</b> | <b>Construcción</b>                                                       |            |                                |           | <b>389 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 4/26/19</b>  |
| 994  |  | 1.1.1.2.18.9.19.6.51     | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 991        |                                |           | 180 days        | Tue 10/17/17        | Mon 7/9/18          |
| 995  |  | 1.1.1.2.18.9.19.6.52     | Replanteo                                                                 | 994        |                                |           | 40 days         | Tue 7/10/18         | Mon 9/3/18          |
| 996  |  | 1.1.1.2.18.9.19.6.53     | Obras Civiles                                                             | 995        |                                |           | 40 days         | Tue 9/4/18          | Mon 10/29/18        |
| 997  |  | 1.1.1.2.18.9.19.6.54     | Montaje Electromecánico                                                   | 996        |                                |           | 40 days         | Tue 10/30/18        | Mon 12/24/18        |
| 998  |  | 1.1.1.2.18.9.19.6.55     | Tendido de Conductores                                                    | 996        |                                |           | 40 days         | Tue 10/30/18        | Mon 12/24/18        |
| 999  |  | 1.1.1.2.18.9.19.6.56     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                          | 998        |                                |           | 40 days         | Tue 12/25/18        | Mon 2/18/19         |
| 1000 |  | 1.1.1.2.18.9.19.6.57     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones              | 999        |                                |           | 30 days         | Tue 2/19/19         | Mon 4/1/19          |
| 1001 |  | 1.1.1.2.18.9.19.6.58     | Energizar redes                                                           | 1000       |                                |           | 4 days          | Tue 4/2/19          | Fri 4/5/19          |
| 1002 |  | 1.1.1.2.18.9.19.6.59     | Pruebas                                                                   | 1001       |                                |           | 15 days         | Mon 4/8/19          | Fri 4/26/19         |
| 1003 |  | 1.1.1.2.18.9.19.6.60     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                             | 1002       |                                |           | 0 days          | Fri 4/26/19         | Fri 4/26/19         |
| 1004 |  | <b>1.1.1.2.18.9.20</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |            |                                |           | <b>79 days</b>  | <b>Tue 12/25/18</b> | <b>Fri 4/12/19</b>  |
| 1005 |  | 1.1.1.2.18.9.20.11       | Pago Planilla 1_20%                                                       | 998        |                                |           | 5 days          | Tue 12/25/18        | Mon 12/31/18        |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                     | Nombre de tarea                                                           | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1006 |    | 1.1.1.2.18.9.20.12      | Pago Planilla 2_20%                                                       | 1001  |                                |           | 5 days          | Mon 4/8/19          | Fri 4/12/19         |
| 1007 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.18.9.21</b>  | <b>Liquidación de Obras</b>                                               |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 4/29/19</b>  | <b>Mon 5/6/19</b>   |
| 1008 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.9.21.26      | Registro Contable                                                         | 1002  |                                |           | 2 days          | Mon 4/29/19         | Tue 4/30/19         |
| 1009 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.9.21.27      | Liquidación Técnica Contable                                              | 1008  |                                |           | 3 days          | Wed 5/1/19          | Fri 5/3/19          |
| 1010 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.9.21.28      | Registro de Activos                                                       | 1009  |                                |           | 1 day           | Mon 5/6/19          | Mon 5/6/19          |
| 1011 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.9.21.29      | Acta de Entrega Recepción                                                 | 1010  |                                |           | 0 days          | Mon 5/6/19          | Mon 5/6/19          |
| 1012 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.9.21.30      | Pago Planilla final 10%                                                   | 1011  |                                |           | 0 days          | Mon 5/6/19          | Mon 5/6/19          |
| 1013 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.18.10</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de S/E Playa Prieta</b> |       |                                |           | <b>425 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 5/6/19</b>   |
| 1014 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.18.10.12</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                              |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 1015 |    | 1.1.1.2.18.10.12.19     | Designar Comisión Técnica                                                 |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |
| 1016 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.19     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                          | 1015  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |
| 1017 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.19     | Resolución de Inicio de proceso                                           | 1016  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17          | Mon 9/11/17         |
| 1018 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.19     | Convocar a Expresiones de Interés                                         | 1017  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17         | Wed 9/20/17         |
| 1019 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.20     | Conformación de Lista Corta                                               | 1018  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17         | Mon 9/25/17         |
| 1020 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.20     | Invitación a empresas de Lista Corta                                      | 1019  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17         | Tue 9/26/17         |
| 1021 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.20     | Elaborar ofertas                                                          | 1020  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17         | Thu 10/5/17         |
| 1022 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.20     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 1021  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17         | Tue 10/10/17        |
| 1023 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.20     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 1022  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17        | Thu 10/12/17        |
| 1024 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.20     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 1023  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 1025 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.20     | Contrato Suscrito                                                         | 1024  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 1026 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.20     | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 1025  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17        | Mon 11/20/17        |
| 1027 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.12.20     | Pago de anticipo 20%                                                      | 1026  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17        | Mon 11/20/17        |
| 1028 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.18.10.13</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |       |                                |           | <b>90 days</b>  | <b>Mon 12/31/18</b> | <b>Mon 5/6/19</b>   |
| 1029 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.13.49     | Pago Planilla 1_35%                                                       | 1005  |                                |           | 0 days          | Mon 12/31/18        | Mon 12/31/18        |
| 1030 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.13.50     | Pago Planilla 2_35%                                                       | 1006  |                                |           | 0 days          | Fri 4/12/19         | Fri 4/12/19         |
| 1031 |                                                                                     | 1.1.1.2.18.10.13.51     | Pago Planilla Final_10%                                                   | 1012  |                                |           | 0 days          | Mon 5/6/19          | Mon 5/6/19          |
| 1032 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.19</b>       | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de S/E Río Oro</b>                    |       | <b>1</b>                       |           | <b>374 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 12/24/18</b> |
| 1033 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.19.11</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de S/E Río Oro</b>              |       |                                |           | <b>374 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 12/24/18</b> |
| 1034 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.19.11.22</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                        |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 1035 |  | 1.1.1.2.19.11.22.85     | Designar Comisión Técnica                                                 |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 1036 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.11.22.86     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                            | 1035  |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 1037 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.11.22.87     | No objeción DDLs                                                          | 1036  |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 1038 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.11.22.88     | Resolución de Inicio de proceso                                           | 1037  |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                       | Nombre de tarea                                                           | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1039 |  | 1.1.1.2.19.11.22.89       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas             | 1038        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 1040 |  | 1.1.1.2.19.11.22.90       | Presentar de ofertas                                                      | 1039        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 1041 |  | 1.1.1.2.19.11.22.91       | Acta de apertura de ofertas                                               | 1040        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 1042 |  | 1.1.1.2.19.11.22.92       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 1041        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 1043 |  | 1.1.1.2.19.11.22.93       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 1042        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 1044 |  | 1.1.1.2.19.11.22.94       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 1043        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 1045 |  | 1.1.1.2.19.11.22.95       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 1044        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 1046 |  | 1.1.1.2.19.11.22.96       | Contrato Suscrito                                                         | 1045        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 1047 |  | 1.1.1.2.19.11.22.97       | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 1046        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 1048 |  | 1.1.1.2.19.11.22.98       | Pago de anticipo 50%                                                      | 1047        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 1049 |  | <b>1.1.1.2.19.11.23</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>1048</b> |                                |           | <b>294 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 12/14/18</b> |
| 1050 |  | <b>1.1.1.2.19.11.23.7</b> | <b>Construcción</b>                                                       |             |                                |           | <b>294 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 12/14/18</b> |
| 1051 |  | 1.1.1.2.19.11.23.7.6      | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 1048        |                                |           | 150 days        | Tue 10/17/17        | Mon 5/28/18         |
| 1052 |  | 1.1.1.2.19.11.23.7.6      | Replanteo                                                                 | 1051        |                                |           | 30 days         | Tue 5/29/18         | Mon 7/9/18          |
| 1053 |  | 1.1.1.2.19.11.23.7.6      | Obras Civiles                                                             | 1052        |                                |           | 30 days         | Tue 7/10/18         | Mon 8/20/18         |
| 1054 |  | 1.1.1.2.19.11.23.7.6      | Montaje Electromecánico                                                   | 1053        |                                |           | 30 days         | Tue 8/21/18         | Mon 10/1/18         |
| 1055 |  | 1.1.1.2.19.11.23.7.6      | Tendido de Conductores                                                    | 1053        |                                |           | 30 days         | Tue 8/21/18         | Mon 10/1/18         |
| 1056 |  | 1.1.1.2.19.11.23.7.6      | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                          | 1055        |                                |           | 30 days         | Tue 10/2/18         | Mon 11/12/18        |
| 1057 |  | 1.1.1.2.19.11.23.7.6      | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones              | 1056        |                                |           | 15 days         | Tue 11/13/18        | Mon 12/3/18         |
| 1058 |  | 1.1.1.2.19.11.23.7.6      | Energizar redes                                                           | 1057        |                                |           | 2 days          | Tue 12/4/18         | Wed 12/5/18         |
| 1059 |  | 1.1.1.2.19.11.23.7.6      | Pruebas                                                                   | 1058        |                                |           | 7 days          | Thu 12/6/18         | Fri 12/14/18        |
| 1060 |  | 1.1.1.2.19.11.23.7.7      | Acta de terminación física-tecnica de la obra                             | 1059        |                                |           | 0 days          | Fri 12/14/18        | Fri 12/14/18        |
| 1061 |  | <b>1.1.1.2.19.11.24</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |             |                                |           | <b>52 days</b>  | <b>Tue 10/2/18</b>  | <b>Wed 12/12/18</b> |
| 1062 |  | 1.1.1.2.19.11.24.13       | Pago Planilla 1_20%                                                       | 1055        |                                |           | 5 days          | Tue 10/2/18         | Mon 10/8/18         |
| 1063 |  | 1.1.1.2.19.11.24.14       | Pago Planilla 2_20%                                                       | 1058        |                                |           | 5 days          | Thu 12/6/18         | Wed 12/12/18        |
| 1064 |  | <b>1.1.1.2.19.11.25</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                               |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 12/17/18</b> | <b>Mon 12/24/18</b> |
| 1065 |  | 1.1.1.2.19.11.25.31       | Registro Contable                                                         | 1059        |                                |           | 2 days          | Mon 12/17/18        | Tue 12/18/18        |
| 1066 |  | 1.1.1.2.19.11.25.32       | Liquidación Técnica Contable                                              | 1065        |                                |           | 3 days          | Wed 12/19/18        | Fri 12/21/18        |
| 1067 |  | 1.1.1.2.19.11.25.33       | Registro de Activos                                                       | 1066        |                                |           | 1 day           | Mon 12/24/18        | Mon 12/24/18        |
| 1068 |  | 1.1.1.2.19.11.25.34       | Acta de Entrega Recepción                                                 | 1067        |                                |           | 0 days          | Mon 12/24/18        | Mon 12/24/18        |
| 1069 |  | 1.1.1.2.19.11.25.35       | Pago Planilla final 10%                                                   | 1068        |                                |           | 0 days          | Mon 12/24/18        | Mon 12/24/18        |
| 1070 |  | <b>1.1.1.2.19.12</b>      | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de S/E Río Oro</b>      |             |                                |           | <b>330 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 12/24/18</b> |
| 1071 |  | <b>1.1.1.2.19.12.14</b>   | <b>Etapa Precontractual</b>                                               |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                     | Nombre de tarea                                                                           | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1072 |    | 1.1.1.2.19.12.14.20     | Designar Comisión Técnica                                                                 |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |
| 1073 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.21     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                          | 1072  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |
| 1074 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.21     | Resolución de Inicio de proceso                                                           | 1073  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |
| 1075 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.21     | Convocar a Expresiones de Interés                                                         | 1074  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |
| 1076 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.21     | Conformación de Lista Corta                                                               | 1075  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |
| 1077 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.21     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                      | 1076  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |
| 1078 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.21     | Elaborar ofertas                                                                          | 1077  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |
| 1079 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.21     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                              | 1078  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 1080 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.21     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                        | 1079  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 1081 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.21     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                | 1080  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 1082 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.21     | Contrato Suscrito                                                                         | 1081  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 1083 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.22     | Trámitar y pagar anticipo                                                                 | 1082  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 1084 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.14.22     | Pago de anticipo 20%                                                                      | 1083  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 1085 |                                                                                     | <b>1.1.1.2.19.12.15</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                               |       |                                |           | <b>55 days</b>  | <b>Mon 10/8/18</b> | <b>Mon 12/24/18</b> |
| 1086 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.15.52     | Pago Planilla 1_35%                                                                       | 1062  |                                |           | 0 days          | Mon 10/8/18        | Mon 10/8/18         |
| 1087 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.15.53     | Pago Planilla 2_35%                                                                       | 1063  |                                |           | 0 days          | Wed 12/12/18       | Wed 12/12/18        |
| 1088 |                                                                                     | 1.1.1.2.19.12.15.54     | Pago Planilla Final_10%                                                                   | 1069  |                                |           | 0 days          | Mon 12/24/18       | Mon 12/24/18        |
| 1089 |                                                                                     | <b>1.1.1.3</b>          | <b>CNEL EP- UN Santo Domingo 8 Proyectos de Subtransmisión fiscalizados y energizados</b> |       | <b>8</b>                       |           | <b>329 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Wed 4/25/18</b>  |
| 1090 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.1</b>        | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Subestación Pedernales</b>                     |       | <b>1</b>                       |           | <b>269 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 7/30/18</b>  |
| 1091 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.1.1</b>      | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Subestación Pedernales</b>               |       |                                |           | <b>269 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 7/30/18</b>  |
| 1092 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.1.1.1</b>    | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                         |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 1093 |  | 1.1.1.3.1.1.1.15        | Designar Comisión Técnica                                                                 |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17         | Tue 7/4/17          |
| 1094 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.16        | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                            | 1093  |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17         | Thu 7/6/17          |
| 1095 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.17        | No objeción DDLs                                                                          | 1094  |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17         | Thu 7/6/17          |
| 1096 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.18        | Resolución de Inicio de proceso                                                           | 1095  |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17         | Mon 7/10/17         |
| 1097 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.19        | Publicar convocatoria prensa nacional y/o Compras Públicas                                | 1096  |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17        | Tue 7/11/17         |
| 1098 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.20        | Presentar de ofertas                                                                      | 1097  |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17        | Wed 8/23/17         |
| 1099 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.21        | Acta de apertura de ofertas                                                               | 1098  |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17        | Wed 8/23/17         |
| 1100 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.22        | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                              | 1099  |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17        | Wed 9/6/17          |
| 1101 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.23        | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                 | 1100  |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17         | Wed 9/6/17          |
| 1102 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.24        | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                        | 1101  |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17         | Fri 9/8/17          |
| 1103 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.25        | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                | 1102  |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17        | Fri 10/6/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                    | Nombre de tarea                                                                     | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1104 |    | 1.1.1.3.1.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                   | 1103        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 1105 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                           | 1104        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 1106 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                | 1105        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 1107 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.1.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                            | <b>1106</b> |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 7/20/18</b>  |
| 1108 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.1.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                 |             |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 7/20/18</b>  |
| 1109 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                               | 1106        |                                |           | 40 days         | Tue 10/17/17        | Thu 12/14/17        |
| 1110 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.2.2.12     | Replanteo                                                                           | 1109        |                                |           | 30 days         | Fri 12/15/17        | Mon 1/29/18         |
| 1111 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                       | 1110        |                                |           | 40 days         | Tue 1/30/18         | Wed 3/28/18         |
| 1112 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                             | 1111        |                                |           | 30 days         | Thu 3/29/18         | Fri 5/11/18         |
| 1113 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                              | 1111        |                                |           | 30 days         | Thu 3/29/18         | Fri 5/11/18         |
| 1114 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                    | 1113        |                                |           | 30 days         | Mon 5/14/18         | Mon 6/25/18         |
| 1115 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                        | 1114        |                                |           | 10 days         | Tue 6/26/18         | Mon 7/9/18          |
| 1116 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.2.2.18     | Energizar redes                                                                     | 1115        |                                |           | 2 days          | Tue 7/10/18         | Wed 7/11/18         |
| 1117 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.2.2.19     | Pruebas                                                                             | 1116        |                                |           | 7 days          | Thu 7/12/18         | Fri 7/20/18         |
| 1118 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                       | 1117        |                                |           | 0 days          | Fri 7/20/18         | Fri 7/20/18         |
| 1119 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.1.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                         |             |                                |           | <b>47 days</b>  | <b>Mon 5/14/18</b>  | <b>Wed 7/18/18</b>  |
| 1120 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                 | 1113        |                                |           | 5 days          | Mon 5/14/18         | Fri 5/18/18         |
| 1121 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                                 | 1116        |                                |           | 5 days          | Thu 7/12/18         | Wed 7/18/18         |
| 1122 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.1.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                         |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 7/23/18</b>  | <b>Mon 7/30/18</b>  |
| 1123 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.4.6        | Registro Contable                                                                   | 1117        |                                |           | 2 days          | Mon 7/23/18         | Tue 7/24/18         |
| 1124 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                                        | 1123        |                                |           | 3 days          | Wed 7/25/18         | Fri 7/27/18         |
| 1125 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.4.8        | Registro de Activos                                                                 | 1124        |                                |           | 1 day           | Mon 7/30/18         | Mon 7/30/18         |
| 1126 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                           | 1125        |                                |           | 0 days          | Mon 7/30/18         | Mon 7/30/18         |
| 1127 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                             | 1126        |                                |           | 0 days          | Mon 7/30/18         | Mon 7/30/18         |
| 1128 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.1.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Subestación Pedernales</b> |             |                                |           | <b>225 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 7/30/18</b>  |
| 1129 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.1.2.1</b>   | <b>Etapas Precontractual</b>                                                        |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 1130 |  | 1.1.1.3.1.2.1.170      | Designar Comisión Técnica                                                           |             |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |
| 1131 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.2.1.171      | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                    | 1130        |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |
| 1132 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.2.1.172      | Resolución de Inicio de proceso                                                     | 1131        |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17          | Mon 9/11/17         |
| 1133 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.2.1.173      | Convocar a Expresiones de Interés                                                   | 1132        |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17         | Wed 9/20/17         |
| 1134 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.2.1.174      | Conformación de Lista Corta                                                         | 1133        |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17         | Mon 9/25/17         |
| 1135 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.2.1.175      | Invitación a empresas de Lista Corta                                                | 1134        |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17         | Tue 9/26/17         |
| 1136 |                                                                                     | 1.1.1.3.1.2.1.176      | Elaborar ofertas                                                                    | 1135        |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17         | Thu 10/5/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                               | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1137 |  | 1.1.1.3.1.2.1.177      | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                  | 1136        |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17         | Tue 10/10/17        |
| 1138 |                                                                                   | 1.1.1.3.1.2.1.178      | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                            | 1137        |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17        | Thu 10/12/17        |
| 1139 |                                                                                   | 1.1.1.3.1.2.1.179      | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                    | 1138        |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 1140 |                                                                                   | 1.1.1.3.1.2.1.180      | Contrato Suscrito                                                                                             | 1139        |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 1141 |                                                                                   | 1.1.1.3.1.2.1.181      | Trámitar y pagar anticipo                                                                                     | 1140        |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17        | Mon 11/20/17        |
| 1142 |                                                                                   | 1.1.1.3.1.2.1.182      | Pago de anticipo 20%                                                                                          | 1141        |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17        | Mon 11/20/17        |
| 1143 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.1.2.2</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                   |             |                                |           | <b>50 days</b>  | <b>Fri 5/18/18</b>  | <b>Mon 7/30/18</b>  |
| 1144 |                                                                                   | 1.1.1.3.1.2.2.43       | Pago Planilla 1_35%                                                                                           | 1120        |                                |           | 0 days          | Fri 5/18/18         | Fri 5/18/18         |
| 1145 |                                                                                   | 1.1.1.3.1.2.2.44       | Pago Planilla 2_35%                                                                                           | 1121        |                                |           | 0 days          | Wed 7/18/18         | Wed 7/18/18         |
| 1146 |                                                                                   | 1.1.1.3.1.2.2.45       | Pago Planilla Final_10%                                                                                       | 1127        |                                |           | 0 days          | Mon 7/30/18         | Mon 7/30/18         |
| 1147 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.2</b>       | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reforzamiento subsistema Pedernales LST S.N.I. - S/E Pedernales a 69 kV</b>       |             | <b>1</b>                       |           | <b>299 days</b> | <b>Mon 7/31/17</b>  | <b>Mon 9/10/18</b>  |
| 1148 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.2.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reforzamiento subsistema Pedernales LST S.N.I. - S/E Pedernales a 69 Kv</b> |             |                                |           | <b>299 days</b> | <b>Mon 7/31/17</b>  | <b>Mon 9/10/18</b>  |
| 1149 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.2.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                             |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/31/17</b>  | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 1150 |  | 1.1.1.3.2.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                                                     |             |                                |           | 2 days          | Mon 7/31/17         | Tue 7/4/17          |
| 1151 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                | 1150        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 1152 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.17       | No objeción DDLs                                                                                              | 1151        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 1153 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                                               | 1152        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 1154 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                 | 1153        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 1155 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                                          | 1154        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 1156 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                                                   | 1155        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 1157 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                  | 1156        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 1158 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                     | 1157        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 1159 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                            | 1158        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 1160 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                    | 1159        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 1161 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                             | 1160        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 1162 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                     | 1161        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 1163 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                                          | 1162        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 1164 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.2.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                      | <b>1163</b> |                                |           | <b>219 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 8/31/18</b>  |
| 1165 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.2.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                                           |             |                                |           | <b>219 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 8/31/18</b>  |
| 1166 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                         | 1163        |                                |           | 150 days        | Tue 10/17/17        | Mon 5/28/18         |
| 1167 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                                     | 1166        |                                |           | 15 days         | Tue 5/29/18         | Mon 6/18/18         |
| 1168 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                                                 | 1167        |                                |           | 15 days         | Tue 6/19/18         | Mon 7/9/18          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                                                       | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| 1169 |  | 1.1.1.3.2.1.2.2.14   | Montaje Electromecánico                                                                                               | 1168  |                                |           | 15 days         | Tue 7/10/18        | Mon 7/30/18         |  |
| 1170 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.2.2.15   | Tendido de Conductores                                                                                                | 1168  |                                |           | 10 days         | Tue 7/10/18        | Mon 7/23/18         |  |
| 1171 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.2.2.16   | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                      | 1170  |                                |           | 10 days         | Tue 7/24/18        | Mon 8/6/18          |  |
| 1172 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.2.2.17   | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                          | 1171  |                                |           | 10 days         | Tue 8/7/18         | Mon 8/20/18         |  |
| 1173 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.2.2.18   | Energizar redes                                                                                                       | 1172  |                                |           | 2 days          | Tue 8/21/18        | Wed 8/22/18         |  |
| 1174 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.2.2.19   | Pruebas                                                                                                               | 1173  |                                |           | 7 days          | Thu 8/23/18        | Fri 8/31/18         |  |
| 1175 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.2.2.20   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                         | 1174  |                                |           | 0 days          | Fri 8/31/18        | Fri 8/31/18         |  |
| 1176 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.2.1.3</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                           |       |                                |           | <b>27 days</b>  | <b>Tue 7/24/18</b> | <b>Wed 8/29/18</b>  |  |
| 1177 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.3.3      | Pago Planilla 1_20%                                                                                                   | 1170  |                                |           | 5 days          | Tue 7/24/18        | Mon 7/30/18         |  |
| 1178 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                                                                   | 1173  |                                |           | 5 days          | Thu 8/23/18        | Wed 8/29/18         |  |
| 1179 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.2.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                           |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 9/3/18</b>  | <b>Mon 9/10/18</b>  |  |
| 1180 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.4.6      | Registro Contable                                                                                                     | 1174  |                                |           | 2 days          | Mon 9/3/18         | Tue 9/4/18          |  |
| 1181 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                                                                          | 1180  |                                |           | 3 days          | Wed 9/5/18         | Fri 9/7/18          |  |
| 1182 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.4.8      | Registro de Activos                                                                                                   | 1181  |                                |           | 1 day           | Mon 9/10/18        | Mon 9/10/18         |  |
| 1183 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                                                                             | 1182  |                                |           | 0 days          | Mon 9/10/18        | Mon 9/10/18         |  |
| 1184 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                                                               | 1183  |                                |           | 0 days          | Mon 9/10/18        | Mon 9/10/18         |  |
| 1185 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.2.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reforzamiento subsistema Pedernales LST S.N.I. - S/E Pedernales a 69 Kv</b> |       |                                |           | <b>255 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 9/10/18</b>  |  |
| 1186 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.2.2.3</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                          |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 1187 |  | 1.1.1.3.2.2.3.183    | Designar Comisión Técnica                                                                                             |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |  |
| 1188 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.184    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                      | 1187  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |  |
| 1189 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.185    | Resolución de Inicio de proceso                                                                                       | 1188  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |  |
| 1190 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.186    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                     | 1189  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |  |
| 1191 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.187    | Conformación de Lista Corta                                                                                           | 1190  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |  |
| 1192 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.188    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                  | 1191  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |  |
| 1193 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.189    | Elaborar ofertas                                                                                                      | 1192  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |  |
| 1194 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.190    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                          | 1193  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |  |
| 1195 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.191    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                    | 1194  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |  |
| 1196 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.192    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                            | 1195  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 1197 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.193    | Contrato Suscrito                                                                                                     | 1196  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 1198 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.194    | Trámitar y pagar anticipo                                                                                             | 1197  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 1199 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.3.195    | Pago de anticipo 20%                                                                                                  | 1198  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 1200 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.2.2.4</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                           |       |                                |           | <b>30 days</b>  | <b>Mon 7/30/18</b> | <b>Mon 9/10/18</b>  |  |
| 1201 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.4.46     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                   | 1177  |                                |           | 0 days          | Mon 7/30/18        | Mon 7/30/18         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                           | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1202 |  | 1.1.1.3.2.2.4.47       | Pago Planilla 2_35%                                                       | 1178        |                                |           | 0 days          | Wed 8/29/18         | Wed 8/29/18         |
| 1203 |                                                                                   | 1.1.1.3.2.2.4.48       | Pago Planilla Final_10%                                                   | 1184        |                                |           | 0 days          | Mon 9/10/18         | Mon 9/10/18         |
| 1204 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.3</b>       | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Subestación Jama</b>           |             | <b>1</b>                       |           | <b>269 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 7/30/18</b>  |
| 1205 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.3.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Subestación Jama</b>     |             |                                |           | <b>269 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 7/30/18</b>  |
| 1206 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.3.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                         |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 1207 |  | 1.1.1.3.3.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                 |             |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 1208 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                            | 1207        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 1209 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.17       | No objeción DDLs                                                          | 1208        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 1210 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                           | 1209        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 1211 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas             | 1210        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 1212 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                      | 1211        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 1213 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                               | 1212        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 1214 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 1213        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 1215 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 1214        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 1216 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 1215        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 1217 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 1216        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 1218 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                         | 1217        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 1219 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 1218        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 1220 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                      | 1219        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 1221 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.3.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>1220</b> |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 7/20/18</b>  |
| 1222 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.3.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                       |             |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 7/20/18</b>  |
| 1223 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 1220        |                                |           | 40 days         | Tue 10/17/17        | Thu 12/14/17        |
| 1224 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.2.2.12     | Replanteo                                                                 | 1223        |                                |           | 30 days         | Fri 12/15/17        | Mon 1/29/18         |
| 1225 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                             | 1224        |                                |           | 30 days         | Tue 1/30/18         | Wed 3/14/18         |
| 1226 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                   | 1225        |                                |           | 30 days         | Thu 3/15/18         | Thu 4/26/18         |
| 1227 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                    | 1225        |                                |           | 30 days         | Thu 3/15/18         | Thu 4/26/18         |
| 1228 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                          | 1227        |                                |           | 30 days         | Fri 4/27/18         | Mon 6/11/18         |
| 1229 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones              | 1228        |                                |           | 20 days         | Tue 6/12/18         | Mon 7/9/18          |
| 1230 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.2.2.18     | Energizar redes                                                           | 1229        |                                |           | 2 days          | Tue 7/10/18         | Wed 7/11/18         |
| 1231 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.2.2.19     | Pruebas                                                                   | 1230        |                                |           | 7 days          | Thu 7/12/18         | Fri 7/20/18         |
| 1232 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                             | 1231        |                                |           | 0 days          | Fri 7/20/18         | Fri 7/20/18         |
| 1233 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.3.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |             |                                |           | <b>57 days</b>  | <b>Fri 4/27/18</b>  | <b>Wed 7/18/18</b>  |
| 1234 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                       | 1227        |                                |           | 5 days          | Fri 4/27/18         | Fri 5/4/18          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                                                     | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1235 |  | 1.1.1.3.3.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                                                                 | 1230  |                                |           | 5 days          | Thu 7/12/18        | Wed 7/18/18         |
| 1236 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.3.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                         |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 7/23/18</b> | <b>Mon 7/30/18</b>  |
| 1237 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.4.6      | Registro Contable                                                                                                   | 1231  |                                |           | 2 days          | Mon 7/23/18        | Tue 7/24/18         |
| 1238 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                                                                        | 1237  |                                |           | 3 days          | Wed 7/25/18        | Fri 7/27/18         |
| 1239 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.4.8      | Registro de Activos                                                                                                 | 1238  |                                |           | 1 day           | Mon 7/30/18        | Mon 7/30/18         |
| 1240 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                                                                           | 1239  |                                |           | 0 days          | Mon 7/30/18        | Mon 7/30/18         |
| 1241 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                                                             | 1240  |                                |           | 0 days          | Mon 7/30/18        | Mon 7/30/18         |
| 1242 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.3.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Subestación Jama</b>                                       |       |                                |           | <b>225 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 7/30/18</b>  |
| 1243 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.3.2.1</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                        |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 1244 |  | 1.1.1.3.3.2.1.209    | Designar Comisión Técnica                                                                                           |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |
| 1245 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.210    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                    | 1244  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |
| 1246 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.211    | Resolución de Inicio de proceso                                                                                     | 1245  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |
| 1247 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.212    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                   | 1246  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |
| 1248 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.213    | Conformación de Lista Corta                                                                                         | 1247  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |
| 1249 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.214    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                | 1248  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |
| 1250 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.215    | Elaborar ofertas                                                                                                    | 1249  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |
| 1251 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.216    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                        | 1250  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 1252 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.217    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                  | 1251  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 1253 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.218    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                          | 1252  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 1254 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.219    | Contrato Suscrito                                                                                                   | 1253  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 1255 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.220    | Trámitar y pagar anticipo                                                                                           | 1254  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 1256 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.1.221    | Pago de anticipo 20%                                                                                                | 1255  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 1257 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.3.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                         |       |                                |           | <b>60 days</b>  | <b>Fri 5/4/18</b>  | <b>Mon 7/30/18</b>  |
| 1258 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.2.52     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                 | 1234  |                                |           | 0 days          | Fri 5/4/18         | Fri 5/4/18          |
| 1259 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.2.53     | Pago Planilla 2_35%                                                                                                 | 1235  |                                |           | 0 days          | Wed 7/18/18        | Wed 7/18/18         |
| 1260 |                                                                                   | 1.1.1.3.3.2.2.54     | Pago Planilla Final_10%                                                                                             | 1241  |                                |           | 0 days          | Mon 7/30/18        | Mon 7/30/18         |
| 1261 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.4</b>     | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Reubicación de 9 km de LST San Vicente Jama a línea de fábrica</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>304 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 3/20/18</b>  |
| 1262 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.4.1</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Reubicación de 9 km de LST San Vicente Jama a línea de fábrica</b> |       |                                |           | <b>304 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 3/20/18</b>  |
| 1263 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.4.1.1</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                                  |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 1264 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.1.1.15     | Designar Comisión Técnica                                                                                           |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17          |
| 1265 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.1.1.16     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                      | 1264  |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17          |
| 1266 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.1.1.17     | No objeción DDLs                                                                                                    | 1265  |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                             | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish             |
|------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 1267 |  | 1.1.1.3.4.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                             | 1266        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17          | Mon 1/9/17         |
| 1268 |  | 1.1.1.3.4.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                               | 1267        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17         | Tue 1/10/17        |
| 1269 |  | 1.1.1.3.4.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                                                        | 1268        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17         | Tue 2/21/17        |
| 1270 |  | 1.1.1.3.4.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                                                                 | 1269        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17         | Tue 2/21/17        |
| 1271 |  | 1.1.1.3.4.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                | 1270        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17         | Thu 3/9/17         |
| 1272 |  | 1.1.1.3.4.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                                   | 1271        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17          | Thu 3/9/17         |
| 1273 |  | 1.1.1.3.4.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                          | 1272        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17         | Mon 3/13/17        |
| 1274 |  | 1.1.1.3.4.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                  | 1273        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17         | Mon 4/10/17        |
| 1275 |  | 1.1.1.3.4.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                                           | 1274        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17         | Mon 4/10/17        |
| 1276 |  | 1.1.1.3.4.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                   | 1275        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17         | Tue 4/18/17        |
| 1277 |  | 1.1.1.3.4.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                                                        | 1276        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17         | Tue 4/18/17        |
| 1278 |  | <b>1.1.1.3.4.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                                    | <b>1277</b> |                                |           | <b>224 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b>  | <b>Mon 3/12/18</b> |
| 1279 |  | <b>1.1.1.3.4.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                         |             |                                |           | <b>224 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b>  | <b>Mon 3/12/18</b> |
| 1280 |  | 1.1.1.3.4.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                       | 1277        |                                |           | 50 days         | Wed 4/19/17         | Wed 6/28/17        |
| 1281 |  | 1.1.1.3.4.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                                                   | 1280        |                                |           | 40 days         | Thu 6/29/17         | Thu 8/24/17        |
| 1282 |  | 1.1.1.3.4.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                                                               | 1281        |                                |           | 35 days         | Fri 8/25/17         | Fri 10/13/17       |
| 1283 |  | 1.1.1.3.4.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                                                                     | 1282        |                                |           | 30 days         | Mon 10/16/17        | Tue 11/28/17       |
| 1284 |  | 1.1.1.3.4.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                                                                      | 1282        |                                |           | 30 days         | Mon 10/16/17        | Tue 11/28/17       |
| 1285 |  | 1.1.1.3.4.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                            | 1284        |                                |           | 30 days         | Wed 11/29/17        | Fri 1/12/18        |
| 1286 |  | 1.1.1.3.4.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                                | 1285        |                                |           | 30 days         | Mon 1/15/18         | Tue 2/27/18        |
| 1287 |  | 1.1.1.3.4.1.2.2.18     | Energizar redes                                                                                                             | 1286        |                                |           | 2 days          | Wed 2/28/18         | Thu 3/1/18         |
| 1288 |  | 1.1.1.3.4.1.2.2.19     | Pruebas                                                                                                                     | 1287        |                                |           | 7 days          | Fri 3/2/18          | Mon 3/12/18        |
| 1289 |  | 1.1.1.3.4.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                               | 1288        |                                |           | 0 days          | Mon 3/12/18         | Mon 3/12/18        |
| 1290 |  | <b>1.1.1.3.4.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                 |             |                                |           | <b>67 days</b>  | <b>Wed 11/29/17</b> | <b>Thu 3/8/18</b>  |
| 1291 |  | 1.1.1.3.4.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                                                         | 1284        |                                |           | 5 days          | Wed 11/29/17        | Tue 12/5/17        |
| 1292 |  | 1.1.1.3.4.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                                                                         | 1287        |                                |           | 5 days          | Fri 3/2/18          | Thu 3/8/18         |
| 1293 |  | <b>1.1.1.3.4.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                 |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Tue 3/13/18</b>  | <b>Tue 3/20/18</b> |
| 1294 |  | 1.1.1.3.4.1.4.6        | Registro Contable                                                                                                           | 1288        |                                |           | 2 days          | Tue 3/13/18         | Wed 3/14/18        |
| 1295 |  | 1.1.1.3.4.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                                                                                | 1294        |                                |           | 3 days          | Thu 3/15/18         | Mon 3/19/18        |
| 1296 |  | 1.1.1.3.4.1.4.8        | Registro de Activos                                                                                                         | 1295        |                                |           | 1 day           | Tue 3/20/18         | Tue 3/20/18        |
| 1297 |  | 1.1.1.3.4.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                                                                   | 1296        |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18         | Tue 3/20/18        |
| 1298 |  | 1.1.1.3.4.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                                                                     | 1297        |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18         | Tue 3/20/18        |
| 1299 |  | <b>1.1.1.3.4.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Reubicación de 9 km de LST San Vicente Jama a línea de fábrica</b> |             |                                |           | <b>263 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>   | <b>Tue 3/20/18</b> |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                                           | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1300 |  | <b>1.1.1.3.4.2.1</b> | <b>Etapla Precontractual</b>                                                                              |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |
| 1301 |  | 1.1.1.3.4.2.1.235    | Designar Comisión Técnica                                                                                 |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |
| 1302 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.236    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                          | 1301  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |
| 1303 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.237    | Resolución de Inicio de proceso                                                                           | 1302  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |
| 1304 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.238    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                         | 1303  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |
| 1305 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.239    | Conformación de Lista Corta                                                                               | 1304  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |
| 1306 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.240    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                      | 1305  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |
| 1307 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.241    | Elaborar ofertas                                                                                          | 1306  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |
| 1308 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.242    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                              | 1307  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17         |
| 1309 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.243    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                        | 1308  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17        |
| 1310 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.244    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                | 1309  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17        |
| 1311 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.245    | Contrato Suscrito                                                                                         | 1310  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17        |
| 1312 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.246    | Trámitar y pagar anticipo                                                                                 | 1311  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17        |
| 1313 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.1.247    | Pago de anticipo 20%                                                                                      | 1312  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17        |
| 1314 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.4.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                               |       |                                |           | <b>70 days</b>  | <b>Tue 12/5/17</b> | <b>Tue 3/20/18</b> |
| 1315 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.2.58     | Pago Planilla 1_35%                                                                                       | 1291  |                                |           | 0 days          | Tue 12/5/17        | Tue 12/5/17        |
| 1316 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.2.59     | Pago Planilla 2_35%                                                                                       | 1292  |                                |           | 0 days          | Thu 3/8/18         | Thu 3/8/18         |
| 1317 |                                                                                   | 1.1.1.3.4.2.2.60     | Pago Planilla Final_10%                                                                                   | 1298  |                                |           | 0 days          | Tue 3/20/18        | Tue 3/20/18        |
| 1318 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.5</b>     | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reforzamiento subsistema Flavio Alfaro (incluye habilitacion de SE)</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>429 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Fri 9/14/18</b> |
| 1319 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.5.1</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reforzamiento subsistema Flavio Alfaro (incluye habilitacion de SE)</b> |       |                                |           | <b>429 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Fri 9/14/18</b> |
| 1320 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.5.1.1</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapla Precontractual)</b>                                                        |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b> |
| 1321 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.15     | Designar Comisión Técnica                                                                                 |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17         |
| 1322 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.16     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                            | 1321  |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17         |
| 1323 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.17     | No objeción DDLs                                                                                          | 1322  |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17         |
| 1324 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.18     | Resolución de Inicio de proceso                                                                           | 1323  |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |
| 1325 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.19     | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                             | 1324  |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17        |
| 1326 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.20     | Presentar de ofertas                                                                                      | 1325  |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17        |
| 1327 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.21     | Acta de apertura de ofertas                                                                               | 1326  |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17        |
| 1328 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.22     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                              | 1327  |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17         |
| 1329 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.23     | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                 | 1328  |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17         |
| 1330 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.24     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                        | 1329  |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17        |
| 1331 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.1.1.25     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                | 1330  |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17        |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                   | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| 1332 |    | 1.1.1.3.5.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                                 | 1331        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |  |
| 1333 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                         | 1332        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |  |
| 1334 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                                              | 1333        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |  |
| 1335 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.5.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                          | <b>1334</b> |                                |           | <b>349 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Thu 9/6/18</b>  |  |
| 1336 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.5.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                                               |             |                                |           | <b>349 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Thu 9/6/18</b>  |  |
| 1337 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                             | 1334        |                                |           | 150 days        | Wed 4/19/17        | Tue 11/21/17       |  |
| 1338 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                                         | 1337        |                                |           | 40 days         | Wed 11/22/17       | Fri 1/19/18        |  |
| 1339 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                                                     | 1338        |                                |           | 40 days         | Mon 1/22/18        | Tue 3/20/18        |  |
| 1340 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                                                           | 1339        |                                |           | 40 days         | Wed 3/21/18        | Thu 5/17/18        |  |
| 1341 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                                                            | 1339        |                                |           | 40 days         | Wed 3/21/18        | Thu 5/17/18        |  |
| 1342 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                  | 1341        |                                |           | 40 days         | Fri 5/18/18        | Fri 7/13/18        |  |
| 1343 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                      | 1342        |                                |           | 30 days         | Mon 7/16/18        | Fri 8/24/18        |  |
| 1344 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.2.2.18     | Energizar redes                                                                                                   | 1343        |                                |           | 2 days          | Mon 8/27/18        | Tue 8/28/18        |  |
| 1345 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.2.2.19     | Pruebas                                                                                                           | 1344        |                                |           | 7 days          | Wed 8/29/18        | Thu 9/6/18         |  |
| 1346 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                     | 1345        |                                |           | 0 days          | Thu 9/6/18         | Thu 9/6/18         |  |
| 1347 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.5.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                       |             |                                |           | <b>77 days</b>  | <b>Fri 5/18/18</b> | <b>Tue 9/4/18</b>  |  |
| 1348 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                                               | 1341        |                                |           | 5 days          | Fri 5/18/18        | Thu 5/24/18        |  |
| 1349 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                                                               | 1344        |                                |           | 5 days          | Wed 8/29/18        | Tue 9/4/18         |  |
| 1350 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.5.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                       |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Fri 9/7/18</b>  | <b>Fri 9/14/18</b> |  |
| 1351 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.4.6        | Registro Contable                                                                                                 | 1345        |                                |           | 2 days          | Fri 9/7/18         | Mon 9/10/18        |  |
| 1352 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                                                                      | 1351        |                                |           | 3 days          | Tue 9/11/18        | Thu 9/13/18        |  |
| 1353 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.4.8        | Registro de Activos                                                                                               | 1352        |                                |           | 1 day           | Fri 9/14/18        | Fri 9/14/18        |  |
| 1354 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                                                         | 1353        |                                |           | 0 days          | Fri 9/14/18        | Fri 9/14/18        |  |
| 1355 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                                                           | 1354        |                                |           | 0 days          | Fri 9/14/18        | Fri 9/14/18        |  |
| 1356 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.5.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reforzamiento subsistema Flavio Alfaro (incluye habilitacion de SE)</b> |             |                                |           | <b>388 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Fri 9/14/18</b> |  |
| 1357 |                                                                                     | <b>1.1.1.3.5.2.1</b>   | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                      |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |  |
| 1358 |  | 1.1.1.3.5.2.1.261      | Designar Comisión Técnica                                                                                         |             |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |  |
| 1359 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.2.1.262      | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                  | 1358        |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |  |
| 1360 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.2.1.263      | Resolución de Inicio de proceso                                                                                   | 1359        |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |  |
| 1361 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.2.1.264      | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                 | 1360        |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |  |
| 1362 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.2.1.265      | Conformación de Lista Corta                                                                                       | 1361        |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |  |
| 1363 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.2.1.266      | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                              | 1362        |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |  |
| 1364 |                                                                                     | 1.1.1.3.5.2.1.267      | Elaborar ofertas                                                                                                  | 1363        |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                            | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1365 |  | 1.1.1.3.5.2.1.268      | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                               | 1364  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17         |
| 1366 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.2.1.269      | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                         | 1365  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17        |
| 1367 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.2.1.270      | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                 | 1366  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17        |
| 1368 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.2.1.271      | Contrato Suscrito                                                                                          | 1367  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17        |
| 1369 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.2.1.272      | Trámitar y pagar anticipo                                                                                  | 1368  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17        |
| 1370 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.2.1.273      | Pago de anticipo 20%                                                                                       | 1369  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17        |
| 1371 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.5.2.2</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                |       |                                |           | <b>80 days</b>  | <b>Thu 5/24/18</b> | <b>Fri 9/14/18</b> |
| 1372 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.2.2.64       | Pago Planilla 1_35%                                                                                        | 1348  |                                |           | 0 days          | Thu 5/24/18        | Thu 5/24/18        |
| 1373 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.2.2.65       | Pago Planilla 2_35%                                                                                        | 1349  |                                |           | 0 days          | Tue 9/4/18         | Tue 9/4/18         |
| 1374 |                                                                                   | 1.1.1.3.5.2.2.66       | Pago Planilla Final_10%                                                                                    | 1355  |                                |           | 0 days          | Fri 9/14/18        | Fri 9/14/18        |
| 1375 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.6</b>       | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reforzamiento subsistema a 69 kV Sesme - Flavio Alfaro (incluye LST)</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>319 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Wed 4/11/18</b> |
| 1376 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.6.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reforzamiento subsistema a 69 kV Sesme - Flavio Alfaro (incluye LST)</b> |       |                                |           | <b>319 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Wed 4/11/18</b> |
| 1377 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.6.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                          |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b> |
| 1378 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                                                  |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17         |
| 1379 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                             | 1378  |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17         |
| 1380 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.17       | No objeción DDLs                                                                                           | 1379  |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17         |
| 1381 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                                            | 1380  |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |
| 1382 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                              | 1381  |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17        |
| 1383 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                                       | 1382  |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17        |
| 1384 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                                                | 1383  |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17        |
| 1385 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                               | 1384  |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17         |
| 1386 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                  | 1385  |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17         |
| 1387 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                         | 1386  |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17        |
| 1388 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                 | 1387  |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17        |
| 1389 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                          | 1388  |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |
| 1390 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                  | 1389  |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |
| 1391 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                                       | 1390  |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |
| 1392 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.6.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                   |       |                                |           | <b>319 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Wed 4/11/18</b> |
| 1393 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.6.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                                        |       |                                |           | <b>319 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Wed 4/11/18</b> |
| 1394 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                      |       |                                |           | 120 days        | Mon 1/2/17         | Thu 6/22/17        |
| 1395 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                                  | 1394  |                                |           | 40 days         | Fri 6/23/17        | Fri 8/18/17        |
| 1396 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                                              | 1395  |                                |           | 40 days         | Mon 8/21/17        | Mon 10/16/17       |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                                                        | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration       | Start             | Finish             |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|--|
| 1397 |  | 1.1.1.3.6.1.2.2.14   | Montaje Electromecánico                                                                                                | 1396  |                                |           | 40 days        | Tue 10/17/17      | Thu 12/14/17       |  |
| 1398 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.2.2.15   | Tendido de Conductores                                                                                                 | 1396  |                                |           | 40 days        | Tue 10/17/17      | Thu 12/14/17       |  |
| 1399 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.2.2.16   | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                       | 1398  |                                |           | 40 days        | Fri 12/15/17      | Wed 2/14/18        |  |
| 1400 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.2.2.17   | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                           | 1399  |                                |           | 30 days        | Thu 2/15/18       | Wed 3/28/18        |  |
| 1401 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.2.2.18   | Energizar redes                                                                                                        | 1400  |                                |           | 2 days         | Thu 3/29/18       | Mon 4/2/18         |  |
| 1402 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.2.2.19   | Pruebas                                                                                                                | 1401  |                                |           | 7 days         | Tue 4/3/18        | Wed 4/11/18        |  |
| 1403 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.2.2.20   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                          | 1402  |                                |           | 0 days         | Wed 4/11/18       | Wed 4/11/18        |  |
| 1404 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.6.1.3</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                            |       |                                |           | <b>5 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Fri 1/6/17</b>  |  |
| 1405 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.3.3      | Pago Planilla 1_20%                                                                                                    |       |                                |           | 5 days         | Mon 1/2/17        | Fri 1/6/17         |  |
| 1406 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                                                                    |       |                                |           | 5 days         | Mon 1/2/17        | Fri 1/6/17         |  |
| 1407 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.6.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                            |       |                                |           | <b>6 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Mon 1/9/17</b>  |  |
| 1408 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.4.6      | Registro Contable                                                                                                      |       |                                |           | 2 days         | Mon 1/2/17        | Tue 1/3/17         |  |
| 1409 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                                                                           | 1408  |                                |           | 3 days         | Wed 1/4/17        | Fri 1/6/17         |  |
| 1410 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.4.8      | Registro de Activos                                                                                                    | 1409  |                                |           | 1 day          | Mon 1/9/17        | Mon 1/9/17         |  |
| 1411 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                                                                              | 1410  |                                |           | 0 days         | Mon 1/9/17        | Mon 1/9/17         |  |
| 1412 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                                                                | 1411  |                                |           | 0 days         | Mon 1/9/17        | Mon 1/9/17         |  |
| 1413 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.6.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reforzamiento subsistema a 69 kV<br/>Sesme - Flavio Alfaro (incluye LST)</b> |       |                                |           | <b>89 days</b> | <b>Fri 1/6/17</b> | <b>Wed 5/17/17</b> |  |
| 1414 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.6.2.3</b> | <b>Etapla Precontractual</b>                                                                                           |       |                                |           | <b>53 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b> | <b>Wed 5/17/17</b> |  |
| 1415 |  | 1.1.1.3.6.2.3.274    | Designar Comisión Técnica                                                                                              |       |                                |           | 2 days         | Thu 3/2/17        | Fri 3/3/17         |  |
| 1416 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.275    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                       | 1415  |                                |           | 2 days         | Mon 3/6/17        | Tue 3/7/17         |  |
| 1417 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.276    | Resolución de Inicio de proceso                                                                                        | 1416  |                                |           | 2 days         | Wed 3/8/17        | Thu 3/9/17         |  |
| 1418 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.277    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                      | 1417  |                                |           | 7 days         | Fri 3/10/17       | Mon 3/20/17        |  |
| 1419 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.278    | Conformación de Lista Corta                                                                                            | 1418  |                                |           | 3 days         | Tue 3/21/17       | Thu 3/23/17        |  |
| 1420 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.279    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                   | 1419  |                                |           | 1 day          | Fri 3/24/17       | Fri 3/24/17        |  |
| 1421 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.280    | Elaborar ofertas                                                                                                       | 1420  |                                |           | 7 days         | Mon 3/27/17       | Tue 4/4/17         |  |
| 1422 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.281    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                           | 1421  |                                |           | 2 days         | Wed 4/5/17        | Thu 4/6/17         |  |
| 1423 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.282    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                     | 1422  |                                |           | 2 days         | Fri 4/7/17        | Mon 4/10/17        |  |
| 1424 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.283    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                             | 1423  |                                |           | 20 days        | Tue 4/11/17       | Wed 5/10/17        |  |
| 1425 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.284    | Contrato Suscrito                                                                                                      | 1424  |                                |           | 0 days         | Wed 5/10/17       | Wed 5/10/17        |  |
| 1426 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.285    | Trámitar y pagar anticipo                                                                                              | 1425  |                                |           | 5 days         | Thu 5/11/17       | Wed 5/17/17        |  |
| 1427 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.3.286    | Pago de anticipo 20%                                                                                                   | 1426  |                                |           | 0 days         | Wed 5/17/17       | Wed 5/17/17        |  |
| 1428 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.6.2.4</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                            |       |                                |           | <b>1 day</b>   | <b>Fri 1/6/17</b> | <b>Mon 1/9/17</b>  |  |
| 1429 |                                                                                   | 1.1.1.3.6.2.4.67     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                    | 1405  |                                |           | 0 days         | Fri 1/6/17        | Fri 1/6/17         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                     | Nombre de tarea                                                                                        | Prede | Meta<br>Matriz<br>Resulti<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start             | Finish              |
|------|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1430 |  | 1.1.1.3.6.2.4.68        | Pago Planilla 2_35%                                                                                    | 1406  |                                 |           | 0 days          | Fri 1/6/17        | Fri 1/6/17          |
| 1431 |  | 1.1.1.3.6.2.4.69        | Pago Planilla Final_10%                                                                                | 1412  |                                 |           | 0 days          | Mon 1/9/17        | Mon 1/9/17          |
| 1432 |  | <b>1.1.1.3.12</b>       | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción celdas de media tensión para 34.5 kV en S/E Sesme</b>       |       | <b>1</b>                        |           | <b>249 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Thu 12/28/17</b> |
| 1433 |  | <b>1.1.1.3.12.3</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción celdas de media tensión para 34.5 kV en S/E Sesme</b> |       |                                 |           | <b>249 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Thu 12/28/17</b> |
| 1434 |  | <b>1.1.1.3.12.3.5</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                      |       |                                 |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 1435 |  | 1.1.1.3.12.3.5.29       | Designar Comisión Técnica                                                                              |       |                                 |           | 2 days          | Mon 1/2/17        | Tue 1/3/17          |
| 1436 |  | 1.1.1.3.12.3.5.30       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                         | 1435  |                                 |           | 2 days          | Wed 1/4/17        | Thu 1/5/17          |
| 1437 |  | 1.1.1.3.12.3.5.31       | No objeción DDLs                                                                                       | 1436  |                                 |           | 0 days          | Thu 1/5/17        | Thu 1/5/17          |
| 1438 |  | 1.1.1.3.12.3.5.32       | Resolución de Inicio de proceso                                                                        | 1437  |                                 |           | 2 days          | Fri 1/6/17        | Mon 1/9/17          |
| 1439 |  | 1.1.1.3.12.3.5.33       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                          | 1438  |                                 |           | 1 day           | Tue 1/10/17       | Tue 1/10/17         |
| 1440 |  | 1.1.1.3.12.3.5.34       | Presentar de ofertas                                                                                   | 1439  |                                 |           | 30 days         | Wed 1/11/17       | Tue 2/21/17         |
| 1441 |  | 1.1.1.3.12.3.5.35       | Acta de apertura de ofertas                                                                            | 1440  |                                 |           | 0 days          | Tue 2/21/17       | Tue 2/21/17         |
| 1442 |  | 1.1.1.3.12.3.5.36       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                           | 1441  |                                 |           | 10 days         | Wed 2/22/17       | Thu 3/9/17          |
| 1443 |  | 1.1.1.3.12.3.5.37       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                              | 1442  |                                 |           | 0 days          | Thu 3/9/17        | Thu 3/9/17          |
| 1444 |  | 1.1.1.3.12.3.5.38       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                     | 1443  |                                 |           | 2 days          | Fri 3/10/17       | Mon 3/13/17         |
| 1445 |  | 1.1.1.3.12.3.5.39       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                             | 1444  |                                 |           | 20 days         | Tue 3/14/17       | Mon 4/10/17         |
| 1446 |  | 1.1.1.3.12.3.5.40       | Contrato Suscrito                                                                                      | 1445  |                                 |           | 0 days          | Mon 4/10/17       | Mon 4/10/17         |
| 1447 |  | 1.1.1.3.12.3.5.41       | Trámitar y pagar anticipo                                                                              | 1446  |                                 |           | 5 days          | Tue 4/11/17       | Tue 4/18/17         |
| 1448 |  | 1.1.1.3.12.3.5.42       | Pago de anticipo 50%                                                                                   | 1447  |                                 |           | 0 days          | Tue 4/18/17       | Tue 4/18/17         |
| 1449 |  | <b>1.1.1.3.12.3.6</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                               |       |                                 |           | <b>249 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Thu 12/28/17</b> |
| 1450 |  | <b>1.1.1.3.12.3.6.3</b> | <b>Construcción</b>                                                                                    |       |                                 |           | <b>249 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Thu 12/28/17</b> |
| 1451 |  | 1.1.1.3.12.3.6.3.21     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                  |       |                                 |           | 50 days         | Mon 1/2/17        | Tue 3/14/17         |
| 1452 |  | 1.1.1.3.12.3.6.3.22     | Replanteo                                                                                              | 1451  |                                 |           | 40 days         | Wed 3/15/17       | Thu 5/11/17         |
| 1453 |  | 1.1.1.3.12.3.6.3.23     | Obras Civiles                                                                                          | 1452  |                                 |           | 40 days         | Fri 5/12/17       | Thu 7/6/17          |
| 1454 |  | 1.1.1.3.12.3.6.3.24     | Montaje Electromecánico                                                                                | 1453  |                                 |           | 40 days         | Fri 7/7/17        | Fri 9/1/17          |
| 1455 |  | 1.1.1.3.12.3.6.3.25     | Tendido de Conductores                                                                                 | 1453  |                                 |           | 40 days         | Fri 7/7/17        | Fri 9/1/17          |
| 1456 |  | 1.1.1.3.12.3.6.3.26     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                       | 1455  |                                 |           | 40 days         | Mon 9/4/17        | Mon 10/30/17        |
| 1457 |  | 1.1.1.3.12.3.6.3.27     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                           | 1456  |                                 |           | 30 days         | Tue 10/31/17      | Thu 12/14/17        |
| 1458 |  | 1.1.1.3.12.3.6.3.28     | Energizar redes                                                                                        | 1457  |                                 |           | 2 days          | Fri 12/15/17      | Mon 12/18/17        |
| 1459 |  | 1.1.1.3.12.3.6.3.29     | Pruebas                                                                                                | 1458  |                                 |           | 7 days          | Tue 12/19/17      | Thu 12/28/17        |
| 1460 |  | 1.1.1.3.12.3.6.3.30     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                          | 1459  |                                 |           | 0 days          | Thu 12/28/17      | Thu 12/28/17        |
| 1461 |  | <b>1.1.1.3.12.3.7</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                            |       |                                 |           | <b>5 days</b>   | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Fri 1/6/17</b>   |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                   | Nombre de tarea                                                                                                                                                                     | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start             | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1462 |  | 1.1.1.3.12.3.7.5      | Pago Planilla 1_20%                                                                                                                                                                 |       |                                |           | 5 days          | Mon 1/2/17        | Fri 1/6/17          |
| 1463 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.3.7.6      | Pago Planilla 2_20%                                                                                                                                                                 |       |                                |           | 5 days          | Mon 1/2/17        | Fri 1/6/17          |
| 1464 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.12.3.8</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                                                                         |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Mon 1/9/17</b>   |
| 1465 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.3.8.11     | Registro Contable                                                                                                                                                                   |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17        | Tue 1/3/17          |
| 1466 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.3.8.12     | Liquidación Técnica Contable                                                                                                                                                        | 1465  |                                |           | 3 days          | Wed 1/4/17        | Fri 1/6/17          |
| 1467 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.3.8.13     | Registro de Activos                                                                                                                                                                 | 1466  |                                |           | 1 day           | Mon 1/9/17        | Mon 1/9/17          |
| 1468 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.3.8.14     | Acta de Entrega Recepción                                                                                                                                                           | 1467  |                                |           | 0 days          | Mon 1/9/17        | Mon 1/9/17          |
| 1469 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.3.8.15     | Pago Planilla final 10%                                                                                                                                                             | 1468  |                                |           | 0 days          | Mon 1/9/17        | Mon 1/9/17          |
| 1470 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.12.4</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción celdas de media tensión para 34.5 kV en S/E Sesme</b>                                                                      |       |                                |           | <b>89 days</b>  | <b>Fri 1/6/17</b> | <b>Wed 5/17/17</b>  |
| 1471 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.12.4.5</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                                                                        |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b> | <b>Wed 5/17/17</b>  |
| 1472 |  | 1.1.1.3.12.4.5.287    | Designar Comisión Técnica                                                                                                                                                           |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17        | Fri 3/3/17          |
| 1473 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.288    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                                                                    | 1472  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17        | Tue 3/7/17          |
| 1474 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.289    | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                                                                     | 1473  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17        | Thu 3/9/17          |
| 1475 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.290    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                                                                                   | 1474  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17       | Mon 3/20/17         |
| 1476 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.291    | Conformación de Lista Corta                                                                                                                                                         | 1475  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17       | Thu 3/23/17         |
| 1477 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.292    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                                                                                | 1476  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17       | Fri 3/24/17         |
| 1478 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.293    | Elaborar ofertas                                                                                                                                                                    | 1477  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17       | Tue 4/4/17          |
| 1479 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.294    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                                                                        | 1478  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17        | Thu 4/6/17          |
| 1480 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.295    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                                                                  | 1479  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17        | Mon 4/10/17         |
| 1481 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.296    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                                                                          | 1480  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17       | Wed 5/10/17         |
| 1482 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.297    | Contrato Suscrito                                                                                                                                                                   | 1481  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17       | Wed 5/10/17         |
| 1483 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.298    | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                                                                           | 1482  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17       | Wed 5/17/17         |
| 1484 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.5.299    | Pago de anticipo 20%                                                                                                                                                                | 1483  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17       | Wed 5/17/17         |
| 1485 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.12.4.6</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                                                                         |       |                                |           | <b>1 day</b>    | <b>Fri 1/6/17</b> | <b>Mon 1/9/17</b>   |
| 1486 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.6.70     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                                                                                 | 1462  |                                |           | 0 days          | Fri 1/6/17        | Fri 1/6/17          |
| 1487 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.6.71     | Pago Planilla 2_35%                                                                                                                                                                 | 1463  |                                |           | 0 days          | Fri 1/6/17        | Fri 1/6/17          |
| 1488 |                                                                                   | 1.1.1.3.12.4.6.72     | Pago Planilla Final_10%                                                                                                                                                             | 1469  |                                |           | 0 days          | Mon 1/9/17        | Mon 1/9/17          |
| 1489 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.13</b>     | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Repotenciamiento subsistema de subtransmisión Chone-Santo Domingo (incluye construcción subestación de corte y seccionamiento vía Chone km 8)</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>355 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Tue 11/27/18</b> |
| 1490 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.13.5</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Repotenciamiento subsistema de subtransmisión Chone-Santo Domingo (incluye construcción subestación de corte y seccionamiento vía Chone km 8)</b> |       |                                |           | <b>355 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Tue 11/27/18</b> |
| 1491 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.13.5.9</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                                                                                                  |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Mon 11/13/17</b> |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                      | Nombre de tarea                                                           | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1492 |  | 1.1.1.3.13.5.9.43        | Designar Comisión Técnica                                                 |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 1493 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.44        | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                            | 1492  |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 1494 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.45        | No objeción DDLs                                                          | 1493  |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 1495 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.46        | Resolución de Inicio de proceso                                           | 1494  |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 1496 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.47        | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas             | 1495  |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 1497 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.48        | Presentar de ofertas                                                      | 1496  |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 1498 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.49        | Acta de apertura de ofertas                                               | 1497  |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 1499 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.50        | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 1498  |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 1500 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.51        | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 1499  |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 1501 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.52        | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 1500  |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 1502 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.53        | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 1501  |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 1503 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.54        | Contrato Suscrito                                                         | 1502  |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 1504 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.55        | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 1503  |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 1505 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.9.56        | Pago de anticipo 50%                                                      | 1504  |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 1506 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.13.5.10</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  |       |                                |           | <b>349 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/19/18</b> |
| 1507 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.13.5.10.4</b> | <b>Construcción</b>                                                       |       |                                |           | <b>349 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/19/18</b> |
| 1508 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.10.4.31     | Compra y acopio de materiales en Obra                                     |       |                                |           | 150 days        | Mon 7/3/17          | Tue 2/6/18          |
| 1509 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.10.4.32     | Replanteo                                                                 | 1508  |                                |           | 40 days         | Wed 2/7/18          | Fri 4/6/18          |
| 1510 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.10.4.33     | Obras Civiles                                                             | 1509  |                                |           | 40 days         | Mon 4/9/18          | Tue 6/5/18          |
| 1511 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.10.4.34     | Montaje Electromecánico                                                   | 1510  |                                |           | 40 days         | Wed 6/6/18          | Tue 7/31/18         |
| 1512 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.10.4.35     | Tendido de Conductores                                                    | 1510  |                                |           | 40 days         | Wed 6/6/18          | Tue 7/31/18         |
| 1513 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.10.4.36     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                          | 1512  |                                |           | 40 days         | Wed 8/1/18          | Tue 9/25/18         |
| 1514 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.10.4.37     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones              | 1513  |                                |           | 30 days         | Wed 9/26/18         | Tue 11/6/18         |
| 1515 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.10.4.38     | Energizar redes                                                           | 1514  |                                |           | 2 days          | Wed 11/7/18         | Thu 11/8/18         |
| 1516 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.10.4.39     | Pruebas                                                                   | 1515  |                                |           | 7 days          | Fri 11/9/18         | Mon 11/19/18        |
| 1517 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.10.4.40     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                             | 1516  |                                |           | 0 days          | Mon 11/19/18        | Mon 11/19/18        |
| 1518 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.13.5.11</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |       |                                |           | <b>77 days</b>  | <b>Wed 8/1/18</b>   | <b>Thu 11/15/18</b> |
| 1519 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.11.7        | Pago Planilla 1_20%                                                       | 1512  |                                |           | 5 days          | Wed 8/1/18          | Tue 8/7/18          |
| 1520 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.11.8        | Pago Planilla 2_20%                                                       | 1515  |                                |           | 5 days          | Fri 11/9/18         | Thu 11/15/18        |
| 1521 |                                                                                   | <b>1.1.1.3.13.5.12</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                               |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Tue 11/20/18</b> | <b>Tue 11/27/18</b> |
| 1522 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.12.16       | Registro Contable                                                         | 1517  |                                |           | 2 days          | Tue 11/20/18        | Wed 11/21/18        |
| 1523 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.12.17       | Liquidación Técnica Contable                                              | 1522  |                                |           | 3 days          | Thu 11/22/18        | Mon 11/26/18        |
| 1524 |                                                                                   | 1.1.1.3.13.5.12.18       | Registro de Activos                                                       | 1523  |                                |           | 1 day           | Tue 11/27/18        | Tue 11/27/18        |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                   | Nombre de tarea                                                                                                                                                                             | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start             | Finish              |
|------|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1525 |  | 1.1.1.3.13.5.12.19    | Acta de Entrega Recepción                                                                                                                                                                   | 1524  |                                |           | 0 days          | Tue 11/27/18      | Tue 11/27/18        |
| 1526 |  | 1.1.1.3.13.5.12.20    | Pago Planilla final 10%                                                                                                                                                                     | 1525  |                                |           | 0 days          | Tue 11/27/18      | Tue 11/27/18        |
| 1527 |  | <b>1.1.1.3.13.6</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Repotenciamiento subsistema de subtransmisión Chone-Santo Domingo (incluye construcción subestación de corte y seccionamiento vía Chone km 8)</b> |       |                                |           | <b>311 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b> | <b>Tue 11/27/18</b> |
| 1528 |  | <b>1.1.1.3.13.6.7</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                                                                                |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b> | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 1529 |  | 1.1.1.3.13.6.7.300    | Designar Comisión Técnica                                                                                                                                                                   |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17        | Tue 9/5/17          |
| 1530 |  | 1.1.1.3.13.6.7.301    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                                                                            | 1529  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17        | Thu 9/7/17          |
| 1531 |  | 1.1.1.3.13.6.7.302    | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                                                                             | 1530  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17        | Mon 9/11/17         |
| 1532 |  | 1.1.1.3.13.6.7.303    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                                                                                           | 1531  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17       | Wed 9/20/17         |
| 1533 |  | 1.1.1.3.13.6.7.304    | Conformación de Lista Corta                                                                                                                                                                 | 1532  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17       | Mon 9/25/17         |
| 1534 |  | 1.1.1.3.13.6.7.305    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                                                                                        | 1533  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17       | Tue 9/26/17         |
| 1535 |  | 1.1.1.3.13.6.7.306    | Elaborar ofertas                                                                                                                                                                            | 1534  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17       | Thu 10/5/17         |
| 1536 |  | 1.1.1.3.13.6.7.307    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                                                                                | 1535  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17       | Tue 10/10/17        |
| 1537 |  | 1.1.1.3.13.6.7.308    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                                                                          | 1536  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17      | Thu 10/12/17        |
| 1538 |  | 1.1.1.3.13.6.7.309    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                                                                                  | 1537  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17      | Mon 11/13/17        |
| 1539 |  | 1.1.1.3.13.6.7.310    | Contrato Suscrito                                                                                                                                                                           | 1538  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17      | Mon 11/13/17        |
| 1540 |  | 1.1.1.3.13.6.7.311    | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                                                                                   | 1539  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17      | Mon 11/20/17        |
| 1541 |  | 1.1.1.3.13.6.7.312    | Pago de anticipo 20%                                                                                                                                                                        | 1540  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17      | Mon 11/20/17        |
| 1542 |  | <b>1.1.1.3.13.6.8</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                                                                                 |       |                                |           | <b>80 days</b>  | <b>Tue 8/7/18</b> | <b>Tue 11/27/18</b> |
| 1543 |  | 1.1.1.3.13.6.8.73     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                                                                                         | 1519  |                                |           | 0 days          | Tue 8/7/18        | Tue 8/7/18          |
| 1544 |  | 1.1.1.3.13.6.8.74     | Pago Planilla 2_35%                                                                                                                                                                         | 1520  |                                |           | 0 days          | Thu 11/15/18      | Thu 11/15/18        |
| 1545 |  | 1.1.1.3.13.6.8.75     | Pago Planilla Final_10%                                                                                                                                                                     | 1526  |                                |           | 0 days          | Tue 11/27/18      | Tue 11/27/18        |
| 1546 |  | <b>1.1.2</b>          | <b>Cl.2 Plan de Reconstrucción Integral del Sistema de Distribución Eléctrica</b>                                                                                                           |       | <b>26</b>                      |           | <b>405 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Mon 8/13/18</b>  |
| 1547 |  | <b>1.1.2.1</b>        | <b>CNEL EP- UN Manabí 9 Proyectos de Distribución fiscalizados y energizados</b>                                                                                                            |       | <b>9</b>                       |           | <b>339 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Thu 5/10/18</b>  |
| 1548 |  | <b>1.1.2.1.1</b>      | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Alimentadores de Subestación Calceta</b>                                                                                                                |       | <b>1</b>                       |           | <b>339 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Thu 5/10/18</b>  |
| 1549 |  | <b>1.1.2.1.1.1</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Alimentadores de Subestación Calceta</b>                                                                                                          |       |                                |           | <b>339 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Thu 5/10/18</b>  |
| 1550 |  | <b>1.1.2.1.1.1.1</b>  | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                                                                                                          |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 1551 |  | 1.1.2.1.1.1.1.15      | Designar Comisión Técnica                                                                                                                                                                   |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17        | Tue 1/3/17          |
| 1552 |  | 1.1.2.1.1.1.1.16      | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                                                                                              | 1551  |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17        | Thu 1/5/17          |
| 1553 |  | 1.1.2.1.1.1.1.17      | No objeción DDLs                                                                                                                                                                            | 1552  |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17        | Thu 1/5/17          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                            | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1554 |  | 1.1.2.1.1.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                            | 1553        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |
| 1555 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.1.19       | Publicar convocatoria prensa nacional y/o Compras Públicas                                 | 1554        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17        |
| 1556 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                       | 1555        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17        |
| 1557 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                                | 1556        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17        |
| 1558 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                               | 1557        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17         |
| 1559 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                  | 1558        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17         |
| 1560 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                         | 1559        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17        |
| 1561 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                 | 1560        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17        |
| 1562 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                          | 1561        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |
| 1563 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                  | 1562        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |
| 1564 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                       | 1563        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |
| 1565 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.1.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                   | <b>1564</b> |                                |           | <b>259 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 5/2/18</b>  |
| 1566 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.1.1.2.5</b> | <b>Construcción</b>                                                                        |             |                                |           | <b>259 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 5/2/18</b>  |
| 1567 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.2.5.31     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                      | 1564        |                                |           | 150 days        | Wed 4/19/17        | Tue 11/21/17       |
| 1568 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.2.5.32     | Replanteo                                                                                  | 1567        |                                |           | 20 days         | Wed 11/22/17       | Wed 12/20/17       |
| 1569 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.2.5.33     | Obras Civiles                                                                              | 1568        |                                |           | 30 days         | Thu 12/21/17       | Fri 2/2/18         |
| 1570 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.2.5.34     | Montaje Electromecánico                                                                    | 1569        |                                |           | 30 days         | Mon 2/5/18         | Tue 3/20/18        |
| 1571 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.2.5.35     | Tendido de Conductores                                                                     | 1569        |                                |           | 20 days         | Mon 2/5/18         | Tue 3/6/18         |
| 1572 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.2.5.36     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                           | 1571        |                                |           | 20 days         | Wed 3/7/18         | Wed 4/4/18         |
| 1573 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.2.5.37     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                               | 1572        |                                |           | 10 days         | Thu 4/5/18         | Wed 4/18/18        |
| 1574 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.2.5.38     | Energizar redes                                                                            | 1573        |                                |           | 2 days          | Thu 4/19/18        | Fri 4/20/18        |
| 1575 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.2.5.39     | Pruebas                                                                                    | 1574        |                                |           | 7 days          | Mon 4/23/18        | Wed 5/2/18         |
| 1576 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.2.5.40     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                              | 1575        |                                |           | 0 days          | Wed 5/2/18         | Wed 5/2/18         |
| 1577 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.1.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                |             |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Wed 3/7/18</b>  | <b>Fri 4/27/18</b> |
| 1578 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                        | 1571        |                                |           | 5 days          | Wed 3/7/18         | Tue 3/13/18        |
| 1579 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                                        | 1574        |                                |           | 5 days          | Mon 4/23/18        | Fri 4/27/18        |
| 1580 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.1.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 5/3/18</b>  | <b>Thu 5/10/18</b> |
| 1581 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.4.6        | Registro Contable                                                                          | 1575        |                                |           | 2 days          | Thu 5/3/18         | Fri 5/4/18         |
| 1582 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                                               | 1581        |                                |           | 3 days          | Mon 5/7/18         | Wed 5/9/18         |
| 1583 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.4.8        | Registro de Activos                                                                        | 1582        |                                |           | 1 day           | Thu 5/10/18        | Thu 5/10/18        |
| 1584 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                                  | 1583        |                                |           | 0 days          | Thu 5/10/18        | Thu 5/10/18        |
| 1585 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                                    | 1584        |                                |           | 0 days          | Thu 5/10/18        | Thu 5/10/18        |
| 1586 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.1.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción Alimentadores de Subestación Calceta</b> |             |                                |           | <b>298 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Thu 5/10/18</b> |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                        | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1587 |  | <b>1.1.2.1.1.2.1</b> | <b>Etapla Precontractual</b>                                                           |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |
| 1588 |  | 1.1.2.1.1.2.1.287    | Designar Comisión Técnica                                                              |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |
| 1589 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.288    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                       | 1588  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |
| 1590 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.289    | Resolución de Inicio de proceso                                                        | 1589  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |
| 1591 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.290    | Convocar a Expresiones de Interés                                                      | 1590  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |
| 1592 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.291    | Conformación de Lista Corta                                                            | 1591  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |
| 1593 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.292    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                   | 1592  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |
| 1594 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.293    | Elaborar ofertas                                                                       | 1593  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |
| 1595 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.294    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                           | 1594  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17         |
| 1596 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.295    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                     | 1595  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17        |
| 1597 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.296    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                             | 1596  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17        |
| 1598 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.297    | Contrato Suscrito                                                                      | 1597  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17        |
| 1599 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.298    | Trámitar y pagar anticipo                                                              | 1598  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17        |
| 1600 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.1.299    | Pago de anticipo 20%                                                                   | 1599  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17        |
| 1601 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.1.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                            |       |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Tue 3/13/18</b> | <b>Thu 5/10/18</b> |
| 1602 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.2.70     | Pago Planilla 1_35%                                                                    | 1578  |                                |           | 0 days          | Tue 3/13/18        | Tue 3/13/18        |
| 1603 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.2.71     | Pago Planilla 2_35%                                                                    | 1579  |                                |           | 0 days          | Fri 4/27/18        | Fri 4/27/18        |
| 1604 |                                                                                   | 1.1.2.1.1.2.2.72     | Pago Planilla Final_10%                                                                | 1585  |                                |           | 0 days          | Thu 5/10/18        | Thu 5/10/18        |
| 1605 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.2</b>     | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción alimentadores de Subestación San Vicente</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>269 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Fri 1/26/18</b> |
| 1606 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.2.1</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción alimentadores de Subestación San Vicente</b> |       |                                |           | <b>269 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Fri 1/26/18</b> |
| 1607 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.2.1.1</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapla Precontractual)</b>                                     |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b> |
| 1608 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.15     | Designar Comisión Técnica                                                              |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17         |
| 1609 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.16     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                         | 1608  |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17         |
| 1610 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.17     | No objeción DDLs                                                                       | 1609  |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17         |
| 1611 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.18     | Resolución de Inicio de proceso                                                        | 1610  |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |
| 1612 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.19     | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                          | 1611  |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17        |
| 1613 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.20     | Presentar de ofertas                                                                   | 1612  |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17        |
| 1614 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.21     | Acta de apertura de ofertas                                                            | 1613  |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17        |
| 1615 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.22     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                           | 1614  |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17         |
| 1616 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.23     | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación              | 1615  |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17         |
| 1617 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.24     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                     | 1616  |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17        |
| 1618 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.1.1.25     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                             | 1617  |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17        |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| 1619 |    | 1.1.2.1.2.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                              | 1618        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |  |
| 1620 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                      | 1619        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |  |
| 1621 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                           | 1620        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |  |
| 1622 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.2.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                       | <b>1621</b> |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Thu 1/18/18</b> |  |
| 1623 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.2.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                            |             |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Thu 1/18/18</b> |  |
| 1624 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                          | 1621        |                                |           | 120 days        | Wed 4/19/17        | Thu 10/5/17        |  |
| 1625 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                      | 1624        |                                |           | 10 days         | Fri 10/6/17        | Fri 10/20/17       |  |
| 1626 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                                  | 1625        |                                |           | 15 days         | Mon 10/23/17       | Tue 11/14/17       |  |
| 1627 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                                        | 1626        |                                |           | 15 days         | Wed 11/15/17       | Tue 12/5/17        |  |
| 1628 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                                         | 1626        |                                |           | 15 days         | Wed 11/15/17       | Tue 12/5/17        |  |
| 1629 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                               | 1628        |                                |           | 10 days         | Thu 12/7/17        | Wed 12/20/17       |  |
| 1630 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                   | 1629        |                                |           | 10 days         | Thu 12/21/17       | Fri 1/5/18         |  |
| 1631 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.2.2.18     | Energizar redes                                                                                | 1630        |                                |           | 2 days          | Mon 1/8/18         | Tue 1/9/18         |  |
| 1632 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.2.2.19     | Pruebas                                                                                        | 1631        |                                |           | 7 days          | Wed 1/10/18        | Thu 1/18/18        |  |
| 1633 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                  | 1632        |                                |           | 0 days          | Thu 1/18/18        | Thu 1/18/18        |  |
| 1634 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.2.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                    |             |                                |           | <b>27 days</b>  | <b>Thu 12/7/17</b> | <b>Tue 1/16/18</b> |  |
| 1635 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                            | 1628        |                                |           | 5 days          | Thu 12/7/17        | Wed 12/13/17       |  |
| 1636 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                                            | 1631        |                                |           | 5 days          | Wed 1/10/18        | Tue 1/16/18        |  |
| 1637 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.2.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                    |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Fri 1/19/18</b> | <b>Fri 1/26/18</b> |  |
| 1638 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.4.6        | Registro Contable                                                                              | 1632        |                                |           | 2 days          | Fri 1/19/18        | Mon 1/22/18        |  |
| 1639 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                                                   | 1638        |                                |           | 3 days          | Tue 1/23/18        | Thu 1/25/18        |  |
| 1640 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.4.8        | Registro de Activos                                                                            | 1639        |                                |           | 1 day           | Fri 1/26/18        | Fri 1/26/18        |  |
| 1641 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                                      | 1640        |                                |           | 0 days          | Fri 1/26/18        | Fri 1/26/18        |  |
| 1642 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                                        | 1641        |                                |           | 0 days          | Fri 1/26/18        | Fri 1/26/18        |  |
| 1643 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.2.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción alimentadores de Subestación San Vicente</b> |             |                                |           | <b>228 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Fri 1/26/18</b> |  |
| 1644 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.2.2.1</b>   | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                   |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |  |
| 1645 |  | 1.1.2.1.2.2.1.300      | Designar Comisión Técnica                                                                      |             |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |  |
| 1646 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.2.1.301      | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                               | 1645        |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |  |
| 1647 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.2.1.302      | Resolución de Inicio de proceso                                                                | 1646        |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |  |
| 1648 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.2.1.303      | Convocar a Expresiones de Interés                                                              | 1647        |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |  |
| 1649 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.2.1.304      | Conformación de Lista Corta                                                                    | 1648        |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |  |
| 1650 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.2.1.305      | Invitación a empresas de Lista Corta                                                           | 1649        |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |  |
| 1651 |                                                                                     | 1.1.2.1.2.2.1.306      | Elaborar ofertas                                                                               | 1650        |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                     | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 1652 |  | 1.1.2.1.2.2.1.307      | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                        | 1651        |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17          | Thu 4/6/17         |
| 1653 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.2.1.308      | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                  | 1652        |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17          | Mon 4/10/17        |
| 1654 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.2.1.309      | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                          | 1653        |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17         | Wed 5/10/17        |
| 1655 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.2.1.310      | Contrato Suscrito                                                                   | 1654        |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17         | Wed 5/10/17        |
| 1656 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.2.1.311      | Trámitar y pagar anticipo                                                           | 1655        |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17         | Wed 5/17/17        |
| 1657 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.2.1.312      | Pago de anticipo 20%                                                                | 1656        |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17         | Wed 5/17/17        |
| 1658 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.2.2.2</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                         |             |                                |           | <b>30 days</b>  | <b>Wed 12/13/17</b> | <b>Fri 1/26/18</b> |
| 1659 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.2.2.73       | Pago Planilla 1_35%                                                                 | 1635        |                                |           | 0 days          | Wed 12/13/17        | Wed 12/13/17       |
| 1660 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.2.2.74       | Pago Planilla 2_35%                                                                 | 1636        |                                |           | 0 days          | Tue 1/16/18         | Tue 1/16/18        |
| 1661 |                                                                                   | 1.1.2.1.2.2.2.75       | Pago Planilla Final_10%                                                             | 1642        |                                |           | 0 days          | Fri 1/26/18         | Fri 1/26/18        |
| 1662 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.3</b>       | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de Alimentadores de Subestación Bahía</b>       |             | <b>1</b>                       |           | <b>280 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>   | <b>Wed 2/14/18</b> |
| 1663 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.3.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de Alimentadores de Subestación Bahía</b> |             |                                |           | <b>280 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>   | <b>Wed 2/14/18</b> |
| 1664 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.3.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                   |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>   | <b>Mon 5/15/17</b> |
| 1665 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                           |             |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17          | Tue 1/3/17         |
| 1666 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                      | 1665        |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17          | Thu 1/5/17         |
| 1667 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.17       | No objeción DDLs                                                                    | 1666        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17          | Thu 1/5/17         |
| 1668 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                     | 1667        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17          | Mon 1/9/17         |
| 1669 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.19       | Publicar convocatoria en UNDB, prensa nacional y/o Compras Públicas                 | 1668        |                                |           | 3 days          | Tue 1/10/17         | Thu 1/12/17        |
| 1670 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                | 1669        |                                |           | 30 days         | Fri 1/13/17         | Thu 2/23/17        |
| 1671 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                         | 1670        |                                |           | 0 days          | Thu 2/23/17         | Thu 2/23/17        |
| 1672 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                        | 1671        |                                |           | 10 days         | Fri 2/24/17         | Mon 3/13/17        |
| 1673 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación           | 1672        |                                |           | 0 days          | Mon 3/13/17         | Mon 3/13/17        |
| 1674 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                  | 1673        |                                |           | 2 days          | Tue 3/14/17         | Wed 3/15/17        |
| 1675 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                          | 1674        |                                |           | 20 days         | Thu 3/16/17         | Wed 4/12/17        |
| 1676 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                   | 1675        |                                |           | 0 days          | Wed 4/12/17         | Wed 4/12/17        |
| 1677 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                           | 1676        |                                |           | 5 days          | Thu 4/13/17         | Thu 4/20/17        |
| 1678 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                | 1677        |                                |           | 0 days          | Thu 4/20/17         | Thu 4/20/17        |
| 1679 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.3.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                            | <b>1678</b> |                                |           | <b>198 days</b> | <b>Fri 4/21/17</b>  | <b>Fri 2/2/18</b>  |
| 1680 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.3.1.2.5</b> | <b>Construcción</b>                                                                 |             |                                |           | <b>198 days</b> | <b>Fri 4/21/17</b>  | <b>Fri 2/2/18</b>  |
| 1681 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.2.5.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                               | 1678        |                                |           | 120 days        | Fri 4/21/17         | Tue 10/10/17       |
| 1682 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.2.5.12     | Replanteo                                                                           | 1681        |                                |           | 10 days         | Wed 10/11/17        | Tue 10/24/17       |
| 1683 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.2.5.13     | Obras Civiles                                                                       | 1682        |                                |           | 15 days         | Wed 10/25/17        | Thu 11/16/17       |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                             | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 1684 |  | 1.1.2.1.3.1.2.5.14   | Montaje Electromecánico                                                                     | 1683  |                                |           | 15 days         | Fri 11/17/17        | Fri 12/8/17        |
| 1685 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.2.5.15   | Tendido de Conductores                                                                      | 1683  |                                |           | 14 days         | Fri 11/17/17        | Thu 12/7/17        |
| 1686 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.2.5.16   | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                            | 1685  |                                |           | 15 days         | Fri 12/8/17         | Fri 12/29/17       |
| 1687 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.2.5.17   | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                | 1686  |                                |           | 15 days         | Tue 1/2/18          | Mon 1/22/18        |
| 1688 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.2.5.18   | Energizar redes                                                                             | 1687  |                                |           | 2 days          | Tue 1/23/18         | Wed 1/24/18        |
| 1689 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.2.5.19   | Pruebas                                                                                     | 1688  |                                |           | 7 days          | Thu 1/25/18         | Fri 2/2/18         |
| 1690 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.2.5.20   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                               | 1689  |                                |           | 0 days          | Fri 2/2/18          | Fri 2/2/18         |
| 1691 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.3.1.3</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                 |       |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Fri 12/8/17</b>  | <b>Wed 1/31/18</b> |
| 1692 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.3.3      | Pago Planilla 1_20%                                                                         | 1685  |                                |           | 5 days          | Fri 12/8/17         | Thu 12/14/17       |
| 1693 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                                         | 1688  |                                |           | 5 days          | Thu 1/25/18         | Wed 1/31/18        |
| 1694 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.3.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                 |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 2/5/18</b>   | <b>Wed 2/14/18</b> |
| 1695 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.4.6      | Registro Contable                                                                           | 1689  |                                |           | 2 days          | Mon 2/5/18          | Tue 2/6/18         |
| 1696 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                                                | 1695  |                                |           | 3 days          | Wed 2/7/18          | Fri 2/9/18         |
| 1697 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.4.8      | Registro de Activos                                                                         | 1696  |                                |           | 1 day           | Wed 2/14/18         | Wed 2/14/18        |
| 1698 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                                                   | 1697  |                                |           | 0 days          | Wed 2/14/18         | Wed 2/14/18        |
| 1699 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                                     | 1698  |                                |           | 0 days          | Wed 2/14/18         | Wed 2/14/18        |
| 1700 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.3.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de Alimentadores de Subestación Bahía</b> |       |                                |           | <b>239 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>   | <b>Wed 2/14/18</b> |
| 1701 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.3.2.1</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>   | <b>Wed 5/17/17</b> |
| 1702 |  | 1.1.2.1.3.2.1.313    | Designar Comisión Técnica                                                                   |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17          | Fri 3/3/17         |
| 1703 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.314    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                            | 1702  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17          | Tue 3/7/17         |
| 1704 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.315    | Resolución de Inicio de proceso                                                             | 1703  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17          | Thu 3/9/17         |
| 1705 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.316    | Convocar a Expresiones de Interés                                                           | 1704  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17         | Mon 3/20/17        |
| 1706 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.317    | Conformación de Lista Corta                                                                 | 1705  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17         | Thu 3/23/17        |
| 1707 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.318    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                        | 1706  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17         | Fri 3/24/17        |
| 1708 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.319    | Elaborar ofertas                                                                            | 1707  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17         | Tue 4/4/17         |
| 1709 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.320    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                | 1708  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17          | Thu 4/6/17         |
| 1710 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.321    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                          | 1709  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17          | Mon 4/10/17        |
| 1711 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.322    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                  | 1710  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17         | Wed 5/10/17        |
| 1712 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.323    | Contrato Suscrito                                                                           | 1711  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17         | Wed 5/10/17        |
| 1713 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.324    | Trámitar y pagar anticipo                                                                   | 1712  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17         | Wed 5/17/17        |
| 1714 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.1.325    | Pago de anticipo 20%                                                                        | 1713  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17         | Wed 5/17/17        |
| 1715 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.3.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                 |       |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Thu 12/14/17</b> | <b>Wed 2/14/18</b> |
| 1716 |                                                                                   | 1.1.2.1.3.2.2.76     | Pago Planilla 1_35%                                                                         | 1692  |                                |           | 0 days          | Thu 12/14/17        | Thu 12/14/17       |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                     | Nombre de tarea                                                                                                   | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1717 |  | 1.1.2.1.3.2.2.77        | Pago Planilla 2_35%                                                                                               | 1693        |                                |           | 0 days          | Wed 1/31/18        | Wed 1/31/18        |
| 1718 |  | 1.1.2.1.3.2.2.78        | Pago Planilla Final_10%                                                                                           | 1699        |                                |           | 0 days          | Wed 2/14/18        | Wed 2/14/18        |
| 1719 |  | <b>1.1.2.1.26</b>       | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción - repotenciación de alimentadores de distribución Cantón Portoviejo</b>       |             | <b>1</b>                       |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Fri 9/29/17</b> |
| 1720 |  | <b>1.1.2.1.26.3</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción - repotenciación de alimentadores de distribución Cantón Portoviejo</b> |             |                                |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Fri 9/29/17</b> |
| 1721 |  | <b>1.1.2.1.26.3.5</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                                 |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b> |
| 1722 |  | 1.1.2.1.26.3.5.29       | Designar Comisión Técnica                                                                                         |             |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17         |
| 1723 |  | 1.1.2.1.26.3.5.30       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                    | 1722        |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17         |
| 1724 |  | 1.1.2.1.26.3.5.31       | No objeción DDLs                                                                                                  | 1723        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17         |
| 1725 |  | 1.1.2.1.26.3.5.32       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                   | 1724        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |
| 1726 |  | 1.1.2.1.26.3.5.33       | Publicar convocatoria en UNDB, prensa nacional y/o Compras Públicas                                               | 1725        |                                |           | 3 days          | Tue 1/10/17        | Thu 1/12/17        |
| 1727 |  | 1.1.2.1.26.3.5.34       | Presentar de ofertas                                                                                              | 1726        |                                |           | 30 days         | Fri 1/13/17        | Thu 2/23/17        |
| 1728 |  | 1.1.2.1.26.3.5.35       | Acta de apertura de ofertas                                                                                       | 1727        |                                |           | 0 days          | Thu 2/23/17        | Thu 2/23/17        |
| 1729 |  | 1.1.2.1.26.3.5.36       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                      | 1728        |                                |           | 10 days         | Fri 2/24/17        | Mon 3/13/17        |
| 1730 |  | 1.1.2.1.26.3.5.37       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                         | 1729        |                                |           | 0 days          | Mon 3/13/17        | Mon 3/13/17        |
| 1731 |  | 1.1.2.1.26.3.5.38       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                | 1730        |                                |           | 2 days          | Tue 3/14/17        | Wed 3/15/17        |
| 1732 |  | 1.1.2.1.26.3.5.39       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                        | 1731        |                                |           | 20 days         | Thu 3/16/17        | Wed 4/12/17        |
| 1733 |  | 1.1.2.1.26.3.5.40       | Contrato Suscrito                                                                                                 | 1732        |                                |           | 0 days          | Wed 4/12/17        | Wed 4/12/17        |
| 1734 |  | 1.1.2.1.26.3.5.41       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                         | 1733        |                                |           | 5 days          | Thu 4/13/17        | Thu 4/20/17        |
| 1735 |  | 1.1.2.1.26.3.5.42       | Pago de anticipo 50%                                                                                              | 1734        |                                |           | 0 days          | Thu 4/20/17        | Thu 4/20/17        |
| 1736 |  | <b>1.1.2.1.26.3.6</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                          | <b>1735</b> |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Fri 4/21/17</b> | <b>Thu 9/21/17</b> |
| 1737 |  | <b>1.1.2.1.26.3.6.6</b> | <b>Construcción</b>                                                                                               |             |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Fri 4/21/17</b> | <b>Thu 9/21/17</b> |
| 1738 |  | 1.1.2.1.26.3.6.6.21     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                             | 1735        |                                |           | 30 days         | Fri 4/21/17        | Fri 6/2/17         |
| 1739 |  | 1.1.2.1.26.3.6.6.22     | Replanteo                                                                                                         | 1738        |                                |           | 10 days         | Mon 6/5/17         | Fri 6/16/17        |
| 1740 |  | 1.1.2.1.26.3.6.6.23     | Obras Civiles                                                                                                     | 1739        |                                |           | 15 days         | Mon 6/19/17        | Fri 7/7/17         |
| 1741 |  | 1.1.2.1.26.3.6.6.24     | Montaje Electromecánico                                                                                           | 1740        |                                |           | 15 days         | Mon 7/10/17        | Fri 7/28/17        |
| 1742 |  | 1.1.2.1.26.3.6.6.25     | Tendido de Conductores                                                                                            | 1740        |                                |           | 14 days         | Mon 7/10/17        | Thu 7/27/17        |
| 1743 |  | 1.1.2.1.26.3.6.6.26     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                  | 1742        |                                |           | 15 days         | Fri 7/28/17        | Fri 8/18/17        |
| 1744 |  | 1.1.2.1.26.3.6.6.27     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                      | 1743        |                                |           | 15 days         | Mon 8/21/17        | Fri 9/8/17         |
| 1745 |  | 1.1.2.1.26.3.6.6.28     | Energizar redes                                                                                                   | 1744        |                                |           | 2 days          | Mon 9/11/17        | Tue 9/12/17        |
| 1746 |  | 1.1.2.1.26.3.6.6.29     | Pruebas                                                                                                           | 1745        |                                |           | 7 days          | Wed 9/13/17        | Thu 9/21/17        |
| 1747 |  | 1.1.2.1.26.3.6.6.30     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                     | 1746        |                                |           | 0 days          | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17        |
| 1748 |  | <b>1.1.2.1.26.3.7</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                       |             |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Fri 7/28/17</b> | <b>Tue 9/19/17</b> |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                   | Nombre de tarea                                                                                                           | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1749 |  | 1.1.2.1.26.3.7.5      | Pago Planilla 1_20%                                                                                                       | 1742  |                                |           | 5 days          | Fri 7/28/17        | Thu 8/3/17         |
| 1750 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.3.7.6      | Pago Planilla 2_20%                                                                                                       | 1745  |                                |           | 5 days          | Wed 9/13/17        | Tue 9/19/17        |
| 1751 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.26.3.8</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                               |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Fri 9/22/17</b> | <b>Fri 9/29/17</b> |
| 1752 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.3.8.11     | Registro Contable                                                                                                         | 1746  |                                |           | 2 days          | Fri 9/22/17        | Mon 9/25/17        |
| 1753 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.3.8.12     | Liquidación Técnica Contable                                                                                              | 1752  |                                |           | 3 days          | Tue 9/26/17        | Thu 9/28/17        |
| 1754 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.3.8.13     | Registro de Activos                                                                                                       | 1753  |                                |           | 1 day           | Fri 9/29/17        | Fri 9/29/17        |
| 1755 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.3.8.14     | Acta de Entrega Recepción                                                                                                 | 1754  |                                |           | 0 days          | Fri 9/29/17        | Fri 9/29/17        |
| 1756 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.3.8.15     | Pago Planilla final 10%                                                                                                   | 1755  |                                |           | 0 days          | Fri 9/29/17        | Fri 9/29/17        |
| 1757 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.26.4</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción - repotenciación de alimentadores de distribución Cantón Portoviejo</b> |       |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Fri 9/29/17</b> |
| 1758 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.26.4.3</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                              |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |
| 1759 |  | 1.1.2.1.26.4.3.326    | Designar Comisión Técnica                                                                                                 |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |
| 1760 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.327    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                          | 1759  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |
| 1761 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.328    | Resolución de Inicio de proceso                                                                                           | 1760  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |
| 1762 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.329    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                         | 1761  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |
| 1763 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.330    | Conformación de Lista Corta                                                                                               | 1762  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |
| 1764 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.331    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                      | 1763  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |
| 1765 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.332    | Elaborar ofertas                                                                                                          | 1764  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |
| 1766 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.333    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                              | 1765  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17         |
| 1767 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.334    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                        | 1766  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17        |
| 1768 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.335    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                | 1767  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17        |
| 1769 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.336    | Contrato Suscrito                                                                                                         | 1768  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17        |
| 1770 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.337    | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                 | 1769  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17        |
| 1771 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.3.338    | Pago de anticipo 20%                                                                                                      | 1770  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17        |
| 1772 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.26.4.4</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                               |       |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Thu 8/3/17</b>  | <b>Fri 9/29/17</b> |
| 1773 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.4.79     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                       | 1749  |                                |           | 0 days          | Thu 8/3/17         | Thu 8/3/17         |
| 1774 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.4.80     | Pago Planilla 2_35%                                                                                                       | 1750  |                                |           | 0 days          | Tue 9/19/17        | Tue 9/19/17        |
| 1775 |                                                                                   | 1.1.2.1.26.4.4.81     | Pago Planilla Final_10%                                                                                                   | 1756  |                                |           | 0 days          | Fri 9/29/17        | Fri 9/29/17        |
| 1776 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.27</b>     | <b>CNEL EP-UN Manabí Reforzamiento del sistema eléctrico de distribución en Manta</b>                                     |       | <b>1</b>                       |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Fri 9/29/17</b> |
| 1777 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.27.5</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reforzamiento del sistema eléctrico de distribución en Manta</b>                               |       |                                |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Fri 9/29/17</b> |
| 1778 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.27.5.9</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                                        |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b> |
| 1779 |                                                                                   | 1.1.2.1.27.5.9.43     | Designar Comisión Técnica                                                                                                 |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17         |
| 1780 |                                                                                   | 1.1.2.1.27.5.9.44     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                            | 1779  |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                      | Nombre de tarea                                                           | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1781 |  | 1.1.2.1.27.5.9.45        | No objeción DDLs                                                          | 1780        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17         |
| 1782 |  | 1.1.2.1.27.5.9.46        | Resolución de Inicio de proceso                                           | 1781        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |
| 1783 |  | 1.1.2.1.27.5.9.47        | Publicar convocatoria en UNDB, prensa nacional y/o Compras Públicas       | 1782        |                                |           | 3 days          | Tue 1/10/17        | Thu 1/12/17        |
| 1784 |  | 1.1.2.1.27.5.9.48        | Presentar de ofertas                                                      | 1783        |                                |           | 30 days         | Fri 1/13/17        | Thu 2/23/17        |
| 1785 |  | 1.1.2.1.27.5.9.49        | Acta de apertura de ofertas                                               | 1784        |                                |           | 0 days          | Thu 2/23/17        | Thu 2/23/17        |
| 1786 |  | 1.1.2.1.27.5.9.50        | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 1785        |                                |           | 10 days         | Fri 2/24/17        | Mon 3/13/17        |
| 1787 |  | 1.1.2.1.27.5.9.51        | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 1786        |                                |           | 0 days          | Mon 3/13/17        | Mon 3/13/17        |
| 1788 |  | 1.1.2.1.27.5.9.52        | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 1787        |                                |           | 2 days          | Tue 3/14/17        | Wed 3/15/17        |
| 1789 |  | 1.1.2.1.27.5.9.53        | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 1788        |                                |           | 20 days         | Thu 3/16/17        | Wed 4/12/17        |
| 1790 |  | 1.1.2.1.27.5.9.54        | Contrato Suscrito                                                         | 1789        |                                |           | 0 days          | Wed 4/12/17        | Wed 4/12/17        |
| 1791 |  | 1.1.2.1.27.5.9.55        | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 1790        |                                |           | 5 days          | Thu 4/13/17        | Thu 4/20/17        |
| 1792 |  | 1.1.2.1.27.5.9.56        | Pago de anticipo 50%                                                      | 1791        |                                |           | 0 days          | Thu 4/20/17        | Thu 4/20/17        |
| 1793 |  | <b>1.1.2.1.27.5.10</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>1792</b> |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Fri 4/21/17</b> | <b>Thu 9/21/17</b> |
| 1794 |  | <b>1.1.2.1.27.5.10.7</b> | <b>Construcción</b>                                                       |             |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Fri 4/21/17</b> | <b>Thu 9/21/17</b> |
| 1795 |  | 1.1.2.1.27.5.10.7.31     | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 1792        |                                |           | 30 days         | Fri 4/21/17        | Fri 6/2/17         |
| 1796 |  | 1.1.2.1.27.5.10.7.32     | Replanteo                                                                 | 1795        |                                |           | 10 days         | Mon 6/5/17         | Fri 6/16/17        |
| 1797 |  | 1.1.2.1.27.5.10.7.33     | Obras Civiles                                                             | 1796        |                                |           | 15 days         | Mon 6/19/17        | Fri 7/7/17         |
| 1798 |  | 1.1.2.1.27.5.10.7.34     | Montaje Electromecánico                                                   | 1797        |                                |           | 15 days         | Mon 7/10/17        | Fri 7/28/17        |
| 1799 |  | 1.1.2.1.27.5.10.7.35     | Tendido de Conductores                                                    | 1797        |                                |           | 14 days         | Mon 7/10/17        | Thu 7/27/17        |
| 1800 |  | 1.1.2.1.27.5.10.7.36     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                          | 1799        |                                |           | 15 days         | Fri 7/28/17        | Fri 8/18/17        |
| 1801 |  | 1.1.2.1.27.5.10.7.37     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones              | 1800        |                                |           | 15 days         | Mon 8/21/17        | Fri 9/8/17         |
| 1802 |  | 1.1.2.1.27.5.10.7.38     | Energizar redes                                                           | 1801        |                                |           | 2 days          | Mon 9/11/17        | Tue 9/12/17        |
| 1803 |  | 1.1.2.1.27.5.10.7.39     | Pruebas                                                                   | 1802        |                                |           | 7 days          | Wed 9/13/17        | Thu 9/21/17        |
| 1804 |  | 1.1.2.1.27.5.10.7.40     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                             | 1803        |                                |           | 0 days          | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17        |
| 1805 |  | <b>1.1.2.1.27.5.11</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |             |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Fri 7/28/17</b> | <b>Tue 9/19/17</b> |
| 1806 |  | 1.1.2.1.27.5.11.7        | Pago Planilla 1_20%                                                       | 1799        |                                |           | 5 days          | Fri 7/28/17        | Thu 8/3/17         |
| 1807 |  | 1.1.2.1.27.5.11.8        | Pago Planilla 2_20%                                                       | 1802        |                                |           | 5 days          | Wed 9/13/17        | Tue 9/19/17        |
| 1808 |  | <b>1.1.2.1.27.5.12</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                               |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Fri 9/22/17</b> | <b>Fri 9/29/17</b> |
| 1809 |  | 1.1.2.1.27.5.12.16       | Registro Contable                                                         | 1803        |                                |           | 2 days          | Fri 9/22/17        | Mon 9/25/17        |
| 1810 |  | 1.1.2.1.27.5.12.17       | Liquidación Técnica Contable                                              | 1809        |                                |           | 3 days          | Tue 9/26/17        | Thu 9/28/17        |
| 1811 |  | 1.1.2.1.27.5.12.18       | Registro de Activos                                                       | 1810        |                                |           | 1 day           | Fri 9/29/17        | Fri 9/29/17        |
| 1812 |  | 1.1.2.1.27.5.12.19       | Acta de Entrega Recepción                                                 | 1811        |                                |           | 0 days          | Fri 9/29/17        | Fri 9/29/17        |
| 1813 |  | 1.1.2.1.27.5.12.20       | Pago Planilla final 10%                                                   | 1812        |                                |           | 0 days          | Fri 9/29/17        | Fri 9/29/17        |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                     | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start             | Finish              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1814 |    | <b>1.1.2.1.27.6</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reforzamiento del sistema eléctrico de distribución en Manta</b> |       |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b> | <b>Fri 9/29/17</b>  |
| 1815 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.27.6.5</b>  | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                        |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b> | <b>Wed 5/17/17</b>  |
| 1816 |    | 1.1.2.1.27.6.5.339     | Designar Comisión Técnica                                                                           |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17        | Fri 3/3/17          |
| 1817 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.340     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                    | 1816  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17        | Tue 3/7/17          |
| 1818 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.341     | Resolución de Inicio de proceso                                                                     | 1817  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17        | Thu 3/9/17          |
| 1819 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.342     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                   | 1818  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17       | Mon 3/20/17         |
| 1820 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.343     | Conformación de Lista Corta                                                                         | 1819  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17       | Thu 3/23/17         |
| 1821 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.344     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                | 1820  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17       | Fri 3/24/17         |
| 1822 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.345     | Elaborar ofertas                                                                                    | 1821  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17       | Tue 4/4/17          |
| 1823 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.346     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                        | 1822  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17        | Thu 4/6/17          |
| 1824 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.347     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                  | 1823  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17        | Mon 4/10/17         |
| 1825 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.348     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                          | 1824  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17       | Wed 5/10/17         |
| 1826 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.349     | Contrato Suscrito                                                                                   | 1825  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17       | Wed 5/10/17         |
| 1827 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.350     | Trámitar y pagar anticipo                                                                           | 1826  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17       | Wed 5/17/17         |
| 1828 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.5.351     | Pago de anticipo 20%                                                                                | 1827  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17       | Wed 5/17/17         |
| 1829 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.27.6.6</b>  | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                         |       |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Thu 8/3/17</b> | <b>Fri 9/29/17</b>  |
| 1830 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.6.82      | Pago Planilla 1_35%                                                                                 | 1806  |                                |           | 0 days          | Thu 8/3/17        | Thu 8/3/17          |
| 1831 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.6.83      | Pago Planilla 2_35%                                                                                 | 1807  |                                |           | 0 days          | Tue 9/19/17       | Tue 9/19/17         |
| 1832 |                                                                                     | 1.1.2.1.27.6.6.84      | Pago Planilla Final_10%                                                                             | 1813  |                                |           | 0 days          | Fri 9/29/17       | Fri 9/29/17         |
| 1833 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.28</b>      | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Portoviejo</b>                               |       | <b>1</b>                       |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Fri 4/6/18</b>   |
| 1834 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.28.7</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Portoviejo</b>                         |       |                                |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Fri 4/6/18</b>   |
| 1835 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.28.7.13</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                  |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 1836 |  | 1.1.2.1.28.7.13.57     | Designar Comisión Técnica                                                                           |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17        | Tue 7/4/17          |
| 1837 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.58     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                      | 1836  |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17        | Thu 7/6/17          |
| 1838 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.59     | No objeción DDLs                                                                                    | 1837  |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17        | Thu 7/6/17          |
| 1839 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.60     | Resolución de Inicio de proceso                                                                     | 1838  |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17        | Mon 7/10/17         |
| 1840 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.61     | Publicar convocatoria en UNDB, prensa nacional y/o Compras Públicas                                 | 1839  |                                |           | 3 days          | Tue 7/11/17       | Thu 7/13/17         |
| 1841 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.62     | Presentar de ofertas                                                                                | 1840  |                                |           | 30 days         | Fri 7/14/17       | Fri 8/25/17         |
| 1842 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.63     | Acta de apertura de ofertas                                                                         | 1841  |                                |           | 0 days          | Fri 8/25/17       | Fri 8/25/17         |
| 1843 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.64     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                        | 1842  |                                |           | 10 days         | Mon 8/28/17       | Fri 9/8/17          |
| 1844 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.65     | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                           | 1843  |                                |           | 0 days          | Fri 9/8/17        | Fri 9/8/17          |
| 1845 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.66     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                  | 1844  |                                |           | 2 days          | Mon 9/11/17       | Tue 9/12/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                      | Nombre de tarea                                                                     | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1846 |    | 1.1.2.1.28.7.13.67       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                          | 1845        |                                |           | 20 days         | Wed 9/13/17         | Wed 10/11/17        |
| 1847 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.68       | Contrato Suscrito                                                                   | 1846        |                                |           | 0 days          | Wed 10/11/17        | Wed 10/11/17        |
| 1848 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.69       | Trámitar y pagar anticipo                                                           | 1847        |                                |           | 5 days          | Thu 10/12/17        | Wed 10/18/17        |
| 1849 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.13.70       | Pago de anticipo 50%                                                                | 1848        |                                |           | 0 days          | Wed 10/18/17        | Wed 10/18/17        |
| 1850 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.28.7.14</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                            | <b>1849</b> |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Thu 10/19/17</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 1851 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.28.7.14.8</b> | <b>Construcción</b>                                                                 |             |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Thu 10/19/17</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 1852 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.14.8.41     | Compra y acopio de materiales en Obra                                               | 1849        |                                |           | 30 days         | Thu 10/19/17        | Fri 12/1/17         |
| 1853 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.14.8.42     | Replanteo                                                                           | 1852        |                                |           | 10 days         | Mon 12/4/17         | Mon 12/18/17        |
| 1854 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.14.8.43     | Obras Civiles                                                                       | 1853        |                                |           | 15 days         | Tue 12/19/17        | Wed 1/10/18         |
| 1855 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.14.8.44     | Montaje Electromecánico                                                             | 1854        |                                |           | 15 days         | Thu 1/11/18         | Wed 1/31/18         |
| 1856 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.14.8.45     | Tendido de Conductores                                                              | 1854        |                                |           | 14 days         | Thu 1/11/18         | Tue 1/30/18         |
| 1857 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.14.8.46     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                    | 1856        |                                |           | 15 days         | Wed 1/31/18         | Thu 2/22/18         |
| 1858 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.14.8.47     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                        | 1857        |                                |           | 15 days         | Fri 2/23/18         | Thu 3/15/18         |
| 1859 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.14.8.48     | Energizar redes                                                                     | 1858        |                                |           | 2 days          | Fri 3/16/18         | Mon 3/19/18         |
| 1860 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.14.8.49     | Pruebas                                                                             | 1859        |                                |           | 7 days          | Tue 3/20/18         | Wed 3/28/18         |
| 1861 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.14.8.50     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                       | 1860        |                                |           | 0 days          | Wed 3/28/18         | Wed 3/28/18         |
| 1862 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.28.7.15</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                         |             |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Wed 1/31/18</b>  | <b>Mon 3/26/18</b>  |
| 1863 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.15.9        | Pago Planilla 1_20%                                                                 | 1856        |                                |           | 5 days          | Wed 1/31/18         | Tue 2/6/18          |
| 1864 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.15.10       | Pago Planilla 2_20%                                                                 | 1859        |                                |           | 5 days          | Tue 3/20/18         | Mon 3/26/18         |
| 1865 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.28.7.16</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                         |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 3/29/18</b>  | <b>Fri 4/6/18</b>   |
| 1866 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.16.21       | Registro Contable                                                                   | 1860        |                                |           | 2 days          | Thu 3/29/18         | Mon 4/2/18          |
| 1867 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.16.22       | Liquidación Técnica Contable                                                        | 1866        |                                |           | 3 days          | Tue 4/3/18          | Thu 4/5/18          |
| 1868 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.16.23       | Registro de Activos                                                                 | 1867        |                                |           | 1 day           | Fri 4/6/18          | Fri 4/6/18          |
| 1869 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.16.24       | Acta de Entrega Recepción                                                           | 1868        |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18          | Fri 4/6/18          |
| 1870 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.7.16.25       | Pago Planilla final 10%                                                             | 1869        |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18          | Fri 4/6/18          |
| 1871 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.28.8</b>      | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Portoviejo</b> |             |                                |           | <b>146 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Fri 4/6/18</b>   |
| 1872 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.28.8.7</b>    | <b>Etapas Precontractual</b>                                                        |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 1873 |  | 1.1.2.1.28.8.7.352       | Designar Comisión Técnica                                                           |             |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |
| 1874 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.8.7.353       | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                    | 1873        |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |
| 1875 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.8.7.354       | Resolución de Inicio de proceso                                                     | 1874        |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17          | Mon 9/11/17         |
| 1876 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.8.7.355       | Convocar a Expresiones de Interés                                                   | 1875        |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17         | Wed 9/20/17         |
| 1877 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.8.7.356       | Conformación de Lista Corta                                                         | 1876        |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17         | Mon 9/25/17         |
| 1878 |                                                                                     | 1.1.2.1.28.8.7.357       | Invitación a empresas de Lista Corta                                                | 1877        |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17         | Tue 9/26/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                      | Nombre de tarea                                                           | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| 1879 |  | 1.1.2.1.28.8.7.358       | Elaborar ofertas                                                          | 1878        |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17         | Thu 10/5/17         |  |
| 1880 |                                                                                   | 1.1.2.1.28.8.7.359       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 1879        |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17         | Tue 10/10/17        |  |
| 1881 |                                                                                   | 1.1.2.1.28.8.7.360       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 1880        |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17        | Thu 10/12/17        |  |
| 1882 |                                                                                   | 1.1.2.1.28.8.7.361       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 1881        |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17        | Mon 11/13/17        |  |
| 1883 |                                                                                   | 1.1.2.1.28.8.7.362       | Contrato Suscrito                                                         | 1882        |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17        | Mon 11/13/17        |  |
| 1884 |                                                                                   | 1.1.2.1.28.8.7.363       | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 1883        |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17        | Mon 11/20/17        |  |
| 1885 |                                                                                   | 1.1.2.1.28.8.7.364       | Pago de anticipo 20%                                                      | 1884        |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17        | Mon 11/20/17        |  |
| 1886 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.28.8.8</b>    | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |             |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Tue 2/6/18</b>   | <b>Fri 4/6/18</b>   |  |
| 1887 |                                                                                   | 1.1.2.1.28.8.8.85        | Pago Planilla 1_35%                                                       | 1863        |                                |           | 0 days          | Tue 2/6/18          | Tue 2/6/18          |  |
| 1888 |                                                                                   | 1.1.2.1.28.8.8.86        | Pago Planilla 2_35%                                                       | 1864        |                                |           | 0 days          | Mon 3/26/18         | Mon 3/26/18         |  |
| 1889 |                                                                                   | 1.1.2.1.28.8.8.87        | Pago Planilla Final_10%                                                   | 1870        |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18          | Fri 4/6/18          |  |
| 1890 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.29</b>        | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Manta</b>          |             | <b>1</b>                       |           | <b>275 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>   | <b>Fri 4/6/18</b>   |  |
| 1891 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.29.9</b>      | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Manta</b>    |             |                                |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Fri 4/6/18</b>   |  |
| 1892 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.29.9.17</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                         |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |  |
| 1893 |  | 1.1.2.1.29.9.17.71       | Designar Comisión Técnica                                                 |             |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |  |
| 1894 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.72       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                            | 1893        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |  |
| 1895 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.73       | No objeción DDLs                                                          | 1894        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |  |
| 1896 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.74       | Resolución de Inicio de proceso                                           | 1895        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |  |
| 1897 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.75       | Publicar convocatoria en UNDB, prensa nacional y/o Compras Públicas       | 1896        |                                |           | 3 days          | Tue 7/11/17         | Thu 7/13/17         |  |
| 1898 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.76       | Presentar de ofertas                                                      | 1897        |                                |           | 30 days         | Fri 7/14/17         | Fri 8/25/17         |  |
| 1899 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.77       | Acta de apertura de ofertas                                               | 1898        |                                |           | 0 days          | Fri 8/25/17         | Fri 8/25/17         |  |
| 1900 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.78       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 1899        |                                |           | 10 days         | Mon 8/28/17         | Fri 9/8/17          |  |
| 1901 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.79       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 1900        |                                |           | 0 days          | Fri 9/8/17          | Fri 9/8/17          |  |
| 1902 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.80       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 1901        |                                |           | 2 days          | Mon 9/11/17         | Tue 9/12/17         |  |
| 1903 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.81       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 1902        |                                |           | 20 days         | Wed 9/13/17         | Wed 10/11/17        |  |
| 1904 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.82       | Contrato Suscrito                                                         | 1903        |                                |           | 0 days          | Wed 10/11/17        | Wed 10/11/17        |  |
| 1905 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.83       | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 1904        |                                |           | 5 days          | Thu 10/12/17        | Wed 10/18/17        |  |
| 1906 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.17.84       | Pago de anticipo 50%                                                      | 1905        |                                |           | 0 days          | Wed 10/18/17        | Wed 10/18/17        |  |
| 1907 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.29.9.18</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>1906</b> |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Thu 10/19/17</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |  |
| 1908 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.29.9.18.9</b> | <b>Construcción</b>                                                       |             |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Thu 10/19/17</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |  |
| 1909 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.18.9.51     | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 1906        |                                |           | 30 days         | Thu 10/19/17        | Fri 12/1/17         |  |
| 1910 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.18.9.52     | Replanteo                                                                 | 1909        |                                |           | 10 days         | Mon 12/4/17         | Mon 12/18/17        |  |
| 1911 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.18.9.53     | Obras Civiles                                                             | 1910        |                                |           | 15 days         | Tue 12/19/17        | Wed 1/10/18         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                     | Nombre de tarea                                                                | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1912 |  | 1.1.2.1.29.9.18.9.54    | Montaje Electromecánico                                                        | 1911  |                                |           | 15 days         | Thu 1/11/18        | Wed 1/31/18        |
| 1913 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.18.9.55    | Tendido de Conductores                                                         | 1911  |                                |           | 14 days         | Thu 1/11/18        | Tue 1/30/18        |
| 1914 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.18.9.56    | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                               | 1913  |                                |           | 15 days         | Wed 1/31/18        | Thu 2/22/18        |
| 1915 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.18.9.57    | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                   | 1914  |                                |           | 15 days         | Fri 2/23/18        | Thu 3/15/18        |
| 1916 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.18.9.58    | Energizar redes                                                                | 1915  |                                |           | 2 days          | Fri 3/16/18        | Mon 3/19/18        |
| 1917 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.18.9.59    | Pruebas                                                                        | 1916  |                                |           | 7 days          | Tue 3/20/18        | Wed 3/28/18        |
| 1918 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.18.9.60    | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                  | 1917  |                                |           | 0 days          | Wed 3/28/18        | Wed 3/28/18        |
| 1919 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.29.9.19</b>  | <b>Ejecución Financiera</b>                                                    |       |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Wed 1/31/18</b> | <b>Mon 3/26/18</b> |
| 1920 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.19.11      | Pago Planilla 1_20%                                                            | 1913  |                                |           | 5 days          | Wed 1/31/18        | Tue 2/6/18         |
| 1921 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.19.12      | Pago Planilla 2_20%                                                            | 1916  |                                |           | 5 days          | Tue 3/20/18        | Mon 3/26/18        |
| 1922 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.29.9.20</b>  | <b>Liquidación de Obras</b>                                                    |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 3/29/18</b> | <b>Fri 4/6/18</b>  |
| 1923 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.20.26      | Registro Contable                                                              | 1917  |                                |           | 2 days          | Thu 3/29/18        | Mon 4/2/18         |
| 1924 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.20.27      | Liquidación Técnica Contable                                                   | 1923  |                                |           | 3 days          | Tue 4/3/18         | Thu 4/5/18         |
| 1925 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.20.28      | Registro de Activos                                                            | 1924  |                                |           | 1 day           | Fri 4/6/18         | Fri 4/6/18         |
| 1926 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.20.29      | Acta de Entrega Recepción                                                      | 1925  |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18         | Fri 4/6/18         |
| 1927 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.9.20.30      | Pago Planilla final 10%                                                        | 1926  |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18         | Fri 4/6/18         |
| 1928 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.29.10</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Manta</b> |       |                                |           | <b>275 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Fri 4/6/18</b>  |
| 1929 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.29.10.9</b>  | <b>Etapas Precontractual</b>                                                   |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |
| 1930 |  | 1.1.2.1.29.10.9.365     | Designar Comisión Técnica                                                      |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17         |
| 1931 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.366     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                               | 1930  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17         |
| 1932 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.367     | Resolución de Inicio de proceso                                                | 1931  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17        |
| 1933 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.368     | Convocar a Expresiones de Interés                                              | 1932  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17        |
| 1934 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.369     | Conformación de Lista Corta                                                    | 1933  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17        |
| 1935 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.370     | Invitación a empresas de Lista Corta                                           | 1934  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17        |
| 1936 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.371     | Elaborar ofertas                                                               | 1935  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17        |
| 1937 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.372     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                   | 1936  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17       |
| 1938 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.373     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                             | 1937  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17       |
| 1939 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.374     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                     | 1938  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17       |
| 1940 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.375     | Contrato Suscrito                                                              | 1939  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17       |
| 1941 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.376     | Trámitar y pagar anticipo                                                      | 1940  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17       |
| 1942 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.9.377     | Pago de anticipo 20%                                                           | 1941  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17       |
| 1943 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.29.10.10</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                    |       |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Tue 2/6/18</b>  | <b>Fri 4/6/18</b>  |
| 1944 |                                                                                   | 1.1.2.1.29.10.10.88     | Pago Planilla 1_35%                                                            | 1920  |                                |           | 0 days          | Tue 2/6/18         | Tue 2/6/18         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                        | Nombre de tarea                                                           | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1945 |  | 1.1.2.1.29.10.10.89        | Pago Planilla 2_35%                                                       | 1921        |                                |           | 0 days          | Mon 3/26/18         | Mon 3/26/18         |
| 1946 |  | 1.1.2.1.29.10.10.90        | Pago Planilla Final_10%                                                   | 1927        |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18          | Fri 4/6/18          |
| 1947 |  | <b>1.1.2.1.30</b>          | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Canoa</b>          |             | <b>1</b>                       |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Fri 4/6/18</b>   |
| 1948 |  | <b>1.1.2.1.30.11</b>       | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Canoa</b>    |             |                                |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Fri 4/6/18</b>   |
| 1949 |  | <b>1.1.2.1.30.11.21</b>    | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                         |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 1950 |  | 1.1.2.1.30.11.21.85        | Designar Comisión Técnica                                                 |             |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 1951 |  | 1.1.2.1.30.11.21.86        | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                            | 1950        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 1952 |  | 1.1.2.1.30.11.21.87        | No objeción DDLs                                                          | 1951        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 1953 |  | 1.1.2.1.30.11.21.88        | Resolución de Inicio de proceso                                           | 1952        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 1954 |  | 1.1.2.1.30.11.21.89        | Publicar convocatoria en UNDB, prensa nacional y/o Compras Públicas       | 1953        |                                |           | 3 days          | Tue 7/11/17         | Thu 7/13/17         |
| 1955 |  | 1.1.2.1.30.11.21.90        | Presentar de ofertas                                                      | 1954        |                                |           | 30 days         | Fri 7/14/17         | Fri 8/25/17         |
| 1956 |  | 1.1.2.1.30.11.21.91        | Acta de apertura de ofertas                                               | 1955        |                                |           | 0 days          | Fri 8/25/17         | Fri 8/25/17         |
| 1957 |  | 1.1.2.1.30.11.21.92        | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 1956        |                                |           | 10 days         | Mon 8/28/17         | Fri 9/8/17          |
| 1958 |  | 1.1.2.1.30.11.21.93        | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 1957        |                                |           | 0 days          | Fri 9/8/17          | Fri 9/8/17          |
| 1959 |  | 1.1.2.1.30.11.21.94        | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 1958        |                                |           | 2 days          | Mon 9/11/17         | Tue 9/12/17         |
| 1960 |  | 1.1.2.1.30.11.21.95        | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 1959        |                                |           | 20 days         | Wed 9/13/17         | Wed 10/11/17        |
| 1961 |  | 1.1.2.1.30.11.21.96        | Contrato Suscrito                                                         | 1960        |                                |           | 0 days          | Wed 10/11/17        | Wed 10/11/17        |
| 1962 |  | 1.1.2.1.30.11.21.97        | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 1961        |                                |           | 5 days          | Thu 10/12/17        | Wed 10/18/17        |
| 1963 |  | 1.1.2.1.30.11.21.98        | Pago de anticipo 50%                                                      | 1962        |                                |           | 0 days          | Wed 10/18/17        | Wed 10/18/17        |
| 1964 |  | <b>1.1.2.1.30.11.22</b>    | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>1963</b> |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Thu 10/19/17</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 1965 |  | <b>1.1.2.1.30.11.22.10</b> | <b>Construcción</b>                                                       |             |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Thu 10/19/17</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |
| 1966 |  | 1.1.2.1.30.11.22.10.       | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 1963        |                                |           | 30 days         | Thu 10/19/17        | Fri 12/1/17         |
| 1967 |  | 1.1.2.1.30.11.22.10.       | Replanteo                                                                 | 1966        |                                |           | 10 days         | Mon 12/4/17         | Mon 12/18/17        |
| 1968 |  | 1.1.2.1.30.11.22.10.       | Obras Civiles                                                             | 1967        |                                |           | 15 days         | Tue 12/19/17        | Wed 1/10/18         |
| 1969 |  | 1.1.2.1.30.11.22.10.       | Montaje Electromecánico                                                   | 1968        |                                |           | 15 days         | Thu 1/11/18         | Wed 1/31/18         |
| 1970 |  | 1.1.2.1.30.11.22.10.       | Tendido de Conductores                                                    | 1968        |                                |           | 14 days         | Thu 1/11/18         | Tue 1/30/18         |
| 1971 |  | 1.1.2.1.30.11.22.10.       | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                          | 1970        |                                |           | 15 days         | Wed 1/31/18         | Thu 2/22/18         |
| 1972 |  | 1.1.2.1.30.11.22.10.       | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones              | 1971        |                                |           | 15 days         | Fri 2/23/18         | Thu 3/15/18         |
| 1973 |  | 1.1.2.1.30.11.22.10.       | Energizar redes                                                           | 1972        |                                |           | 2 days          | Fri 3/16/18         | Mon 3/19/18         |
| 1974 |  | 1.1.2.1.30.11.22.10.       | Pruebas                                                                   | 1973        |                                |           | 7 days          | Tue 3/20/18         | Wed 3/28/18         |
| 1975 |  | 1.1.2.1.30.11.22.10.       | Acta de terminación física-tecnica de la obra                             | 1974        |                                |           | 0 days          | Wed 3/28/18         | Wed 3/28/18         |
| 1976 |  | <b>1.1.2.1.30.11.23</b>    | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |             |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Wed 1/31/18</b>  | <b>Mon 3/26/18</b>  |
| 1977 |  | 1.1.2.1.30.11.23.13        | Pago Planilla 1_20%                                                       | 1970        |                                |           | 5 days          | Wed 1/31/18         | Tue 2/6/18          |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                     | Nombre de tarea                                                                | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| 1978 |    | 1.1.2.1.30.11.23.14     | Pago Planilla 2_20%                                                            | 1973  |                                |           | 5 days          | Tue 3/20/18        | Mon 3/26/18         |  |
| 1979 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.30.11.24</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                    |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 3/29/18</b> | <b>Fri 4/6/18</b>   |  |
| 1980 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.11.24.31     | Registro Contable                                                              | 1974  |                                |           | 2 days          | Thu 3/29/18        | Mon 4/2/18          |  |
| 1981 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.11.24.32     | Liquidación Técnica Contable                                                   | 1980  |                                |           | 3 days          | Tue 4/3/18         | Thu 4/5/18          |  |
| 1982 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.11.24.33     | Registro de Activos                                                            | 1981  |                                |           | 1 day           | Fri 4/6/18         | Fri 4/6/18          |  |
| 1983 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.11.24.34     | Acta de Entrega Recepción                                                      | 1982  |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18         | Fri 4/6/18          |  |
| 1984 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.11.24.35     | Pago Planilla final 10%                                                        | 1983  |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18         | Fri 4/6/18          |  |
| 1985 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.30.12</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Canoa</b> |       |                                |           | <b>146 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Fri 4/6/18</b>   |  |
| 1986 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.30.12.11</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                   |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 1987 |    | 1.1.2.1.30.12.11.37     | Designar Comisión Técnica                                                      |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |  |
| 1988 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.37     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                               | 1987  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |  |
| 1989 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.38     | Resolución de Inicio de proceso                                                | 1988  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |  |
| 1990 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.38     | Convocar a Expresiones de Interés                                              | 1989  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |  |
| 1991 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.38     | Conformación de Lista Corta                                                    | 1990  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |  |
| 1992 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.38     | Invitación a empresas de Lista Corta                                           | 1991  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |  |
| 1993 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.38     | Elaborar ofertas                                                               | 1992  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |  |
| 1994 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.38     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                   | 1993  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |  |
| 1995 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.38     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                             | 1994  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |  |
| 1996 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.38     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                     | 1995  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 1997 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.38     | Contrato Suscrito                                                              | 1996  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 1998 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.38     | Trámitar y pagar anticipo                                                      | 1997  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 1999 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.11.39     | Pago de anticipo 20%                                                           | 1998  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 2000 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.30.12.12</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                    |       |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Tue 2/6/18</b>  | <b>Fri 4/6/18</b>   |  |
| 2001 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.12.91     | Pago Planilla 1_35%                                                            | 1977  |                                |           | 0 days          | Tue 2/6/18         | Tue 2/6/18          |  |
| 2002 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.12.92     | Pago Planilla 2_35%                                                            | 1978  |                                |           | 0 days          | Mon 3/26/18        | Mon 3/26/18         |  |
| 2003 |                                                                                     | 1.1.2.1.30.12.12.93     | Pago Planilla Final_10%                                                        | 1984  |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18         | Fri 4/6/18          |  |
| 2004 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.31</b>       | <b>CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Chone</b>               |       | <b>1</b>                       |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Fri 4/6/18</b>   |  |
| 2005 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.31.13</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Chone</b>         |       |                                |           | <b>190 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Fri 4/6/18</b>   |  |
| 2006 |                                                                                     | <b>1.1.2.1.31.13.25</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                             |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 11/13/17</b> |  |
| 2007 |  | 1.1.2.1.31.13.25.99     | Designar Comisión Técnica                                                      |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17         | Tue 7/4/17          |  |
| 2008 |                                                                                     | 1.1.2.1.31.13.25.10     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                 | 2007  |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17         | Thu 7/6/17          |  |
| 2009 |                                                                                     | 1.1.2.1.31.13.25.10     | No objeción DDLs                                                               | 2008  |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17         | Thu 7/6/17          |  |
| 2010 |                                                                                     | 1.1.2.1.31.13.25.10     | Resolución de Inicio de proceso                                                | 2009  |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17         | Mon 7/10/17         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                        | Nombre de tarea                                                                | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| 2011 |  | 1.1.2.1.31.13.25.10        | Publicar convocatoria en UNDB, prensa nacional y/o Compras Públicas            | 2010        |                                |           | 3 days          | Tue 7/11/17         | Thu 7/13/17         |  |
| 2012 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.25.10        | Presentar de ofertas                                                           | 2011        |                                |           | 30 days         | Fri 7/14/17         | Fri 8/25/17         |  |
| 2013 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.25.10        | Acta de apertura de ofertas                                                    | 2012        |                                |           | 0 days          | Fri 8/25/17         | Fri 8/25/17         |  |
| 2014 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.25.10        | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                   | 2013        |                                |           | 10 days         | Mon 8/28/17         | Fri 9/8/17          |  |
| 2015 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.25.10        | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación      | 2014        |                                |           | 0 days          | Fri 9/8/17          | Fri 9/8/17          |  |
| 2016 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.25.10        | Publicar resultados y notificación de adjudicación                             | 2015        |                                |           | 2 days          | Mon 9/11/17         | Tue 9/12/17         |  |
| 2017 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.25.10        | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                     | 2016        |                                |           | 20 days         | Wed 9/13/17         | Wed 10/11/17        |  |
| 2018 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.25.11        | Contrato Suscrito                                                              | 2017        |                                |           | 0 days          | Wed 10/11/17        | Wed 10/11/17        |  |
| 2019 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.25.11        | Trámitar y pagar anticipo                                                      | 2018        |                                |           | 5 days          | Thu 10/12/17        | Wed 10/18/17        |  |
| 2020 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.25.11        | Pago de anticipo 50%                                                           | 2019        |                                |           | 0 days          | Wed 10/18/17        | Wed 10/18/17        |  |
| 2021 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.31.13.26</b>    | <b>Ejecución de Obra</b>                                                       | <b>2020</b> |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Thu 10/19/17</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |  |
| 2022 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.31.13.26.11</b> | <b>Construcción</b>                                                            |             |                                |           | <b>108 days</b> | <b>Thu 10/19/17</b> | <b>Wed 3/28/18</b>  |  |
| 2023 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.26.11        | Compra y acopio de materiales en Obra                                          | 2020        |                                |           | 30 days         | Thu 10/19/17        | Fri 12/1/17         |  |
| 2024 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.26.11        | Replanteo                                                                      | 2023        |                                |           | 10 days         | Mon 12/4/17         | Mon 12/18/17        |  |
| 2025 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.26.11        | Obras Civiles                                                                  | 2024        |                                |           | 15 days         | Tue 12/19/17        | Wed 1/10/18         |  |
| 2026 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.26.11        | Montaje Electromecánico                                                        | 2025        |                                |           | 15 days         | Thu 1/11/18         | Wed 1/31/18         |  |
| 2027 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.26.11        | Tendido de Conductores                                                         | 2025        |                                |           | 14 days         | Thu 1/11/18         | Tue 1/30/18         |  |
| 2028 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.26.11        | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                               | 2027        |                                |           | 15 days         | Wed 1/31/18         | Thu 2/22/18         |  |
| 2029 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.26.11        | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                   | 2028        |                                |           | 15 days         | Fri 2/23/18         | Thu 3/15/18         |  |
| 2030 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.26.11        | Energizar redes                                                                | 2029        |                                |           | 2 days          | Fri 3/16/18         | Mon 3/19/18         |  |
| 2031 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.26.11        | Pruebas                                                                        | 2030        |                                |           | 7 days          | Tue 3/20/18         | Wed 3/28/18         |  |
| 2032 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.26.11        | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                  | 2031        |                                |           | 0 days          | Wed 3/28/18         | Wed 3/28/18         |  |
| 2033 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.31.13.27</b>    | <b>Ejecución Financiera</b>                                                    |             |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Wed 1/31/18</b>  | <b>Mon 3/26/18</b>  |  |
| 2034 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.27.15        | Pago Planilla 1_20%                                                            | 2027        |                                |           | 5 days          | Wed 1/31/18         | Tue 2/6/18          |  |
| 2035 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.27.16        | Pago Planilla 2_20%                                                            | 2030        |                                |           | 5 days          | Tue 3/20/18         | Mon 3/26/18         |  |
| 2036 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.31.13.28</b>    | <b>Liquidación de Obras</b>                                                    |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 3/29/18</b>  | <b>Fri 4/6/18</b>   |  |
| 2037 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.28.36        | Registro Contable                                                              | 2031        |                                |           | 2 days          | Thu 3/29/18         | Mon 4/2/18          |  |
| 2038 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.28.37        | Liquidación Técnica Contable                                                   | 2037        |                                |           | 3 days          | Tue 4/3/18          | Thu 4/5/18          |  |
| 2039 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.28.38        | Registro de Activos                                                            | 2038        |                                |           | 1 day           | Fri 4/6/18          | Fri 4/6/18          |  |
| 2040 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.28.39        | Acta de Entrega Recepción                                                      | 2039        |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18          | Fri 4/6/18          |  |
| 2041 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.13.28.40        | Pago Planilla final 10%                                                        | 2040        |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18          | Fri 4/6/18          |  |
| 2042 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.31.14</b>       | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Manabí Reconstrucción de redes aéreas en Chone</b> |             |                                |           | <b>146 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Fri 4/6/18</b>   |  |
| 2043 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.31.14.13</b>    | <b>Etapas Precontractual</b>                                                   |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                     | Nombre de tarea                                                                                                  | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start             | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 2044 |  | 1.1.2.1.31.14.13.39     | Designar Comisión Técnica                                                                                        |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17        | Tue 9/5/17          |
| 2045 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.39     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                 | 2044  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17        | Thu 9/7/17          |
| 2046 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.39     | Resolución de Inicio de proceso                                                                                  | 2045  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17        | Mon 9/11/17         |
| 2047 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.39     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                | 2046  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17       | Wed 9/20/17         |
| 2048 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.39     | Conformación de Lista Corta                                                                                      | 2047  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17       | Mon 9/25/17         |
| 2049 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.39     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                             | 2048  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17       | Tue 9/26/17         |
| 2050 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.39     | Elaborar ofertas                                                                                                 | 2049  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17       | Thu 10/5/17         |
| 2051 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.39     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                     | 2050  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17       | Tue 10/10/17        |
| 2052 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.39     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                               | 2051  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17      | Thu 10/12/17        |
| 2053 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.40     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                       | 2052  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17      | Mon 11/13/17        |
| 2054 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.40     | Contrato Suscrito                                                                                                | 2053  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17      | Mon 11/13/17        |
| 2055 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.40     | Trámitar y pagar anticipo                                                                                        | 2054  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17      | Mon 11/20/17        |
| 2056 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.13.40     | Pago de anticipo 20%                                                                                             | 2055  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17      | Mon 11/20/17        |
| 2057 |                                                                                   | <b>1.1.2.1.31.14.14</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                      |       |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Tue 2/6/18</b> | <b>Fri 4/6/18</b>   |
| 2058 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.14.94     | Pago Planilla 1_35%                                                                                              | 2034  |                                |           | 0 days          | Tue 2/6/18        | Tue 2/6/18          |
| 2059 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.14.95     | Pago Planilla 2_35%                                                                                              | 2035  |                                |           | 0 days          | Mon 3/26/18       | Mon 3/26/18         |
| 2060 |                                                                                   | 1.1.2.1.31.14.14.96     | Pago Planilla Final_10%                                                                                          | 2041  |                                |           | 0 days          | Fri 4/6/18        | Fri 4/6/18          |
| 2061 |                                                                                   | <b>1.1.2.2</b>          | <b>CNEL EP- UN Santo Domingo 11 Proyectos de Distribución fiscalizados y energizados</b>                         |       | <b>11</b>                      |           | <b>315 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2062 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.1</b>        | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción de Alimentador Pedernales<br/>Centro-Subestación Pedernales</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>229 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Tue 11/28/17</b> |
| 2063 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.1.1</b>      | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción de Alimentador Pedernales<br/>Centro-Subestación Pedernales</b> |       |                                |           | <b>229 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Tue 11/28/17</b> |
| 2064 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.1.1.1</b>    | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                                |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 2065 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.1.1.15        | Designar Comisión Técnica                                                                                        |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17        | Tue 1/3/17          |
| 2066 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.1.1.16        | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                   | 2065  |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17        | Thu 1/5/17          |
| 2067 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.1.1.17        | No objeción DDLs                                                                                                 | 2066  |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17        | Thu 1/5/17          |
| 2068 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.1.1.18        | Resolución de Inicio de proceso                                                                                  | 2067  |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17        | Mon 1/9/17          |
| 2069 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.1.1.19        | Publicar convocatoria prensa nacional y/o Compras Públicas                                                       | 2068  |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17       | Tue 1/10/17         |
| 2070 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.1.1.20        | Presentar de ofertas                                                                                             | 2069  |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17       | Tue 2/21/17         |
| 2071 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.1.1.21        | Acta de apertura de ofertas                                                                                      | 2070  |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17       | Tue 2/21/17         |
| 2072 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.1.1.22        | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                     | 2071  |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17       | Thu 3/9/17          |
| 2073 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.1.1.23        | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                        | 2072  |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17        | Thu 3/9/17          |
| 2074 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.1.1.24        | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                               | 2073  |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17       | Mon 3/13/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                      | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| 2075 |    | 1.1.2.2.1.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                           | 2074        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17         | Mon 4/10/17         |  |
| 2076 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                                    | 2075        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17         | Mon 4/10/17         |  |
| 2077 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                            | 2076        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17         | Tue 4/18/17         |  |
| 2078 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                                                 | 2077        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17         | Tue 4/18/17         |  |
| 2079 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.1.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                             | <b>2078</b> |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 2080 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.1.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                  |             |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 2081 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                | 2078        |                                |           | 40 days         | Wed 4/19/17         | Wed 6/14/17         |  |
| 2082 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                                            | 2081        |                                |           | 20 days         | Thu 6/15/17         | Wed 7/12/17         |  |
| 2083 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.2.2.13     | Obras Civiles                                                                                                        | 2082        |                                |           | 30 days         | Thu 7/13/17         | Thu 8/24/17         |  |
| 2084 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.2.2.14     | Montaje Electromecánico                                                                                              | 2083        |                                |           | 30 days         | Fri 8/25/17         | Thu 10/5/17         |  |
| 2085 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.2.2.15     | Tendido de Conductores                                                                                               | 2083        |                                |           | 20 days         | Fri 8/25/17         | Thu 9/21/17         |  |
| 2086 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.2.2.16     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                     | 2085        |                                |           | 20 days         | Fri 9/22/17         | Fri 10/20/17        |  |
| 2087 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.2.2.17     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                         | 2086        |                                |           | 10 days         | Mon 10/23/17        | Tue 11/7/17         |  |
| 2088 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.2.2.18     | Energizar redes                                                                                                      | 2087        |                                |           | 2 days          | Wed 11/8/17         | Thu 11/9/17         |  |
| 2089 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.2.2.19     | Pruebas                                                                                                              | 2088        |                                |           | 7 days          | Fri 11/10/17        | Mon 11/20/17        |  |
| 2090 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.2.2.20     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                        | 2089        |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17        | Mon 11/20/17        |  |
| 2091 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.1.1.3</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                          |             |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Fri 9/22/17</b>  | <b>Thu 11/16/17</b> |  |
| 2092 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.3.3        | Pago Planilla 1_20%                                                                                                  | 2085        |                                |           | 5 days          | Fri 9/22/17         | Thu 9/28/17         |  |
| 2093 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.3.4        | Pago Planilla 2_20%                                                                                                  | 2088        |                                |           | 5 days          | Fri 11/10/17        | Thu 11/16/17        |  |
| 2094 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.1.1.4</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                          |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Tue 11/21/17</b> | <b>Tue 11/28/17</b> |  |
| 2095 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.4.6        | Registro Contable                                                                                                    | 2089        |                                |           | 2 days          | Tue 11/21/17        | Wed 11/22/17        |  |
| 2096 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.4.7        | Liquidación Técnica Contable                                                                                         | 2095        |                                |           | 3 days          | Thu 11/23/17        | Mon 11/27/17        |  |
| 2097 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.4.8        | Registro de Activos                                                                                                  | 2096        |                                |           | 1 day           | Tue 11/28/17        | Tue 11/28/17        |  |
| 2098 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.4.9        | Acta de Entrega Recepción                                                                                            | 2097        |                                |           | 0 days          | Tue 11/28/17        | Tue 11/28/17        |  |
| 2099 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.1.4.10       | Pago Planilla final 10%                                                                                              | 2098        |                                |           | 0 days          | Tue 11/28/17        | Tue 11/28/17        |  |
| 2100 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.1.2</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción de Alimentador Pedernales Centro-Subestación Pedernales</b> |             |                                |           | <b>188 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>   | <b>Tue 11/28/17</b> |  |
| 2101 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.1.2.1</b>   | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                         |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>   | <b>Wed 5/17/17</b>  |  |
| 2102 |  | 1.1.2.2.1.2.1.326      | Designar Comisión Técnica                                                                                            |             |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17          | Fri 3/3/17          |  |
| 2103 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.2.1.327      | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                     | 2102        |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17          | Tue 3/7/17          |  |
| 2104 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.2.1.328      | Resolución de Inicio de proceso                                                                                      | 2103        |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17          | Thu 3/9/17          |  |
| 2105 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.2.1.329      | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                    | 2104        |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17         | Mon 3/20/17         |  |
| 2106 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.2.1.330      | Conformación de Lista Corta                                                                                          | 2105        |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17         | Thu 3/23/17         |  |
| 2107 |                                                                                     | 1.1.2.2.1.2.1.331      | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                 | 2106        |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17         | Fri 3/24/17         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                   | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2108 |  | 1.1.2.2.1.2.1.332      | Elaborar ofertas                                                                                  | 2107        |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17          |
| 2109 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.2.1.333      | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                      | 2108        |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17          |
| 2110 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.2.1.334      | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                | 2109        |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17         |
| 2111 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.2.1.335      | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                        | 2110        |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17         |
| 2112 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.2.1.336      | Contrato Suscrito                                                                                 | 2111        |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17         |
| 2113 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.2.1.337      | Trámitar y pagar anticipo                                                                         | 2112        |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17         |
| 2114 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.2.1.338      | Pago de anticipo 20%                                                                              | 2113        |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17         |
| 2115 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.1.2.2</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                       |             |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Thu 9/28/17</b> | <b>Tue 11/28/17</b> |
| 2116 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.2.2.79       | Pago Planilla 1_35%                                                                               | 2092        |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17         |
| 2117 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.2.2.80       | Pago Planilla 2_35%                                                                               | 2093        |                                |           | 0 days          | Thu 11/16/17       | Thu 11/16/17        |
| 2118 |                                                                                   | 1.1.2.2.1.2.2.81       | Pago Planilla Final_10%                                                                           | 2099        |                                |           | 0 days          | Tue 11/28/17       | Tue 11/28/17        |
| 2119 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.2</b>       | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Alimentador Jama<br/>Centro-Subestación Jama</b>       |             | <b>1</b>                       |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b>  |
| 2120 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.2.1</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Alimentador Jama<br/>Centro-Subestación Jama</b> |             |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b>  |
| 2121 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.2.1.1</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                 |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 2122 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.15       | Designar Comisión Técnica                                                                         |             |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17          |
| 2123 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.16       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                    | 2122        |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17          |
| 2124 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.17       | No objeción DDLs                                                                                  | 2123        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17          |
| 2125 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.18       | Resolución de Inicio de proceso                                                                   | 2124        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17          |
| 2126 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.19       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                     | 2125        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17         |
| 2127 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.20       | Presentar de ofertas                                                                              | 2126        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17         |
| 2128 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.21       | Acta de apertura de ofertas                                                                       | 2127        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17         |
| 2129 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.22       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                      | 2128        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17          |
| 2130 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.23       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                         | 2129        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17          |
| 2131 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.24       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                | 2130        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17         |
| 2132 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.25       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                        | 2131        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17         |
| 2133 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.26       | Contrato Suscrito                                                                                 | 2132        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17         |
| 2134 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.27       | Trámitar y pagar anticipo                                                                         | 2133        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17         |
| 2135 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.1.28       | Pago de anticipo 50%                                                                              | 2134        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17         |
| 2136 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.2.1.2</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                          | <b>2135</b> |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/20/17</b>  |
| 2137 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.2.1.2.2</b> | <b>Construcción</b>                                                                               |             |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/20/17</b>  |
| 2138 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.2.2.11     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                             | 2135        |                                |           | 30 days         | Wed 4/19/17        | Wed 5/31/17         |
| 2139 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.2.2.12     | Replanteo                                                                                         | 2138        |                                |           | 15 days         | Thu 6/1/17         | Wed 6/21/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                  | Nombre de tarea                                                                                       | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 2140 |  | 1.1.2.2.2.1.2.2.13   | Obras Civiles                                                                                         | 2139  |                                |           | 15 days         | Thu 6/22/17        | Wed 7/12/17        |
| 2141 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.2.2.14   | Montaje Electromecánico                                                                               | 2140  |                                |           | 15 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/2/17         |
| 2142 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.2.2.15   | Tendido de Conductores                                                                                | 2140  |                                |           | 15 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/2/17         |
| 2143 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.2.2.16   | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                      | 2142  |                                |           | 15 days         | Thu 8/3/17         | Thu 8/24/17        |
| 2144 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.2.2.17   | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                          | 2143  |                                |           | 10 days         | Fri 8/25/17        | Thu 9/7/17         |
| 2145 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.2.2.18   | Energizar redes                                                                                       | 2144  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17        |
| 2146 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.2.2.19   | Pruebas                                                                                               | 2145  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17        |
| 2147 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.2.2.20   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                         | 2146  |                                |           | 0 days          | Wed 9/20/17        | Wed 9/20/17        |
| 2148 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.2.1.3</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                           |       |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Thu 8/3/17</b>  | <b>Mon 9/18/17</b> |
| 2149 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.3.3      | Pago Planilla 1_20%                                                                                   | 2142  |                                |           | 5 days          | Thu 8/3/17         | Wed 8/9/17         |
| 2150 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.3.4      | Pago Planilla 2_20%                                                                                   | 2145  |                                |           | 5 days          | Tue 9/12/17        | Mon 9/18/17        |
| 2151 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.2.1.4</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                           |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 9/21/17</b> | <b>Thu 9/28/17</b> |
| 2152 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.4.6      | Registro Contable                                                                                     | 2146  |                                |           | 2 days          | Thu 9/21/17        | Fri 9/22/17        |
| 2153 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.4.7      | Liquidación Técnica Contable                                                                          | 2152  |                                |           | 3 days          | Mon 9/25/17        | Wed 9/27/17        |
| 2154 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.4.8      | Registro de Activos                                                                                   | 2153  |                                |           | 1 day           | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17        |
| 2155 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.4.9      | Acta de Entrega Recepción                                                                             | 2154  |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17        |
| 2156 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.1.4.10     | Pago Planilla final 10%                                                                               | 2155  |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17        |
| 2157 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.2.2</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción Alimentador Jama Centro-Subestación Jama</b> |       |                                |           | <b>148 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b> |
| 2158 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.2.2.1</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                          |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |
| 2159 |  | 1.1.2.2.2.2.1.339    | Designar Comisión Técnica                                                                             |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |
| 2160 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.340    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                      | 2159  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |
| 2161 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.341    | Resolución de Inicio de proceso                                                                       | 2160  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |
| 2162 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.342    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                     | 2161  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |
| 2163 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.343    | Conformación de Lista Corta                                                                           | 2162  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |
| 2164 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.344    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                  | 2163  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |
| 2165 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.345    | Elaborar ofertas                                                                                      | 2164  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |
| 2166 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.346    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                          | 2165  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17         |
| 2167 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.347    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                    | 2166  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17        |
| 2168 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.348    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                            | 2167  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17        |
| 2169 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.349    | Contrato Suscrito                                                                                     | 2168  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17        |
| 2170 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.350    | Trámitar y pagar anticipo                                                                             | 2169  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17        |
| 2171 |                                                                                   | 1.1.2.2.2.2.1.351    | Pago de anticipo 20%                                                                                  | 2170  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17        |
| 2172 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.2.2.2</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                           |       |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Wed 8/9/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b> |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                              | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 2173 |  | 1.1.2.2.2.2.82         | Pago Planilla 1_35%                                                                                          | 2149        |                                |           | 0 days          | Wed 8/9/17         | Wed 8/9/17         |
| 2174 |  | 1.1.2.2.2.2.83         | Pago Planilla 2_35%                                                                                          | 2150        |                                |           | 0 days          | Mon 9/18/17        | Mon 9/18/17        |
| 2175 |  | 1.1.2.2.2.2.84         | Pago Planilla Final_10%                                                                                      | 2156        |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17        |
| 2176 |  | <b>1.1.2.2.4</b>       | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción subsistema de distribución Palmares (Jama a Pedernales)</b>       |             | <b>1</b>                       |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b> |
| 2177 |  | <b>1.1.2.2.4.3</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción subsistema de distribución Palmares (Jama a Pedernales)</b> |             |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b> |
| 2178 |  | <b>1.1.2.2.4.3.5</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                            |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b> |
| 2179 |  | 1.1.2.2.4.3.5.29       | Designar Comisión Técnica                                                                                    |             |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17         |
| 2180 |  | 1.1.2.2.4.3.5.30       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                               | 2179        |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17         |
| 2181 |  | 1.1.2.2.4.3.5.31       | No objeción DDLs                                                                                             | 2180        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17         |
| 2182 |  | 1.1.2.2.4.3.5.32       | Resolución de Inicio de proceso                                                                              | 2181        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |
| 2183 |  | 1.1.2.2.4.3.5.33       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                | 2182        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17        |
| 2184 |  | 1.1.2.2.4.3.5.34       | Presentar de ofertas                                                                                         | 2183        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17        |
| 2185 |  | 1.1.2.2.4.3.5.35       | Acta de apertura de ofertas                                                                                  | 2184        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17        |
| 2186 |  | 1.1.2.2.4.3.5.36       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                 | 2185        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17         |
| 2187 |  | 1.1.2.2.4.3.5.37       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                    | 2186        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17         |
| 2188 |  | 1.1.2.2.4.3.5.38       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                           | 2187        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17        |
| 2189 |  | 1.1.2.2.4.3.5.39       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                   | 2188        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17        |
| 2190 |  | 1.1.2.2.4.3.5.40       | Contrato Suscrito                                                                                            | 2189        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |
| 2191 |  | 1.1.2.2.4.3.5.41       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                    | 2190        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |
| 2192 |  | 1.1.2.2.4.3.5.42       | Pago de anticipo 50%                                                                                         | 2191        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |
| 2193 |  | <b>1.1.2.2.4.3.6</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                     | <b>2192</b> |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/20/17</b> |
| 2194 |  | <b>1.1.2.2.4.3.6.3</b> | <b>Construcción</b>                                                                                          |             |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/20/17</b> |
| 2195 |  | 1.1.2.2.4.3.6.3.21     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                        | 2192        |                                |           | 30 days         | Wed 4/19/17        | Wed 5/31/17        |
| 2196 |  | 1.1.2.2.4.3.6.3.22     | Replanteo                                                                                                    | 2195        |                                |           | 15 days         | Thu 6/1/17         | Wed 6/21/17        |
| 2197 |  | 1.1.2.2.4.3.6.3.23     | Obras Civiles                                                                                                | 2196        |                                |           | 15 days         | Thu 6/22/17        | Wed 7/12/17        |
| 2198 |  | 1.1.2.2.4.3.6.3.24     | Montaje Electromecánico                                                                                      | 2197        |                                |           | 15 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/2/17         |
| 2199 |  | 1.1.2.2.4.3.6.3.25     | Tendido de Conductores                                                                                       | 2197        |                                |           | 15 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/2/17         |
| 2200 |  | 1.1.2.2.4.3.6.3.26     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                             | 2199        |                                |           | 15 days         | Thu 8/3/17         | Thu 8/24/17        |
| 2201 |  | 1.1.2.2.4.3.6.3.27     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                 | 2200        |                                |           | 10 days         | Fri 8/25/17        | Thu 9/7/17         |
| 2202 |  | 1.1.2.2.4.3.6.3.28     | Energizar redes                                                                                              | 2201        |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17        |
| 2203 |  | 1.1.2.2.4.3.6.3.29     | Pruebas                                                                                                      | 2202        |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17        |
| 2204 |  | 1.1.2.2.4.3.6.3.30     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                | 2203        |                                |           | 0 days          | Wed 9/20/17        | Wed 9/20/17        |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                  | Nombre de tarea                                                                                                      | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2205 |    | <b>1.1.2.2.4.3.7</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                          |       |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Thu 8/3/17</b>  | <b>Mon 9/18/17</b>  |
| 2206 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.3.7.5      | Pago Planilla 1_20%                                                                                                  | 2199  |                                |           | 5 days          | Thu 8/3/17         | Wed 8/9/17          |
| 2207 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.3.7.6      | Pago Planilla 2_20%                                                                                                  | 2202  |                                |           | 5 days          | Tue 9/12/17        | Mon 9/18/17         |
| 2208 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.4.3.8</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                          |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 9/21/17</b> | <b>Thu 9/28/17</b>  |
| 2209 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.3.8.11     | Registro Contable                                                                                                    | 2203  |                                |           | 2 days          | Thu 9/21/17        | Fri 9/22/17         |
| 2210 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.3.8.12     | Liquidación Técnica Contable                                                                                         | 2209  |                                |           | 3 days          | Mon 9/25/17        | Wed 9/27/17         |
| 2211 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.3.8.13     | Registro de Activos                                                                                                  | 2210  |                                |           | 1 day           | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17         |
| 2212 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.3.8.14     | Acta de Entrega Recepción                                                                                            | 2211  |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17         |
| 2213 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.3.8.15     | Pago Planilla final 10%                                                                                              | 2212  |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17         |
| 2214 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.4.4</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción subsistema de distribución Palmares (Jama a Pedernales)</b> |       |                                |           | <b>148 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b>  |
| 2215 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.4.4.3</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                         |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b>  |
| 2216 |    | 1.1.2.2.4.4.3.352    | Designar Comisión Técnica                                                                                            |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17          |
| 2217 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.353    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                     | 2216  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17          |
| 2218 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.354    | Resolución de Inicio de proceso                                                                                      | 2217  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17          |
| 2219 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.355    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                    | 2218  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17         |
| 2220 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.356    | Conformación de Lista Corta                                                                                          | 2219  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17         |
| 2221 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.357    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                 | 2220  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17         |
| 2222 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.358    | Elaborar ofertas                                                                                                     | 2221  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17          |
| 2223 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.359    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                         | 2222  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17          |
| 2224 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.360    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                   | 2223  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17         |
| 2225 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.361    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                           | 2224  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17         |
| 2226 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.362    | Contrato Suscrito                                                                                                    | 2225  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17         |
| 2227 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.363    | Trámite y pagar anticipo                                                                                             | 2226  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17         |
| 2228 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.3.364    | Pago de anticipo 20%                                                                                                 | 2227  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17         |
| 2229 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.4.4.4</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                          |       |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Wed 8/9/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b>  |
| 2230 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.4.85     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                  | 2206  |                                |           | 0 days          | Wed 8/9/17         | Wed 8/9/17          |
| 2231 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.4.86     | Pago Planilla 2_35%                                                                                                  | 2207  |                                |           | 0 days          | Mon 9/18/17        | Mon 9/18/17         |
| 2232 |                                                                                     | 1.1.2.2.4.4.4.87     | Pago Planilla Final_10%                                                                                              | 2213  |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17         |
| 2233 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.5</b>     | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción subsistema de distribución Flavio Alfaro</b>                              |       | <b>1</b>                       |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2234 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.5.5</b>   | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción subsistema de distribución Flavio Alfaro</b>                        |       |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2235 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.5.5.9</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                                   |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 2236 |  | 1.1.2.2.5.5.9.43     | Designar Comisión Técnica                                                                                            |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17         | Tue 7/4/17          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                     | Nombre de tarea                                                           | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish             |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|--|
| 2237 |  | 1.1.2.2.5.5.9.44        | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                            | 2236        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17         |  |
| 2238 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.45        | No objeción DDLs                                                          | 2237        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17         |  |
| 2239 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.46        | Resolución de Inicio de proceso                                           | 2238        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17        |  |
| 2240 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.47        | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas             | 2239        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17        |  |
| 2241 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.48        | Presentar de ofertas                                                      | 2240        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17        |  |
| 2242 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.49        | Acta de apertura de ofertas                                               | 2241        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17        |  |
| 2243 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.50        | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 2242        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17         |  |
| 2244 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.51        | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 2243        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17         |  |
| 2245 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.52        | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 2244        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17         |  |
| 2246 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.53        | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 2245        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17        |  |
| 2247 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.54        | Contrato Suscrito                                                         | 2246        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17        |  |
| 2248 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.55        | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 2247        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17       |  |
| 2249 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.9.56        | Pago de anticipo 50%                                                      | 2248        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17       |  |
| 2250 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.5.5.10</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>2249</b> |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/27/18</b> |  |
| 2251 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.5.5.10.4</b> | <b>Construcción</b>                                                       |             |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/27/18</b> |  |
| 2252 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.10.4.31     | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 2249        |                                |           | 30 days         | Tue 10/17/17        | Wed 11/29/17       |  |
| 2253 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.10.4.32     | Replanteo                                                                 | 2252        |                                |           | 15 days         | Thu 11/30/17        | Thu 12/21/17       |  |
| 2254 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.10.4.33     | Obras Civiles                                                             | 2253        |                                |           | 15 days         | Fri 12/22/17        | Mon 1/15/18        |  |
| 2255 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.10.4.34     | Montaje Electromecánico                                                   | 2254        |                                |           | 15 days         | Tue 1/16/18         | Mon 2/5/18         |  |
| 2256 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.10.4.35     | Tendido de Conductores                                                    | 2254        |                                |           | 15 days         | Tue 1/16/18         | Mon 2/5/18         |  |
| 2257 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.10.4.36     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                          | 2256        |                                |           | 15 days         | Tue 2/6/18          | Wed 2/28/18        |  |
| 2258 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.10.4.37     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones              | 2257        |                                |           | 10 days         | Thu 3/1/18          | Wed 3/14/18        |  |
| 2259 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.10.4.38     | Energizar redes                                                           | 2258        |                                |           | 2 days          | Thu 3/15/18         | Fri 3/16/18        |  |
| 2260 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.10.4.39     | Pruebas                                                                   | 2259        |                                |           | 7 days          | Mon 3/19/18         | Tue 3/27/18        |  |
| 2261 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.10.4.40     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                             | 2260        |                                |           | 0 days          | Tue 3/27/18         | Tue 3/27/18        |  |
| 2262 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.5.5.11</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |             |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Tue 2/6/18</b>   | <b>Fri 3/23/18</b> |  |
| 2263 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.11.7        | Pago Planilla 1_20%                                                       | 2256        |                                |           | 5 days          | Tue 2/6/18          | Wed 2/14/18        |  |
| 2264 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.11.8        | Pago Planilla 2_20%                                                       | 2259        |                                |           | 5 days          | Mon 3/19/18         | Fri 3/23/18        |  |
| 2265 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.5.5.12</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                               |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Wed 3/28/18</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>  |  |
| 2266 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.12.16       | Registro Contable                                                         | 2260        |                                |           | 2 days          | Wed 3/28/18         | Thu 3/29/18        |  |
| 2267 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.12.17       | Liquidación Técnica Contable                                              | 2266        |                                |           | 3 days          | Mon 4/2/18          | Wed 4/4/18         |  |
| 2268 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.12.18       | Registro de Activos                                                       | 2267        |                                |           | 1 day           | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18         |  |
| 2269 |                                                                                   | 1.1.2.2.5.5.12.19       | Acta de Entrega Recepción                                                 | 2268        |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                   | Nombre de tarea                                                                                       | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|------|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2270 |  | 1.1.2.2.5.5.12.20     | Pago Planilla final 10%                                                                               | 2269  |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18         | Thu 4/5/18          |
| 2271 |  | <b>1.1.2.2.5.6</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción subsistema de distribución Flavio Alfaro</b> |       |                                |           | <b>145 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2272 |  | <b>1.1.2.2.5.6.5</b>  | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                          |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 2273 |  | 1.1.2.2.5.6.5.365     | Designar Comisión Técnica                                                                             |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |
| 2274 |  | 1.1.2.2.5.6.5.366     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                      | 2273  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |
| 2275 |  | 1.1.2.2.5.6.5.367     | Resolución de Inicio de proceso                                                                       | 2274  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |
| 2276 |  | 1.1.2.2.5.6.5.368     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                     | 2275  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |
| 2277 |  | 1.1.2.2.5.6.5.369     | Conformación de Lista Corta                                                                           | 2276  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |
| 2278 |  | 1.1.2.2.5.6.5.370     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                  | 2277  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |
| 2279 |  | 1.1.2.2.5.6.5.371     | Elaborar ofertas                                                                                      | 2278  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |
| 2280 |  | 1.1.2.2.5.6.5.372     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                          | 2279  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 2281 |  | 1.1.2.2.5.6.5.373     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                    | 2280  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 2282 |  | 1.1.2.2.5.6.5.374     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                            | 2281  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 2283 |  | 1.1.2.2.5.6.5.375     | Contrato Suscrito                                                                                     | 2282  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 2284 |  | 1.1.2.2.5.6.5.376     | Trámitar y pagar anticipo                                                                             | 2283  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 2285 |  | 1.1.2.2.5.6.5.377     | Pago de anticipo 20%                                                                                  | 2284  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 2286 |  | <b>1.1.2.2.5.6.6</b>  | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                           |       |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Wed 2/14/18</b> | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2287 |  | 1.1.2.2.5.6.6.88      | Pago Planilla 1_35%                                                                                   | 2263  |                                |           | 0 days          | Wed 2/14/18        | Wed 2/14/18         |
| 2288 |  | 1.1.2.2.5.6.6.89      | Pago Planilla 2_35%                                                                                   | 2264  |                                |           | 0 days          | Fri 3/23/18        | Fri 3/23/18         |
| 2289 |  | 1.1.2.2.5.6.6.90      | Pago Planilla Final_10%                                                                               | 2270  |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18         | Thu 4/5/18          |
| 2290 |  | <b>1.1.2.2.6</b>      | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción subsistema de distribución Jama-San Isidro</b>             |       | <b>1</b>                       |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2291 |  | <b>1.1.2.2.6.7</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción subsistema de distribución Jama-San Isidro</b>       |       |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2292 |  | <b>1.1.2.2.6.7.13</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                    |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 2293 |  | 1.1.2.2.6.7.13.57     | Designar Comisión Técnica                                                                             |       |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17         | Tue 7/4/17          |
| 2294 |  | 1.1.2.2.6.7.13.58     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                        | 2293  |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17         | Thu 7/6/17          |
| 2295 |  | 1.1.2.2.6.7.13.59     | No objeción DDLs                                                                                      | 2294  |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17         | Thu 7/6/17          |
| 2296 |  | 1.1.2.2.6.7.13.60     | Resolución de Inicio de proceso                                                                       | 2295  |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17         | Mon 7/10/17         |
| 2297 |  | 1.1.2.2.6.7.13.61     | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                         | 2296  |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17        | Tue 7/11/17         |
| 2298 |  | 1.1.2.2.6.7.13.62     | Presentar de ofertas                                                                                  | 2297  |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17        | Wed 8/23/17         |
| 2299 |  | 1.1.2.2.6.7.13.63     | Acta de apertura de ofertas                                                                           | 2298  |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17        | Wed 8/23/17         |
| 2300 |  | 1.1.2.2.6.7.13.64     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                          | 2299  |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17        | Wed 9/6/17          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                     | Nombre de tarea                                                                                         | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| 2301 |    | 1.1.2.2.6.7.13.65       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                               | 2300        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |  |
| 2302 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.13.66       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                      | 2301        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |  |
| 2303 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.13.67       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                              | 2302        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |  |
| 2304 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.13.68       | Contrato Suscrito                                                                                       | 2303        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |  |
| 2305 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.13.69       | Trámitar y pagar anticipo                                                                               | 2304        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |  |
| 2306 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.13.70       | Pago de anticipo 50%                                                                                    | 2305        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |  |
| 2307 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.6.7.14</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                | <b>2306</b> |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/27/18</b>  |  |
| 2308 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.6.7.14.5</b> | <b>Construcción</b>                                                                                     |             |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/27/18</b>  |  |
| 2309 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.14.5.41     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                   | 2306        |                                |           | 30 days         | Tue 10/17/17        | Wed 11/29/17        |  |
| 2310 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.14.5.42     | Replanteo                                                                                               | 2309        |                                |           | 15 days         | Thu 11/30/17        | Thu 12/21/17        |  |
| 2311 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.14.5.43     | Obras Civiles                                                                                           | 2310        |                                |           | 15 days         | Fri 12/22/17        | Mon 1/15/18         |  |
| 2312 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.14.5.44     | Montaje Electromecánico                                                                                 | 2311        |                                |           | 15 days         | Tue 1/16/18         | Mon 2/5/18          |  |
| 2313 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.14.5.45     | Tendido de Conductores                                                                                  | 2311        |                                |           | 15 days         | Tue 1/16/18         | Mon 2/5/18          |  |
| 2314 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.14.5.46     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                        | 2313        |                                |           | 15 days         | Tue 2/6/18          | Wed 2/28/18         |  |
| 2315 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.14.5.47     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                            | 2314        |                                |           | 10 days         | Thu 3/1/18          | Wed 3/14/18         |  |
| 2316 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.14.5.48     | Energizar redes                                                                                         | 2315        |                                |           | 2 days          | Thu 3/15/18         | Fri 3/16/18         |  |
| 2317 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.14.5.49     | Pruebas                                                                                                 | 2316        |                                |           | 7 days          | Mon 3/19/18         | Tue 3/27/18         |  |
| 2318 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.14.5.50     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                           | 2317        |                                |           | 0 days          | Tue 3/27/18         | Tue 3/27/18         |  |
| 2319 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.6.7.15</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                             |             |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Tue 2/6/18</b>   | <b>Fri 3/23/18</b>  |  |
| 2320 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.15.9        | Pago Planilla 1_20%                                                                                     | 2313        |                                |           | 5 days          | Tue 2/6/18          | Wed 2/14/18         |  |
| 2321 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.15.10       | Pago Planilla 2_20%                                                                                     | 2316        |                                |           | 5 days          | Mon 3/19/18         | Fri 3/23/18         |  |
| 2322 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.6.7.16</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                             |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Wed 3/28/18</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   |  |
| 2323 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.16.21       | Registro Contable                                                                                       | 2317        |                                |           | 2 days          | Wed 3/28/18         | Thu 3/29/18         |  |
| 2324 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.16.22       | Liquidación Técnica Contable                                                                            | 2323        |                                |           | 3 days          | Mon 4/2/18          | Wed 4/4/18          |  |
| 2325 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.16.23       | Registro de Activos                                                                                     | 2324        |                                |           | 1 day           | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |  |
| 2326 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.16.24       | Acta de Entrega Recepción                                                                               | 2325        |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |  |
| 2327 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.7.16.25       | Pago Planilla final 10%                                                                                 | 2326        |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |  |
| 2328 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.6.8</b>      | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción subsistema de distribución Jama-San Isidro</b> |             |                                |           | <b>145 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Thu 4/5/18</b>   |  |
| 2329 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.6.8.7</b>    | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                            |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 2330 |  | 1.1.2.2.6.8.7.378       | Designar Comisión Técnica                                                                               |             |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |  |
| 2331 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.8.7.379       | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                        | 2330        |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |  |
| 2332 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.8.7.380       | Resolución de Inicio de proceso                                                                         | 2331        |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17          | Mon 9/11/17         |  |
| 2333 |                                                                                     | 1.1.2.2.6.8.7.381       | Convocar a Expresiones de Interés                                                                       | 2332        |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17         | Wed 9/20/17         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                     | Nombre de tarea                                                                                                      | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2334 |  | 1.1.2.2.6.8.7.382       | Conformación de Lista Corta                                                                                          | 2333        |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |
| 2335 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.7.383       | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                 | 2334        |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |
| 2336 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.7.384       | Elaborar ofertas                                                                                                     | 2335        |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |
| 2337 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.7.385       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                         | 2336        |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |
| 2338 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.7.386       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                   | 2337        |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |
| 2339 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.7.387       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                           | 2338        |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 2340 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.7.388       | Contrato Suscrito                                                                                                    | 2339        |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |
| 2341 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.7.389       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                            | 2340        |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |
| 2342 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.7.390       | Pago de anticipo 20%                                                                                                 | 2341        |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |
| 2343 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.6.8.8</b>    | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                          |             |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Wed 2/14/18</b> | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2344 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.8.91        | Pago Planilla 1_35%                                                                                                  | 2320        |                                |           | 0 days          | Wed 2/14/18        | Wed 2/14/18         |
| 2345 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.8.92        | Pago Planilla 2_35%                                                                                                  | 2321        |                                |           | 0 days          | Fri 3/23/18        | Fri 3/23/18         |
| 2346 |                                                                                   | 1.1.2.2.6.8.8.93        | Pago Planilla Final_10%                                                                                              | 2327        |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18         | Thu 4/5/18          |
| 2347 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.7</b>        | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Repotenciación alimentador Cojimíes y nuevo alimentador subestación Pedernales</b>       |             | <b>1</b>                       |           | <b>219 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 11/14/17</b> |
| 2348 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.7.9</b>      | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Repotenciación alimentador Cojimíes y nuevo alimentador subestación Pedernales</b> |             |                                |           | <b>219 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 11/14/17</b> |
| 2349 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.7.9.17</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                                    |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 2350 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.71       | Designar Comisión Técnica                                                                                            |             |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17          |
| 2351 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.72       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                       | 2350        |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17          |
| 2352 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.73       | No objeción DDLs                                                                                                     | 2351        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17          |
| 2353 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.74       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                      | 2352        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17          |
| 2354 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.75       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                        | 2353        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17         |
| 2355 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.76       | Presentar de ofertas                                                                                                 | 2354        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17         |
| 2356 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.77       | Acta de apertura de ofertas                                                                                          | 2355        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17         |
| 2357 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.78       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                         | 2356        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17          |
| 2358 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.79       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                            | 2357        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17          |
| 2359 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.80       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                   | 2358        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17         |
| 2360 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.81       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                           | 2359        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17         |
| 2361 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.82       | Contrato Suscrito                                                                                                    | 2360        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17         |
| 2362 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.83       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                            | 2361        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17         |
| 2363 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.9.17.84       | Pago de anticipo 50%                                                                                                 | 2362        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17         |
| 2364 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.7.9.18</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                             | <b>2363</b> |                                |           | <b>139 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 11/6/17</b>  |
| 2365 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.7.9.18.6</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                  |             |                                |           | <b>139 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 11/6/17</b>  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                   | Nombre de tarea                                                                                                              | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2366 |    | 1.1.2.2.7.9.18.6.51   | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                        | 2363  |                                |           | 60 days         | Wed 4/19/17        | Wed 7/12/17         |
| 2367 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.18.6.52   | Replanteo                                                                                                                    | 2366  |                                |           | 15 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/2/17          |
| 2368 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.18.6.53   | Obras Civiles                                                                                                                | 2367  |                                |           | 15 days         | Thu 8/3/17         | Thu 8/24/17         |
| 2369 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.18.6.54   | Montaje Electromecánico                                                                                                      | 2368  |                                |           | 15 days         | Fri 8/25/17        | Thu 9/14/17         |
| 2370 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.18.6.55   | Tendido de Conductores                                                                                                       | 2368  |                                |           | 15 days         | Fri 8/25/17        | Thu 9/14/17         |
| 2371 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.18.6.56   | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                             | 2370  |                                |           | 15 days         | Fri 9/15/17        | Thu 10/5/17         |
| 2372 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.18.6.57   | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                                 | 2371  |                                |           | 10 days         | Fri 10/6/17        | Fri 10/20/17        |
| 2373 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.18.6.58   | Energizar redes                                                                                                              | 2372  |                                |           | 2 days          | Mon 10/23/17       | Tue 10/24/17        |
| 2374 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.18.6.59   | Pruebas                                                                                                                      | 2373  |                                |           | 7 days          | Wed 10/25/17       | Mon 11/6/17         |
| 2375 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.18.6.60   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                                | 2374  |                                |           | 0 days          | Mon 11/6/17        | Mon 11/6/17         |
| 2376 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.7.9.19</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                  |       |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Fri 9/15/17</b> | <b>Tue 10/31/17</b> |
| 2377 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.19.11     | Pago Planilla 1_20%                                                                                                          | 2370  |                                |           | 5 days          | Fri 9/15/17        | Thu 9/21/17         |
| 2378 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.19.12     | Pago Planilla 2_20%                                                                                                          | 2373  |                                |           | 5 days          | Wed 10/25/17       | Tue 10/31/17        |
| 2379 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.7.9.20</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                  |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Tue 11/7/17</b> | <b>Tue 11/14/17</b> |
| 2380 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.20.26     | Registro Contable                                                                                                            | 2374  |                                |           | 2 days          | Tue 11/7/17        | Wed 11/8/17         |
| 2381 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.20.27     | Liquidación Técnica Contable                                                                                                 | 2380  |                                |           | 3 days          | Thu 11/9/17        | Mon 11/13/17        |
| 2382 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.20.28     | Registro de Activos                                                                                                          | 2381  |                                |           | 1 day           | Tue 11/14/17       | Tue 11/14/17        |
| 2383 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.20.29     | Acta de Entrega Recepción                                                                                                    | 2382  |                                |           | 0 days          | Tue 11/14/17       | Tue 11/14/17        |
| 2384 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.9.20.30     | Pago Planilla final 10%                                                                                                      | 2383  |                                |           | 0 days          | Tue 11/14/17       | Tue 11/14/17        |
| 2385 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.7.10</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Repotenciación alimentador Cojimíes y nuevo alimentador subestación Pedernales</b> |       |                                |           | <b>178 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Tue 11/14/17</b> |
| 2386 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.7.10.9</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                 |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b>  |
| 2387 |  | 1.1.2.2.7.10.9.391    | Designar Comisión Técnica                                                                                                    |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17          |
| 2388 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.392    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                             | 2387  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17          |
| 2389 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.393    | Resolución de Inicio de proceso                                                                                              | 2388  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17          |
| 2390 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.394    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                            | 2389  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17         |
| 2391 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.395    | Conformación de Lista Corta                                                                                                  | 2390  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17         |
| 2392 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.396    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                         | 2391  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17         |
| 2393 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.397    | Elaborar ofertas                                                                                                             | 2392  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17          |
| 2394 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.398    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                 | 2393  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17          |
| 2395 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.399    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                           | 2394  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17         |
| 2396 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.400    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                   | 2395  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17         |
| 2397 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.401    | Contrato Suscrito                                                                                                            | 2396  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17         |
| 2398 |                                                                                     | 1.1.2.2.7.10.9.402    | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                    | 2397  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                      | Nombre de tarea                                                                                                                        | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Resulti<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2399 |  | 1.1.2.2.7.10.9.403       | Pago de anticipo 20%                                                                                                                   | 2398        |                                 |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17         |
| 2400 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.7.10.10</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                            |             |                                 |           | <b>35 days</b>  | <b>Thu 9/21/17</b> | <b>Tue 11/14/17</b> |
| 2401 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.10.10.94       | Pago Planilla 1_35%                                                                                                                    | 2377        |                                 |           | 0 days          | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17         |
| 2402 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.10.10.95       | Pago Planilla 2_35%                                                                                                                    | 2378        |                                 |           | 0 days          | Tue 10/31/17       | Tue 10/31/17        |
| 2403 |                                                                                   | 1.1.2.2.7.10.10.96       | Pago Planilla Final_10%                                                                                                                | 2384        |                                 |           | 0 days          | Tue 11/14/17       | Tue 11/14/17        |
| 2404 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.8</b>         | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción alimentadores Cojimíes vía a San Isidro del área rural de la zona norte de Manabí</b>       |             | <b>1</b>                        |           | <b>249 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 12/28/17</b> |
| 2405 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.8.11</b>      | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción alimentadores Cojimíes vía a San Isidro del área rural de la zona norte de Manabí</b> |             |                                 |           | <b>249 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 12/28/17</b> |
| 2406 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.8.11.21</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                                                      |             |                                 |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 2407 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.85       | Designar Comisión Técnica                                                                                                              |             |                                 |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17          |
| 2408 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.86       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                                         | 2407        |                                 |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17          |
| 2409 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.87       | No objeción DDLs                                                                                                                       | 2408        |                                 |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17          |
| 2410 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.88       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                        | 2409        |                                 |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17          |
| 2411 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.89       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                                          | 2410        |                                 |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17         |
| 2412 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.90       | Presentar de ofertas                                                                                                                   | 2411        |                                 |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17         |
| 2413 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.91       | Acta de apertura de ofertas                                                                                                            | 2412        |                                 |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17         |
| 2414 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.92       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                           | 2413        |                                 |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17          |
| 2415 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.93       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                                              | 2414        |                                 |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17          |
| 2416 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.94       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                     | 2415        |                                 |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17         |
| 2417 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.95       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                             | 2416        |                                 |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17         |
| 2418 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.96       | Contrato Suscrito                                                                                                                      | 2417        |                                 |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17         |
| 2419 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.97       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                              | 2418        |                                 |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17         |
| 2420 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.21.98       | Pago de anticipo 50%                                                                                                                   | 2419        |                                 |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17         |
| 2421 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.8.11.22</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                                               | <b>2420</b> |                                 |           | <b>169 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Tue 12/19/17</b> |
| 2422 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.8.11.22.7</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                                    |             |                                 |           | <b>169 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Tue 12/19/17</b> |
| 2423 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.22.7.61     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                                  | 2420        |                                 |           | 90 days         | Wed 4/19/17        | Thu 8/24/17         |
| 2424 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.22.7.62     | Replanteo                                                                                                                              | 2423        |                                 |           | 15 days         | Fri 8/25/17        | Thu 9/14/17         |
| 2425 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.22.7.63     | Obras Civiles                                                                                                                          | 2424        |                                 |           | 15 days         | Fri 9/15/17        | Thu 10/5/17         |
| 2426 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.22.7.64     | Montaje Electromecánico                                                                                                                | 2425        |                                 |           | 15 days         | Fri 10/6/17        | Fri 10/27/17        |
| 2427 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.22.7.65     | Tendido de Conductores                                                                                                                 | 2425        |                                 |           | 15 days         | Fri 10/6/17        | Fri 10/27/17        |
| 2428 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.22.7.66     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                                       | 2427        |                                 |           | 15 days         | Mon 10/30/17       | Tue 11/21/17        |
| 2429 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.22.7.67     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                                           | 2428        |                                 |           | 10 days         | Wed 11/22/17       | Tue 12/5/17         |
| 2430 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.22.7.68     | Energizar redes                                                                                                                        | 2429        |                                 |           | 2 days          | Thu 12/7/17        | Fri 12/8/17         |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                                                               | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 2431 |  | 1.1.2.2.8.11.22.7.69   | Pruebas                                                                                                                                                       | 2430  |                                |           | 7 days          | Mon 12/11/17        | Tue 12/19/17        |
| 2432 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.22.7.70   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                                                                 | 2431  |                                |           | 0 days          | Tue 12/19/17        | Tue 12/19/17        |
| 2433 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.8.11.23</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                                                   |       |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Mon 10/30/17</b> | <b>Fri 12/15/17</b> |
| 2434 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.23.13     | Pago Planilla 1_20%                                                                                                                                           | 2427  |                                |           | 5 days          | Mon 10/30/17        | Tue 11/7/17         |
| 2435 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.23.14     | Pago Planilla 2_20%                                                                                                                                           | 2430  |                                |           | 5 days          | Mon 12/11/17        | Fri 12/15/17        |
| 2436 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.8.11.24</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                                                   |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Wed 12/20/17</b> | <b>Thu 12/28/17</b> |
| 2437 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.24.31     | Registro Contable                                                                                                                                             | 2431  |                                |           | 2 days          | Wed 12/20/17        | Thu 12/21/17        |
| 2438 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.24.32     | Liquidación Técnica Contable                                                                                                                                  | 2437  |                                |           | 3 days          | Fri 12/22/17        | Wed 12/27/17        |
| 2439 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.24.33     | Registro de Activos                                                                                                                                           | 2438  |                                |           | 1 day           | Thu 12/28/17        | Thu 12/28/17        |
| 2440 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.24.34     | Acta de Entrega Recepción                                                                                                                                     | 2439  |                                |           | 0 days          | Thu 12/28/17        | Thu 12/28/17        |
| 2441 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.11.24.35     | Pago Planilla final 10%                                                                                                                                       | 2440  |                                |           | 0 days          | Thu 12/28/17        | Thu 12/28/17        |
| 2442 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.8.12</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción alimentadores Cojimíes vía a San Isidro del área rural de la zona norte de Manabí</b>                |       |                                |           | <b>208 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>   | <b>Thu 12/28/17</b> |
| 2443 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.8.12.11</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                                                  |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>   | <b>Wed 5/17/17</b>  |
| 2444 |  | 1.1.2.2.8.12.11.404    | Designar Comisión Técnica                                                                                                                                     |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17          | Fri 3/3/17          |
| 2445 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.405    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                                              | 2444  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17          | Tue 3/7/17          |
| 2446 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.406    | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                                               | 2445  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17          | Thu 3/9/17          |
| 2447 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.407    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                                                             | 2446  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17         | Mon 3/20/17         |
| 2448 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.408    | Conformación de Lista Corta                                                                                                                                   | 2447  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17         | Thu 3/23/17         |
| 2449 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.409    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                                                          | 2448  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17         | Fri 3/24/17         |
| 2450 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.410    | Elaborar ofertas                                                                                                                                              | 2449  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17         | Tue 4/4/17          |
| 2451 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.411    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                                                  | 2450  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17          | Thu 4/6/17          |
| 2452 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.412    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                                            | 2451  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17          | Mon 4/10/17         |
| 2453 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.413    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                                                    | 2452  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17         | Wed 5/10/17         |
| 2454 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.414    | Contrato Suscrito                                                                                                                                             | 2453  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17         | Wed 5/10/17         |
| 2455 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.415    | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                                                     | 2454  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17         | Wed 5/17/17         |
| 2456 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.11.416    | Pago de anticipo 20%                                                                                                                                          | 2455  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17         | Wed 5/17/17         |
| 2457 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.8.12.12</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                                                   |       |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Tue 11/7/17</b>  | <b>Thu 12/28/17</b> |
| 2458 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.12.97     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                                                           | 2434  |                                |           | 0 days          | Tue 11/7/17         | Tue 11/7/17         |
| 2459 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.12.98     | Pago Planilla 2_35%                                                                                                                                           | 2435  |                                |           | 0 days          | Fri 12/15/17        | Fri 12/15/17        |
| 2460 |                                                                                   | 1.1.2.2.8.12.12.99     | Pago Planilla Final_10%                                                                                                                                       | 2441  |                                |           | 0 days          | Thu 12/28/17        | Thu 12/28/17        |
| 2461 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.9</b>       | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción y reforzamiento del sistema de distribución (MT-BT-CT en alimentadores Flavio Alfaro, San Isidro de S/E Sesme)</b> |       | <b>1</b>                       |           | <b>219 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>   | <b>Tue 11/14/17</b> |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                      | Nombre de tarea                                                                                                                                                     | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Resulti<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2462 |  | <b>1.1.2.2.9.13</b>      | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción y reforzamiento del sistema de distribución (MT-BT-CT en alimentadores Flavio Alfaro, San Isidro de S/E Sesme)</b> |             |                                 |           | <b>219 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 11/14/17</b> |
| 2463 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.9.13.25</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                                                                                   |             |                                 |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 2464 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.99       | Designar Comisión Técnica                                                                                                                                           |             |                                 |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17          |
| 2465 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.100      | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                                                                      | 2464        |                                 |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17          |
| 2466 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.101      | No objeción DDLs                                                                                                                                                    | 2465        |                                 |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17          |
| 2467 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.102      | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                                                     | 2466        |                                 |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17          |
| 2468 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.103      | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                                                                       | 2467        |                                 |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17         |
| 2469 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.104      | Presentar de ofertas                                                                                                                                                | 2468        |                                 |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17         |
| 2470 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.105      | Acta de apertura de ofertas                                                                                                                                         | 2469        |                                 |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17         |
| 2471 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.106      | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                                                        | 2470        |                                 |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17          |
| 2472 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.107      | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                                                                           | 2471        |                                 |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17          |
| 2473 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.108      | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                                                  | 2472        |                                 |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17         |
| 2474 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.109      | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                                                          | 2473        |                                 |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17         |
| 2475 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.110      | Contrato Suscrito                                                                                                                                                   | 2474        |                                 |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17         |
| 2476 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.111      | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                                                           | 2475        |                                 |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17         |
| 2477 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.25.112      | Pago de anticipo 50%                                                                                                                                                | 2476        |                                 |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17         |
| 2478 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.9.13.26</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                                                                            | <b>2477</b> |                                 |           | <b>139 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 11/6/17</b>  |
| 2479 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.9.13.26.8</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                                                                 |             |                                 |           | <b>139 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Mon 11/6/17</b>  |
| 2480 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.26.8.71     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                                                               | 2477        |                                 |           | 60 days         | Wed 4/19/17        | Wed 7/12/17         |
| 2481 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.26.8.72     | Replanteo                                                                                                                                                           | 2480        |                                 |           | 15 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/2/17          |
| 2482 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.26.8.73     | Obras Civiles                                                                                                                                                       | 2481        |                                 |           | 15 days         | Thu 8/3/17         | Thu 8/24/17         |
| 2483 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.26.8.74     | Montaje Electromecánico                                                                                                                                             | 2482        |                                 |           | 15 days         | Fri 8/25/17        | Thu 9/14/17         |
| 2484 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.26.8.75     | Tendido de Conductores                                                                                                                                              | 2482        |                                 |           | 15 days         | Fri 8/25/17        | Thu 9/14/17         |
| 2485 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.26.8.76     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                                                                    | 2484        |                                 |           | 15 days         | Fri 9/15/17        | Thu 10/5/17         |
| 2486 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.26.8.77     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                                                                        | 2485        |                                 |           | 10 days         | Fri 10/6/17        | Fri 10/20/17        |
| 2487 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.26.8.78     | Energizar redes                                                                                                                                                     | 2486        |                                 |           | 2 days          | Mon 10/23/17       | Tue 10/24/17        |
| 2488 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.26.8.79     | Pruebas                                                                                                                                                             | 2487        |                                 |           | 7 days          | Wed 10/25/17       | Mon 11/6/17         |
| 2489 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.26.8.80     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                                                                       | 2488        |                                 |           | 0 days          | Mon 11/6/17        | Mon 11/6/17         |
| 2490 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.9.13.27</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                                                         |             |                                 |           | <b>32 days</b>  | <b>Fri 9/15/17</b> | <b>Tue 10/31/17</b> |
| 2491 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.27.15       | Pago Planilla 1_20%                                                                                                                                                 | 2484        |                                 |           | 5 days          | Fri 9/15/17        | Thu 9/21/17         |
| 2492 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.27.16       | Pago Planilla 2_20%                                                                                                                                                 | 2487        |                                 |           | 5 days          | Wed 10/25/17       | Tue 10/31/17        |
| 2493 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.9.13.28</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                                                         |             |                                 |           | <b>6 days</b>   | <b>Tue 11/7/17</b> | <b>Tue 11/14/17</b> |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                     | Nombre de tarea                                                                                                                                                             | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2494 |  | 1.1.2.2.9.13.28.36      | Registro Contable                                                                                                                                                           | 2488  |                                |           | 2 days          | Tue 11/7/17        | Wed 11/8/17         |
| 2495 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.28.37      | Liquidación Técnica Contable                                                                                                                                                | 2494  |                                |           | 3 days          | Thu 11/9/17        | Mon 11/13/17        |
| 2496 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.28.38      | Registro de Activos                                                                                                                                                         | 2495  |                                |           | 1 day           | Tue 11/14/17       | Tue 11/14/17        |
| 2497 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.28.39      | Acta de Entrega Recepción                                                                                                                                                   | 2496  |                                |           | 0 days          | Tue 11/14/17       | Tue 11/14/17        |
| 2498 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.13.28.40      | Pago Planilla final 10%                                                                                                                                                     | 2497  |                                |           | 0 days          | Tue 11/14/17       | Tue 11/14/17        |
| 2499 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.9.14</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción y reforzamiento del sistema de distribución (MT-BT-CT en alimentadores Flavio Alfaro, San Isidro de S/E Sesme)</b> |       |                                |           | <b>178 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Tue 11/14/17</b> |
| 2500 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.9.14.13</b>  | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                                                                |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b>  |
| 2501 |  | 1.1.2.2.9.14.13.417     | Designar Comisión Técnica                                                                                                                                                   |       |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17          |
| 2502 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.418     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                                                            | 2501  |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17          |
| 2503 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.419     | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                                                             | 2502  |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17          |
| 2504 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.420     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                                                                           | 2503  |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17         |
| 2505 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.421     | Conformación de Lista Corta                                                                                                                                                 | 2504  |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17         |
| 2506 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.422     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                                                                        | 2505  |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17         |
| 2507 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.423     | Elaborar ofertas                                                                                                                                                            | 2506  |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17          |
| 2508 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.424     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                                                                | 2507  |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17         | Thu 4/6/17          |
| 2509 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.425     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                                                          | 2508  |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17         | Mon 4/10/17         |
| 2510 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.426     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                                                                  | 2509  |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17        | Wed 5/10/17         |
| 2511 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.427     | Contrato Suscrito                                                                                                                                                           | 2510  |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17        | Wed 5/10/17         |
| 2512 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.428     | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                                                                   | 2511  |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17        | Wed 5/17/17         |
| 2513 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.13.429     | Pago de anticipo 20%                                                                                                                                                        | 2512  |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17        | Wed 5/17/17         |
| 2514 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.9.14.14</b>  | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                                                                 |       |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Thu 9/21/17</b> | <b>Tue 11/14/17</b> |
| 2515 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.14.100     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                                                                         | 2491  |                                |           | 0 days          | Thu 9/21/17        | Thu 9/21/17         |
| 2516 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.14.101     | Pago Planilla 2_35%                                                                                                                                                         | 2492  |                                |           | 0 days          | Tue 10/31/17       | Tue 10/31/17        |
| 2517 |                                                                                   | 1.1.2.2.9.14.14.102     | Pago Planilla Final_10%                                                                                                                                                     | 2498  |                                |           | 0 days          | Tue 11/14/17       | Tue 11/14/17        |
| 2518 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.10</b>       | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción de tramos de red trifásica a 13,8kV entre los alimentadores La Bramadora y LA 14 (cambio de topología)</b>                       |       | <b>1</b>                       |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b>  |
| 2519 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.10.15</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción de tramos de red trifásica a 13,8kV entre los alimentadores La Bramadora y LA 14 (cambio de topología)</b>                 |       |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b>  |
| 2520 |                                                                                   | <b>1.1.2.2.10.15.29</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                                                                                          |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b>  |
| 2521 |                                                                                   | 1.1.2.2.10.15.29.11     | Designar Comisión Técnica                                                                                                                                                   |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17          |
| 2522 |                                                                                   | 1.1.2.2.10.15.29.11     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                                                                              | 2521  |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                       | Nombre de tarea                                                           | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 2523 |  | 1.1.2.2.10.15.29.11       | No objeción DDLs                                                          | 2522        |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17         |
| 2524 |  | 1.1.2.2.10.15.29.11       | Resolución de Inicio de proceso                                           | 2523        |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |
| 2525 |  | 1.1.2.2.10.15.29.11       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas             | 2524        |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17        |
| 2526 |  | 1.1.2.2.10.15.29.11       | Presentar de ofertas                                                      | 2525        |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17        |
| 2527 |  | 1.1.2.2.10.15.29.11       | Acta de apertura de ofertas                                               | 2526        |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17        |
| 2528 |  | 1.1.2.2.10.15.29.12       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 2527        |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17         |
| 2529 |  | 1.1.2.2.10.15.29.12       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 2528        |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17         |
| 2530 |  | 1.1.2.2.10.15.29.12       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 2529        |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17        |
| 2531 |  | 1.1.2.2.10.15.29.12       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 2530        |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17        |
| 2532 |  | 1.1.2.2.10.15.29.12       | Contrato Suscrito                                                         | 2531        |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |
| 2533 |  | 1.1.2.2.10.15.29.12       | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 2532        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |
| 2534 |  | 1.1.2.2.10.15.29.12       | Pago de anticipo 50%                                                      | 2533        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |
| 2535 |  | <b>1.1.2.2.10.15.30</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>2534</b> |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/20/17</b> |
| 2536 |  | <b>1.1.2.2.10.15.30.9</b> | <b>Construcción</b>                                                       |             |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/20/17</b> |
| 2537 |  | 1.1.2.2.10.15.30.9.8      | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 2534        |                                |           | 30 days         | Wed 4/19/17        | Wed 5/31/17        |
| 2538 |  | 1.1.2.2.10.15.30.9.8      | Replanteo                                                                 | 2537        |                                |           | 15 days         | Thu 6/1/17         | Wed 6/21/17        |
| 2539 |  | 1.1.2.2.10.15.30.9.8      | Obras Civiles                                                             | 2538        |                                |           | 15 days         | Thu 6/22/17        | Wed 7/12/17        |
| 2540 |  | 1.1.2.2.10.15.30.9.8      | Montaje Electromecánico                                                   | 2539        |                                |           | 15 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/2/17         |
| 2541 |  | 1.1.2.2.10.15.30.9.8      | Tendido de Conductores                                                    | 2539        |                                |           | 15 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/2/17         |
| 2542 |  | 1.1.2.2.10.15.30.9.8      | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                          | 2541        |                                |           | 15 days         | Thu 8/3/17         | Thu 8/24/17        |
| 2543 |  | 1.1.2.2.10.15.30.9.8      | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones              | 2542        |                                |           | 10 days         | Fri 8/25/17        | Thu 9/7/17         |
| 2544 |  | 1.1.2.2.10.15.30.9.8      | Energizar redes                                                           | 2543        |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17        |
| 2545 |  | 1.1.2.2.10.15.30.9.8      | Pruebas                                                                   | 2544        |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17        |
| 2546 |  | 1.1.2.2.10.15.30.9.9      | Acta de terminación física-tecnica de la obra                             | 2545        |                                |           | 0 days          | Wed 9/20/17        | Wed 9/20/17        |
| 2547 |  | <b>1.1.2.2.10.15.31</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |             |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Thu 8/3/17</b>  | <b>Mon 9/18/17</b> |
| 2548 |  | 1.1.2.2.10.15.31.17       | Pago Planilla 1_20%                                                       | 2541        |                                |           | 5 days          | Thu 8/3/17         | Wed 8/9/17         |
| 2549 |  | 1.1.2.2.10.15.31.18       | Pago Planilla 2_20%                                                       | 2544        |                                |           | 5 days          | Tue 9/12/17        | Mon 9/18/17        |
| 2550 |  | <b>1.1.2.2.10.15.32</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                               |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 9/21/17</b> | <b>Thu 9/28/17</b> |
| 2551 |  | 1.1.2.2.10.15.32.41       | Registro Contable                                                         | 2545        |                                |           | 2 days          | Thu 9/21/17        | Fri 9/22/17        |
| 2552 |  | 1.1.2.2.10.15.32.42       | Liquidación Técnica Contable                                              | 2551        |                                |           | 3 days          | Mon 9/25/17        | Wed 9/27/17        |
| 2553 |  | 1.1.2.2.10.15.32.43       | Registro de Activos                                                       | 2552        |                                |           | 1 day           | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17        |
| 2554 |  | 1.1.2.2.10.15.32.44       | Acta de Entrega Recepción                                                 | 2553        |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17        |
| 2555 |  | 1.1.2.2.10.15.32.45       | Pago Planilla final 10%                                                   | 2554        |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17        |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                 | Nombre de tarea                                                                                                                                                              | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration | Start       | Finish       |
|------|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 2556 |  | 1.1.2.2.10.16       | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción de tramos de red trifásica a 13,8kV entre los alimentadores La Bramadora y LA 14 (cambio de topología)</b>          |       |                                |           | 148 days | Thu 3/2/17  | Thu 9/28/17  |
| 2557 |  | 1.1.2.2.10.16.15    | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                                                                 |       |                                |           | 53 days  | Thu 3/2/17  | Wed 5/17/17  |
| 2558 |  | 1.1.2.2.10.16.15.43 | Designar Comisión Técnica                                                                                                                                                    |       |                                |           | 2 days   | Thu 3/2/17  | Fri 3/3/17   |
| 2559 |  | 1.1.2.2.10.16.15.43 | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                                                             | 2558  |                                |           | 2 days   | Mon 3/6/17  | Tue 3/7/17   |
| 2560 |  | 1.1.2.2.10.16.15.43 | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                                                              | 2559  |                                |           | 2 days   | Wed 3/8/17  | Thu 3/9/17   |
| 2561 |  | 1.1.2.2.10.16.15.43 | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                                                                            | 2560  |                                |           | 7 days   | Fri 3/10/17 | Mon 3/20/17  |
| 2562 |  | 1.1.2.2.10.16.15.43 | Conformación de Lista Corta                                                                                                                                                  | 2561  |                                |           | 3 days   | Tue 3/21/17 | Thu 3/23/17  |
| 2563 |  | 1.1.2.2.10.16.15.43 | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                                                                         | 2562  |                                |           | 1 day    | Fri 3/24/17 | Fri 3/24/17  |
| 2564 |  | 1.1.2.2.10.16.15.43 | Elaborar ofertas                                                                                                                                                             | 2563  |                                |           | 7 days   | Mon 3/27/17 | Tue 4/4/17   |
| 2565 |  | 1.1.2.2.10.16.15.43 | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                                                                 | 2564  |                                |           | 2 days   | Wed 4/5/17  | Thu 4/6/17   |
| 2566 |  | 1.1.2.2.10.16.15.43 | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                                                           | 2565  |                                |           | 2 days   | Fri 4/7/17  | Mon 4/10/17  |
| 2567 |  | 1.1.2.2.10.16.15.43 | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                                                                   | 2566  |                                |           | 20 days  | Tue 4/11/17 | Wed 5/10/17  |
| 2568 |  | 1.1.2.2.10.16.15.44 | Contrato Suscrito                                                                                                                                                            | 2567  |                                |           | 0 days   | Wed 5/10/17 | Wed 5/10/17  |
| 2569 |  | 1.1.2.2.10.16.15.44 | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                                                                    | 2568  |                                |           | 5 days   | Thu 5/11/17 | Wed 5/17/17  |
| 2570 |  | 1.1.2.2.10.16.15.44 | Pago de anticipo 20%                                                                                                                                                         | 2569  |                                |           | 0 days   | Wed 5/17/17 | Wed 5/17/17  |
| 2571 |  | 1.1.2.2.10.16.16    | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                                                                  |       |                                |           | 35 days  | Wed 8/9/17  | Thu 9/28/17  |
| 2572 |  | 1.1.2.2.10.16.16.10 | Pago Planilla 1_35%                                                                                                                                                          | 2548  |                                |           | 0 days   | Wed 8/9/17  | Wed 8/9/17   |
| 2573 |  | 1.1.2.2.10.16.16.10 | Pago Planilla 2_35%                                                                                                                                                          | 2549  |                                |           | 0 days   | Mon 9/18/17 | Mon 9/18/17  |
| 2574 |  | 1.1.2.2.10.16.16.10 | Pago Planilla Final_10%                                                                                                                                                      | 2555  |                                |           | 0 days   | Thu 9/28/17 | Thu 9/28/17  |
| 2575 |  | 1.1.2.2.11          | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción y reforzamiento del sistema de distribución (MT-BT-CT en alimentadores Nuevo Israel, Avenida Chone, Maicito y Porvenir)</b>       |       | 1                              |           | 189 days | Mon 7/3/17  | Thu 4/5/18   |
| 2576 |  | 1.1.2.2.11.17       | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción y reforzamiento del sistema de distribución (MT-BT-CT en alimentadores Nuevo Israel, Avenida Chone, Maicito y Porvenir)</b> |       |                                |           | 189 days | Mon 7/3/17  | Thu 4/5/18   |
| 2577 |  | 1.1.2.2.11.17.33    | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                                                                                           |       |                                |           | 92 days  | Mon 7/3/17  | Mon 11/13/17 |
| 2578 |  | 1.1.2.2.11.17.33.12 | Designar Comisión Técnica                                                                                                                                                    |       |                                |           | 2 days   | Mon 7/3/17  | Tue 7/4/17   |
| 2579 |  | 1.1.2.2.11.17.33.12 | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                                                                               | 2578  |                                |           | 2 days   | Wed 7/5/17  | Thu 7/6/17   |
| 2580 |  | 1.1.2.2.11.17.33.12 | No objeción DDLs                                                                                                                                                             | 2579  |                                |           | 0 days   | Thu 7/6/17  | Thu 7/6/17   |
| 2581 |  | 1.1.2.2.11.17.33.13 | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                                                              | 2580  |                                |           | 2 days   | Fri 7/7/17  | Mon 7/10/17  |
| 2582 |  | 1.1.2.2.11.17.33.13 | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                                                                                | 2581  |                                |           | 1 day    | Tue 7/11/17 | Tue 7/11/17  |
| 2583 |  | 1.1.2.2.11.17.33.13 | Presentar de ofertas                                                                                                                                                         | 2582  |                                |           | 30 days  | Wed 7/12/17 | Wed 8/23/17  |
| 2584 |  | 1.1.2.2.11.17.33.13 | Acta de apertura de ofertas                                                                                                                                                  | 2583  |                                |           | 0 days   | Wed 8/23/17 | Wed 8/23/17  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                        | Nombre de tarea                                                                                                                                                                      | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 2585 |    | 1.1.2.2.11.17.33.13        | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                                                                         | 2584        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 2586 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.33.13        | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                                                                                            | 2585        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 2587 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.33.13        | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                                                                   | 2586        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 2588 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.33.13        | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                                                                           | 2587        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 2589 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.33.13        | Contrato Suscrito                                                                                                                                                                    | 2588        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 2590 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.33.13        | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                                                                            | 2589        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 2591 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.33.14        | Pago de anticipo 50%                                                                                                                                                                 | 2590        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 2592 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.11.17.34</b>    | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                                                                                             | <b>2591</b> |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/27/18</b>  |
| 2593 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.11.17.34.10</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                                                                                  |             |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/27/18</b>  |
| 2594 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.34.10        | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                                                                                | 2591        |                                |           | 30 days         | Tue 10/17/17        | Wed 11/29/17        |
| 2595 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.34.10        | Replanteo                                                                                                                                                                            | 2594        |                                |           | 15 days         | Thu 11/30/17        | Thu 12/21/17        |
| 2596 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.34.10        | Obras Civiles                                                                                                                                                                        | 2595        |                                |           | 15 days         | Fri 12/22/17        | Mon 1/15/18         |
| 2597 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.34.10        | Montaje Electromecánico                                                                                                                                                              | 2596        |                                |           | 15 days         | Tue 1/16/18         | Mon 2/5/18          |
| 2598 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.34.10        | Tendido de Conductores                                                                                                                                                               | 2596        |                                |           | 15 days         | Tue 1/16/18         | Mon 2/5/18          |
| 2599 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.34.10        | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                                                                                     | 2598        |                                |           | 15 days         | Tue 2/6/18          | Wed 2/28/18         |
| 2600 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.34.10        | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                                                                                         | 2599        |                                |           | 10 days         | Thu 3/1/18          | Wed 3/14/18         |
| 2601 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.34.10        | Energizar redes                                                                                                                                                                      | 2600        |                                |           | 2 days          | Thu 3/15/18         | Fri 3/16/18         |
| 2602 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.34.10        | Pruebas                                                                                                                                                                              | 2601        |                                |           | 7 days          | Mon 3/19/18         | Tue 3/27/18         |
| 2603 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.34.10        | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                                                                                        | 2602        |                                |           | 0 days          | Tue 3/27/18         | Tue 3/27/18         |
| 2604 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.11.17.35</b>    | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                                                                          |             |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Tue 2/6/18</b>   | <b>Fri 3/23/18</b>  |
| 2605 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.35.19        | Pago Planilla 1_20%                                                                                                                                                                  | 2598        |                                |           | 5 days          | Tue 2/6/18          | Wed 2/14/18         |
| 2606 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.35.20        | Pago Planilla 2_20%                                                                                                                                                                  | 2601        |                                |           | 5 days          | Mon 3/19/18         | Fri 3/23/18         |
| 2607 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.11.17.36</b>    | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                                                                          |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Wed 3/28/18</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2608 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.36.46        | Registro Contable                                                                                                                                                                    | 2602        |                                |           | 2 days          | Wed 3/28/18         | Thu 3/29/18         |
| 2609 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.36.47        | Liquidación Técnica Contable                                                                                                                                                         | 2608        |                                |           | 3 days          | Mon 4/2/18          | Wed 4/4/18          |
| 2610 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.36.48        | Registro de Activos                                                                                                                                                                  | 2609        |                                |           | 1 day           | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |
| 2611 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.36.49        | Acta de Entrega Recepción                                                                                                                                                            | 2610        |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |
| 2612 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.17.36.50        | Pago Planilla final 10%                                                                                                                                                              | 2611        |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |
| 2613 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.11.18</b>       | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Reconstrucción y reforzamiento del sistema de distribución (MT-BT-CT en alimentadores Nuevo Israel, Avenida Chone, Maicito y Porvenir)</b> |             |                                |           | <b>145 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2614 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.11.18.17</b>    | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                                                                         |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 2615 |  | 1.1.2.2.11.18.17.44        | Designar Comisión Técnica                                                                                                                                                            |             |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |
| 2616 |                                                                                     | 1.1.2.2.11.18.17.44        | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                                                                     | 2615        |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                     | Nombre de tarea                                                                                                                                 | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 2617 |  | 1.1.2.2.11.18.17.44     | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                                 | 2616  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17        |
| 2618 |  | 1.1.2.2.11.18.17.44     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                                               | 2617  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17        |
| 2619 |  | 1.1.2.2.11.18.17.44     | Conformación de Lista Corta                                                                                                                     | 2618  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17        |
| 2620 |  | 1.1.2.2.11.18.17.44     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                                            | 2619  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17        |
| 2621 |  | 1.1.2.2.11.18.17.44     | Elaborar ofertas                                                                                                                                | 2620  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17        |
| 2622 |  | 1.1.2.2.11.18.17.45     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                                    | 2621  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17       |
| 2623 |  | 1.1.2.2.11.18.17.45     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                              | 2622  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17       |
| 2624 |  | 1.1.2.2.11.18.17.45     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                                      | 2623  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17       |
| 2625 |  | 1.1.2.2.11.18.17.45     | Contrato Suscrito                                                                                                                               | 2624  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17       |
| 2626 |  | 1.1.2.2.11.18.17.45     | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                                       | 2625  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17       |
| 2627 |  | 1.1.2.2.11.18.17.45     | Pago de anticipo 20%                                                                                                                            | 2626  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17       |
| 2628 |  | <b>1.1.2.2.11.18.18</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                                     |       |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Wed 2/14/18</b> | <b>Thu 4/5/18</b>  |
| 2629 |  | 1.1.2.2.11.18.18.10     | Pago Planilla 1_35%                                                                                                                             | 2605  |                                |           | 0 days          | Wed 2/14/18        | Wed 2/14/18        |
| 2630 |  | 1.1.2.2.11.18.18.10     | Pago Planilla 2_35%                                                                                                                             | 2606  |                                |           | 0 days          | Fri 3/23/18        | Fri 3/23/18        |
| 2631 |  | 1.1.2.2.11.18.18.10     | Pago Planilla Final_10%                                                                                                                         | 2612  |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18         | Thu 4/5/18         |
| 2632 |  | <b>1.1.2.2.12</b>       | <b>CNEL EP-UN Santo Domingo Repotenciamiento del sistema de distribución (interconexión a 13.8kV entre alimentadores Chone y Maicito)</b>       |       | <b>1</b>                       |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b> |
| 2633 |  | <b>1.1.2.2.12.19</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN Santo Domingo Repotenciamiento del sistema de distribución (interconexión a 13.8kV entre alimentadores Chone y Maicito)</b> |       |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b> |
| 2634 |  | <b>1.1.2.2.12.19.37</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                                                               |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Mon 5/15/17</b> |
| 2635 |  | 1.1.2.2.12.19.37.14     | Designar Comisión Técnica                                                                                                                       |       |                                |           | 2 days          | Mon 1/2/17         | Tue 1/3/17         |
| 2636 |  | 1.1.2.2.12.19.37.14     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                                                  | 2635  |                                |           | 2 days          | Wed 1/4/17         | Thu 1/5/17         |
| 2637 |  | 1.1.2.2.12.19.37.14     | No objeción DDLs                                                                                                                                | 2636  |                                |           | 0 days          | Thu 1/5/17         | Thu 1/5/17         |
| 2638 |  | 1.1.2.2.12.19.37.14     | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                                 | 2637  |                                |           | 2 days          | Fri 1/6/17         | Mon 1/9/17         |
| 2639 |  | 1.1.2.2.12.19.37.14     | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                                                   | 2638  |                                |           | 1 day           | Tue 1/10/17        | Tue 1/10/17        |
| 2640 |  | 1.1.2.2.12.19.37.14     | Presentar de ofertas                                                                                                                            | 2639  |                                |           | 30 days         | Wed 1/11/17        | Tue 2/21/17        |
| 2641 |  | 1.1.2.2.12.19.37.14     | Acta de apertura de ofertas                                                                                                                     | 2640  |                                |           | 0 days          | Tue 2/21/17        | Tue 2/21/17        |
| 2642 |  | 1.1.2.2.12.19.37.14     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                                    | 2641  |                                |           | 10 days         | Wed 2/22/17        | Thu 3/9/17         |
| 2643 |  | 1.1.2.2.12.19.37.14     | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                                                       | 2642  |                                |           | 0 days          | Thu 3/9/17         | Thu 3/9/17         |
| 2644 |  | 1.1.2.2.12.19.37.15     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                              | 2643  |                                |           | 2 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/13/17        |
| 2645 |  | 1.1.2.2.12.19.37.15     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                                      | 2644  |                                |           | 20 days         | Tue 3/14/17        | Mon 4/10/17        |
| 2646 |  | 1.1.2.2.12.19.37.15     | Contrato Suscrito                                                                                                                               | 2645  |                                |           | 0 days          | Mon 4/10/17        | Mon 4/10/17        |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                        | Nombre de tarea                                                                                                                                         | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 2647 |    | 1.1.2.2.12.19.37.15        | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                                               | 2646        |                                |           | 5 days          | Tue 4/11/17        | Tue 4/18/17        |
| 2648 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.37.15        | Pago de anticipo 50%                                                                                                                                    | 2647        |                                |           | 0 days          | Tue 4/18/17        | Tue 4/18/17        |
| 2649 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.12.19.38</b>    | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                                                                | <b>2648</b> |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/20/17</b> |
| 2650 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.12.19.38.11</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                                                     |             |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Wed 4/19/17</b> | <b>Wed 9/20/17</b> |
| 2651 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.38.11        | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                                                   | 2648        |                                |           | 30 days         | Wed 4/19/17        | Wed 5/31/17        |
| 2652 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.38.11        | Replanteo                                                                                                                                               | 2651        |                                |           | 15 days         | Thu 6/1/17         | Wed 6/21/17        |
| 2653 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.38.11        | Obras Civiles                                                                                                                                           | 2652        |                                |           | 15 days         | Thu 6/22/17        | Wed 7/12/17        |
| 2654 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.38.11        | Montaje Electromecánico                                                                                                                                 | 2653        |                                |           | 15 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/2/17         |
| 2655 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.38.11        | Tendido de Conductores                                                                                                                                  | 2653        |                                |           | 15 days         | Thu 7/13/17        | Wed 8/2/17         |
| 2656 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.38.11        | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                                                        | 2655        |                                |           | 15 days         | Thu 8/3/17         | Thu 8/24/17        |
| 2657 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.38.11        | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                                                            | 2656        |                                |           | 10 days         | Fri 8/25/17        | Thu 9/7/17         |
| 2658 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.38.11        | Energizar redes                                                                                                                                         | 2657        |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17        |
| 2659 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.38.11        | Pruebas                                                                                                                                                 | 2658        |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17        |
| 2660 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.38.11        | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                                                           | 2659        |                                |           | 0 days          | Wed 9/20/17        | Wed 9/20/17        |
| 2661 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.12.19.39</b>    | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                                             |             |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Thu 8/3/17</b>  | <b>Mon 9/18/17</b> |
| 2662 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.39.21        | Pago Planilla 1_20%                                                                                                                                     | 2655        |                                |           | 5 days          | Thu 8/3/17         | Wed 8/9/17         |
| 2663 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.39.22        | Pago Planilla 2_20%                                                                                                                                     | 2658        |                                |           | 5 days          | Tue 9/12/17        | Mon 9/18/17        |
| 2664 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.12.19.40</b>    | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                                             |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Thu 9/21/17</b> | <b>Thu 9/28/17</b> |
| 2665 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.40.51        | Registro Contable                                                                                                                                       | 2659        |                                |           | 2 days          | Thu 9/21/17        | Fri 9/22/17        |
| 2666 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.40.52        | Liquidación Técnica Contable                                                                                                                            | 2665        |                                |           | 3 days          | Mon 9/25/17        | Wed 9/27/17        |
| 2667 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.40.53        | Registro de Activos                                                                                                                                     | 2666        |                                |           | 1 day           | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17        |
| 2668 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.40.54        | Acta de Entrega Recepción                                                                                                                               | 2667        |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17        |
| 2669 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.19.40.55        | Pago Planilla final 10%                                                                                                                                 | 2668        |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17        | Thu 9/28/17        |
| 2670 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.12.20</b>       | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Santo Domingo Repotenciamiento del sistema de distribución (interconexión a 13.8kV entre alimentadores Chone y Maicito)</b> |             |                                |           | <b>148 days</b> | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Thu 9/28/17</b> |
| 2671 |                                                                                     | <b>1.1.2.2.12.20.19</b>    | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                                            |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Thu 3/2/17</b>  | <b>Wed 5/17/17</b> |
| 2672 |  | 1.1.2.2.12.20.19.45        | Designar Comisión Técnica                                                                                                                               |             |                                |           | 2 days          | Thu 3/2/17         | Fri 3/3/17         |
| 2673 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.20.19.45        | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                                        | 2672        |                                |           | 2 days          | Mon 3/6/17         | Tue 3/7/17         |
| 2674 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.20.19.45        | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                                         | 2673        |                                |           | 2 days          | Wed 3/8/17         | Thu 3/9/17         |
| 2675 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.20.19.45        | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                                                       | 2674        |                                |           | 7 days          | Fri 3/10/17        | Mon 3/20/17        |
| 2676 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.20.19.46        | Conformación de Lista Corta                                                                                                                             | 2675        |                                |           | 3 days          | Tue 3/21/17        | Thu 3/23/17        |
| 2677 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.20.19.46        | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                                                    | 2676        |                                |           | 1 day           | Fri 3/24/17        | Fri 3/24/17        |
| 2678 |                                                                                     | 1.1.2.2.12.20.19.46        | Elaborar ofertas                                                                                                                                        | 2677        |                                |           | 7 days          | Mon 3/27/17        | Tue 4/4/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                     | Nombre de tarea                                                                              | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 2679 |  | 1.1.2.2.12.20.19.46     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                 | 2678        |                                |           | 2 days          | Wed 4/5/17          | Thu 4/6/17          |
| 2680 |  | 1.1.2.2.12.20.19.46     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                           | 2679        |                                |           | 2 days          | Fri 4/7/17          | Mon 4/10/17         |
| 2681 |  | 1.1.2.2.12.20.19.46     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                   | 2680        |                                |           | 20 days         | Tue 4/11/17         | Wed 5/10/17         |
| 2682 |  | 1.1.2.2.12.20.19.46     | Contrato Suscrito                                                                            | 2681        |                                |           | 0 days          | Wed 5/10/17         | Wed 5/10/17         |
| 2683 |  | 1.1.2.2.12.20.19.46     | Trámitar y pagar anticipo                                                                    | 2682        |                                |           | 5 days          | Thu 5/11/17         | Wed 5/17/17         |
| 2684 |  | 1.1.2.2.12.20.19.46     | Pago de anticipo 20%                                                                         | 2683        |                                |           | 0 days          | Wed 5/17/17         | Wed 5/17/17         |
| 2685 |  | <b>1.1.2.2.12.20.20</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                  |             |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Wed 8/9/17</b>   | <b>Thu 9/28/17</b>  |
| 2686 |  | 1.1.2.2.12.20.20.10     | Pago Planilla 1_35%                                                                          | 2662        |                                |           | 0 days          | Wed 8/9/17          | Wed 8/9/17          |
| 2687 |  | 1.1.2.2.12.20.20.11     | Pago Planilla 2_35%                                                                          | 2663        |                                |           | 0 days          | Mon 9/18/17         | Mon 9/18/17         |
| 2688 |  | 1.1.2.2.12.20.20.11     | Pago Planilla Final_10%                                                                      | 2669        |                                |           | 0 days          | Thu 9/28/17         | Thu 9/28/17         |
| 2689 |  | <b>1.1.2.5</b>          | <b>CNEL EP- UN Esmeraldas 6 Proyectos de Distribución fiscalizados y energizados</b>         |             | <b>6</b>                       |           | <b>279 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 8/13/18</b>  |
| 2690 |  | <b>1.1.2.5.14</b>       | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de redes aéreas en zona centro de Shamanga</b>       |             | <b>1</b>                       |           | <b>229 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 6/4/18</b>   |
| 2691 |  | <b>1.1.2.5.14.3</b>     | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de redes aéreas en zona centro de Shamanga</b> |             |                                |           | <b>229 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 6/4/18</b>   |
| 2692 |  | <b>1.1.2.5.14.3.5</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                           |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 2693 |  | 1.1.2.5.14.3.5.29       | Designar Comisión Técnica                                                                    |             |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 2694 |  | 1.1.2.5.14.3.5.30       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                               | 2693        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 2695 |  | 1.1.2.5.14.3.5.31       | No objeción DDLs                                                                             | 2694        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 2696 |  | 1.1.2.5.14.3.5.32       | Resolución de Inicio de proceso                                                              | 2695        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 2697 |  | 1.1.2.5.14.3.5.33       | Publicar convocatoria prensa nacional y/o Compras Públicas                                   | 2696        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 2698 |  | 1.1.2.5.14.3.5.34       | Presentar de ofertas                                                                         | 2697        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 2699 |  | 1.1.2.5.14.3.5.35       | Acta de apertura de ofertas                                                                  | 2698        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 2700 |  | 1.1.2.5.14.3.5.36       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                 | 2699        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 2701 |  | 1.1.2.5.14.3.5.37       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                    | 2700        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 2702 |  | 1.1.2.5.14.3.5.38       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                           | 2701        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 2703 |  | 1.1.2.5.14.3.5.39       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                   | 2702        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 2704 |  | 1.1.2.5.14.3.5.40       | Contrato Suscrito                                                                            | 2703        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 2705 |  | 1.1.2.5.14.3.5.41       | Trámitar y pagar anticipo                                                                    | 2704        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 2706 |  | 1.1.2.5.14.3.5.42       | Pago de anticipo 50%                                                                         | 2705        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 2707 |  | <b>1.1.2.5.14.3.6</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                     | <b>2706</b> |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Thu 5/24/18</b>  |
| 2708 |  | <b>1.1.2.5.14.3.6.3</b> | <b>Construcción</b>                                                                          |             |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Thu 5/24/18</b>  |
| 2709 |  | 1.1.2.5.14.3.6.3.21     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                        | 2706        |                                |           | 40 days         | Tue 10/17/17        | Thu 12/14/17        |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                   | Nombre de tarea                                                                                      | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| 2710 |  | 1.1.2.5.14.3.6.3.22   | Replanteo                                                                                            | 2709  |                                |           | 20 days         | Fri 12/15/17       | Mon 1/15/18         |  |
| 2711 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.6.3.23   | Obras Civiles                                                                                        | 2710  |                                |           | 30 days         | Tue 1/16/18        | Wed 2/28/18         |  |
| 2712 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.6.3.24   | Montaje Electromecánico                                                                              | 2711  |                                |           | 30 days         | Thu 3/1/18         | Thu 4/12/18         |  |
| 2713 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.6.3.25   | Tendido de Conductores                                                                               | 2711  |                                |           | 20 days         | Thu 3/1/18         | Wed 3/28/18         |  |
| 2714 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.6.3.26   | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                     | 2713  |                                |           | 20 days         | Thu 3/29/18        | Thu 4/26/18         |  |
| 2715 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.6.3.27   | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                         | 2714  |                                |           | 10 days         | Fri 4/27/18        | Fri 5/11/18         |  |
| 2716 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.6.3.28   | Energizar redes                                                                                      | 2715  |                                |           | 2 days          | Mon 5/14/18        | Tue 5/15/18         |  |
| 2717 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.6.3.29   | Pruebas                                                                                              | 2716  |                                |           | 7 days          | Wed 5/16/18        | Thu 5/24/18         |  |
| 2718 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.6.3.30   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                        | 2717  |                                |           | 0 days          | Thu 5/24/18        | Thu 5/24/18         |  |
| 2719 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.14.3.7</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                          |       |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Thu 3/29/18</b> | <b>Tue 5/22/18</b>  |  |
| 2720 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.7.5      | Pago Planilla 1_20%                                                                                  | 2713  |                                |           | 5 days          | Thu 3/29/18        | Thu 4/5/18          |  |
| 2721 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.7.6      | Pago Planilla 2_20%                                                                                  | 2716  |                                |           | 5 days          | Wed 5/16/18        | Tue 5/22/18         |  |
| 2722 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.14.3.8</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                          |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 5/28/18</b> | <b>Mon 6/4/18</b>   |  |
| 2723 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.8.11     | Registro Contable                                                                                    | 2717  |                                |           | 2 days          | Mon 5/28/18        | Tue 5/29/18         |  |
| 2724 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.8.12     | Liquidación Técnica Contable                                                                         | 2723  |                                |           | 3 days          | Wed 5/30/18        | Fri 6/1/18          |  |
| 2725 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.8.13     | Registro de Activos                                                                                  | 2724  |                                |           | 1 day           | Mon 6/4/18         | Mon 6/4/18          |  |
| 2726 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.8.14     | Acta de Entrega Recepción                                                                            | 2725  |                                |           | 0 days          | Mon 6/4/18         | Mon 6/4/18          |  |
| 2727 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.3.8.15     | Pago Planilla final 10%                                                                              | 2726  |                                |           | 0 days          | Mon 6/4/18         | Mon 6/4/18          |  |
| 2728 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.14.4</b>   | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de redes aéreas en zona centro de Shamanga</b> |       |                                |           | <b>185 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 6/4/18</b>   |  |
| 2729 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.14.4.3</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                         |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 2730 |  | 1.1.2.5.14.4.3.339    | Designar Comisión Técnica                                                                            |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |  |
| 2731 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.340    | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                     | 2730  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |  |
| 2732 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.341    | Resolución de Inicio de proceso                                                                      | 2731  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |  |
| 2733 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.342    | Convocar a Expresiones de Interés                                                                    | 2732  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |  |
| 2734 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.343    | Conformación de Lista Corta                                                                          | 2733  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |  |
| 2735 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.344    | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                 | 2734  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |  |
| 2736 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.345    | Elaborar ofertas                                                                                     | 2735  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |  |
| 2737 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.346    | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                         | 2736  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |  |
| 2738 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.347    | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                   | 2737  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |  |
| 2739 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.348    | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                           | 2738  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 2740 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.349    | Contrato Suscrito                                                                                    | 2739  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 2741 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.350    | Trámitar y pagar anticipo                                                                            | 2740  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 2742 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.3.351    | Pago de anticipo 20%                                                                                 | 2741  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                      | Nombre de tarea                                                                              | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 2743 |  | <b>1.1.2.5.14.4.4</b>    | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                  |             |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   | <b>Mon 6/4/18</b>   |
| 2744 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.4.82        | Pago Planilla 1_35%                                                                          | 2720        |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |
| 2745 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.4.83        | Pago Planilla 2_35%                                                                          | 2721        |                                |           | 0 days          | Tue 5/22/18         | Tue 5/22/18         |
| 2746 |                                                                                   | 1.1.2.5.14.4.4.84        | Pago Planilla Final_10%                                                                      | 2727        |                                |           | 0 days          | Mon 6/4/18          | Mon 6/4/18          |
| 2747 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.26</b>        | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de redes aéreas en zona centro de Mompiche</b>       |             | <b>1</b>                       |           | <b>229 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 6/4/18</b>   |
| 2748 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.26.5</b>      | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de redes aéreas en zona centro de Mompiche</b> |             |                                |           | <b>229 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 6/4/18</b>   |
| 2749 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.26.5.9</b>    | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                            |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 2750 |  | 1.1.2.5.26.5.9.43        | Designar Comisión Técnica                                                                    |             |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 2751 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.44        | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                               | 2750        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 2752 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.45        | No objeción DDLs                                                                             | 2751        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 2753 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.46        | Resolución de Inicio de proceso                                                              | 2752        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 2754 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.47        | Publicar convocatoria prensa nacional y/o Compras Públicas                                   | 2753        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 2755 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.48        | Presentar de ofertas                                                                         | 2754        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 2756 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.49        | Acta de apertura de ofertas                                                                  | 2755        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 2757 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.50        | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                 | 2756        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 2758 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.51        | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                    | 2757        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 2759 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.52        | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                           | 2758        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 2760 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.53        | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                   | 2759        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 2761 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.54        | Contrato Suscrito                                                                            | 2760        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 2762 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.55        | Trámitar y pagar anticipo                                                                    | 2761        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 2763 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.9.56        | Pago de anticipo 50%                                                                         | 2762        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 2764 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.26.5.10</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                     | <b>2763</b> |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Thu 5/24/18</b>  |
| 2765 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.26.5.10.4</b> | <b>Construcción</b>                                                                          |             |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Thu 5/24/18</b>  |
| 2766 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.10.4.31     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                        | 2763        |                                |           | 40 days         | Tue 10/17/17        | Thu 12/14/17        |
| 2767 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.10.4.32     | Replanteo                                                                                    | 2766        |                                |           | 20 days         | Fri 12/15/17        | Mon 1/15/18         |
| 2768 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.10.4.33     | Obras Civiles                                                                                | 2767        |                                |           | 30 days         | Tue 1/16/18         | Wed 2/28/18         |
| 2769 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.10.4.34     | Montaje Electromecánico                                                                      | 2768        |                                |           | 30 days         | Thu 3/1/18          | Thu 4/12/18         |
| 2770 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.10.4.35     | Tendido de Conductores                                                                       | 2768        |                                |           | 20 days         | Thu 3/1/18          | Wed 3/28/18         |
| 2771 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.10.4.36     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                             | 2770        |                                |           | 20 days         | Thu 3/29/18         | Thu 4/26/18         |
| 2772 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.10.4.37     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                 | 2771        |                                |           | 10 days         | Fri 4/27/18         | Fri 5/11/18         |
| 2773 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.10.4.38     | Energizar redes                                                                              | 2772        |                                |           | 2 days          | Mon 5/14/18         | Tue 5/15/18         |
| 2774 |                                                                                   | 1.1.2.5.26.5.10.4.39     | Pruebas                                                                                      | 2773        |                                |           | 7 days          | Wed 5/16/18         | Thu 5/24/18         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |  | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                      | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |  |
|------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| 2775 |  | 1.1.2.5.26.5.10.4.40   | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                        | 2774  |                                |           | 0 days          | Thu 5/24/18        | Thu 5/24/18         |  |
| 2776 |  | <b>1.1.2.5.26.5.11</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                          |       |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Thu 3/29/18</b> | <b>Tue 5/22/18</b>  |  |
| 2777 |  | 1.1.2.5.26.5.11.7      | Pago Planilla 1_20%                                                                                  | 2770  |                                |           | 5 days          | Thu 3/29/18        | Thu 4/5/18          |  |
| 2778 |  | 1.1.2.5.26.5.11.8      | Pago Planilla 2_20%                                                                                  | 2773  |                                |           | 5 days          | Wed 5/16/18        | Tue 5/22/18         |  |
| 2779 |  | <b>1.1.2.5.26.5.12</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                          |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 5/28/18</b> | <b>Mon 6/4/18</b>   |  |
| 2780 |  | 1.1.2.5.26.5.12.16     | Registro Contable                                                                                    | 2774  |                                |           | 2 days          | Mon 5/28/18        | Tue 5/29/18         |  |
| 2781 |  | 1.1.2.5.26.5.12.17     | Liquidación Técnica Contable                                                                         | 2780  |                                |           | 3 days          | Wed 5/30/18        | Fri 6/1/18          |  |
| 2782 |  | 1.1.2.5.26.5.12.18     | Registro de Activos                                                                                  | 2781  |                                |           | 1 day           | Mon 6/4/18         | Mon 6/4/18          |  |
| 2783 |  | 1.1.2.5.26.5.12.19     | Acta de Entrega Recepción                                                                            | 2782  |                                |           | 0 days          | Mon 6/4/18         | Mon 6/4/18          |  |
| 2784 |  | 1.1.2.5.26.5.12.20     | Pago Planilla final 10%                                                                              | 2783  |                                |           | 0 days          | Mon 6/4/18         | Mon 6/4/18          |  |
| 2785 |  | <b>1.1.2.5.26.6</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de redes aéreas en zona centro de Mompiche</b> |       |                                |           | <b>185 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 6/4/18</b>   |  |
| 2786 |  | <b>1.1.2.5.26.6.5</b>  | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                         |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 2787 |  | 1.1.2.5.26.6.5.352     | Designar Comisión Técnica                                                                            |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |  |
| 2788 |  | 1.1.2.5.26.6.5.353     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                     | 2787  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |  |
| 2789 |  | 1.1.2.5.26.6.5.354     | Resolución de Inicio de proceso                                                                      | 2788  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |  |
| 2790 |  | 1.1.2.5.26.6.5.355     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                    | 2789  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |  |
| 2791 |  | 1.1.2.5.26.6.5.356     | Conformación de Lista Corta                                                                          | 2790  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |  |
| 2792 |  | 1.1.2.5.26.6.5.357     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                 | 2791  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |  |
| 2793 |  | 1.1.2.5.26.6.5.358     | Elaborar ofertas                                                                                     | 2792  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |  |
| 2794 |  | 1.1.2.5.26.6.5.359     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                         | 2793  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |  |
| 2795 |  | 1.1.2.5.26.6.5.360     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                   | 2794  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |  |
| 2796 |  | 1.1.2.5.26.6.5.361     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                           | 2795  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 2797 |  | 1.1.2.5.26.6.5.362     | Contrato Suscrito                                                                                    | 2796  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 2798 |  | 1.1.2.5.26.6.5.363     | Trámite y pagar anticipo                                                                             | 2797  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 2799 |  | 1.1.2.5.26.6.5.364     | Pago de anticipo 20%                                                                                 | 2798  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 2800 |  | <b>1.1.2.5.26.6.6</b>  | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                          |       |                                |           | <b>40 days</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>  | <b>Mon 6/4/18</b>   |  |
| 2801 |  | 1.1.2.5.26.6.6.85      | Pago Planilla 1_35%                                                                                  | 2777  |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18         | Thu 4/5/18          |  |
| 2802 |  | 1.1.2.5.26.6.6.86      | Pago Planilla 2_35%                                                                                  | 2778  |                                |           | 0 days          | Tue 5/22/18        | Tue 5/22/18         |  |
| 2803 |  | 1.1.2.5.26.6.6.87      | Pago Planilla Final_10%                                                                              | 2784  |                                |           | 0 days          | Mon 6/4/18         | Mon 6/4/18          |  |
| 2804 |  | <b>1.1.2.5.27</b>      | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de redes aéreas en zona centro de Muisne</b>                 |       | <b>1</b>                       |           | <b>229 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 6/4/18</b>   |  |
| 2805 |  | <b>1.1.2.5.27.5</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de redes aéreas en zona centro de Muisne</b>           |       |                                |           | <b>229 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 6/4/18</b>   |  |
| 2806 |  | <b>1.1.2.5.27.5.9</b>  | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                   |       |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>  | <b>Mon 11/13/17</b> |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                      | Nombre de tarea                                                           | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish             |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|--|
| 2807 |  | 1.1.2.5.27.5.9.43        | Designar Comisión Técnica                                                 |             |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17         |  |
| 2808 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.44        | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                            | 2807        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17         |  |
| 2809 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.45        | No objeción DDLs                                                          | 2808        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17         |  |
| 2810 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.46        | Resolución de Inicio de proceso                                           | 2809        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17        |  |
| 2811 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.47        | Publicar convocatoria prensa nacional y/o Compras Públicas                | 2810        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17        |  |
| 2812 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.48        | Presentar de ofertas                                                      | 2811        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17        |  |
| 2813 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.49        | Acta de apertura de ofertas                                               | 2812        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17        |  |
| 2814 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.50        | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas              | 2813        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17         |  |
| 2815 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.51        | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación | 2814        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17         |  |
| 2816 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.52        | Publicar resultados y notificación de adjudicación                        | 2815        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17         |  |
| 2817 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.53        | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                | 2816        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17        |  |
| 2818 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.54        | Contrato Suscrito                                                         | 2817        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17        |  |
| 2819 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.55        | Trámitar y pagar anticipo                                                 | 2818        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17       |  |
| 2820 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.9.56        | Pago de anticipo 50%                                                      | 2819        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17       |  |
| 2821 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.27.5.10</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                  | <b>2820</b> |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Thu 5/24/18</b> |  |
| 2822 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.27.5.10.4</b> | <b>Construcción</b>                                                       |             |                                |           | <b>149 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Thu 5/24/18</b> |  |
| 2823 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.10.4.31     | Compra y acopio de materiales en Obra                                     | 2820        |                                |           | 40 days         | Tue 10/17/17        | Thu 12/14/17       |  |
| 2824 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.10.4.32     | Replanteo                                                                 | 2823        |                                |           | 20 days         | Fri 12/15/17        | Mon 1/15/18        |  |
| 2825 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.10.4.33     | Obras Civiles                                                             | 2824        |                                |           | 30 days         | Tue 1/16/18         | Wed 2/28/18        |  |
| 2826 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.10.4.34     | Montaje Electromecánico                                                   | 2825        |                                |           | 30 days         | Thu 3/1/18          | Thu 4/12/18        |  |
| 2827 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.10.4.35     | Tendido de Conductores                                                    | 2825        |                                |           | 20 days         | Thu 3/1/18          | Wed 3/28/18        |  |
| 2828 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.10.4.36     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                          | 2827        |                                |           | 20 days         | Thu 3/29/18         | Thu 4/26/18        |  |
| 2829 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.10.4.37     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones              | 2828        |                                |           | 10 days         | Fri 4/27/18         | Fri 5/11/18        |  |
| 2830 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.10.4.38     | Energizar redes                                                           | 2829        |                                |           | 2 days          | Mon 5/14/18         | Tue 5/15/18        |  |
| 2831 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.10.4.39     | Pruebas                                                                   | 2830        |                                |           | 7 days          | Wed 5/16/18         | Thu 5/24/18        |  |
| 2832 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.10.4.40     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                             | 2831        |                                |           | 0 days          | Thu 5/24/18         | Thu 5/24/18        |  |
| 2833 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.27.5.11</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                               |             |                                |           | <b>37 days</b>  | <b>Thu 3/29/18</b>  | <b>Tue 5/22/18</b> |  |
| 2834 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.11.7        | Pago Planilla 1_20%                                                       | 2827        |                                |           | 5 days          | Thu 3/29/18         | Thu 4/5/18         |  |
| 2835 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.11.8        | Pago Planilla 2_20%                                                       | 2830        |                                |           | 5 days          | Wed 5/16/18         | Tue 5/22/18        |  |
| 2836 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.27.5.12</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                               |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 5/28/18</b>  | <b>Mon 6/4/18</b>  |  |
| 2837 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.12.16       | Registro Contable                                                         | 2831        |                                |           | 2 days          | Mon 5/28/18         | Tue 5/29/18        |  |
| 2838 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.12.17       | Liquidación Técnica Contable                                              | 2837        |                                |           | 3 days          | Wed 5/30/18         | Fri 6/1/18         |  |
| 2839 |                                                                                   | 1.1.2.5.27.5.12.18       | Registro de Activos                                                       | 2838        |                                |           | 1 day           | Mon 6/4/18          | Mon 6/4/18         |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                                              | Prede | Meta<br>Matriz<br>Resulti<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start             | Finish              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 2840 |    | 1.1.2.5.27.5.12.19     | Acta de Entrega Recepción                                                                                                    | 2839  |                                 |           | 0 days          | Mon 6/4/18        | Mon 6/4/18          |
| 2841 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.5.12.20     | Pago Planilla final 10%                                                                                                      | 2840  |                                 |           | 0 days          | Mon 6/4/18        | Mon 6/4/18          |
| 2842 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.27.6</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción de redes aéreas en zona centro de Muisne</b>                           |       |                                 |           | <b>185 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b> | <b>Mon 6/4/18</b>   |
| 2843 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.27.6.5</b>  | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                 |       |                                 |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b> | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 2844 |    | 1.1.2.5.27.6.5.352     | Designar Comisión Técnica                                                                                                    |       |                                 |           | 2 days          | Mon 9/4/17        | Tue 9/5/17          |
| 2845 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.353     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                             | 2844  |                                 |           | 2 days          | Wed 9/6/17        | Thu 9/7/17          |
| 2846 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.354     | Resolución de Inicio de proceso                                                                                              | 2845  |                                 |           | 2 days          | Fri 9/8/17        | Mon 9/11/17         |
| 2847 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.355     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                                            | 2846  |                                 |           | 7 days          | Tue 9/12/17       | Wed 9/20/17         |
| 2848 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.356     | Conformación de Lista Corta                                                                                                  | 2847  |                                 |           | 3 days          | Thu 9/21/17       | Mon 9/25/17         |
| 2849 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.357     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                                         | 2848  |                                 |           | 1 day           | Tue 9/26/17       | Tue 9/26/17         |
| 2850 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.358     | Elaborar ofertas                                                                                                             | 2849  |                                 |           | 7 days          | Wed 9/27/17       | Thu 10/5/17         |
| 2851 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.359     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                 | 2850  |                                 |           | 2 days          | Fri 10/6/17       | Tue 10/10/17        |
| 2852 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.360     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                           | 2851  |                                 |           | 2 days          | Wed 10/11/17      | Thu 10/12/17        |
| 2853 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.361     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                   | 2852  |                                 |           | 20 days         | Fri 10/13/17      | Mon 11/13/17        |
| 2854 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.362     | Contrato Suscrito                                                                                                            | 2853  |                                 |           | 0 days          | Mon 11/13/17      | Mon 11/13/17        |
| 2855 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.363     | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                    | 2854  |                                 |           | 5 days          | Tue 11/14/17      | Mon 11/20/17        |
| 2856 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.5.364     | Pago de anticipo 20%                                                                                                         | 2855  |                                 |           | 0 days          | Mon 11/20/17      | Mon 11/20/17        |
| 2857 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.27.6.6</b>  | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                  |       |                                 |           | <b>40 days</b>  | <b>Thu 4/5/18</b> | <b>Mon 6/4/18</b>   |
| 2858 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.6.85      | Pago Planilla 1_35%                                                                                                          | 2834  |                                 |           | 0 days          | Thu 4/5/18        | Thu 4/5/18          |
| 2859 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.6.86      | Pago Planilla 2_35%                                                                                                          | 2835  |                                 |           | 0 days          | Tue 5/22/18       | Tue 5/22/18         |
| 2860 |                                                                                     | 1.1.2.5.27.6.6.87      | Pago Planilla Final_10%                                                                                                      | 2841  |                                 |           | 0 days          | Mon 6/4/18        | Mon 6/4/18          |
| 2861 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.17</b>      | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción y reconfiguración de alimentadores 13.8kV del subsistema El Salto-Atacames</b>       |       | <b>1</b>                        |           | <b>279 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Mon 8/13/18</b>  |
| 2862 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.17.7</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción y reconfiguración de alimentadores 13.8kV del subsistema El Salto-Atacames</b> |       |                                 |           | <b>279 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Mon 8/13/18</b>  |
| 2863 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.17.7.13</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapas Precontractual)</b>                                                                           |       |                                 |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b> | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 2864 |  | 1.1.2.5.17.7.13.57     | Designar Comisión Técnica                                                                                                    |       |                                 |           | 2 days          | Mon 7/3/17        | Tue 7/4/17          |
| 2865 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.58     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                                               | 2864  |                                 |           | 2 days          | Wed 7/5/17        | Thu 7/6/17          |
| 2866 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.59     | No objeción DDLs                                                                                                             | 2865  |                                 |           | 0 days          | Thu 7/6/17        | Thu 7/6/17          |
| 2867 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.60     | Resolución de Inicio de proceso                                                                                              | 2866  |                                 |           | 2 days          | Fri 7/7/17        | Mon 7/10/17         |
| 2868 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.61     | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                                                | 2867  |                                 |           | 1 day           | Tue 7/11/17       | Tue 7/11/17         |
| 2869 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.62     | Presentar de ofertas                                                                                                         | 2868  |                                 |           | 30 days         | Wed 7/12/17       | Wed 8/23/17         |
| 2870 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.63     | Acta de apertura de ofertas                                                                                                  | 2869  |                                 |           | 0 days          | Wed 8/23/17       | Wed 8/23/17         |
| 2871 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.64     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                                                 | 2870  |                                 |           | 10 days         | Thu 8/24/17       | Wed 9/6/17          |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                      | Nombre de tarea                                                                                                                      | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 2872 |    | 1.1.2.5.17.7.13.65       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                                                            | 2871        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 2873 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.66       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                                                   | 2872        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 2874 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.67       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                                                           | 2873        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 2875 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.68       | Contrato Suscrito                                                                                                                    | 2874        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 2876 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.69       | Trámitar y pagar anticipo                                                                                                            | 2875        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 2877 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.13.70       | Pago de anticipo 50%                                                                                                                 | 2876        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 2878 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.17.7.14</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                                                             | <b>2877</b> |                                |           | <b>199 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 8/3/18</b>   |
| 2879 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.17.7.14.5</b> | <b>Construcción</b>                                                                                                                  |             |                                |           | <b>199 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Fri 8/3/18</b>   |
| 2880 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.14.5.41     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                                                                | 2877        |                                |           | 120 days        | Tue 10/17/17        | Thu 4/12/18         |
| 2881 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.14.5.42     | Replanteo                                                                                                                            | 2880        |                                |           | 15 days         | Fri 4/13/18         | Fri 5/4/18          |
| 2882 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.14.5.43     | Obras Civiles                                                                                                                        | 2881        |                                |           | 15 days         | Mon 5/7/18          | Mon 5/28/18         |
| 2883 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.14.5.44     | Montaje Electromecánico                                                                                                              | 2882        |                                |           | 15 days         | Tue 5/29/18         | Mon 6/18/18         |
| 2884 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.14.5.45     | Tendido de Conductores                                                                                                               | 2882        |                                |           | 15 days         | Tue 5/29/18         | Mon 6/18/18         |
| 2885 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.14.5.46     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                                                     | 2884        |                                |           | 15 days         | Tue 6/19/18         | Mon 7/9/18          |
| 2886 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.14.5.47     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                                                         | 2885        |                                |           | 10 days         | Tue 7/10/18         | Mon 7/23/18         |
| 2887 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.14.5.48     | Energizar redes                                                                                                                      | 2886        |                                |           | 2 days          | Tue 7/24/18         | Wed 7/25/18         |
| 2888 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.14.5.49     | Pruebas                                                                                                                              | 2887        |                                |           | 7 days          | Thu 7/26/18         | Fri 8/3/18          |
| 2889 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.14.5.50     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                                                        | 2888        |                                |           | 0 days          | Fri 8/3/18          | Fri 8/3/18          |
| 2890 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.17.7.15</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                                                          |             |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Tue 6/19/18</b>  | <b>Wed 8/1/18</b>   |
| 2891 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.15.9        | Pago Planilla 1_20%                                                                                                                  | 2884        |                                |           | 5 days          | Tue 6/19/18         | Mon 6/25/18         |
| 2892 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.15.10       | Pago Planilla 2_20%                                                                                                                  | 2887        |                                |           | 5 days          | Thu 7/26/18         | Wed 8/1/18          |
| 2893 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.17.7.16</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                                                          |             |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Mon 8/6/18</b>   | <b>Mon 8/13/18</b>  |
| 2894 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.16.21       | Registro Contable                                                                                                                    | 2888        |                                |           | 2 days          | Mon 8/6/18          | Tue 8/7/18          |
| 2895 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.16.22       | Liquidación Técnica Contable                                                                                                         | 2894        |                                |           | 3 days          | Wed 8/8/18          | Fri 8/10/18         |
| 2896 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.16.23       | Registro de Activos                                                                                                                  | 2895        |                                |           | 1 day           | Mon 8/13/18         | Mon 8/13/18         |
| 2897 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.16.24       | Acta de Entrega Recepción                                                                                                            | 2896        |                                |           | 0 days          | Mon 8/13/18         | Mon 8/13/18         |
| 2898 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.7.16.25       | Pago Planilla final 10%                                                                                                              | 2897        |                                |           | 0 days          | Mon 8/13/18         | Mon 8/13/18         |
| 2899 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.17.8</b>      | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reconstrucción y reconfiguración de alimentadores 13.8kV del subsistema El Salto-Atacames</b> |             |                                |           | <b>235 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 8/13/18</b>  |
| 2900 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.17.8.7</b>    | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                                                         |             |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |
| 2901 |  | 1.1.2.5.17.8.7.378       | Designar Comisión Técnica                                                                                                            |             |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |
| 2902 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.8.7.379       | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                                                     | 2901        |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |
| 2903 |                                                                                     | 1.1.2.5.17.8.7.380       | Resolución de Inicio de proceso                                                                                                      | 2902        |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17          | Mon 9/11/17         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                    | Nombre de tarea                                                                                     | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 2904 |  | 1.1.2.5.17.8.7.381     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                   | 2903        |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17         | Wed 9/20/17         |
| 2905 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.7.382     | Conformación de Lista Corta                                                                         | 2904        |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17         | Mon 9/25/17         |
| 2906 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.7.383     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                | 2905        |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17         | Tue 9/26/17         |
| 2907 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.7.384     | Elaborar ofertas                                                                                    | 2906        |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17         | Thu 10/5/17         |
| 2908 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.7.385     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                        | 2907        |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17         | Tue 10/10/17        |
| 2909 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.7.386     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                  | 2908        |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17        | Thu 10/12/17        |
| 2910 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.7.387     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                          | 2909        |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 2911 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.7.388     | Contrato Suscrito                                                                                   | 2910        |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17        | Mon 11/13/17        |
| 2912 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.7.389     | Trámitar y pagar anticipo                                                                           | 2911        |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17        | Mon 11/20/17        |
| 2913 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.7.390     | Pago de anticipo 20%                                                                                | 2912        |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17        | Mon 11/20/17        |
| 2914 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.17.8.8</b>  | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                         |             |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Mon 6/25/18</b>  | <b>Mon 8/13/18</b>  |
| 2915 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.8.91      | Pago Planilla 1_35%                                                                                 | 2891        |                                |           | 0 days          | Mon 6/25/18         | Mon 6/25/18         |
| 2916 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.8.92      | Pago Planilla 2_35%                                                                                 | 2892        |                                |           | 0 days          | Wed 8/1/18          | Wed 8/1/18          |
| 2917 |                                                                                   | 1.1.2.5.17.8.8.93      | Pago Planilla Final_10%                                                                             | 2898        |                                |           | 0 days          | Mon 8/13/18         | Mon 8/13/18         |
| 2918 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.18</b>      | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reforzamiento sistema de distribución Borbón-Cacagual</b>                  |             | <b>1</b>                       |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2919 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.18.9</b>    | <b>OBRAS CNEL EP-UN CNEL EP-UN Esmeraldas Reforzamiento sistema de distribución Borbón-Cacagual</b> |             |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2920 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.18.9.17</b> | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                                   |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 2921 |  | 1.1.2.5.18.9.17.71     | Designar Comisión Técnica                                                                           |             |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 2922 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.72     | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                                      | 2921        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 2923 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.73     | No objeción DDLs                                                                                    | 2922        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 2924 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.74     | Resolución de Inicio de proceso                                                                     | 2923        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 2925 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.75     | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                                       | 2924        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 2926 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.76     | Presentar de ofertas                                                                                | 2925        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 2927 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.77     | Acta de apertura de ofertas                                                                         | 2926        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 2928 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.78     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                        | 2927        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 2929 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.79     | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                           | 2928        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 2930 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.80     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                  | 2929        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 2931 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.81     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                          | 2930        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 2932 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.82     | Contrato Suscrito                                                                                   | 2931        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 2933 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.83     | Trámitar y pagar anticipo                                                                           | 2932        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 2934 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.9.17.84     | Pago de anticipo 50%                                                                                | 2933        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 2935 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.18.9.18</b> | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                            | <b>2934</b> |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/27/18</b>  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                      | Nombre de tarea                                                                                  | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| 2936 |    | <b>1.1.2.5.18.9.18.6</b> | <b>Construcción</b>                                                                              |       |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/27/18</b>  |  |
| 2937 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.18.6.51     | Compra y acopio de materiales en Obra                                                            | 2934  |                                |           | 30 days         | Tue 10/17/17        | Wed 11/29/17        |  |
| 2938 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.18.6.52     | Replanteo                                                                                        | 2937  |                                |           | 15 days         | Thu 11/30/17        | Thu 12/21/17        |  |
| 2939 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.18.6.53     | Obras Civiles                                                                                    | 2938  |                                |           | 15 days         | Fri 12/22/17        | Mon 1/15/18         |  |
| 2940 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.18.6.54     | Montaje Electromecánico                                                                          | 2939  |                                |           | 15 days         | Tue 1/16/18         | Mon 2/5/18          |  |
| 2941 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.18.6.55     | Tendido de Conductores                                                                           | 2939  |                                |           | 15 days         | Tue 1/16/18         | Mon 2/5/18          |  |
| 2942 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.18.6.56     | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                                 | 2941  |                                |           | 15 days         | Tue 2/6/18          | Wed 2/28/18         |  |
| 2943 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.18.6.57     | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                     | 2942  |                                |           | 10 days         | Thu 3/1/18          | Wed 3/14/18         |  |
| 2944 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.18.6.58     | Energizar redes                                                                                  | 2943  |                                |           | 2 days          | Thu 3/15/18         | Fri 3/16/18         |  |
| 2945 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.18.6.59     | Pruebas                                                                                          | 2944  |                                |           | 7 days          | Mon 3/19/18         | Tue 3/27/18         |  |
| 2946 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.18.6.60     | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                    | 2945  |                                |           | 0 days          | Tue 3/27/18         | Tue 3/27/18         |  |
| 2947 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.18.9.19</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                      |       |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Tue 2/6/18</b>   | <b>Fri 3/23/18</b>  |  |
| 2948 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.19.11       | Pago Planilla 1_20%                                                                              | 2941  |                                |           | 5 days          | Tue 2/6/18          | Wed 2/14/18         |  |
| 2949 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.19.12       | Pago Planilla 2_20%                                                                              | 2944  |                                |           | 5 days          | Mon 3/19/18         | Fri 3/23/18         |  |
| 2950 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.18.9.20</b>   | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                      |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Wed 3/28/18</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   |  |
| 2951 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.20.26       | Registro Contable                                                                                | 2945  |                                |           | 2 days          | Wed 3/28/18         | Thu 3/29/18         |  |
| 2952 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.20.27       | Liquidación Técnica Contable                                                                     | 2951  |                                |           | 3 days          | Mon 4/2/18          | Wed 4/4/18          |  |
| 2953 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.20.28       | Registro de Activos                                                                              | 2952  |                                |           | 1 day           | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |  |
| 2954 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.20.29       | Acta de Entrega Recepción                                                                        | 2953  |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |  |
| 2955 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.9.20.30       | Pago Planilla final 10%                                                                          | 2954  |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |  |
| 2956 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.18.10</b>     | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reforzamiento sistema de distribución Borbón-Cacagual</b> |       |                                |           | <b>145 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Thu 4/5/18</b>   |  |
| 2957 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.18.10.9</b>   | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                     |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>   | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 2958 |  | 1.1.2.5.18.10.9.391      | Designar Comisión Técnica                                                                        |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17          | Tue 9/5/17          |  |
| 2959 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.10.9.392      | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                 | 2958  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17          | Thu 9/7/17          |  |
| 2960 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.10.9.393      | Resolución de Inicio de proceso                                                                  | 2959  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17          | Mon 9/11/17         |  |
| 2961 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.10.9.394      | Convocar a Expresiones de Interés                                                                | 2960  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17         | Wed 9/20/17         |  |
| 2962 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.10.9.395      | Conformación de Lista Corta                                                                      | 2961  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17         | Mon 9/25/17         |  |
| 2963 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.10.9.396      | Invitación a empresas de Lista Corta                                                             | 2962  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17         | Tue 9/26/17         |  |
| 2964 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.10.9.397      | Elaborar ofertas                                                                                 | 2963  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17         | Thu 10/5/17         |  |
| 2965 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.10.9.398      | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                     | 2964  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17         | Tue 10/10/17        |  |
| 2966 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.10.9.399      | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                               | 2965  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17        | Thu 10/12/17        |  |
| 2967 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.10.9.400      | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                       | 2966  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17        | Mon 11/13/17        |  |
| 2968 |                                                                                     | 1.1.2.5.18.10.9.401      | Contrato Suscrito                                                                                | 2967  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17        | Mon 11/13/17        |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS                       | Nombre de tarea                                                                             | Prede       | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start               | Finish              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 2969 |  | 1.1.2.5.18.10.9.402       | Trámitar y pagar anticipo                                                                   | 2968        |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17        | Mon 11/20/17        |
| 2970 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.10.9.403       | Pago de anticipo 20%                                                                        | 2969        |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17        | Mon 11/20/17        |
| 2971 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.18.10.10</b>   | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                 |             |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Wed 2/14/18</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2972 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.10.10.94       | Pago Planilla 1_35%                                                                         | 2948        |                                |           | 0 days          | Wed 2/14/18         | Wed 2/14/18         |
| 2973 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.10.10.95       | Pago Planilla 2_35%                                                                         | 2949        |                                |           | 0 days          | Fri 3/23/18         | Fri 3/23/18         |
| 2974 |                                                                                   | 1.1.2.5.18.10.10.96       | Pago Planilla Final_10%                                                                     | 2955        |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18          | Thu 4/5/18          |
| 2975 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.19</b>         | <b>CNEL EP-UN Esmeraldas Reforzamiento sistema de distribución Rocafuerte-Lagarto</b>       |             | <b>1</b>                       |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2976 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.19.11</b>      | <b>OBRAS CNEL EP-UN Esmeraldas Reforzamiento sistema de distribución Rocafuerte-Lagarto</b> |             |                                |           | <b>189 days</b> | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Thu 4/5/18</b>   |
| 2977 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.19.11.21</b>   | <b>Proyecto Contratado (Etapa Precontractual)</b>                                           |             |                                |           | <b>92 days</b>  | <b>Mon 7/3/17</b>   | <b>Mon 11/13/17</b> |
| 2978 |  | 1.1.2.5.19.11.21.85       | Designar Comisión Técnica                                                                   |             |                                |           | 2 days          | Mon 7/3/17          | Tue 7/4/17          |
| 2979 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.86       | Aprobar Documento de Licitación DDLs (Pliegos)                                              | 2978        |                                |           | 2 days          | Wed 7/5/17          | Thu 7/6/17          |
| 2980 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.87       | No objeción DDLs                                                                            | 2979        |                                |           | 0 days          | Thu 7/6/17          | Thu 7/6/17          |
| 2981 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.88       | Resolución de Inicio de proceso                                                             | 2980        |                                |           | 2 days          | Fri 7/7/17          | Mon 7/10/17         |
| 2982 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.89       | Publicar convocatoria en prensa nacional y/o Compras Públicas                               | 2981        |                                |           | 1 day           | Tue 7/11/17         | Tue 7/11/17         |
| 2983 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.90       | Presentar de ofertas                                                                        | 2982        |                                |           | 30 days         | Wed 7/12/17         | Wed 8/23/17         |
| 2984 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.91       | Acta de apertura de ofertas                                                                 | 2983        |                                |           | 0 days          | Wed 8/23/17         | Wed 8/23/17         |
| 2985 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.92       | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                | 2984        |                                |           | 10 days         | Thu 8/24/17         | Wed 9/6/17          |
| 2986 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.93       | Solicitud de No Objeción al Informe Final y recomendación de adjudicación                   | 2985        |                                |           | 0 days          | Wed 9/6/17          | Wed 9/6/17          |
| 2987 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.94       | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                          | 2986        |                                |           | 2 days          | Thu 9/7/17          | Fri 9/8/17          |
| 2988 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.95       | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                  | 2987        |                                |           | 20 days         | Mon 9/11/17         | Fri 10/6/17         |
| 2989 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.96       | Contrato Suscrito                                                                           | 2988        |                                |           | 0 days          | Fri 10/6/17         | Fri 10/6/17         |
| 2990 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.97       | Trámitar y pagar anticipo                                                                   | 2989        |                                |           | 5 days          | Tue 10/10/17        | Mon 10/16/17        |
| 2991 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.21.98       | Pago de anticipo 50%                                                                        | 2990        |                                |           | 0 days          | Mon 10/16/17        | Mon 10/16/17        |
| 2992 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.19.11.22</b>   | <b>Ejecución de Obra</b>                                                                    | <b>2991</b> |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/27/18</b>  |
| 2993 |                                                                                   | <b>1.1.2.5.19.11.22.7</b> | <b>Construcción</b>                                                                         |             |                                |           | <b>109 days</b> | <b>Tue 10/17/17</b> | <b>Tue 3/27/18</b>  |
| 2994 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.22.7.6      | Compra y acopio de materiales en Obra                                                       | 2991        |                                |           | 30 days         | Tue 10/17/17        | Wed 11/29/17        |
| 2995 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.22.7.6      | Replanteo                                                                                   | 2994        |                                |           | 15 days         | Thu 11/30/17        | Thu 12/21/17        |
| 2996 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.22.7.6      | Obras Civiles                                                                               | 2995        |                                |           | 15 days         | Fri 12/22/17        | Mon 1/15/18         |
| 2997 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.22.7.6      | Montaje Electromecánico                                                                     | 2996        |                                |           | 15 days         | Tue 1/16/18         | Mon 2/5/18          |
| 2998 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.22.7.6      | Tendido de Conductores                                                                      | 2996        |                                |           | 15 days         | Tue 1/16/18         | Mon 2/5/18          |
| 2999 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.22.7.6      | Instalación de Equipos de Seccionamiento y Corte                                            | 2998        |                                |           | 15 days         | Tue 2/6/18          | Wed 2/28/18         |
| 3000 |                                                                                   | 1.1.2.5.19.11.22.7.6      | Instalación de Equipamiento de Protecciones y Comunicaciones                                | 2999        |                                |           | 10 days         | Thu 3/1/18          | Wed 3/14/18         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                     | WBS                     | Nombre de tarea                                                                                     | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start              | Finish              |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| 3001 |    | 1.1.2.5.19.11.22.7.6    | Energizar redes                                                                                     | 3000  |                                |           | 2 days          | Thu 3/15/18        | Fri 3/16/18         |  |
| 3002 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.11.22.7.6    | Pruebas                                                                                             | 3001  |                                |           | 7 days          | Mon 3/19/18        | Tue 3/27/18         |  |
| 3003 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.11.22.7.7    | Acta de terminación física-tecnica de la obra                                                       | 3002  |                                |           | 0 days          | Tue 3/27/18        | Tue 3/27/18         |  |
| 3004 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.19.11.23</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                         |       |                                |           | <b>32 days</b>  | <b>Tue 2/6/18</b>  | <b>Fri 3/23/18</b>  |  |
| 3005 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.11.23.13     | Pago Planilla 1_20%                                                                                 | 2998  |                                |           | 5 days          | Tue 2/6/18         | Wed 2/14/18         |  |
| 3006 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.11.23.14     | Pago Planilla 2_20%                                                                                 | 3001  |                                |           | 5 days          | Mon 3/19/18        | Fri 3/23/18         |  |
| 3007 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.19.11.24</b> | <b>Liquidación de Obras</b>                                                                         |       |                                |           | <b>6 days</b>   | <b>Wed 3/28/18</b> | <b>Thu 4/5/18</b>   |  |
| 3008 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.11.24.31     | Registro Contable                                                                                   | 3002  |                                |           | 2 days          | Wed 3/28/18        | Thu 3/29/18         |  |
| 3009 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.11.24.32     | Liquidación Técnica Contable                                                                        | 3008  |                                |           | 3 days          | Mon 4/2/18         | Wed 4/4/18          |  |
| 3010 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.11.24.33     | Registro de Activos                                                                                 | 3009  |                                |           | 1 day           | Thu 4/5/18         | Thu 4/5/18          |  |
| 3011 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.11.24.34     | Acta de Entrega Recepción                                                                           | 3010  |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18         | Thu 4/5/18          |  |
| 3012 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.11.24.35     | Pago Planilla final 10%                                                                             | 3011  |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18         | Thu 4/5/18          |  |
| 3013 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.19.12</b>    | <b>FISCALIZACIÓN CNEL EP-UN Esmeraldas Reforzamiento sistema de distribución Rocafuerte-Lagarto</b> |       |                                |           | <b>145 days</b> | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Thu 4/5/18</b>   |  |
| 3014 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.19.12.11</b> | <b>Etapas Precontractual</b>                                                                        |       |                                |           | <b>53 days</b>  | <b>Mon 9/4/17</b>  | <b>Mon 11/20/17</b> |  |
| 3015 |    | 1.1.2.5.19.12.11.40     | Designar Comisión Técnica                                                                           |       |                                |           | 2 days          | Mon 9/4/17         | Tue 9/5/17          |  |
| 3016 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.40     | Elaborar Solicitud de Propuestas                                                                    | 3015  |                                |           | 2 days          | Wed 9/6/17         | Thu 9/7/17          |  |
| 3017 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.40     | Resolución de Inicio de proceso                                                                     | 3016  |                                |           | 2 days          | Fri 9/8/17         | Mon 9/11/17         |  |
| 3018 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.40     | Convocar a Expresiones de Interés                                                                   | 3017  |                                |           | 7 days          | Tue 9/12/17        | Wed 9/20/17         |  |
| 3019 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.40     | Conformación de Lista Corta                                                                         | 3018  |                                |           | 3 days          | Thu 9/21/17        | Mon 9/25/17         |  |
| 3020 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.40     | Invitación a empresas de Lista Corta                                                                | 3019  |                                |           | 1 day           | Tue 9/26/17        | Tue 9/26/17         |  |
| 3021 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.41     | Elaborar ofertas                                                                                    | 3020  |                                |           | 7 days          | Wed 9/27/17        | Thu 10/5/17         |  |
| 3022 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.41     | Informe de evaluación final de ofertas técnicas y económicas                                        | 3021  |                                |           | 2 days          | Fri 10/6/17        | Tue 10/10/17        |  |
| 3023 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.41     | Publicar resultados y notificación de adjudicación                                                  | 3022  |                                |           | 2 days          | Wed 10/11/17       | Thu 10/12/17        |  |
| 3024 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.41     | Suscribir Contrato y documentos requeridos                                                          | 3023  |                                |           | 20 days         | Fri 10/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 3025 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.41     | Contrato Suscrito                                                                                   | 3024  |                                |           | 0 days          | Mon 11/13/17       | Mon 11/13/17        |  |
| 3026 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.41     | Trámitar y pagar anticipo                                                                           | 3025  |                                |           | 5 days          | Tue 11/14/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 3027 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.11.41     | Pago de anticipo 20%                                                                                | 3026  |                                |           | 0 days          | Mon 11/20/17       | Mon 11/20/17        |  |
| 3028 |                                                                                     | <b>1.1.2.5.19.12.12</b> | <b>Ejecución Financiera</b>                                                                         |       |                                |           | <b>35 days</b>  | <b>Wed 2/14/18</b> | <b>Thu 4/5/18</b>   |  |
| 3029 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.12.97     | Pago Planilla 1_35%                                                                                 | 3005  |                                |           | 0 days          | Wed 2/14/18        | Wed 2/14/18         |  |
| 3030 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.12.98     | Pago Planilla 2_35%                                                                                 | 3006  |                                |           | 0 days          | Fri 3/23/18        | Fri 3/23/18         |  |
| 3031 |                                                                                     | 1.1.2.5.19.12.12.99     | Pago Planilla Final_10%                                                                             | 3012  |                                |           | 0 days          | Thu 4/5/18         | Thu 4/5/18          |  |
| 3032 |                                                                                     | <b>1.1.11</b>           | <b>Administración del Programa</b>                                                                  |       |                                |           | <b>2 days</b>   | <b>Mon 1/2/17</b>  | <b>Tue 1/3/17</b>   |  |
| 3033 |  | 1.1.11.23               | Monitoreo y seguimiento del programa                                                                |       |                                |           | 595 days        | Mon 1/2/17         | Mon 5/6/19          |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| ID   |                                                                                   | WBS              | Nombre de tarea                                   | Prede | Meta<br>Matriz<br>Result<br>MR | Ava<br>MR | Duration        | Start             | Finish             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 3034 |  | 1.1.11.24        | Equipo Técnico del Programa                       |       |                                |           | 768 days        | Mon 1/2/17        | Thu 1/2/20         |
| 3035 |                                                                                   | <b>1.1.11.25</b> | <b>Evaluación Intermedia y final del Programa</b> |       |                                |           | <b>457 days</b> | <b>Tue 1/2/18</b> | <b>Wed 10/9/19</b> |
| 3036 |  | 1.1.11.25.1      | Evaluación Intermedia                             |       |                                |           | 30 days         | Tue 1/2/18        | Wed 2/14/18        |
| 3037 |  | 1.1.11.25.2      | Evaluación Final                                  |       |                                |           | 90 days         | Thu 6/6/19        | Wed 10/9/19        |
| 3038 |                                                                                   | <b>1.1.11.26</b> | <b>Auditorías Externas</b>                        |       |                                |           | <b>395 days</b> | <b>Tue 4/3/18</b> | <b>Wed 10/9/19</b> |
| 3039 |  | 1.1.11.26.1      | Auditoría 2017                                    |       |                                |           | 5 days          | Tue 4/3/18        | Mon 4/9/18         |
| 3040 |  | 1.1.11.26.2      | Auditoría 2018                                    |       |                                |           | 5 days          | Wed 4/3/19        | Tue 4/9/19         |
| 3041 |  | 1.1.11.26.3      | Auditoría 2019                                    |       |                                |           | 90 days         | Thu 6/6/19        | Wed 10/9/19        |
| 3042 |                                                                                   | <b>2</b>         | <b>Inicio del Programa</b>                        |       |                                |           | <b>768 days</b> | <b>Mon 1/2/17</b> | <b>Thu 1/2/20</b>  |
| 3043 |  | 2.10             | Inicio del Programa                               |       |                                |           | 0 days          | Mon 1/2/17        | Mon 1/2/17         |
| 3044 |  | 2.14             | Firma de Contrato de Préstamo                     | 3043  |                                |           | 0 days          | Mon 1/2/17        | Mon 1/2/17         |
| 3045 |                                                                                   | 2.11             | Elegibilidad Total                                | 3044  |                                |           | 30 days         | Mon 1/2/17        | Fri 2/10/17        |
| 3046 |  | 2.13             | Fin Proyecto                                      |       |                                |           | 768 days        | Mon 1/2/17        | Thu 1/2/20         |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID    | Aporte Local   | Costo Total     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                |                 | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                 |                |                 | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$60,000,000.00 | \$9,234,000.00 | \$69,234,000.00 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$60,000,000.00 | \$9,234,000.00 | \$69,234,000.00 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$60,000,000.00 | \$9,234,000.00 | \$69,234,000.00 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$41,392,929.42 | \$5,795,010.03 | \$47,187,939.45 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$9,533,573.40  | \$1,334,700.02 | \$10,868,273.42 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,157,495.93  | \$162,049.18   | \$1,319,545.11  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,086,045.66  | \$152,046.40   | \$1,238,092.06  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$543,022.83    | \$0.00         | \$543,022.83    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$543,022.83    | \$0.00         | \$543,022.83    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$434,418.26</b> | <b>\$121,637.12</b> | <b>\$556,055.38</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$217,209.13        | \$60,818.56         | \$278,027.69        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$217,209.13        | \$60,818.56         | \$278,027.69        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$108,604.57</b> | <b>\$30,409.28</b>  | <b>\$139,013.85</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$108,604.57        | \$30,409.28         | \$139,013.85        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$71,450.27</b>  | <b>\$10,002.78</b>  | <b>\$81,453.05</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$14,290.07</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$14,290.07</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$14,290.07         | \$0.00              | \$14,290.07         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$57,160.20</b>  | <b>\$10,002.78</b>  | <b>\$67,162.98</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$25,007.60         | \$4,201.18          | \$29,208.78         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$25,007.60         | \$4,201.18          | \$29,208.78         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$38,919.60         | \$10,897.49         | \$49,817.09         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$19,459.80</b>  | <b>\$5,448.74</b>   | <b>\$24,908.54</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$19,459.80         | \$5,448.74          | \$24,908.54         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$12,657.00</b>  | <b>\$1,771.98</b>   | <b>\$14,428.98</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$2,531.40</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,531.40</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$2,531.40          | \$0.00              | \$2,531.40          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$10,125.60</b>  | <b>\$1,771.98</b>   | <b>\$11,897.58</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$4,429.95          | \$744.23            | \$5,174.18          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$4,429.95          | \$744.23            | \$5,174.18          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,265.70          | \$283.52            | \$1,549.22          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$768,137.01</b> | <b>\$107,539.19</b> | <b>\$875,676.20</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$732,636.01</b> | <b>\$102,569.05</b> | <b>\$835,205.06</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$366,318.01</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$366,318.01</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$175,438.60        | \$0.00             | \$175,438.60        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$140,350.88</b> | <b>\$39,298.24</b> | <b>\$179,649.12</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$70,175.44         | \$19,649.12        | \$89,824.56         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$70,175.44         | \$19,649.12        | \$89,824.56         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$35,087.72</b>  | <b>\$9,824.56</b>  | <b>\$44,912.28</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$35,087.72         | \$9,824.56         | \$44,912.28         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$20,404.00</b>  | <b>\$2,856.57</b>  | <b>\$23,260.57</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$4,080.80</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$4,080.80</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$764,852.68</b> | <b>\$214,158.74</b> | <b>\$979,011.42</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$382,426.34        | \$107,079.37        | \$489,505.71        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$382,426.34        | \$107,079.37        | \$489,505.71        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$191,213.17</b> | <b>\$53,539.69</b>  | <b>\$244,752.86</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$191,213.17        | \$53,539.69         | \$244,752.86        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$95,606.58</b>  | <b>\$13,384.93</b>  | <b>\$108,991.51</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$19,121.32</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$19,121.32</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$19,121.32         | \$0.00              | \$19,121.32         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$76,485.26</b>  | <b>\$13,384.93</b>  | <b>\$89,870.19</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$33,462.30         | \$5,621.67          | \$39,083.97         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$33,462.30         | \$5,621.67          | \$39,083.97         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$573,566.58          | \$160,598.64        | \$734,165.22          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$286,783.29</b>   | <b>\$80,299.32</b>  | <b>\$367,082.61</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$286,783.29          | \$80,299.32         | \$367,082.61          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$129,180.00</b>   | <b>\$18,085.19</b>  | <b>\$147,265.19</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$25,836.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$25,836.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$25,836.00           | \$0.00              | \$25,836.00           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$103,344.00</b>   | <b>\$18,085.19</b>  | <b>\$121,429.19</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$45,213.00           | \$7,595.78          | \$52,808.78           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$45,213.00           | \$7,595.78          | \$52,808.78           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$12,918.00           | \$2,893.63          | \$15,811.63           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$2,024,653.10</b> | <b>\$283,451.43</b> | <b>\$2,308,104.53</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,926,890.10</b> | <b>\$269,764.62</b> | <b>\$2,196,654.72</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$963,445.05</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$963,445.05</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |              |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |              | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$963,445.05 | \$0.00       | \$963,445.05 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$770,756.04 | \$215,811.70 | \$986,567.74 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$385,378.02 | \$107,905.85 | \$493,283.87 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$385,378.02 | \$107,905.85 | \$493,283.87 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$192,689.01 | \$53,952.92  | \$246,641.93 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$192,689.01 | \$53,952.92  | \$246,641.93 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$97,763.00  | \$13,686.81  | \$111,449.81 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$524,199.66        | \$0.00              | \$524,199.66        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$419,359.72</b> | <b>\$117,420.70</b> | <b>\$536,780.42</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$209,679.86        | \$58,710.35         | \$268,390.21        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$209,679.86        | \$58,710.35         | \$268,390.21        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$104,839.93</b> | <b>\$29,355.18</b>  | <b>\$134,195.11</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$104,839.93        | \$29,355.18         | \$134,195.11        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$77,350.00</b>  | <b>\$10,829.00</b>  | <b>\$88,179.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$15,470.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$15,470.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$15,470.00           | \$0.00              | \$15,470.00           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$61,880.00</b>    | <b>\$10,829.00</b>  | <b>\$72,709.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$27,072.50           | \$4,548.18          | \$31,620.68           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$27,072.50           | \$4,548.18          | \$31,620.68           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$7,735.00            | \$1,732.64          | \$9,467.64            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,690,304.68</b> | <b>\$236,642.86</b> | <b>\$1,926,947.54</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,590,126.70</b> | <b>\$222,617.93</b> | <b>\$1,812,744.63</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$795,063.35</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$795,063.35</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$795,063.35          | \$0.00              | \$795,063.35          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$636,050.68</b> | <b>\$178,094.38</b> | <b>\$814,145.06</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$318,025.34        | \$89,047.19         | \$407,072.53        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$318,025.34        | \$89,047.19         | \$407,072.53        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$159,012.67</b> | <b>\$44,523.55</b>  | <b>\$203,536.22</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$159,012.67        | \$44,523.55         | \$203,536.22        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$100,177.98</b> | <b>\$14,024.93</b>  | <b>\$114,202.91</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$20,035.60</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$20,035.60</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$20,035.60         | \$0.00              | \$20,035.60         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$80,142.38</b>  | <b>\$14,024.93</b>  | <b>\$94,167.31</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$35,062.29         | \$5,890.47          | \$40,952.76         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$35,062.29         | \$5,890.47          | \$40,952.76         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$246,323.28          | \$68,970.52         | \$315,293.80          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$123,161.64</b>   | <b>\$34,485.26</b>  | <b>\$157,646.90</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$123,161.64          | \$34,485.26         | \$157,646.90          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$65,050.00</b>    | <b>\$9,107.00</b>   | <b>\$74,157.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$13,010.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$13,010.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$13,010.00           | \$0.00              | \$13,010.00           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$52,040.00</b>    | <b>\$9,107.00</b>   | <b>\$61,147.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$22,767.50           | \$3,824.94          | \$26,592.44           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$22,767.50           | \$3,824.94          | \$26,592.44           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$6,505.00            | \$1,457.12          | \$7,962.12            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$2,703,277.14</b> | <b>\$378,458.80</b> | <b>\$3,081,735.94</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$2,538,000.14</b> | <b>\$355,320.02</b> | <b>\$2,893,320.16</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,269,000.07</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,269,000.07</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,467,186.87        | \$0.00              | \$1,467,186.87        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,173,749.50</b> | <b>\$328,649.86</b> | <b>\$1,502,399.36</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$586,874.75          | \$164,324.93        | \$751,199.68          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$586,874.75          | \$164,324.93        | \$751,199.68          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$293,437.37</b>   | <b>\$82,162.46</b>  | <b>\$375,599.83</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$293,437.37          | \$82,162.46         | \$375,599.83          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$215,521.00</b>   | <b>\$30,172.93</b>  | <b>\$245,693.93</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$43,104.20</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$43,104.20</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$808,825.56</b> | <b>\$226,471.16</b> | <b>\$1,035,296.72</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$404,412.78        | \$113,235.58        | \$517,648.36          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$404,412.78        | \$113,235.58        | \$517,648.36          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$202,206.39</b> | <b>\$56,617.79</b>  | <b>\$258,824.18</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$202,206.39        | \$56,617.79         | \$258,824.18          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$110,584.58</b> | <b>\$15,481.83</b>  | <b>\$126,066.41</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$22,116.92</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$22,116.92</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$22,116.92         | \$0.00              | \$22,116.92           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$88,467.66</b>  | <b>\$15,481.83</b>  | <b>\$103,949.49</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$38,704.60         | \$6,502.37          | \$45,206.97           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$38,704.60         | \$6,502.37          | \$45,206.97           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$436,876.20          | \$122,325.34        | \$559,201.54          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$218,438.10</b>   | <b>\$61,162.67</b>  | <b>\$279,600.77</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$218,438.10          | \$61,162.67         | \$279,600.77          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$147,198.00</b>   | <b>\$20,607.72</b>  | <b>\$167,805.72</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$29,439.60</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$29,439.60</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$29,439.60           | \$0.00              | \$29,439.60           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$117,758.40</b>   | <b>\$20,607.72</b>  | <b>\$138,366.12</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$51,519.30           | \$8,655.24          | \$60,174.54           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$51,519.30           | \$8,655.24          | \$60,174.54           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$14,719.80           | \$3,297.24          | \$18,017.04           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,676,521.68</b> | <b>\$234,713.03</b> | <b>\$1,911,234.71</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,597,058.19</b> | <b>\$223,588.15</b> | <b>\$1,820,646.34</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$798,529.09</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$798,529.09</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$536,500.85        | \$0.00              | \$536,500.85        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$429,200.68</b> | <b>\$120,176.18</b> | <b>\$549,376.86</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$214,600.34        | \$60,088.09         | \$274,688.43        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$214,600.34        | \$60,088.09         | \$274,688.43        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$107,300.17</b> | <b>\$30,044.05</b>  | <b>\$137,344.22</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$107,300.17        | \$30,044.05         | \$137,344.22        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$58,655.06</b>  | <b>\$8,211.71</b>   | <b>\$66,866.77</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$11,731.01</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$11,731.01</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$11,731.01           | \$0.00              | \$11,731.01           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$46,924.05</b>    | <b>\$8,211.71</b>   | <b>\$55,135.76</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$20,529.27           | \$3,448.92          | \$23,978.19           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$20,529.27           | \$3,448.92          | \$23,978.19           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$5,865.51            | \$1,313.87          | \$7,179.38            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,133,676.17</b> | <b>\$158,714.66</b> | <b>\$1,292,390.83</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,083,634.60</b> | <b>\$151,708.85</b> | <b>\$1,235,343.45</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$541,817.30</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$541,817.30</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$541,817.30          | \$0.00              | \$541,817.30          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |              | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |              | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$433,453.84 | \$121,367.08 | \$554,820.92 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$216,726.92 | \$60,683.54  | \$277,410.46 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$216,726.92 | \$60,683.54  | \$277,410.46 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$108,363.46 | \$30,341.77  | \$138,705.23 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$108,363.46 | \$30,341.77  | \$138,705.23 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$50,041.57  | \$7,005.81   | \$57,047.38  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$10,008.31  | \$0.00       | \$10,008.31  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$10,008.31  | \$0.00       | \$10,008.31  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$40,033.26  | \$7,005.81   | \$47,039.07  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$17,514.55  | \$2,942.44   | \$20,456.99  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$17,514.55           | \$2,942.44          | \$20,456.99           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$5,004.16            | \$1,120.93          | \$6,125.09            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,487,728.00</b> | <b>\$208,281.93</b> | <b>\$1,696,009.93</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,390,400.00</b> | <b>\$194,656.00</b> | <b>\$1,585,056.00</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$695,200.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$695,200.00</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$695,200.00          | \$0.00              | \$695,200.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$556,160.00</b>   | <b>\$155,724.80</b> | <b>\$711,884.80</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$278,080.00          | \$77,862.40         | \$355,942.40          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$278,080.00        | \$77,862.40         | \$355,942.40        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$139,040.00</b> | <b>\$38,931.20</b>  | <b>\$177,971.20</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$139,040.00        | \$38,931.20         | \$177,971.20        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$97,328.00</b>  | <b>\$13,625.93</b>  | <b>\$110,953.93</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$19,465.60</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$19,465.60</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$19,465.60         | \$0.00              | \$19,465.60         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$77,862.40</b>  | <b>\$13,625.93</b>  | <b>\$91,488.33</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$34,064.80         | \$5,722.89          | \$39,787.69         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$34,064.80         | \$5,722.89          | \$39,787.69         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$9,732.80          | \$2,180.15          | \$11,912.95         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$836,330.71</b> | <b>\$117,086.30</b> | <b>\$953,417.01</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$796,830.71</b> | <b>\$111,556.30</b> | <b>\$908,387.01</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$398,415.36</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$398,415.36</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
 EC - L1219  
 Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
 Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$423,298.98        | \$0.00             | \$423,298.98        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$338,639.18</b> | <b>\$94,818.98</b> | <b>\$433,458.16</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$169,319.59        | \$47,409.49        | \$216,729.08        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$169,319.59        | \$47,409.49        | \$216,729.08        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$84,659.80</b>  | <b>\$23,704.74</b> | <b>\$108,364.54</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$84,659.80         | \$23,704.74        | \$108,364.54        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$57,000.00</b>  | <b>\$7,980.00</b>  | <b>\$64,980.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$11,400.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$11,400.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$11,400.00           | \$0.00              | \$11,400.00           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$45,600.00</b>    | <b>\$7,980.00</b>   | <b>\$53,580.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$19,950.00           | \$3,351.60          | \$23,301.60           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$19,950.00           | \$3,351.60          | \$23,301.60           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$5,700.00            | \$1,276.80          | \$6,976.80            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,152,419.00</b> | <b>\$161,338.67</b> | <b>\$1,313,757.67</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,079,261.00</b> | <b>\$151,096.55</b> | <b>\$1,230,357.55</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$539,630.50</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$539,630.50</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$539,630.50          | \$0.00              | \$539,630.50          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |              |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |              | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$431,704.40 | \$120,877.24 | \$552,581.64 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$215,852.20 | \$60,438.62  | \$276,290.82 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$215,852.20 | \$60,438.62  | \$276,290.82 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$107,926.10 | \$30,219.31  | \$138,145.41 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$107,926.10 | \$30,219.31  | \$138,145.41 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$73,158.00  | \$10,242.12  | \$83,400.12  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$14,631.60  | \$0.00       | \$14,631.60  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$14,631.60  | \$0.00       | \$14,631.60  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$58,526.40  | \$10,242.12  | \$68,768.52  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$25,605.30  | \$4,301.69   | \$29,906.99  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$25,605.30         | \$4,301.69          | \$29,906.99         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$7,315.80          | \$1,638.74          | \$8,954.54          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$755,596.39</b> | <b>\$105,783.50</b> | <b>\$861,379.89</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$708,096.39</b> | <b>\$99,133.50</b>  | <b>\$807,229.89</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$354,048.19</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$354,048.19</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$354,048.19        | \$0.00              | \$354,048.19        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$283,238.56</b> | <b>\$79,306.80</b>  | <b>\$362,545.36</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$141,619.28        | \$39,653.40         | \$181,272.68        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$141,619.28          | \$39,653.40         | \$181,272.68          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$70,809.64</b>    | <b>\$19,826.70</b>  | <b>\$90,636.34</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$70,809.64           | \$19,826.70         | \$90,636.34           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$47,500.00</b>    | <b>\$6,650.00</b>   | <b>\$54,150.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$9,500.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$9,500.00</b>     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$9,500.00            | \$0.00              | \$9,500.00            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$38,000.00</b>    | <b>\$6,650.00</b>   | <b>\$44,650.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$16,625.00           | \$2,793.00          | \$19,418.00           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$16,625.00           | \$2,793.00          | \$19,418.00           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$4,750.00            | \$1,064.00          | \$5,814.00            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,147,936.80</b> | <b>\$160,711.14</b> | <b>\$1,308,647.94</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,080,845.80</b> | <b>\$151,318.40</b> | <b>\$1,232,164.20</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$540,422.90</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$540,422.90</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$908,926.79        | \$0.00              | \$908,926.79        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$727,141.44</b> | <b>\$203,599.60</b> | <b>\$930,741.04</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$363,570.72        | \$101,799.80        | \$465,370.52        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$363,570.72        | \$101,799.80        | \$465,370.52        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$181,785.36</b> | <b>\$50,899.90</b>  | <b>\$232,685.26</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$181,785.36        | \$50,899.90         | \$232,685.26        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$105,349.00</b> | <b>\$14,748.86</b>  | <b>\$120,097.86</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$21,069.80</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$21,069.80</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID   | Aporte Local | Costo Total    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|----------------|--------------|----------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                |              |                |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                |              |                | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$21,069.80    | \$0.00       | \$21,069.80    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$84,279.20    | \$14,748.86  | \$99,028.06    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$36,872.15    | \$6,194.52   | \$43,066.67    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$36,872.15    | \$6,194.52   | \$43,066.67    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$10,534.90    | \$2,359.82   | \$12,894.72    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$2,563,958.36 | \$358,954.17 | \$2,922,912.53 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$2,417,943.36 | \$338,512.07 | \$2,756,455.43 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,208,971.68 | \$0.00       | \$1,208,971.68 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,208,971.68 | \$0.00       | \$1,208,971.68 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|----------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |                |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |                | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$967,177.34 | \$270,809.66 | \$1,237,987.00 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$483,588.67 | \$135,404.83 | \$618,993.50   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$483,588.67 | \$135,404.83 | \$618,993.50   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$241,794.34 | \$67,702.41  | \$309,496.75   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$241,794.34 | \$67,702.41  | \$309,496.75   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$146,015.00 | \$20,442.10  | \$166,457.10   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$29,203.00  | \$0.00       | \$29,203.00    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$29,203.00  | \$0.00       | \$29,203.00    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$116,812.00 | \$20,442.10  | \$137,254.10   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$51,105.25  | \$8,585.68   | \$59,690.93    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$51,105.25         | \$8,585.68         | \$59,690.93         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$14,601.50         | \$3,270.74         | \$17,872.24         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$321,875.00</b> | <b>\$45,062.50</b> | <b>\$366,937.50</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$312,500.00</b> | <b>\$43,750.00</b> | <b>\$356,250.00</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$156,250.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$156,250.00</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$156,250.00        | \$0.00             | \$156,250.00        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$125,000.00</b> | <b>\$35,000.00</b> | <b>\$160,000.00</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$62,500.00           | \$17,500.00         | \$80,000.00           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$62,500.00           | \$17,500.00         | \$80,000.00           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$31,250.00</b>    | <b>\$8,750.00</b>   | <b>\$40,000.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$31,250.00           | \$8,750.00          | \$40,000.00           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$9,375.00</b>     | <b>\$1,312.50</b>   | <b>\$10,687.50</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,875.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,875.00</b>     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,875.00            | \$0.00              | \$1,875.00            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$7,500.00</b>     | <b>\$1,312.50</b>   | <b>\$8,812.50</b>     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$3,281.25            | \$551.25            | \$3,832.50            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$3,281.25            | \$551.25            | \$3,832.50            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$937.50              | \$210.00            | \$1,147.50            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$2,394,736.84</b> | <b>\$335,263.15</b> | <b>\$2,729,999.99</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$2,267,286.84</b> | <b>\$317,420.15</b> | <b>\$2,584,706.99</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,133,643.42</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,133,643.42</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID           | Aporte Local          | Costo Total            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                        |                       |                        | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                        |                       |                        | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$226,728.68           | \$63,484.03           | \$290,212.71           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$127,450.00</b>    | <b>\$17,843.00</b>    | <b>\$145,293.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|                        |                       |                        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$25,490.00</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$25,490.00</b>     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$25,490.00            | \$0.00                | \$25,490.00            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$101,960.00</b>    | <b>\$17,843.00</b>    | <b>\$119,803.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$44,607.50            | \$7,494.06            | \$52,101.56            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$44,607.50            | \$7,494.06            | \$52,101.56            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$12,745.00            | \$2,854.88            | \$15,599.88            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$18,347,070.58</b> | <b>\$2,568,589.97</b> | <b>\$20,915,660.55</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$8,496,570.10</b>  | <b>\$1,189,519.92</b> | <b>\$9,686,090.02</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|                        |                       |                        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$2,080,041.70</b>  | <b>\$291,205.85</b>   | <b>\$2,371,247.55</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,936,391.70</b>  | <b>\$271,094.85</b>   | <b>\$2,207,486.55</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|                        |                       |                        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$968,195.85</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$968,195.85</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |              |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |              | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$968,195.85 | \$0.00       | \$968,195.85 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$774,556.68 | \$216,875.88 | \$991,432.56 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$387,278.34 | \$108,437.94 | \$495,716.28 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$387,278.34 | \$108,437.94 | \$495,716.28 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$193,639.17 | \$54,218.97  | \$247,858.14 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$193,639.17 | \$54,218.97  | \$247,858.14 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$143,650.00 | \$20,111.00  | \$163,761.00 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$644,669.31        | \$0.00              | \$644,669.31        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$515,735.44</b> | <b>\$144,405.92</b> | <b>\$660,141.36</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$257,867.72        | \$72,202.96         | \$330,070.68        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$257,867.72        | \$72,202.96         | \$330,070.68        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$128,933.86</b> | <b>\$36,101.48</b>  | <b>\$165,035.34</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$128,933.86        | \$36,101.48         | \$165,035.34        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$87,534.23</b>  | <b>\$12,254.79</b>  | <b>\$99,789.02</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$17,506.85</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$17,506.85</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |              |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |              | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$613,255.88 | \$171,711.64 | \$784,967.52 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$306,627.94 | \$85,855.82  | \$392,483.76 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$306,627.94 | \$85,855.82  | \$392,483.76 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$153,313.97 | \$42,927.91  | \$196,241.88 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$153,313.97 | \$42,927.91  | \$196,241.88 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$84,322.00  | \$11,805.07  | \$96,127.07  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$16,864.40  | \$0.00       | \$16,864.40  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$16,864.40  | \$0.00       | \$16,864.40  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$67,457.60  | \$11,805.07  | \$79,262.67  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$29,512.70  | \$4,958.13   | \$34,470.83  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$148,202.19        | \$41,496.61         | \$189,698.80          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$148,202.19        | \$41,496.61         | \$189,698.80          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$74,101.10</b>  | <b>\$20,748.41</b>  | <b>\$94,849.51</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$74,101.10         | \$20,748.41         | \$94,849.51           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$38,050.00</b>  | <b>\$5,327.00</b>   | <b>\$43,377.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$7,610.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$7,610.00</b>     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$7,610.00          | \$0.00              | \$7,610.00            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$30,440.00</b>  | <b>\$5,327.00</b>   | <b>\$35,767.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$13,317.50         | \$2,237.34          | \$15,554.84           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$13,317.50         | \$2,237.34          | \$15,554.84           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$3,805.00          | \$852.32            | \$4,657.32            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$877,448.49</b> | <b>\$122,842.80</b> | <b>\$1,000,291.29</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$832,898.49</b> | <b>\$116,605.80</b> | <b>\$949,504.29</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$416,449.24</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$416,449.24</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |              |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |              | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$416,449.24 | \$0.00       | \$416,449.24 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$83,289.85  | \$23,321.16  | \$106,611.01 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$83,289.85  | \$23,321.16  | \$106,611.01 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
 EC - L1219  
 Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
 Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$455,867.67        | \$0.00              | \$455,867.67        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$364,694.14</b> | <b>\$102,114.36</b> | <b>\$466,808.50</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$182,347.07        | \$51,057.18         | \$233,404.25        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$182,347.07        | \$51,057.18         | \$233,404.25        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$91,173.53</b>  | <b>\$25,528.59</b>  | <b>\$116,702.12</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$91,173.53         | \$25,528.59         | \$116,702.12        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$44,100.00</b>  | <b>\$6,174.00</b>   | <b>\$50,274.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$8,820.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$8,820.00</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |              |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |              | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$176,371.08 | \$49,383.90  | \$225,754.98 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$88,185.54  | \$24,691.95  | \$112,877.49 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$88,185.54  | \$24,691.95  | \$112,877.49 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$44,092.77  | \$12,345.98  | \$56,438.75  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$44,092.77  | \$12,345.98  | \$56,438.75  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$21,050.00  | \$2,947.00   | \$23,997.00  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$4,210.00   | \$0.00       | \$4,210.00   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$4,210.00   | \$0.00       | \$4,210.00   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$16,840.00  | \$2,947.00   | \$19,787.00  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$7,367.50   | \$1,237.74   | \$8,605.24   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$7,367.50          | \$1,237.74         | \$8,605.24          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$2,105.00          | \$471.52           | \$2,576.52          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$176,313.48</b> | <b>\$24,683.90</b> | <b>\$200,997.38</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$171,178.14</b> | <b>\$23,964.95</b> | <b>\$195,143.09</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$85,589.07</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$85,589.07</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$85,589.07         | \$0.00             | \$85,589.07         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$68,471.26</b>  | <b>\$19,171.96</b> | <b>\$87,643.22</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$34,235.63         | \$9,585.98         | \$43,821.61         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$34,235.63         | \$9,585.98         | \$43,821.61         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$17,117.81</b>  | <b>\$4,792.99</b>  | <b>\$21,910.80</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$17,117.81         | \$4,792.99         | \$21,910.80         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$5,135.34</b>   | <b>\$718.95</b>    | <b>\$5,854.29</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,027.07</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,027.07</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,027.07          | \$0.00             | \$1,027.07          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$4,108.27</b>   | <b>\$718.95</b>    | <b>\$4,827.22</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,797.37          | \$301.96           | \$2,099.33          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,797.37          | \$301.96           | \$2,099.33          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$513.53            | \$115.03           | \$628.56            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$171,557.87</b> | <b>\$24,018.10</b> | <b>\$195,575.97</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$166,561.04</b> | <b>\$23,318.55</b> | <b>\$189,879.59</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$83,280.52</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$83,280.52</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID       | Aporte Local       | Costo Total        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                    |                    |                    | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                    |                    |                    | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$83,280.52        | \$0.00             | \$83,280.52        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$66,624.42</b> | <b>\$18,654.84</b> | <b>\$85,279.26</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$33,312.21        | \$9,327.42         | \$42,639.63        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$33,312.21        | \$9,327.42         | \$42,639.63        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$16,656.10</b> | <b>\$4,663.71</b>  | <b>\$21,319.81</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$16,656.10        | \$4,663.71         | \$21,319.81        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$4,996.83</b>  | <b>\$699.55</b>    | <b>\$5,696.38</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$999.37</b>    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$999.37</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$789,541.80        | \$0.00              | \$789,541.80        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$631,633.44</b> | <b>\$176,857.36</b> | <b>\$808,490.80</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$315,816.72        | \$88,428.68         | \$404,245.40        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$315,816.72        | \$88,428.68         | \$404,245.40        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$157,908.36</b> | <b>\$44,214.34</b>  | <b>\$202,122.70</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$157,908.36        | \$44,214.34         | \$202,122.70        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$105,154.20</b> | <b>\$14,721.59</b>  | <b>\$119,875.79</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$21,030.84</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$21,030.84</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$21,030.84         | \$0.00             | \$21,030.84         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$84,123.36</b>  | <b>\$14,721.59</b> | <b>\$98,844.95</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$36,803.97         | \$6,183.07         | \$42,987.04         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$36,803.97         | \$6,183.07         | \$42,987.04         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$10,515.42         | \$2,355.45         | \$12,870.87         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$403,699.67</b> | <b>\$56,517.95</b> | <b>\$460,217.62</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$375,813.76</b> | <b>\$52,613.93</b> | <b>\$428,427.69</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$187,906.88</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$187,906.88</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$187,906.88        | \$0.00             | \$187,906.88        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total  |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
|              |              |              |     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |
|              |              |              | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr | May         | Jun | Jul | Aug         | Sep | Oct |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$150,325.50 | \$42,091.14  | \$192,416.64 |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$75,162.75  | \$21,045.57  | \$96,208.32  |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$75,162.75  | \$21,045.57  | \$96,208.32  |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$37,581.38  | \$10,522.79  | \$48,104.17  |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$37,581.38  | \$10,522.79  | \$48,104.17  |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$27,885.91  | \$3,904.02   | \$31,789.93  |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$5,577.18   | \$0.00       | \$5,577.18   |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$5,577.18   | \$0.00       | \$5,577.18   |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| \$22,308.73  | \$3,904.02   | \$26,212.75  |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| <b>\$403,032.64</b> | <b>\$112,849.14</b> | <b>\$515,881.78</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$201,516.32        | \$56,424.57         | \$257,940.89        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$201,516.32        | \$56,424.57         | \$257,940.89        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$100,758.16</b> | <b>\$28,212.28</b>  | <b>\$128,970.44</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$100,758.16        | \$28,212.28         | \$128,970.44        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$45,050.00</b>  | <b>\$6,307.00</b>   | <b>\$51,357.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$9,010.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$9,010.00</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$9,010.00          | \$0.00              | \$9,010.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$36,040.00</b>  | <b>\$6,307.00</b>   | <b>\$42,347.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$15,767.50         | \$2,648.94          | \$18,416.44         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$15,767.50         | \$2,648.94          | \$18,416.44         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$4,505.00          | \$1,009.12          | \$5,514.12          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$165,789.48</b> | <b>\$23,210.53</b>  | <b>\$189,000.01</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$157,894.74</b> | <b>\$22,105.27</b>  | <b>\$180,000.01</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$78,947.37</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$78,947.37</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$15,789.47         | \$4,421.05          | \$20,210.52         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$7,894.74</b>   | <b>\$1,105.26</b>   | <b>\$9,000.00</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,578.95</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,578.95</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$1,578.95          | \$0.00              | \$1,578.95          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$6,315.79</b>   | <b>\$1,105.26</b>   | <b>\$7,421.05</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$2,763.16          | \$464.21            | \$3,227.37          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$2,763.16          | \$464.21            | \$3,227.37          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$789.47            | \$176.84            | \$966.31            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$771,929.81</b> | <b>\$108,070.18</b> | <b>\$879,999.99</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$739,379.81</b> | <b>\$103,513.18</b> | <b>\$842,892.99</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$369,689.91</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$369,689.91</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$369,689.91        | \$0.00             | \$369,689.91        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$295,751.92</b> | <b>\$82,810.54</b> | <b>\$378,562.46</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$147,875.96        | \$41,405.27        | \$189,281.23        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$147,875.96        | \$41,405.27        | \$189,281.23        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$73,937.98</b>  | <b>\$20,702.64</b> | <b>\$94,640.62</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$73,937.98         | \$20,702.64        | \$94,640.62         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$32,550.00</b>  | <b>\$4,557.00</b>  | <b>\$37,107.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$6,510.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$6,510.00</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |              |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |              | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$6,510.00   | \$0.00       | \$6,510.00   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$26,040.00  | \$4,557.00   | \$30,597.00  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$11,392.50  | \$1,913.94   | \$13,306.44  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$11,392.50  | \$1,913.94   | \$13,306.44  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$3,255.00   | \$729.12     | \$3,984.12   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$410,526.31 | \$57,473.68  | \$467,999.99 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$386,426.31 | \$54,099.68  | \$440,525.99 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$193,213.16 | \$0.00       | \$193,213.16 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$193,213.16 | \$0.00       | \$193,213.16 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$267,027.36</b> | <b>\$74,767.66</b> | <b>\$341,795.02</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$133,513.68        | \$37,383.83        | \$170,897.51        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$133,513.68        | \$37,383.83        | \$170,897.51        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$66,756.84</b>  | <b>\$18,691.92</b> | <b>\$85,448.76</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$66,756.84         | \$18,691.92        | \$85,448.76         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$29,800.00</b>  | <b>\$4,172.00</b>  | <b>\$33,972.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$5,960.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,960.00</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$5,960.00          | \$0.00             | \$5,960.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$23,840.00</b>  | <b>\$4,172.00</b>  | <b>\$28,012.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$10,430.00         | \$1,752.24         | \$12,182.24         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$10,430.00         | \$1,752.24         | \$12,182.24         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$2,980.00          | \$667.52           | \$3,647.52          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$589,702.49</b> | <b>\$82,558.35</b> | <b>\$672,260.84</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$56,120.25         | \$15,713.67        | \$71,833.92         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$28,500.00</b>  | <b>\$3,990.00</b>  | <b>\$32,490.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|                     |                    |                     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$5,700.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,700.00</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$5,700.00          | \$0.00             | \$5,700.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$22,800.00</b>  | <b>\$3,990.00</b>  | <b>\$26,790.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$9,975.00          | \$1,675.80         | \$11,650.80         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$9,975.00          | \$1,675.80         | \$11,650.80         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$2,850.00          | \$638.40           | \$3,488.40          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$534,456.14</b> | <b>\$74,823.85</b> | <b>\$609,279.99</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|                     |                    |                     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$508,256.14</b> | <b>\$71,155.85</b> | <b>\$579,411.99</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|                     |                    |                     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$254,128.07</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$254,128.07</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$227,728.10        | \$0.00             | \$227,728.10        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$182,182.48</b> | <b>\$51,011.10</b> | <b>\$233,193.58</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$91,091.24         | \$25,505.55        | \$116,596.79        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$91,091.24         | \$25,505.55        | \$116,596.79        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$45,545.62</b>  | <b>\$12,752.77</b> | <b>\$58,298.39</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$45,545.62         | \$12,752.77        | \$58,298.39         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$25,350.00</b>  | <b>\$3,549.00</b>  | <b>\$28,899.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$5,070.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,070.00</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID       | Aporte Local       | Costo Total        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                    |                    |                    | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                    |                    |                    | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$58,913.60        | \$0.00             | \$58,913.60        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$47,130.88</b> | <b>\$13,196.64</b> | <b>\$60,327.52</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$23,565.44        | \$6,598.32         | \$30,163.76        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$23,565.44        | \$6,598.32         | \$30,163.76        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$11,782.72</b> | <b>\$3,299.16</b>  | <b>\$15,081.88</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$11,782.72        | \$3,299.16         | \$15,081.88        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$3,534.82</b>  | <b>\$494.88</b>    | <b>\$4,029.70</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|                    |                    |                    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$706.96</b>    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$706.96</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |             |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |             | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$21,052.64  | \$5,894.74   | \$26,947.38 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$10,526.32  | \$2,947.37   | \$13,473.69 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$10,526.32  | \$2,947.37   | \$13,473.69 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$5,263.16   | \$1,473.68   | \$6,736.84  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$5,263.16   | \$1,473.68   | \$6,736.84  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$2,105.26   | \$294.74     | \$2,400.00  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$421.05     | \$0.00       | \$421.05    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$421.05     | \$0.00       | \$421.05    |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID       | Aporte Local      | Costo Total        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                    |                   |                    | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                    |                   |                    | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$21,052.64</b> | <b>\$5,894.74</b> | <b>\$26,947.38</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$10,526.32        | \$2,947.37        | \$13,473.69        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$10,526.32        | \$2,947.37        | \$13,473.69        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$5,263.16</b>  | <b>\$1,473.68</b> | <b>\$6,736.84</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$5,263.16         | \$1,473.68        | \$6,736.84         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$2,105.26</b>  | <b>\$294.74</b>   | <b>\$2,400.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$421.05</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$421.05</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00             | \$0.00            | \$0.00             |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$421.05           | \$0.00            | \$421.05           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,684.21</b>  | <b>\$294.74</b>   | <b>\$1,978.95</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$736.84           | \$123.79          | \$860.63           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$736.84           | \$123.79          | \$860.63           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$210.53           | \$47.16           | \$257.69           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$54,736.85</b> | <b>\$7,663.16</b> | <b>\$62,400.01</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$52,631.59</b> | <b>\$7,368.42</b> | <b>\$60,000.01</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$26,315.79</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$26,315.79</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID          | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                       |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                       |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$5,263.16            | \$1,473.68          | \$6,736.84            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$2,105.26</b>     | <b>\$294.74</b>     | <b>\$2,400.00</b>     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$421.05</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$421.05</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$421.05              | \$0.00              | \$421.05              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,684.21</b>     | <b>\$294.74</b>     | <b>\$1,978.95</b>     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$736.84              | \$123.79            | \$860.63              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$736.84              | \$123.79            | \$860.63              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$210.53              | \$47.16             | \$257.69              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,509,036.59</b> | <b>\$211,265.12</b> | <b>\$1,720,301.71</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$1,414,286.59</b> | <b>\$198,000.12</b> | <b>\$1,612,286.71</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$707,143.29</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$707,143.29</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$707,143.29        | \$0.00              | \$707,143.29        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$565,714.64</b> | <b>\$158,400.10</b> | <b>\$724,114.74</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$282,857.32        | \$79,200.05         | \$362,057.37        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$282,857.32        | \$79,200.05         | \$362,057.37        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$141,428.66</b> | <b>\$39,600.02</b>  | <b>\$181,028.68</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$141,428.66        | \$39,600.02         | \$181,028.68        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$94,750.00</b>  | <b>\$13,265.00</b>  | <b>\$108,015.00</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$18,950.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$18,950.00</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID | Aporte Local | Costo Total  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|              |              |              |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|              |              |              | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$18,950.00  | \$0.00       | \$18,950.00  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$75,800.00  | \$13,265.00  | \$89,065.00  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$33,162.50  | \$5,571.30   | \$38,733.80  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$33,162.50  | \$5,571.30   | \$38,733.80  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$9,475.00   | \$2,122.40   | \$11,597.40  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$781,190.80 | \$109,366.70 | \$890,557.50 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$743,991.23 | \$104,158.77 | \$848,150.00 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$371,995.61 | \$0.00       | \$371,995.61 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$371,995.61 | \$0.00       | \$371,995.61 |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$7,439.91          | \$0.00             | \$7,439.91          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$29,759.66</b>  | <b>\$5,207.93</b>  | <b>\$34,967.59</b>  |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$13,019.85         | \$2,187.33         | \$15,207.18         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$13,019.85         | \$2,187.33         | \$15,207.18         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$3,719.96          | \$833.27           | \$4,553.23          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$483,552.62</b> | <b>\$67,697.37</b> | <b>\$551,249.99</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$460,526.31</b> | <b>\$64,473.68</b> | <b>\$524,999.99</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$230,263.16</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$230,263.16</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$230,263.16        | \$0.00             | \$230,263.16        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local        | Costo Total           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                     |                       | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                     |                       | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$184,210.52</b> | <b>\$51,578.94</b>  | <b>\$235,789.46</b>   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$92,105.26         | \$25,789.47         | \$117,894.73          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$92,105.26         | \$25,789.47         | \$117,894.73          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$46,052.63</b>  | <b>\$12,894.74</b>  | <b>\$58,947.37</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$46,052.63         | \$12,894.74         | \$58,947.37           |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$23,026.31</b>  | <b>\$3,223.69</b>   | <b>\$26,250.00</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$4,605.26</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$4,605.26</b>     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$4,605.26          | \$0.00              | \$4,605.26            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$18,421.05</b>  | <b>\$3,223.69</b>   | <b>\$21,644.74</b>    |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$8,059.21          | \$1,353.95          | \$9,413.16            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$8,059.21          | \$1,353.95          | \$9,413.16            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$2,302.63          | \$515.79            | \$2,818.42            |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$260,000.00</b> | <b>\$870,400.00</b> | <b>\$1,130,400.00</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$168,000.00        | \$168,000.00          |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| Recursos BID        | Aporte Local       | Costo Total         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|
|                     |                    |                     | 1st Quarter |     |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th |  |
|                     |                    |                     | Dec         | Jan | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |
| \$0.00              | \$666,000.00       | \$666,000.00        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$110,000.00</b> | <b>\$15,400.00</b> | <b>\$125,400.00</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$50,000.00         | \$7,000.00         | \$57,000.00         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$60,000.00         | \$8,400.00         | \$68,400.00         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$150,000.00</b> | <b>\$21,000.00</b> | <b>\$171,000.00</b> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$50,000.00         | \$7,000.00         | \$57,000.00         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$50,000.00         | \$7,000.00         | \$57,000.00         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$50,000.00         | \$7,000.00         | \$57,000.00         |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |
| \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

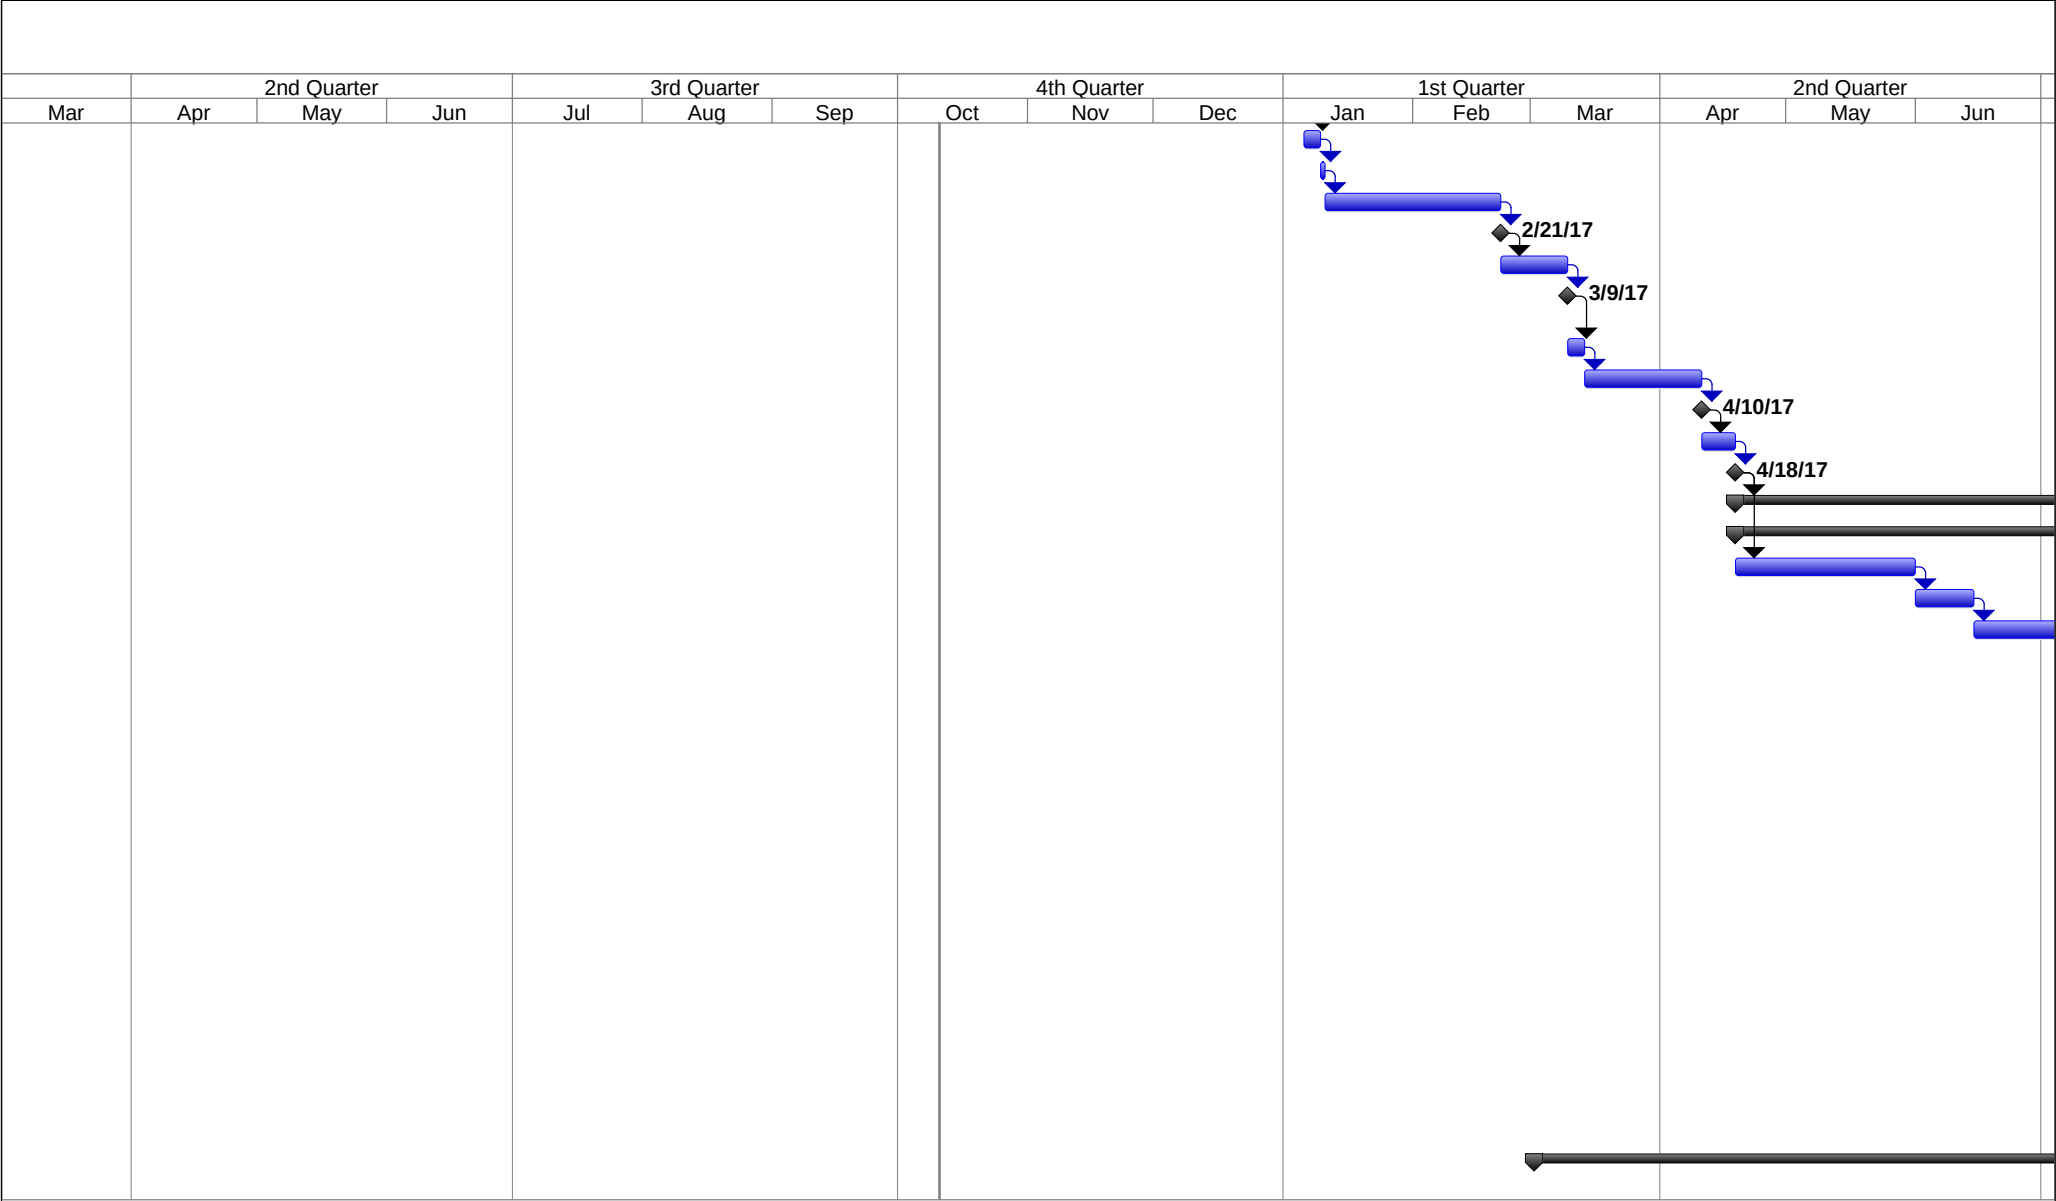


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

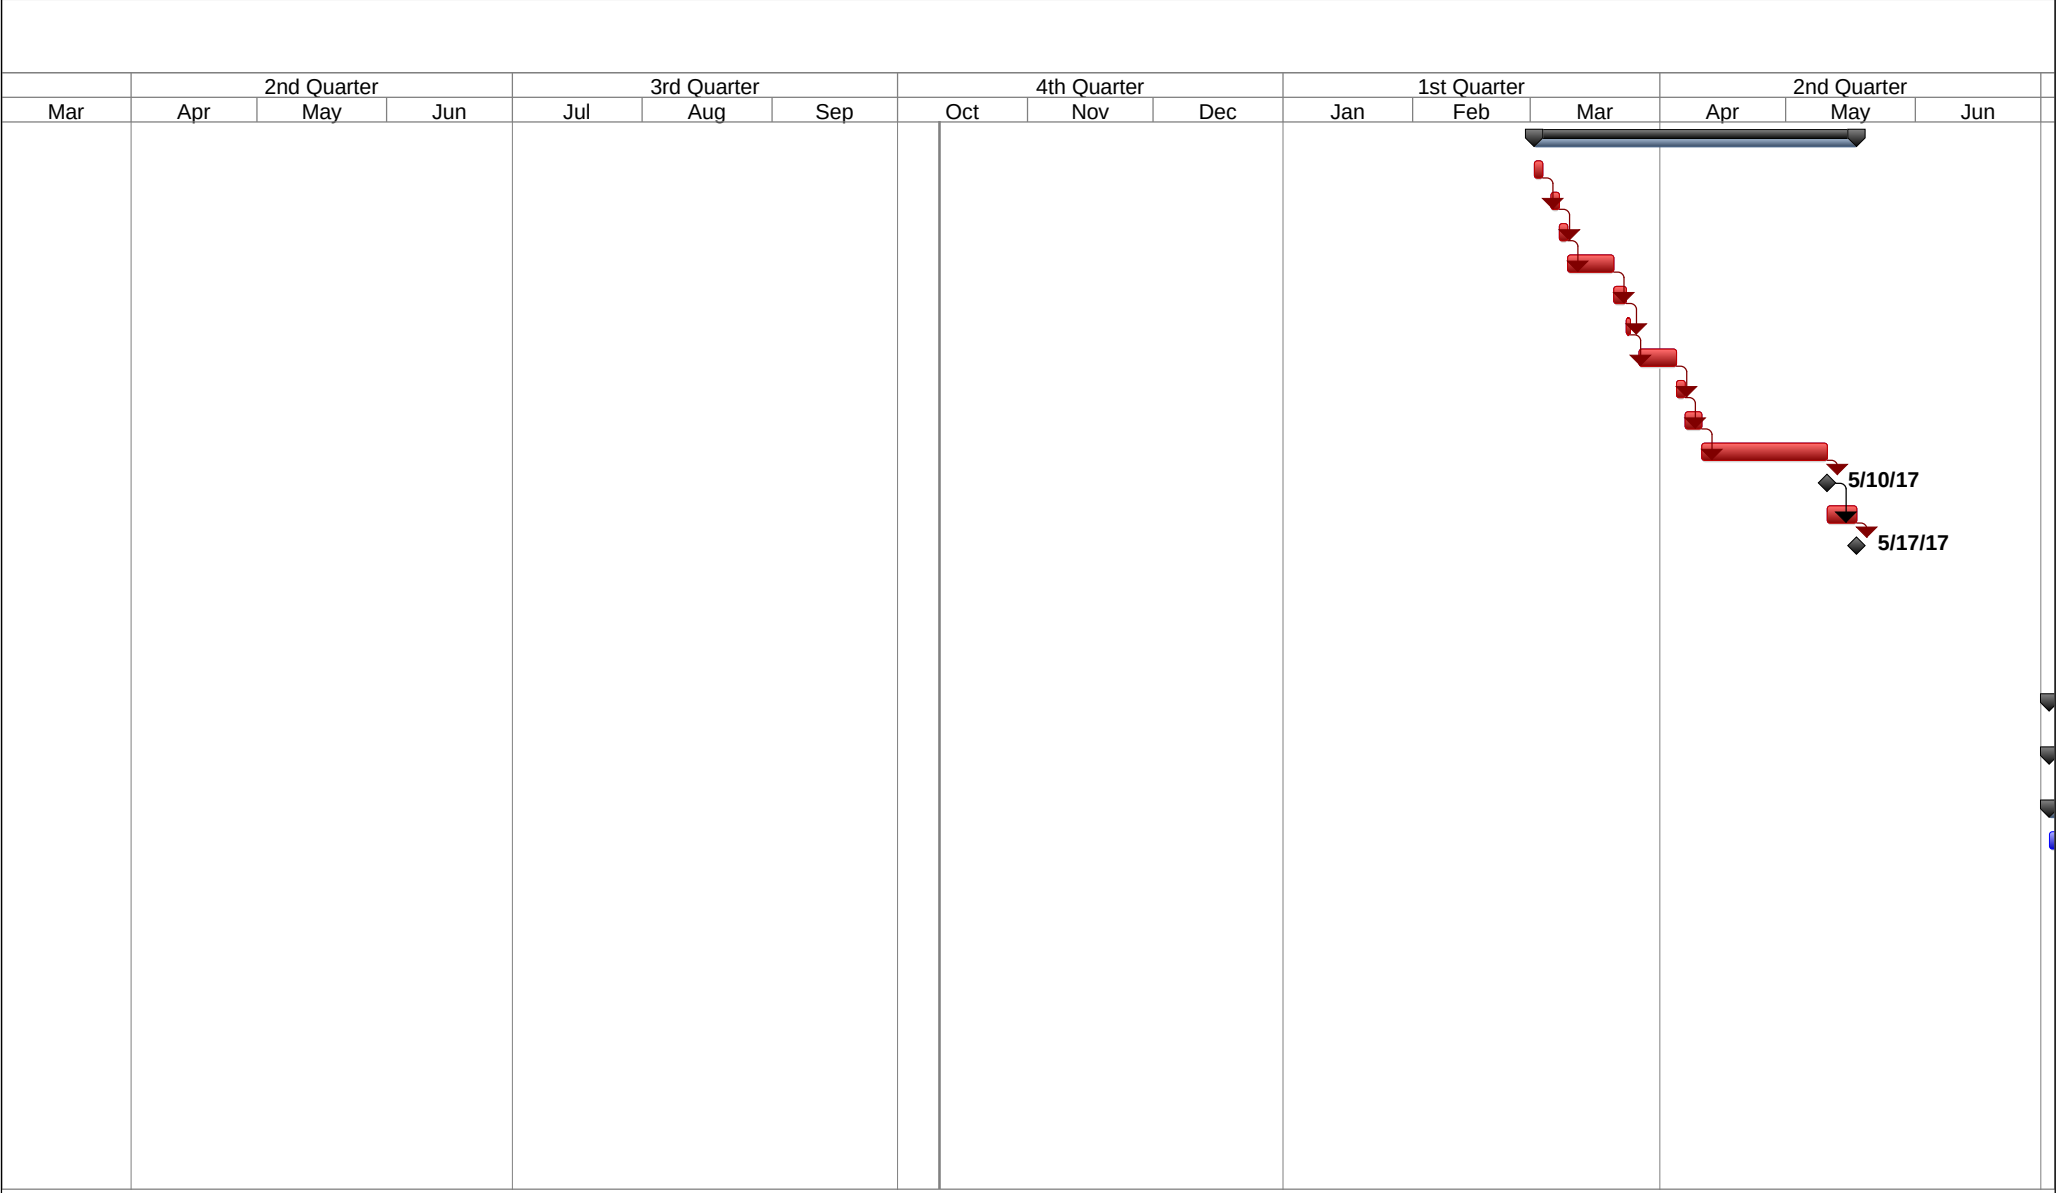


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

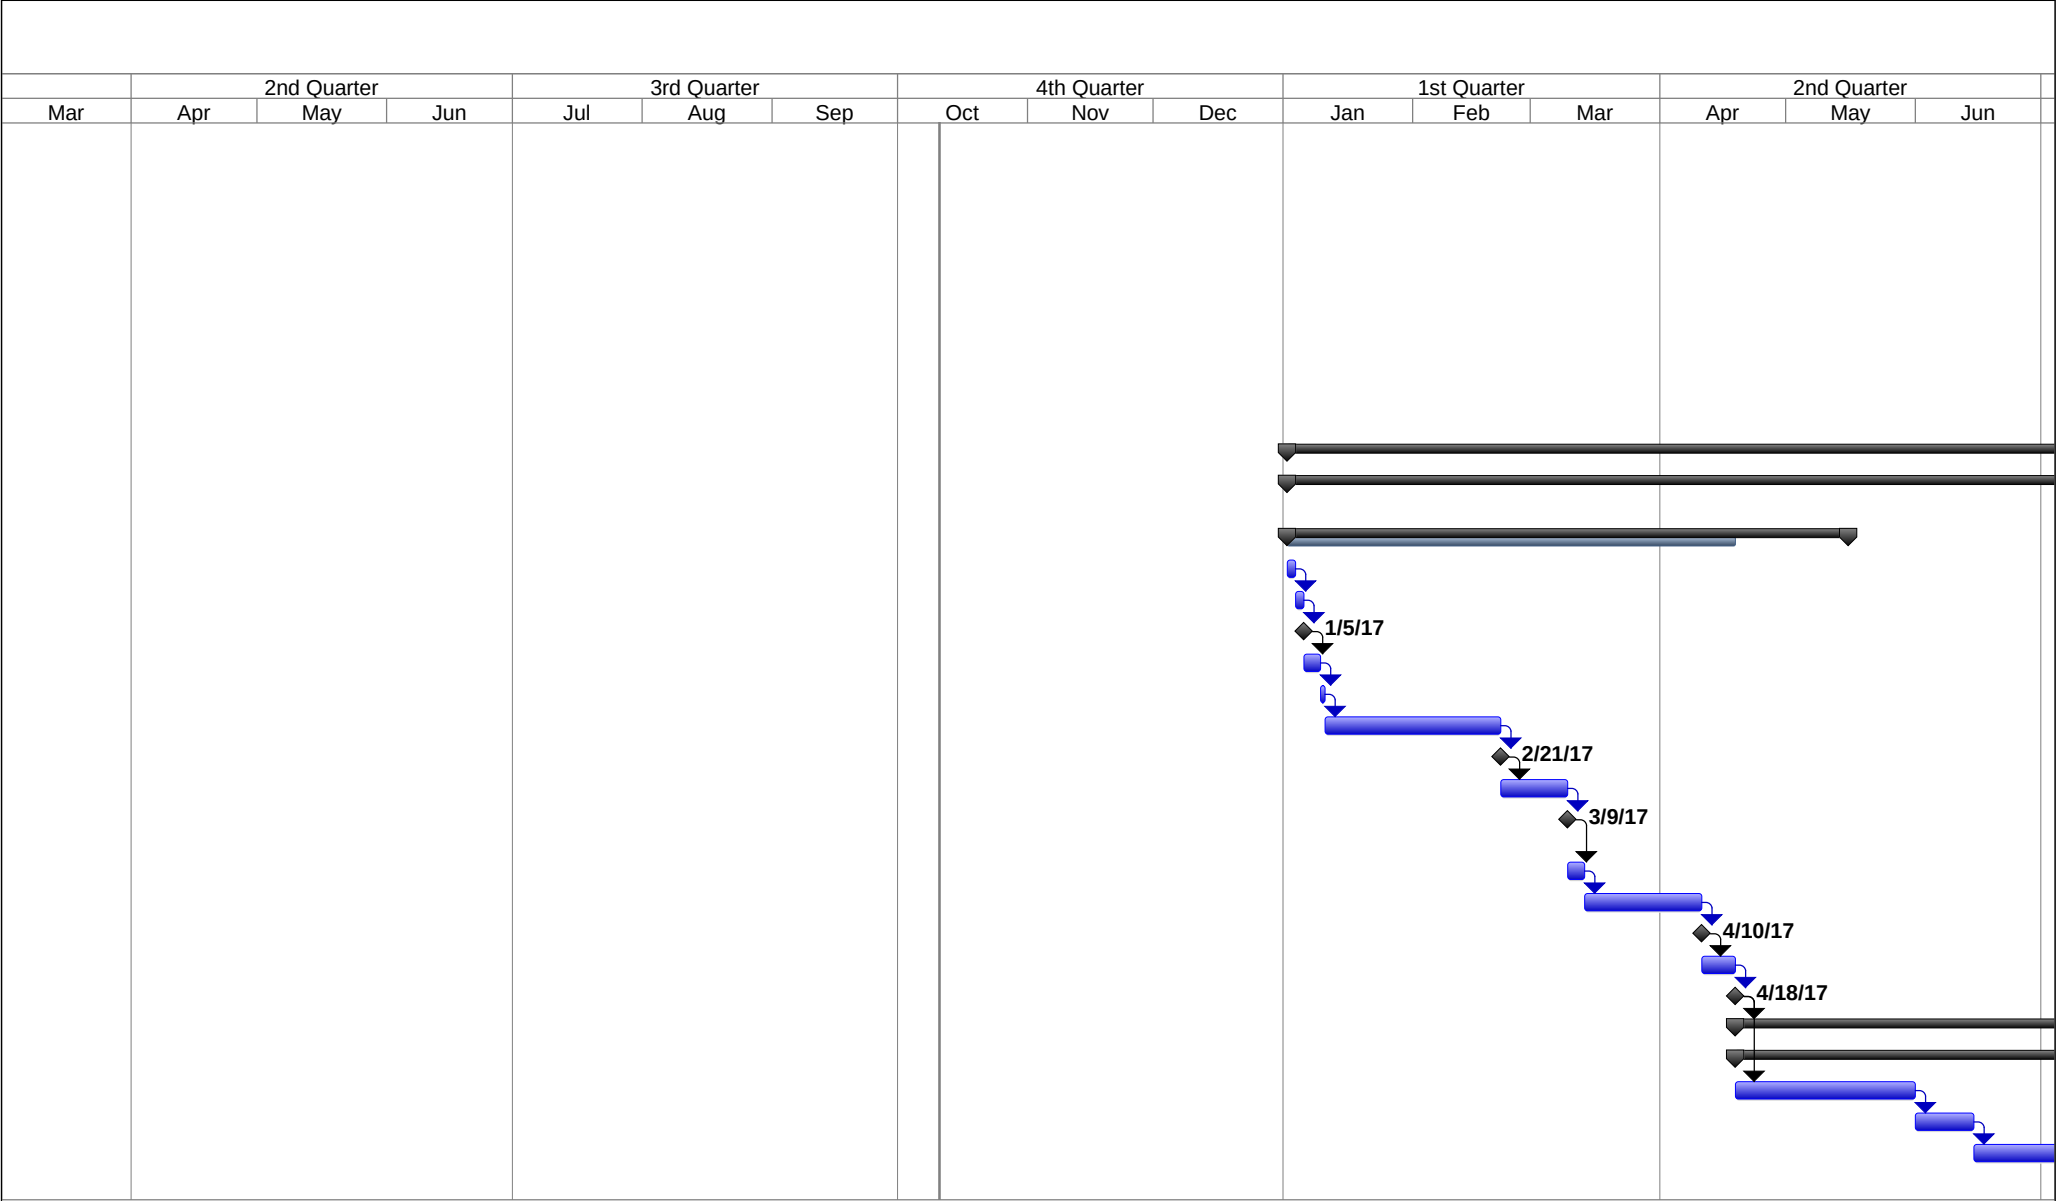

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

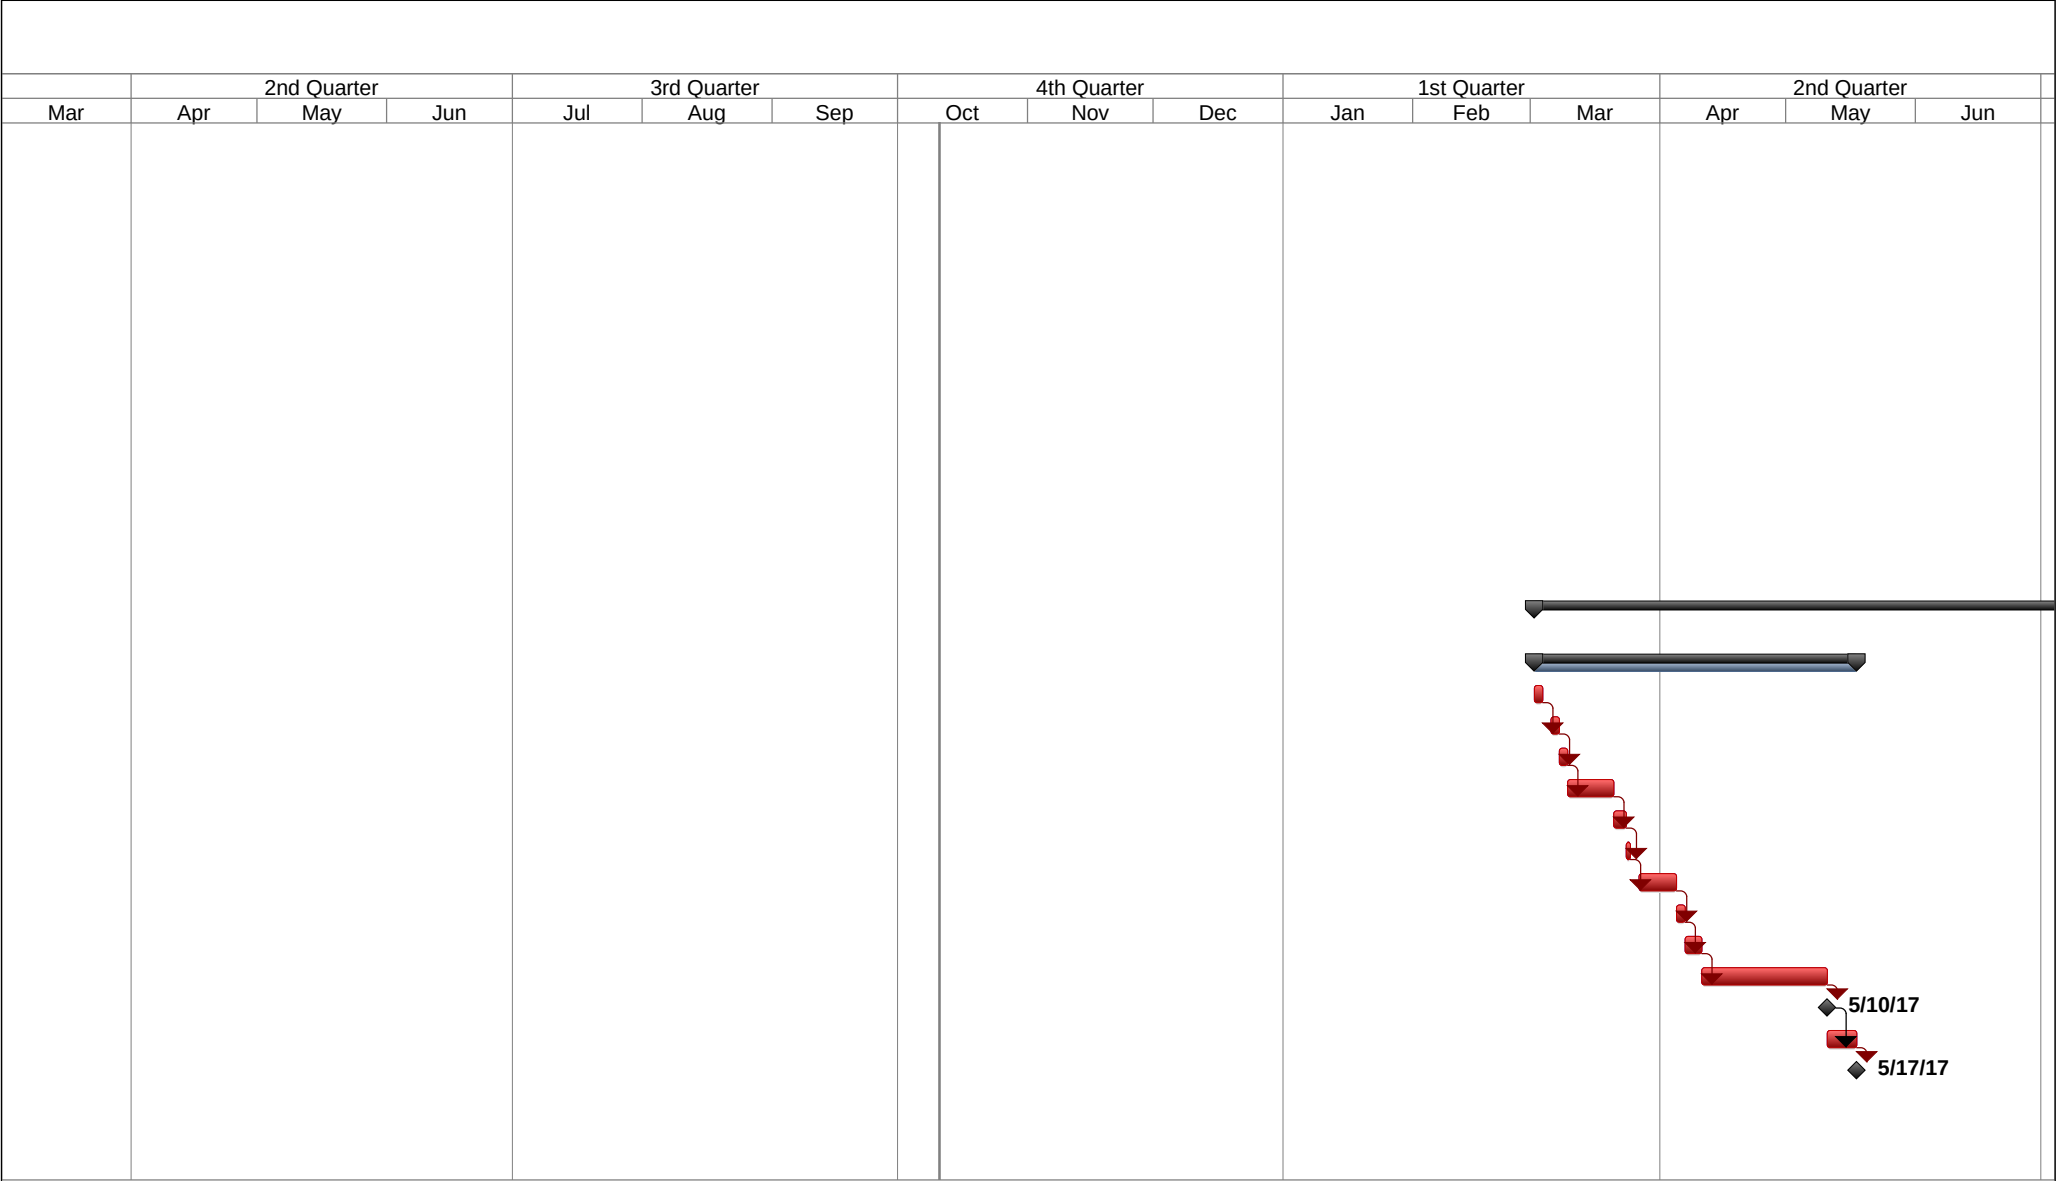

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

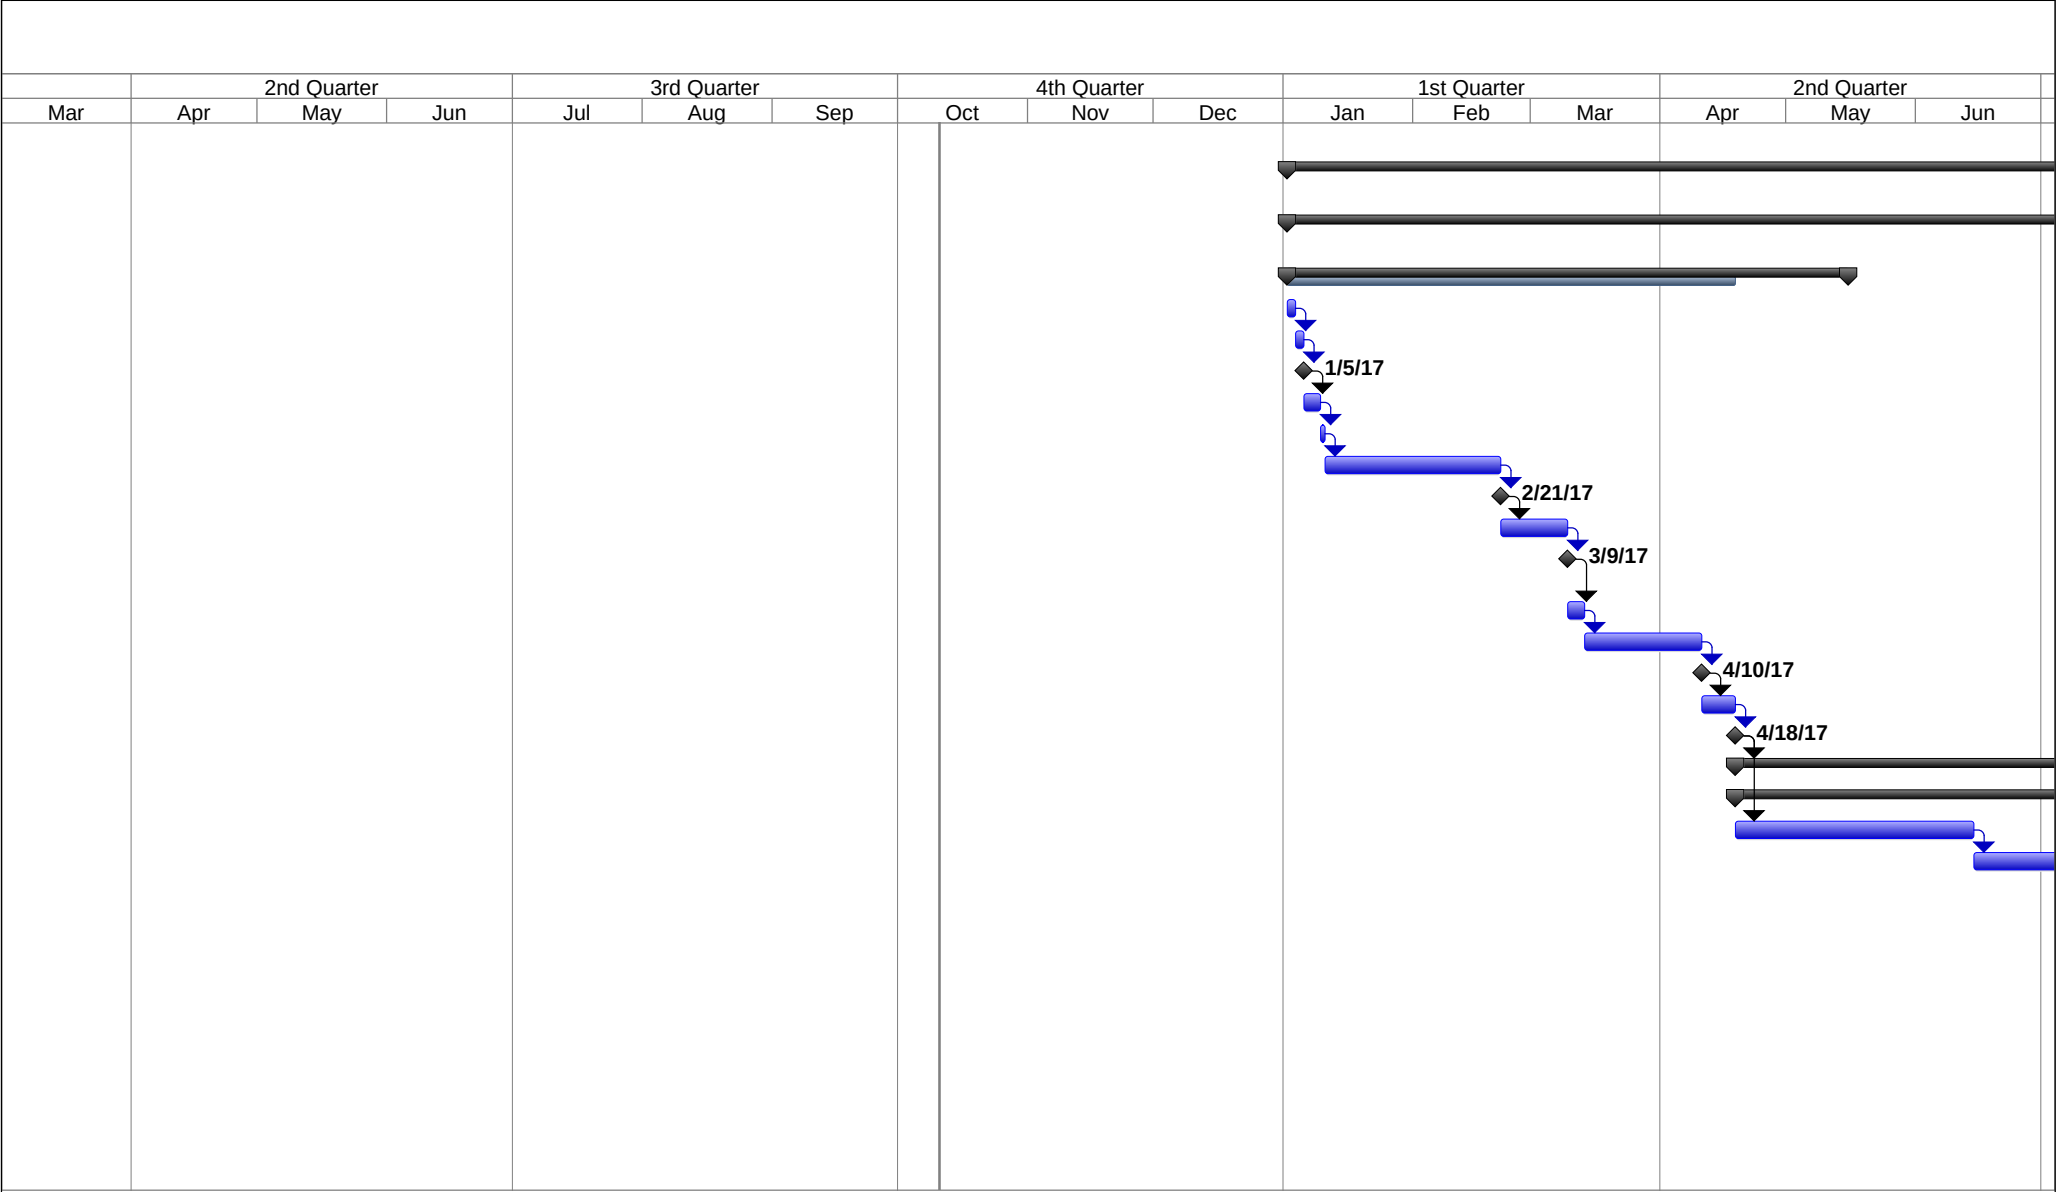







Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

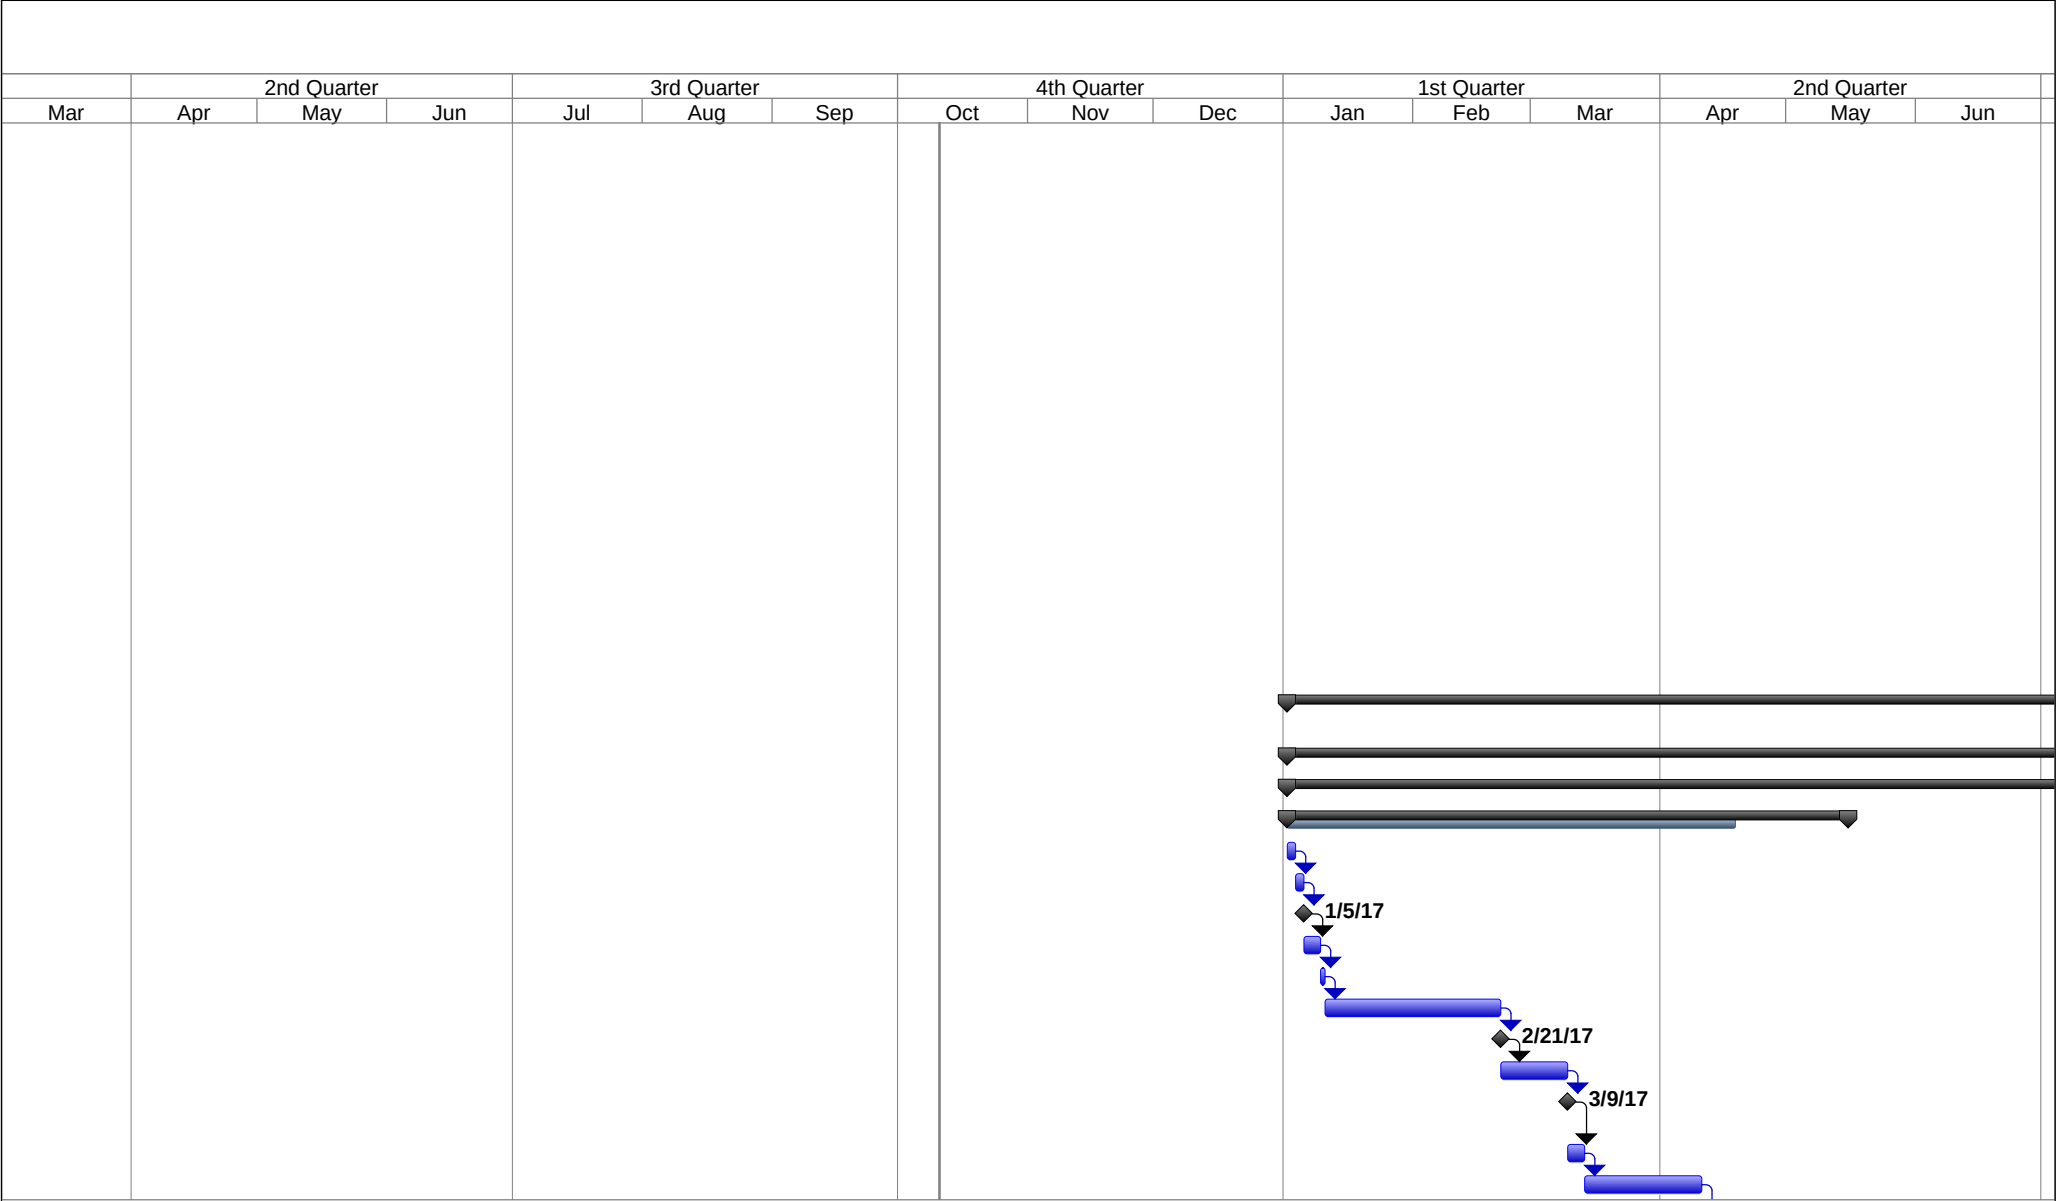


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

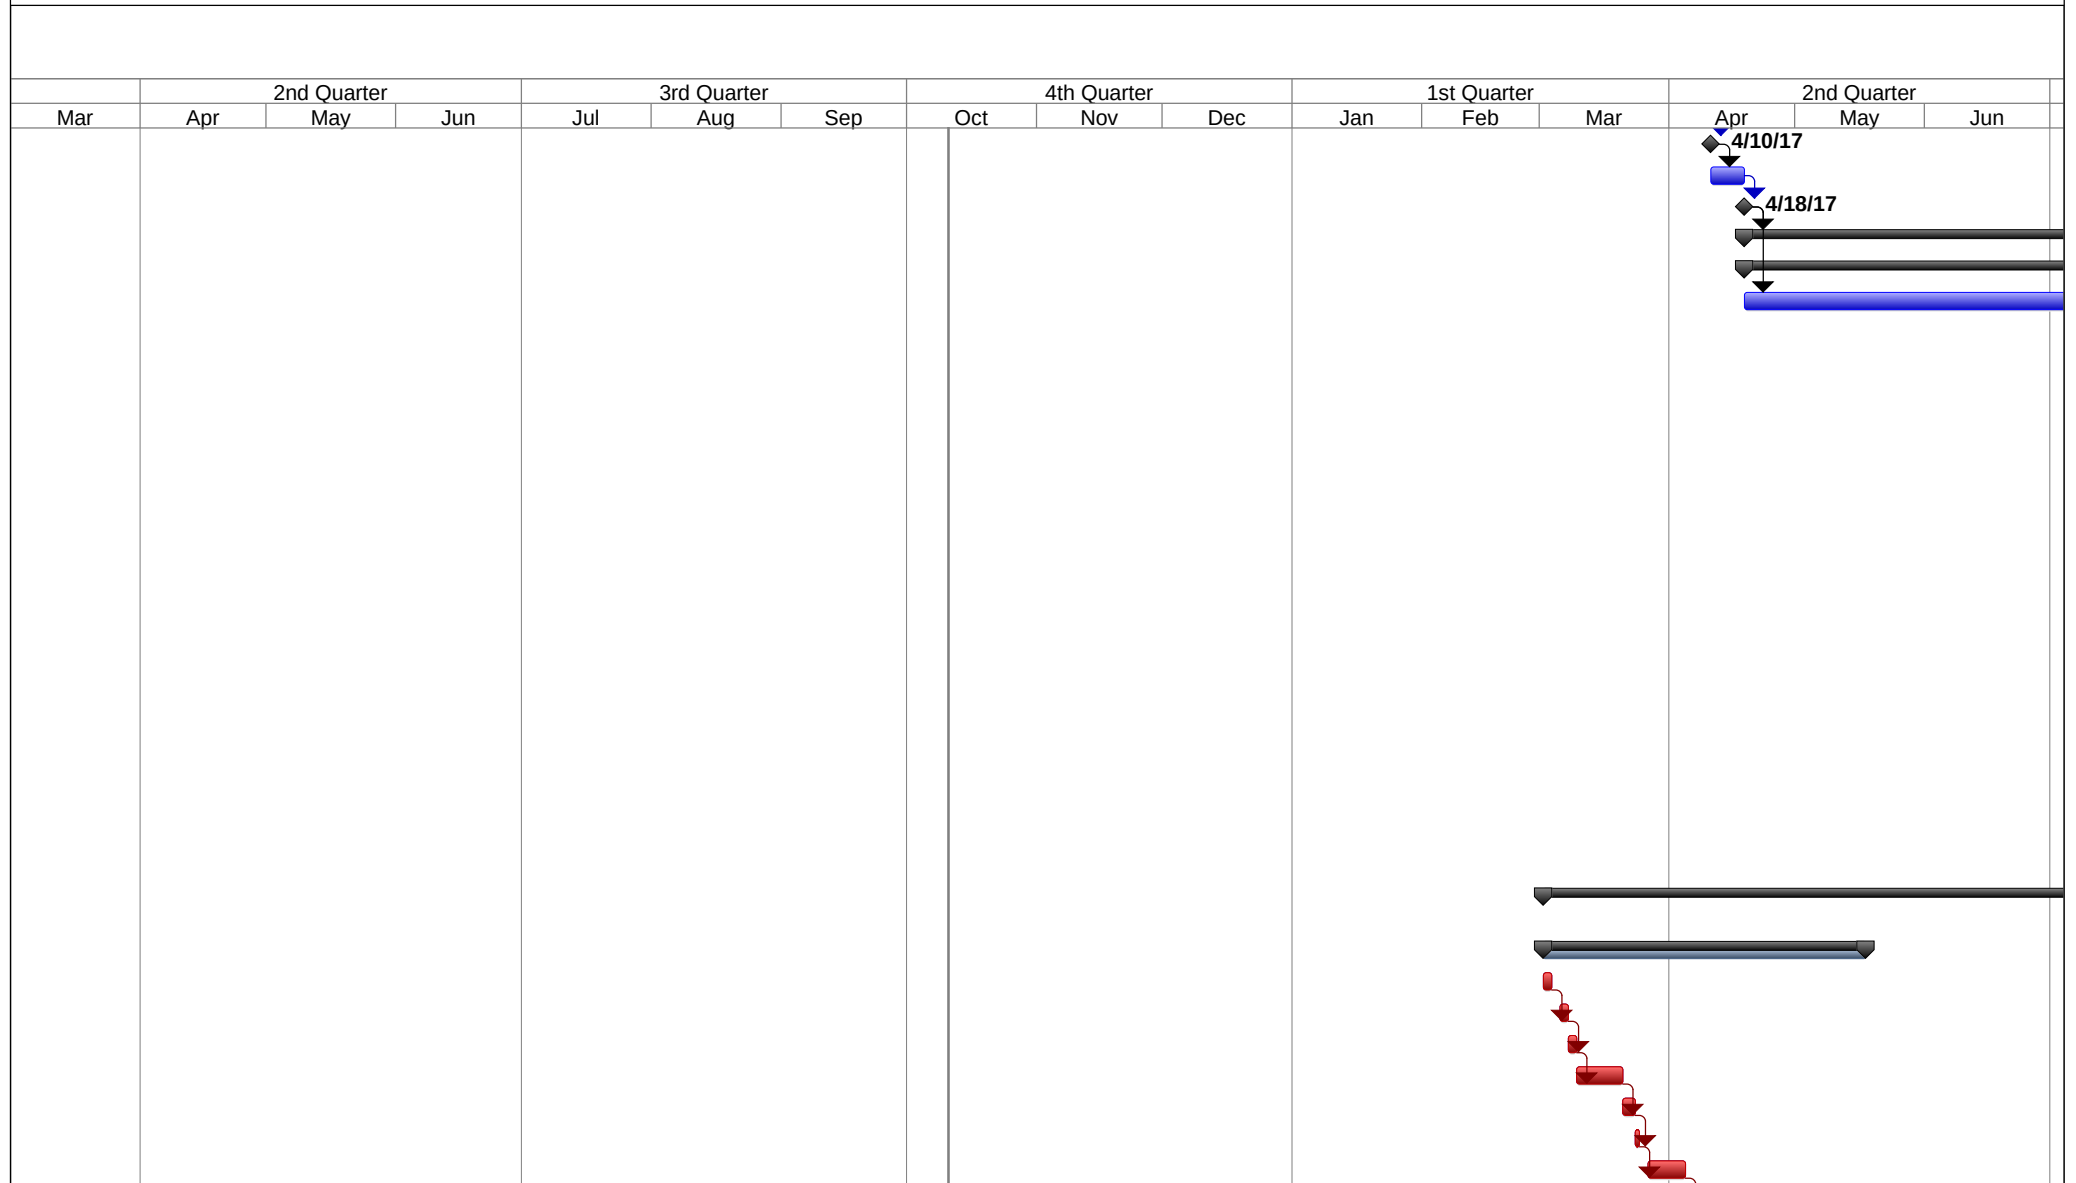

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

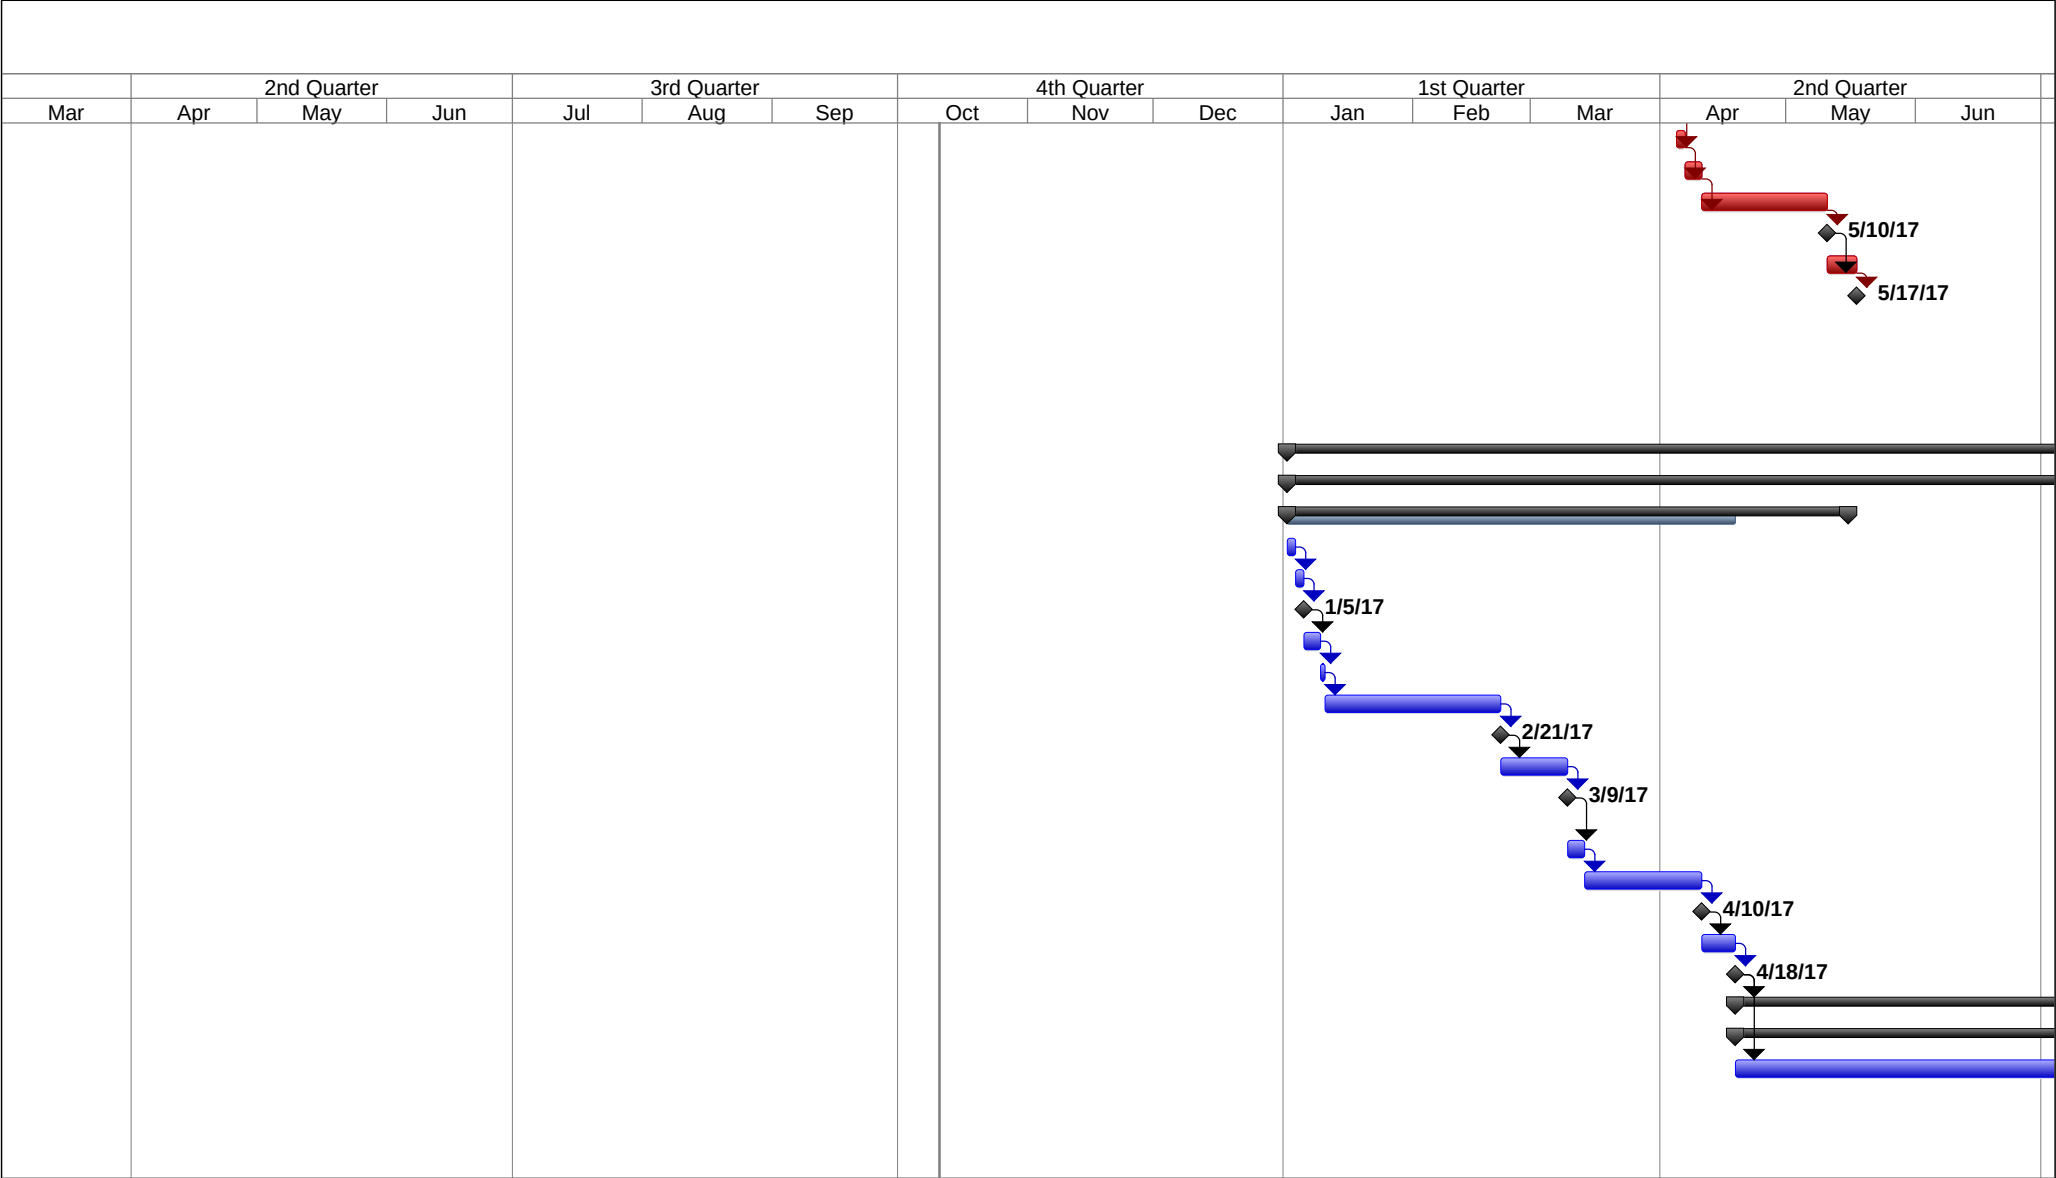

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

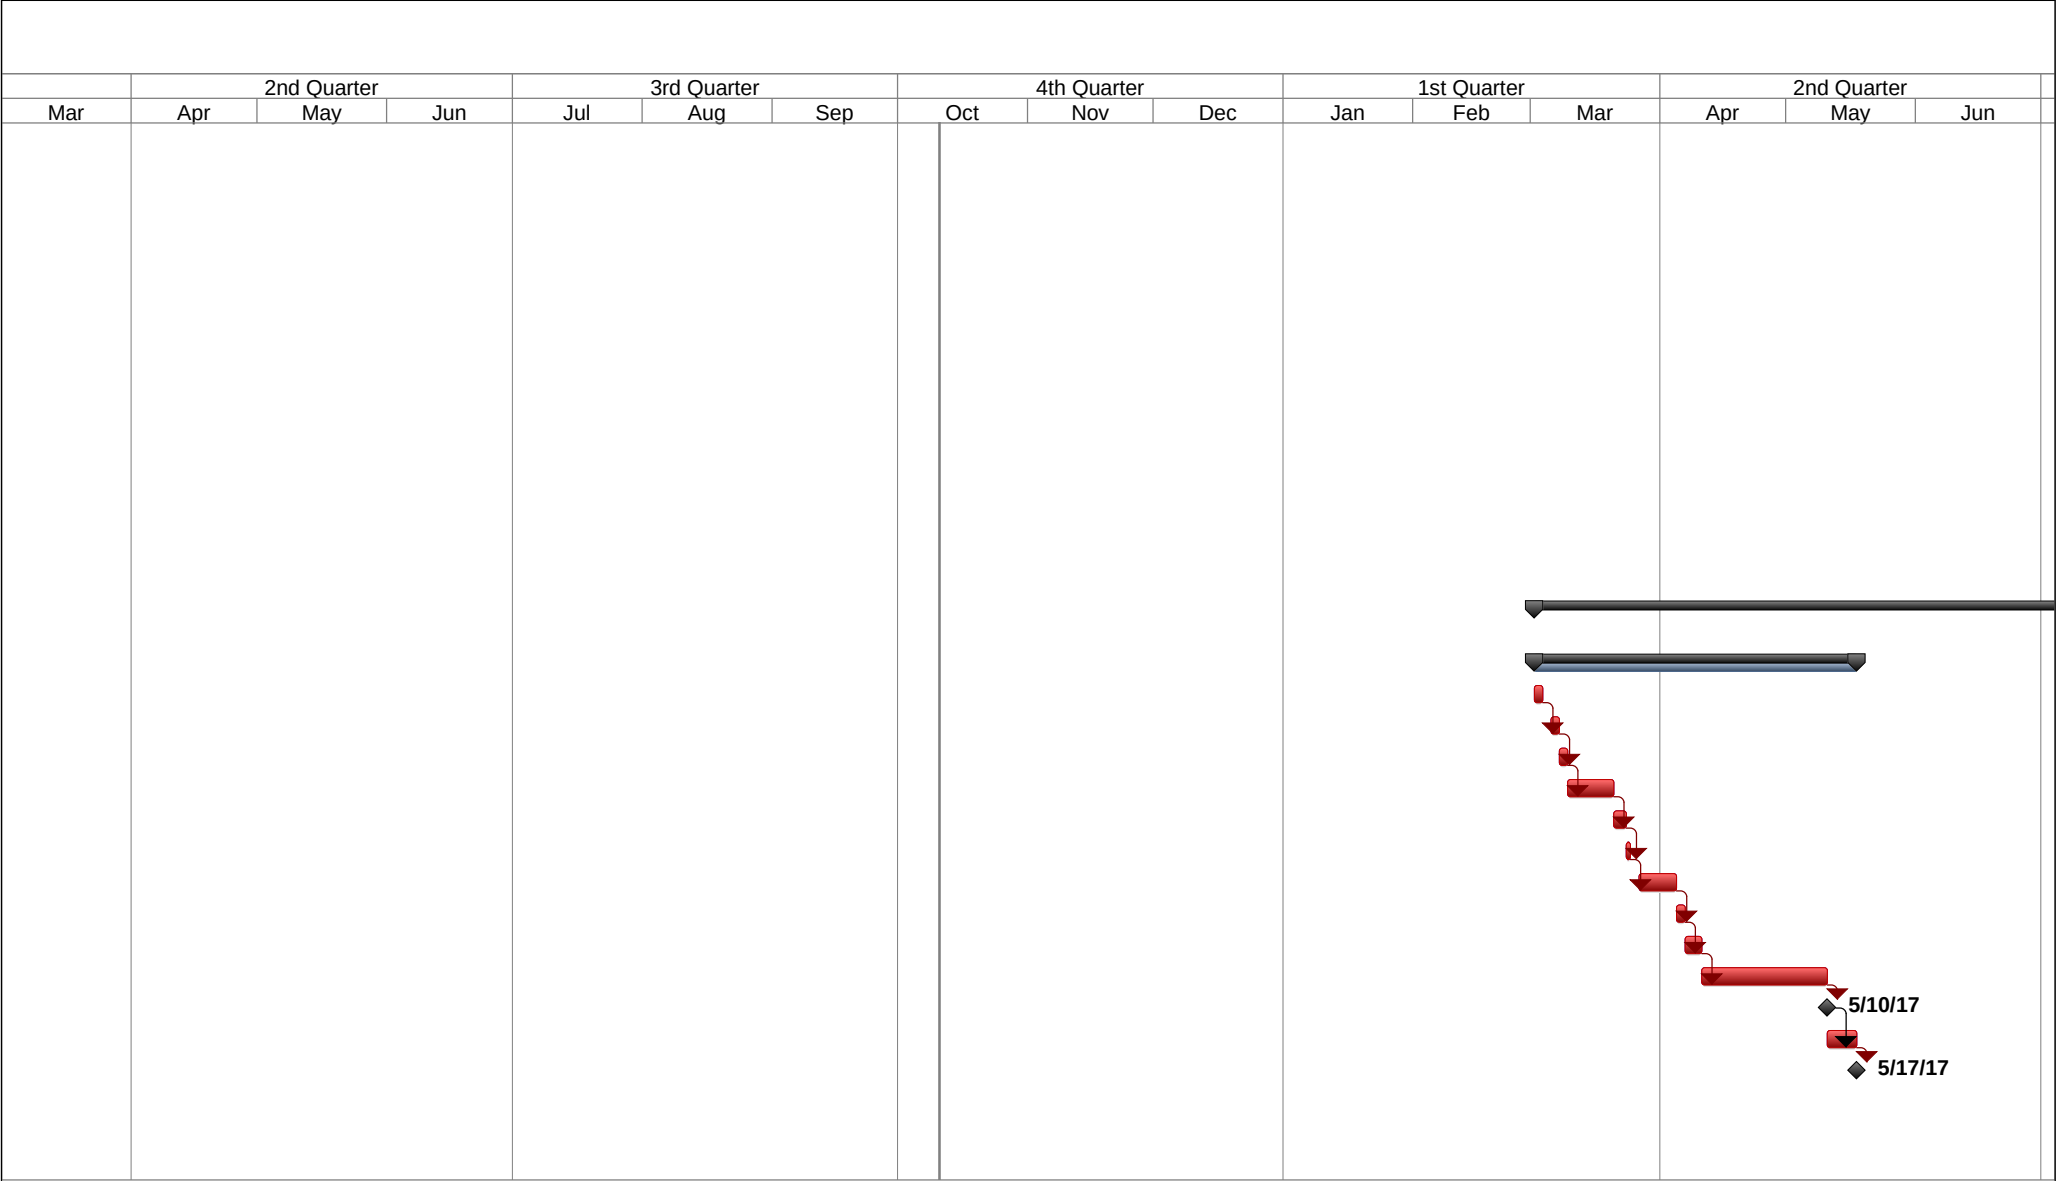

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

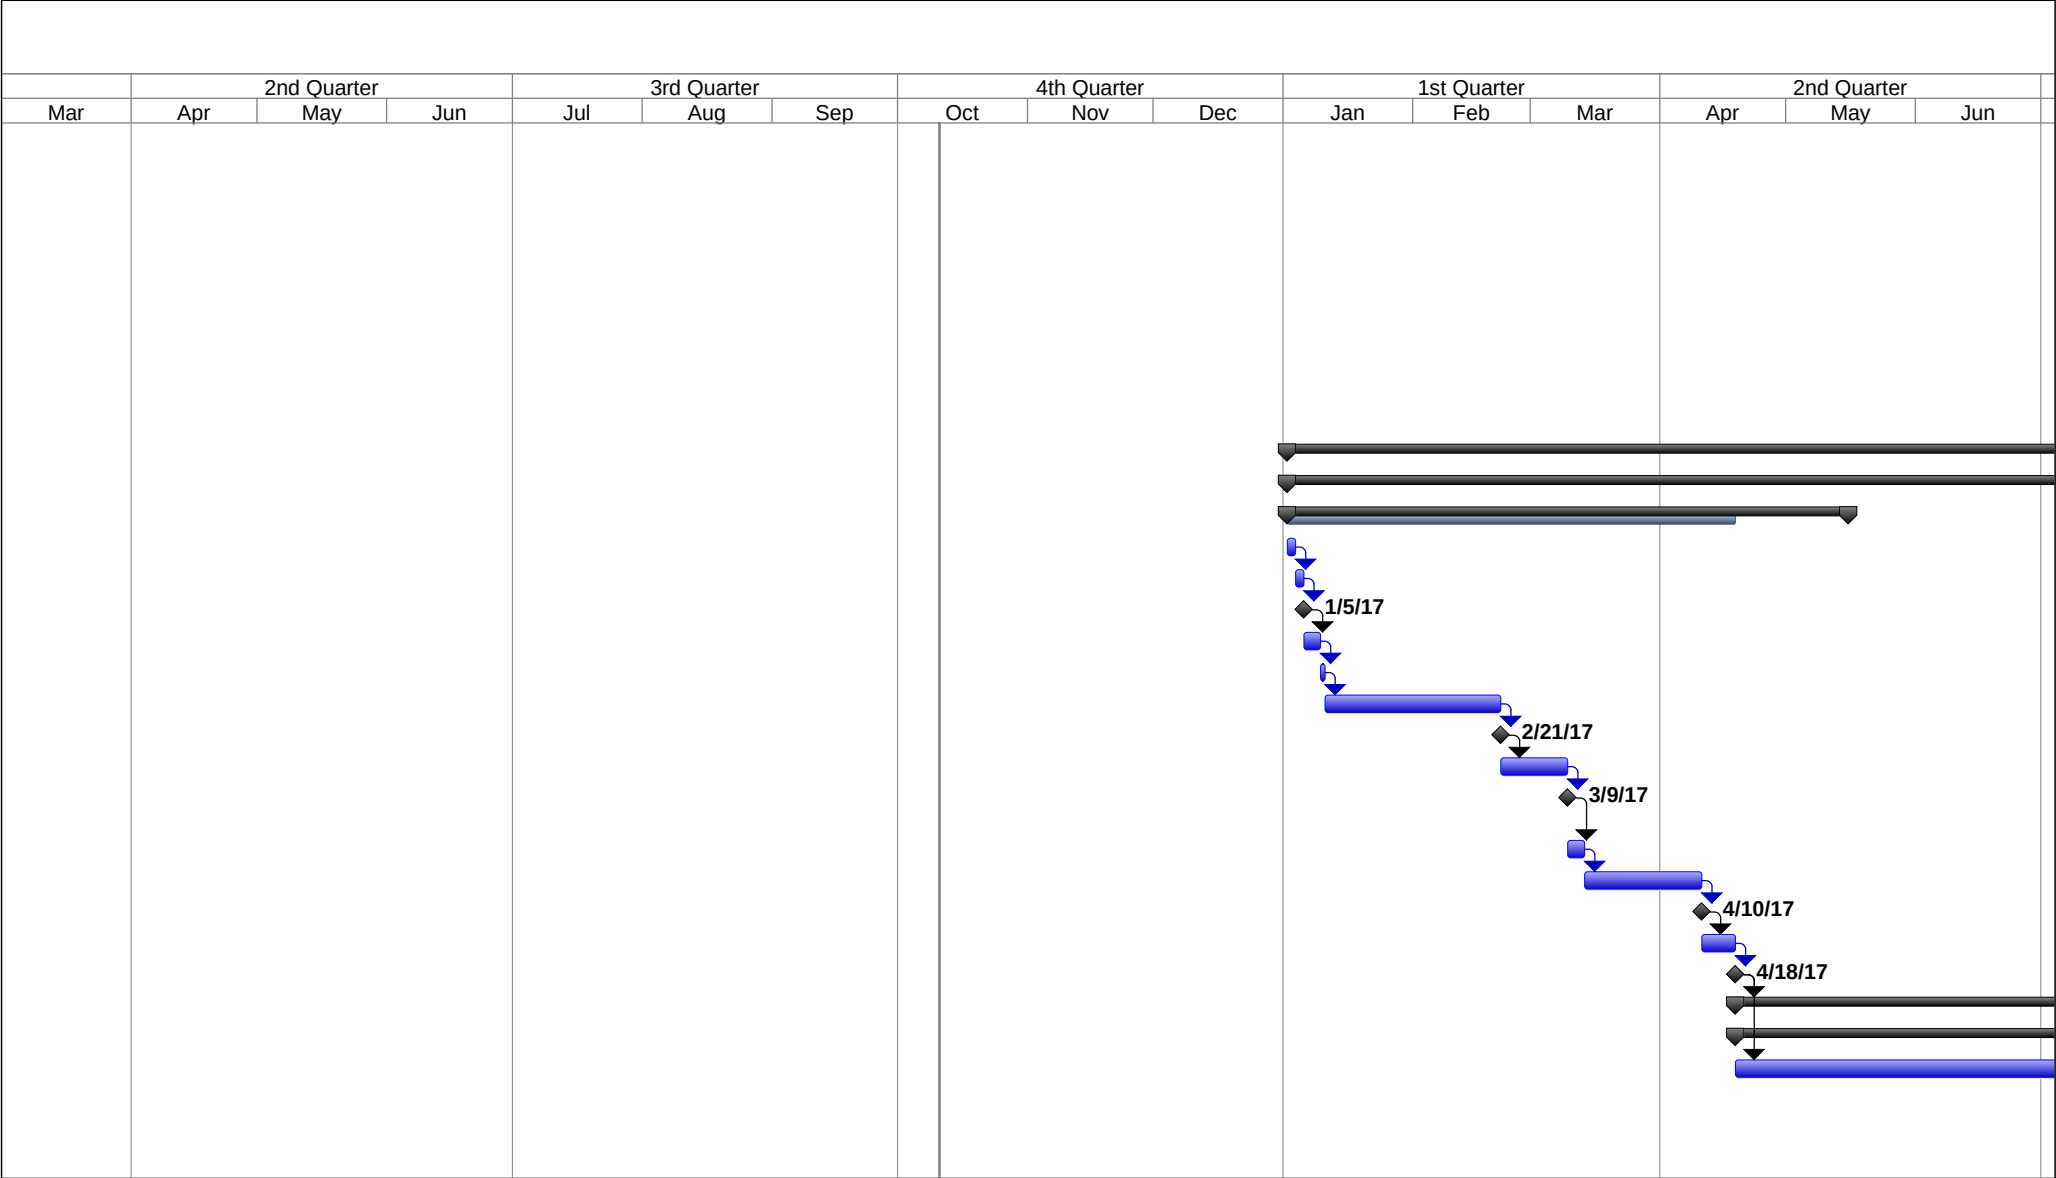

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

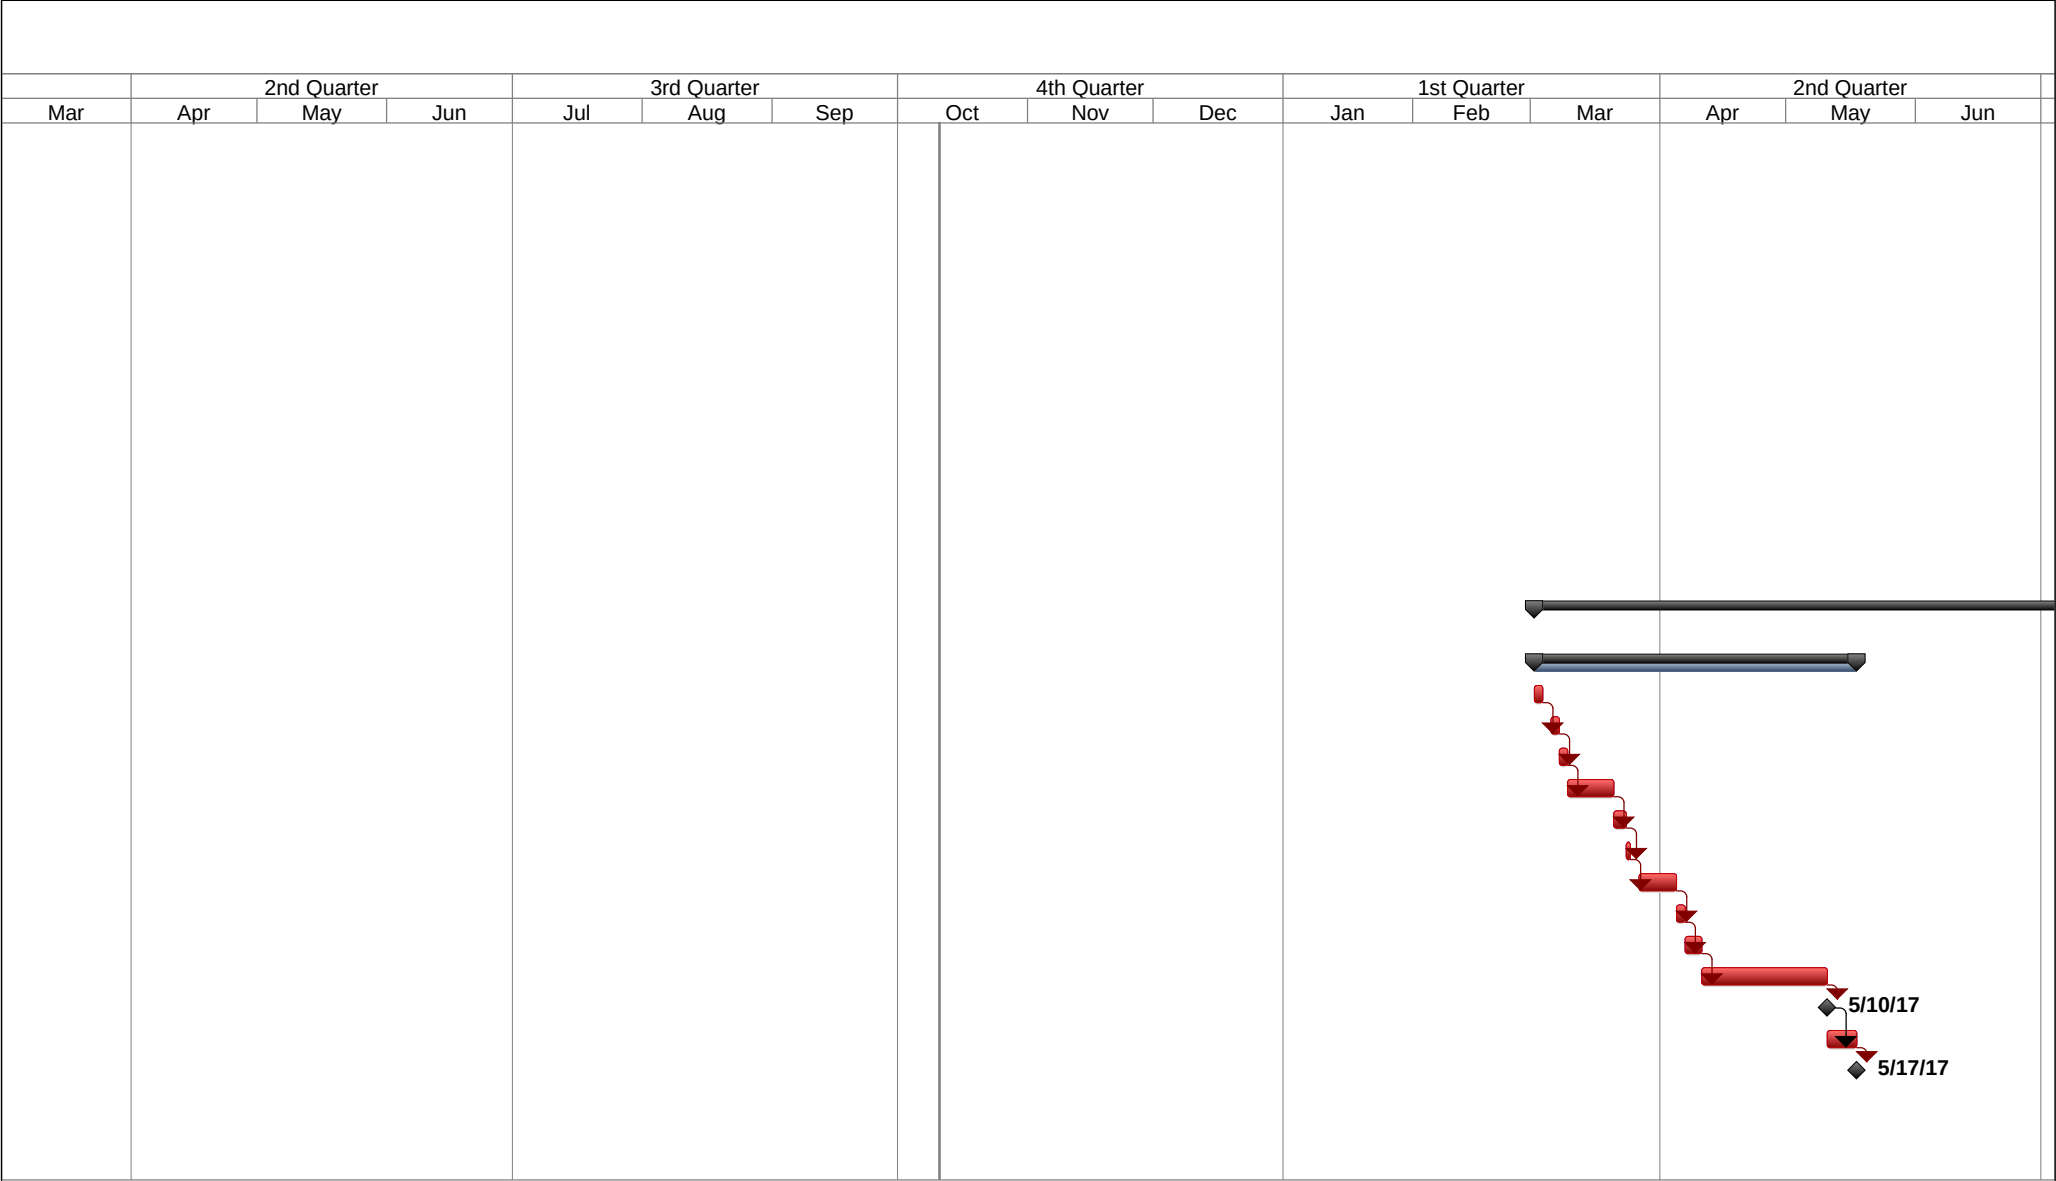

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

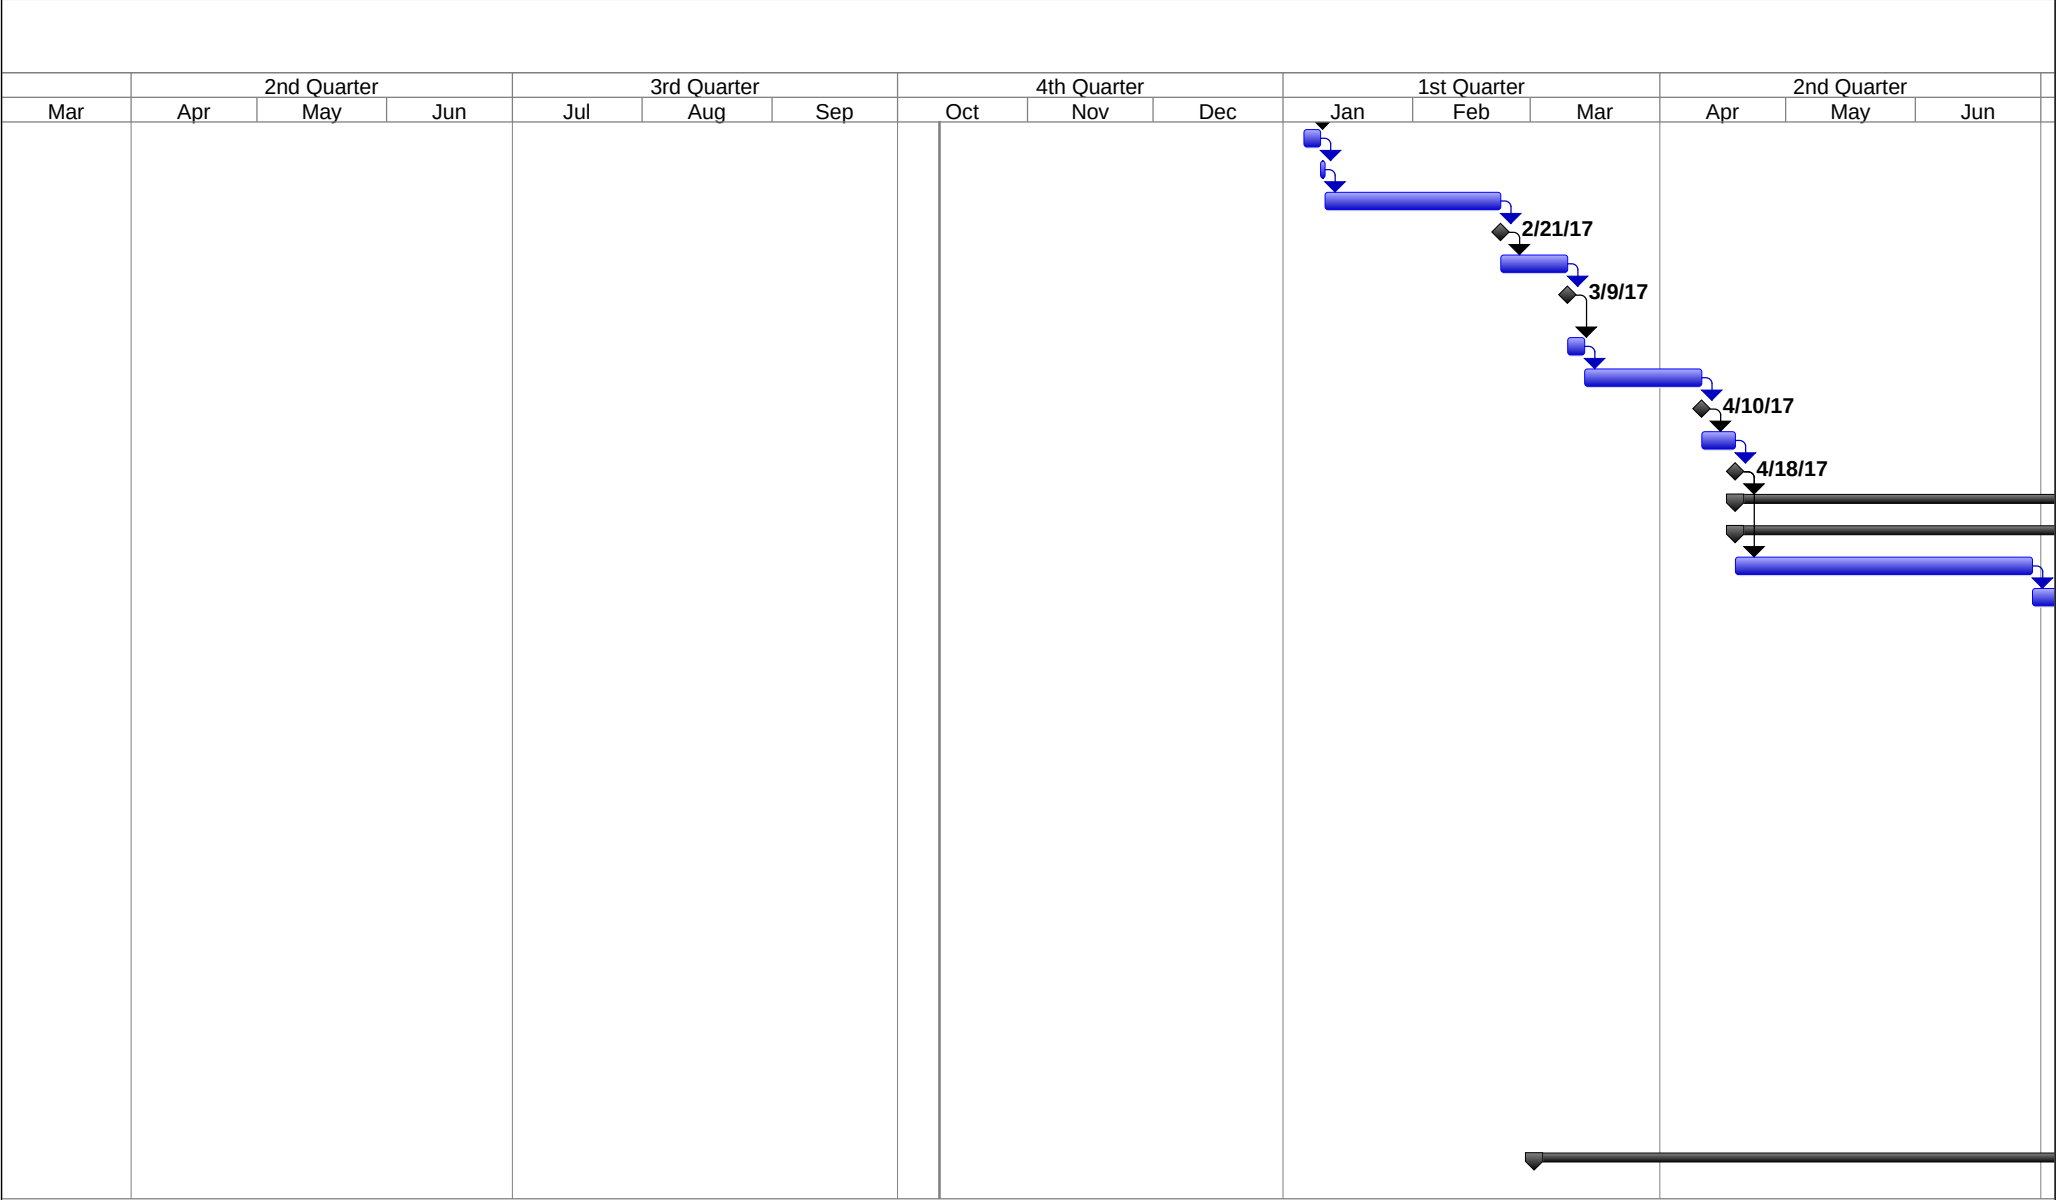

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

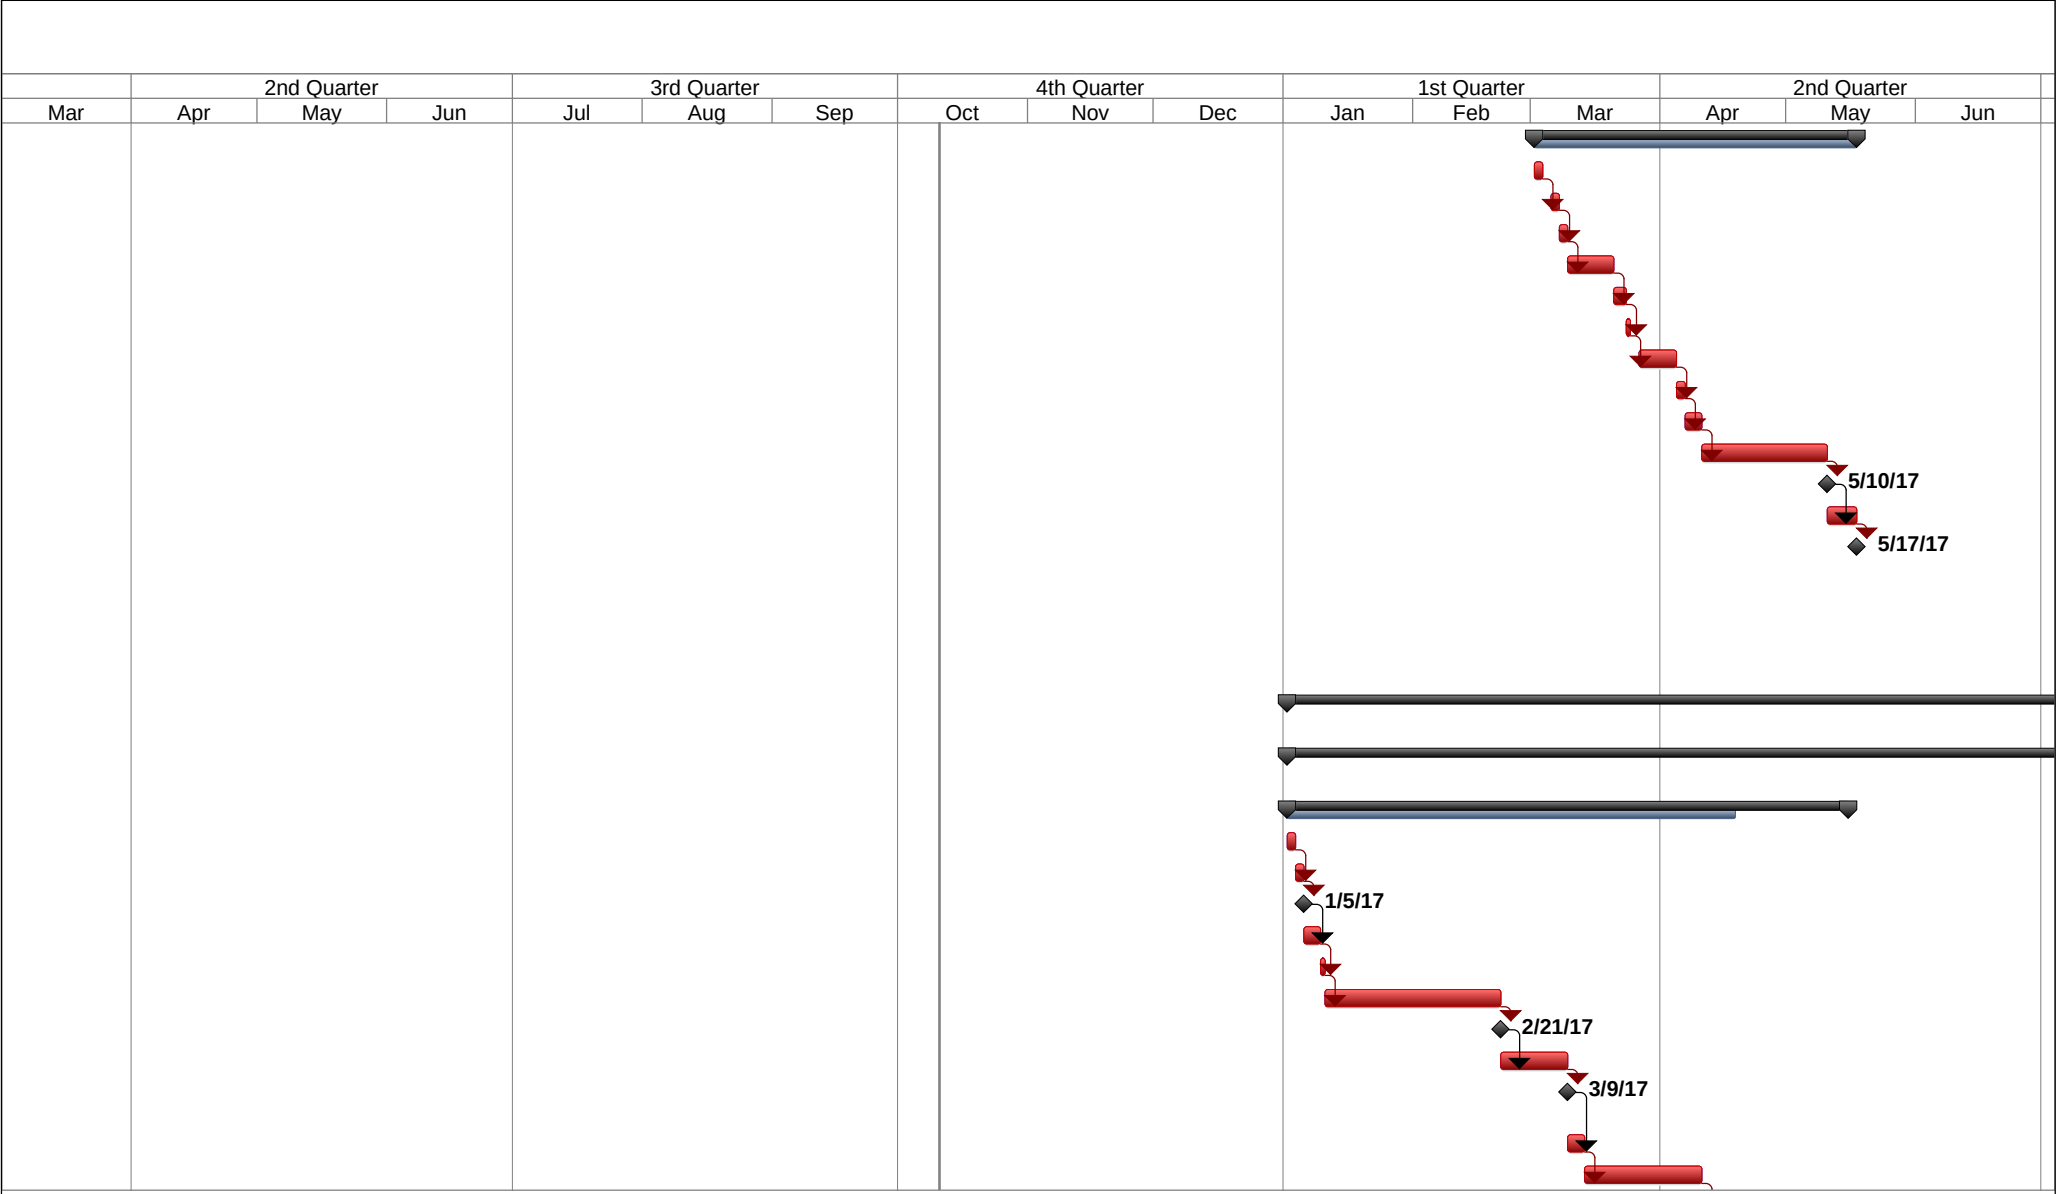


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

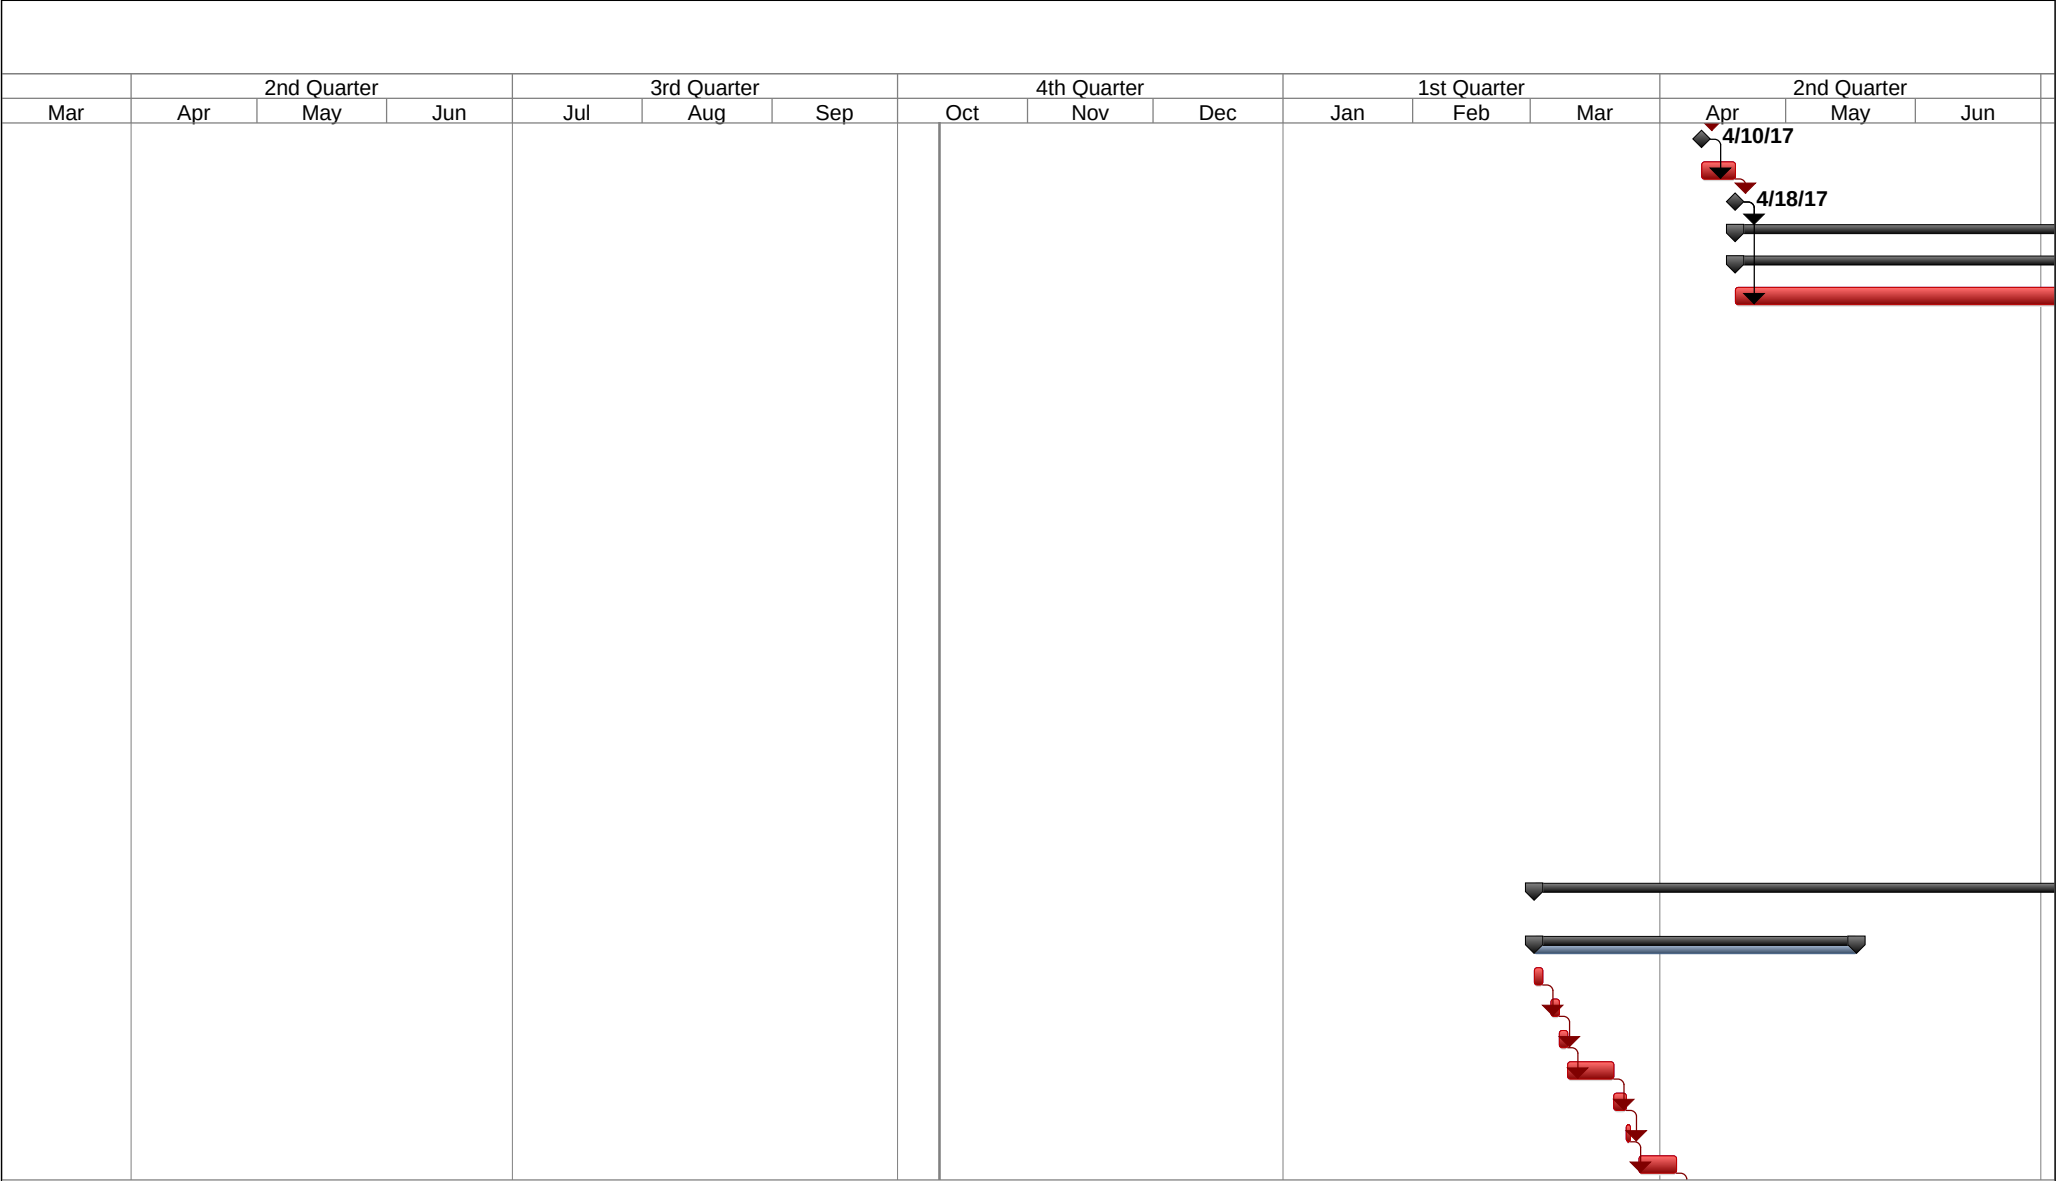





Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

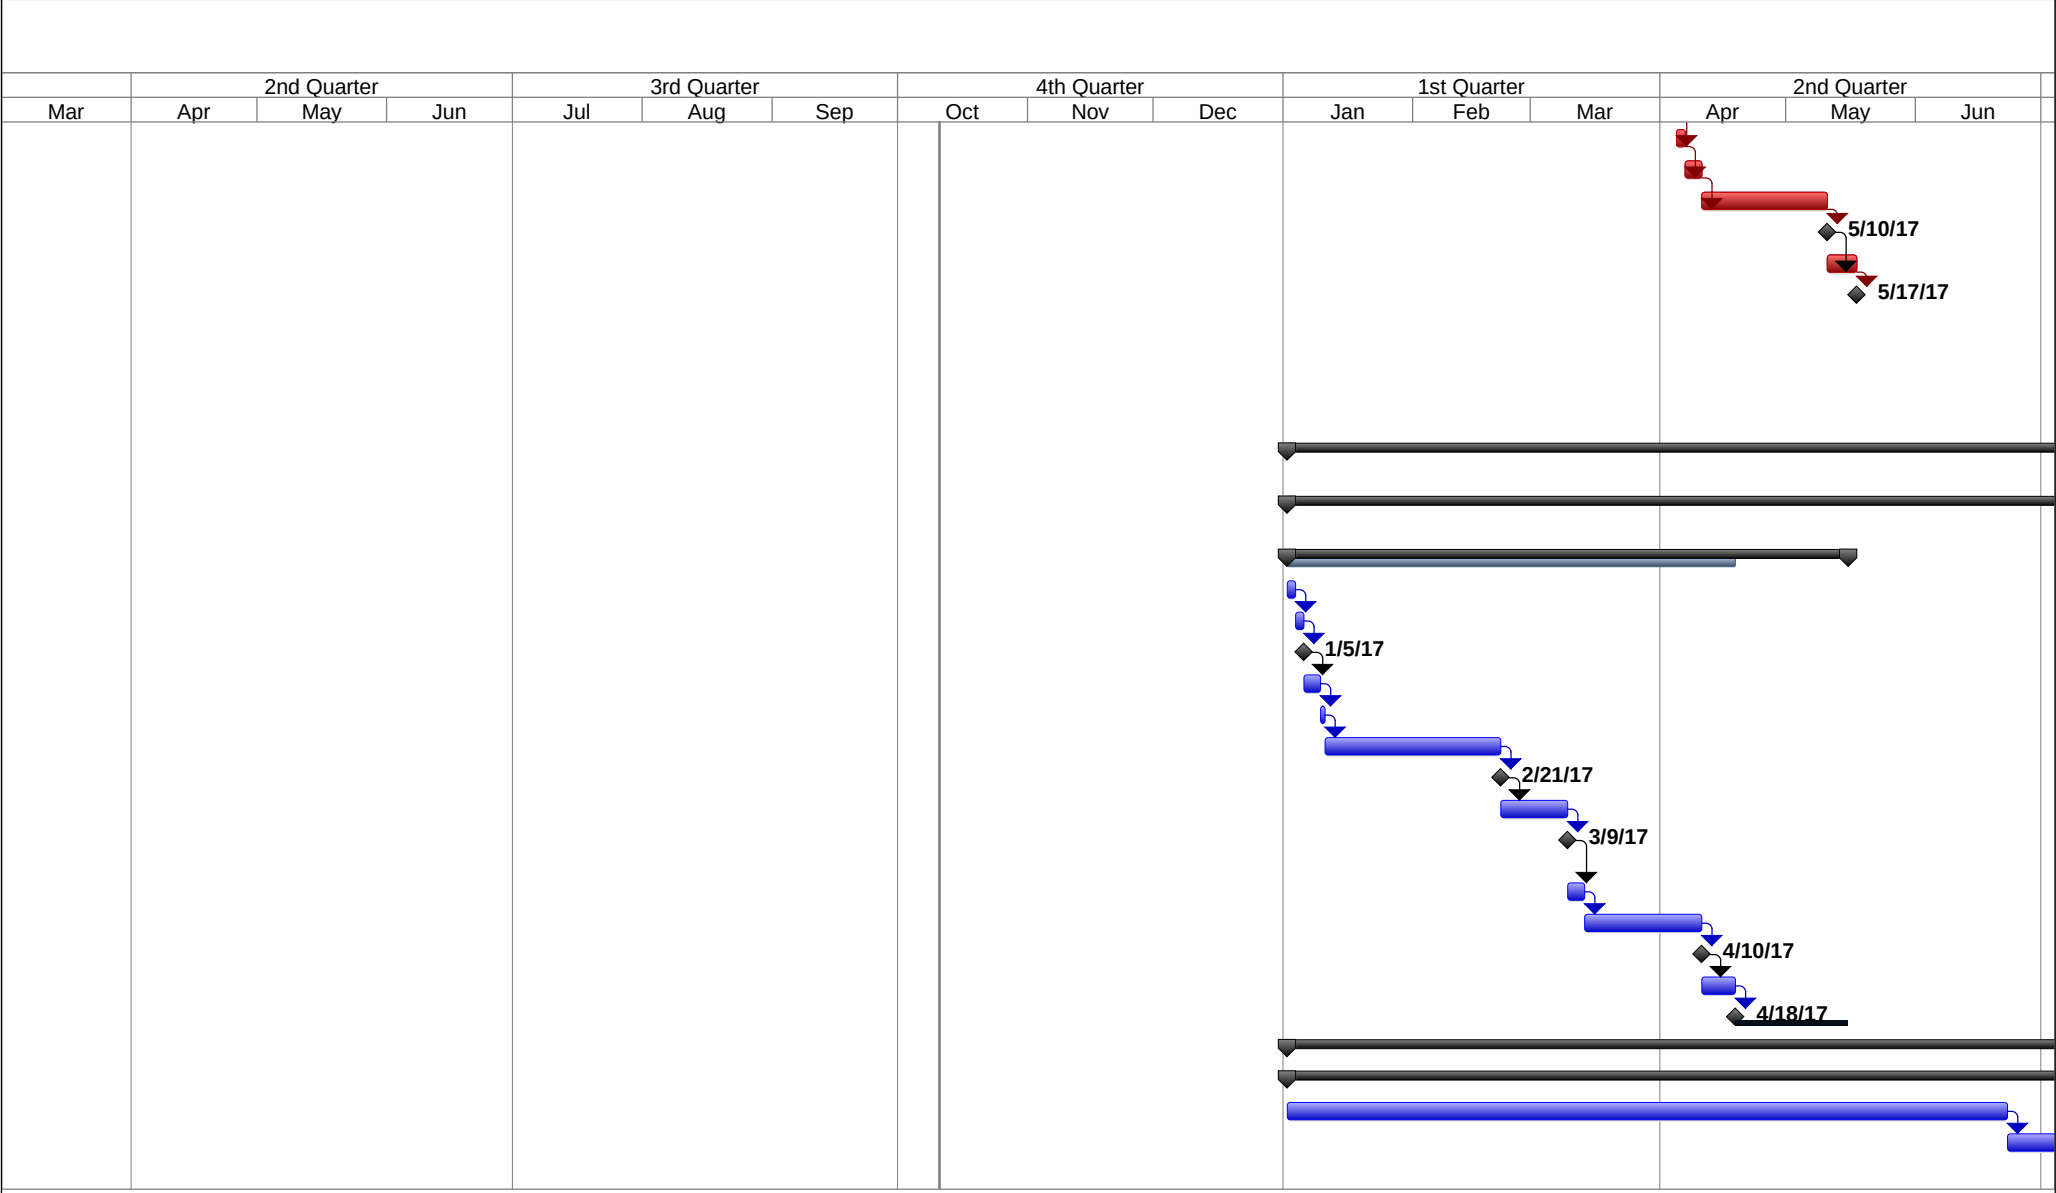


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

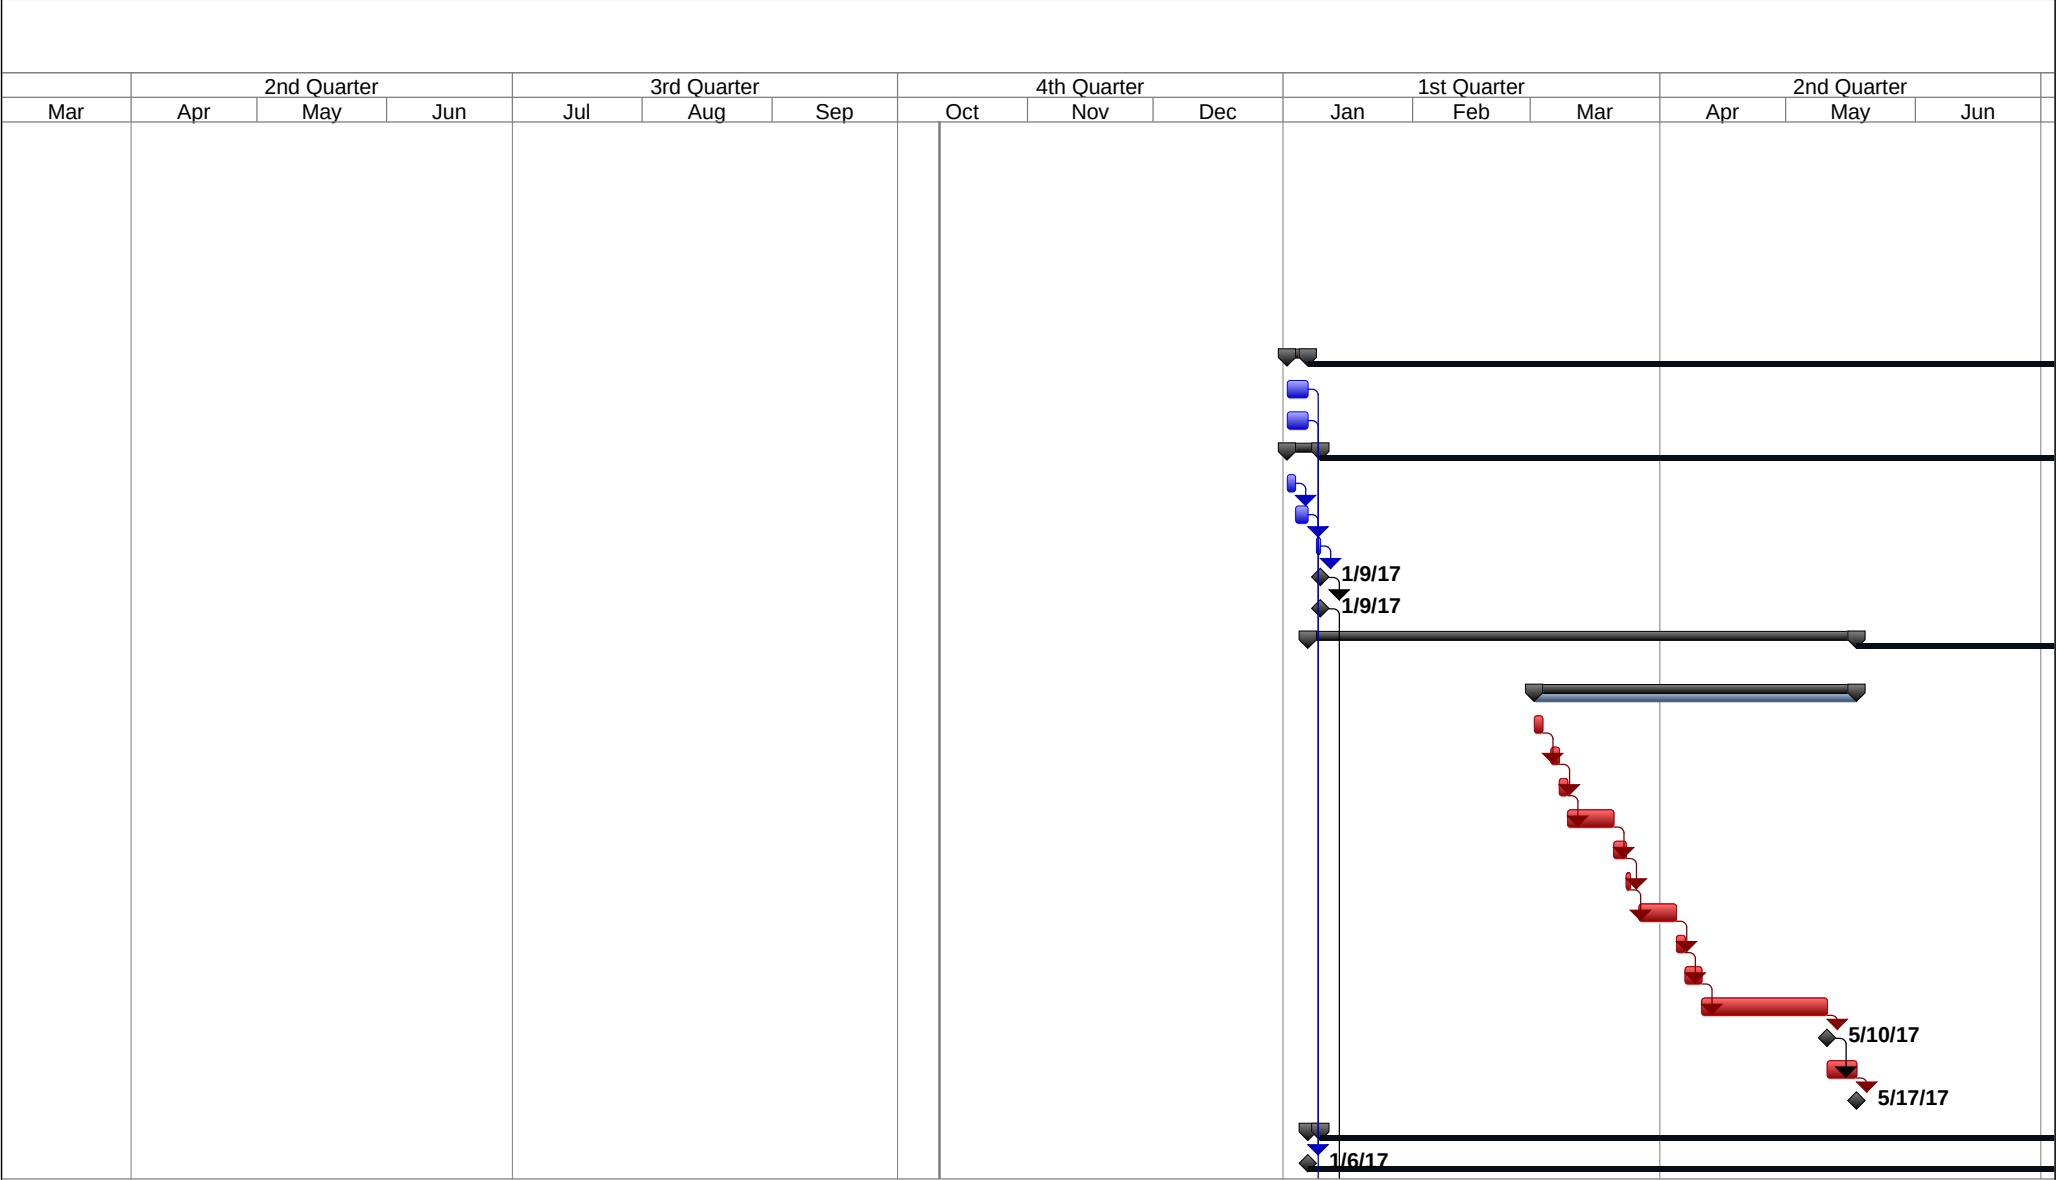

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

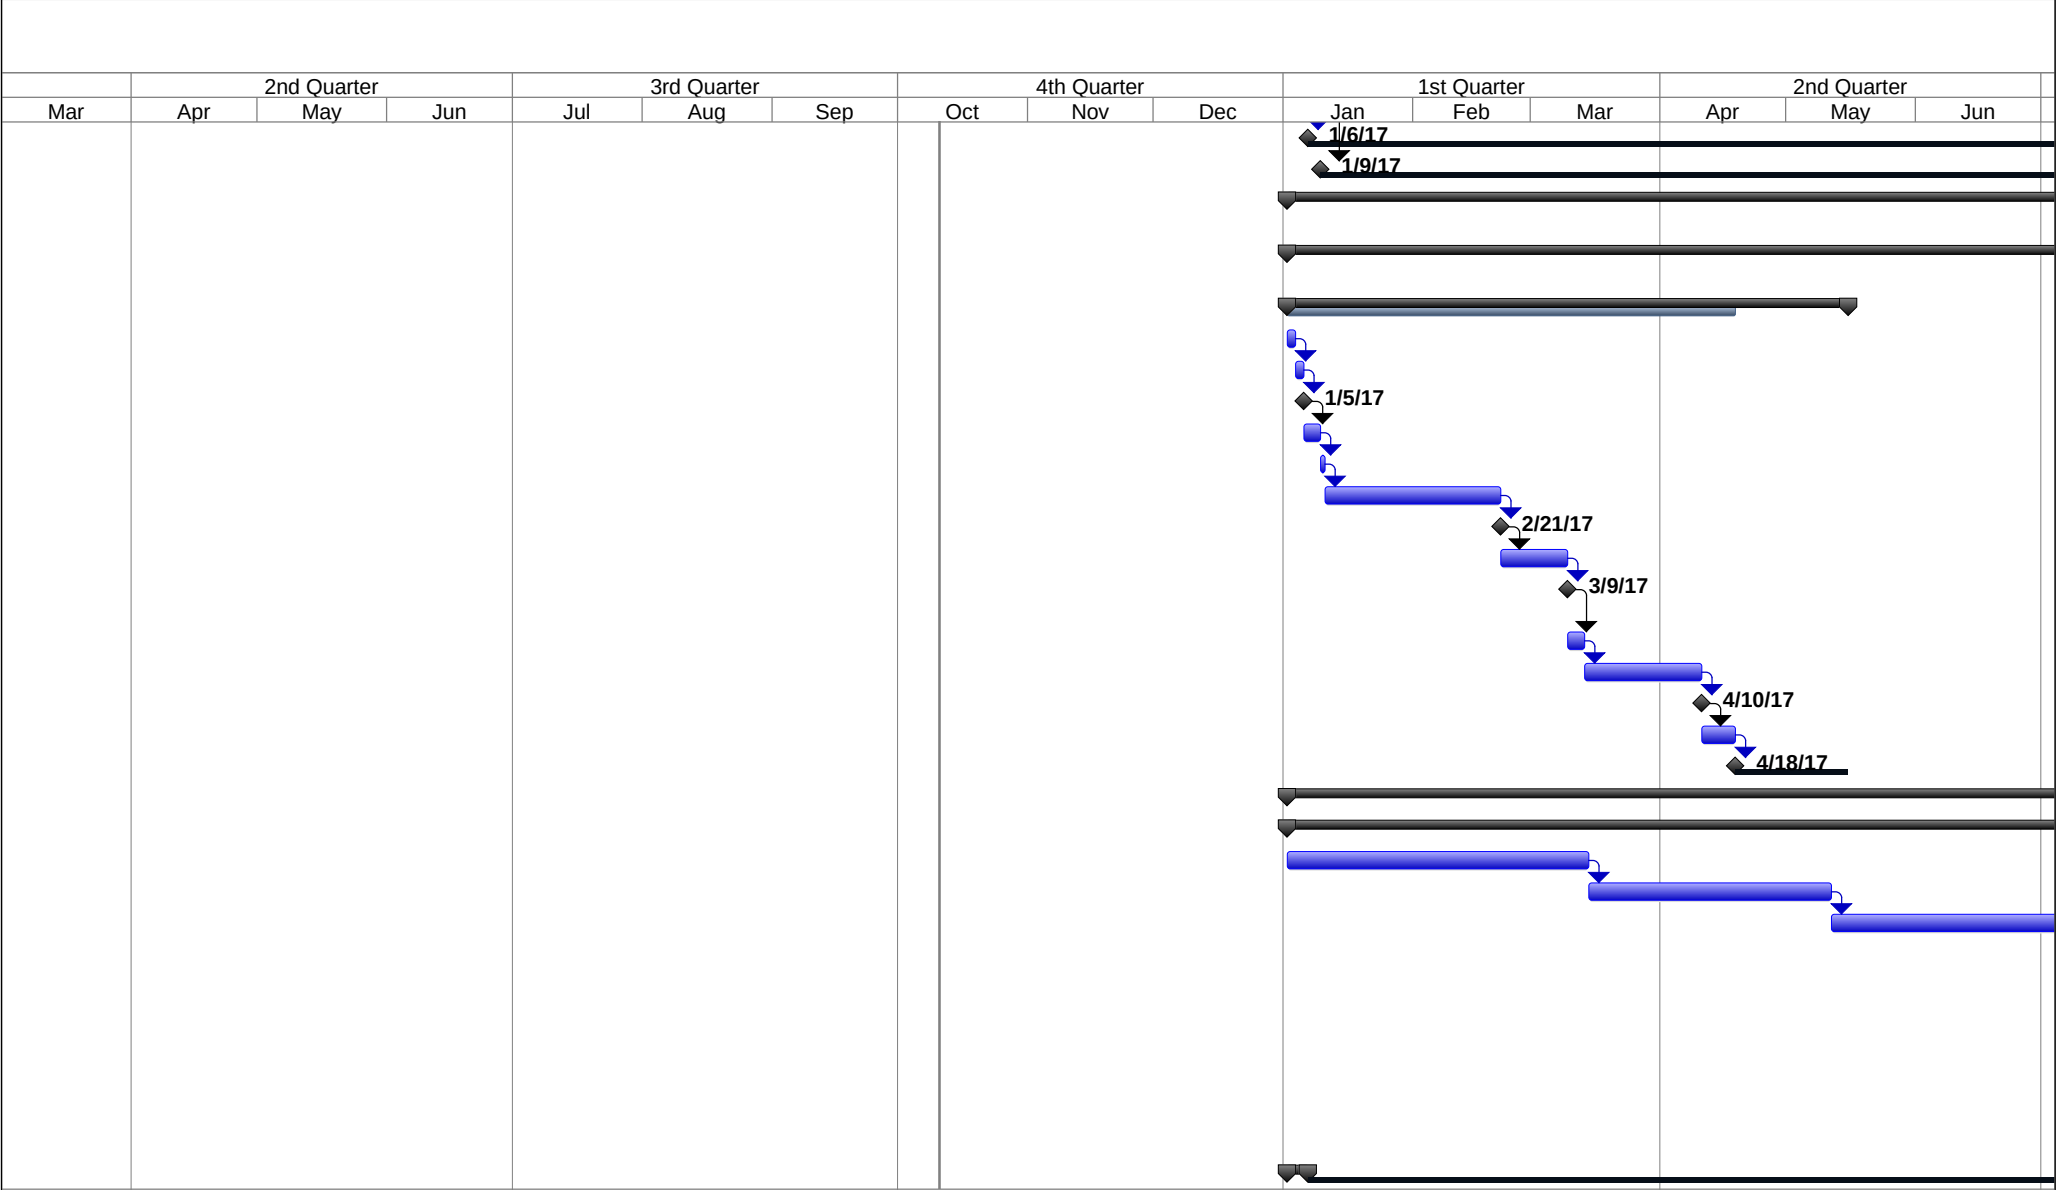

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

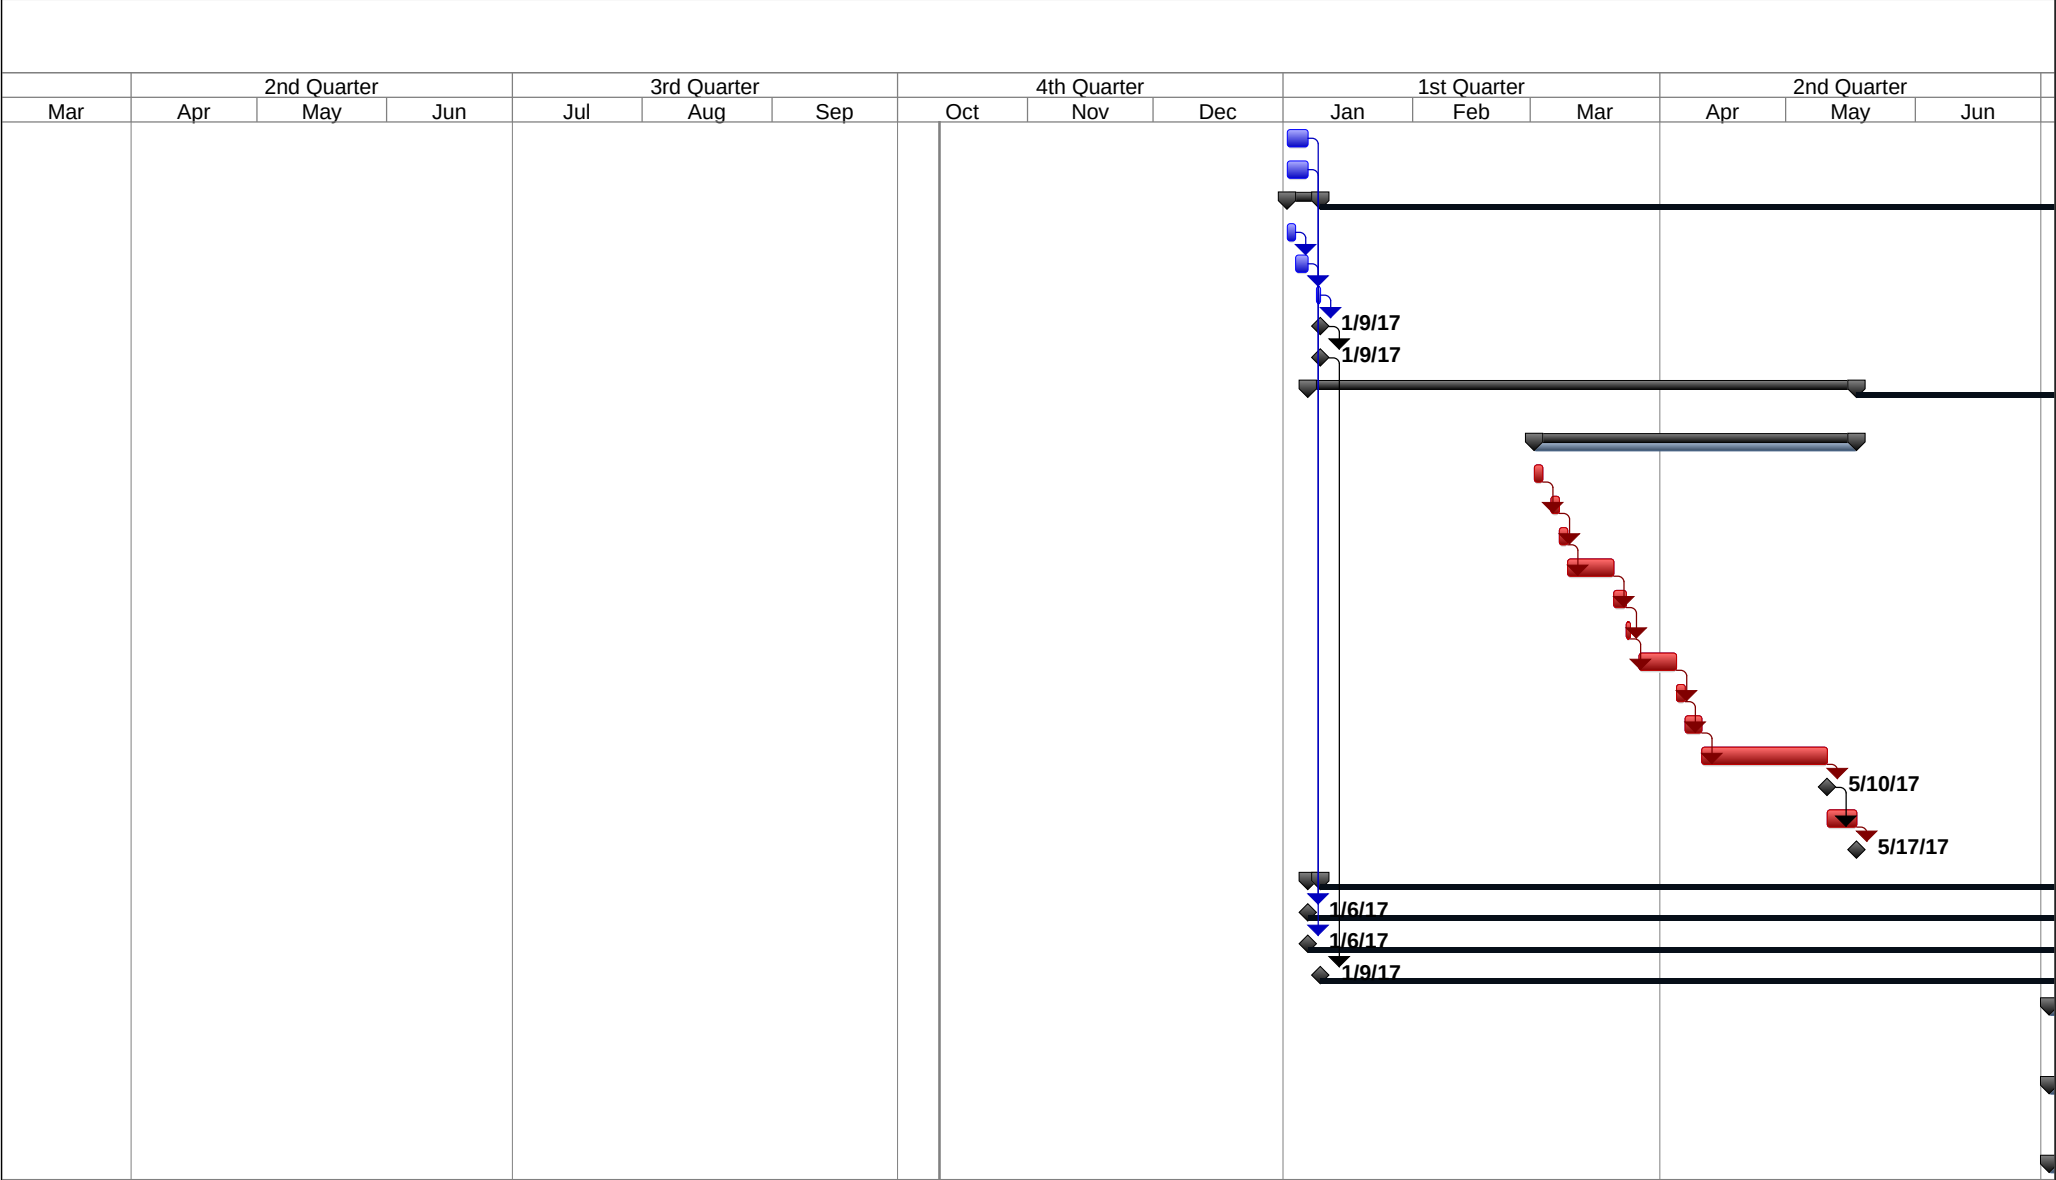


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

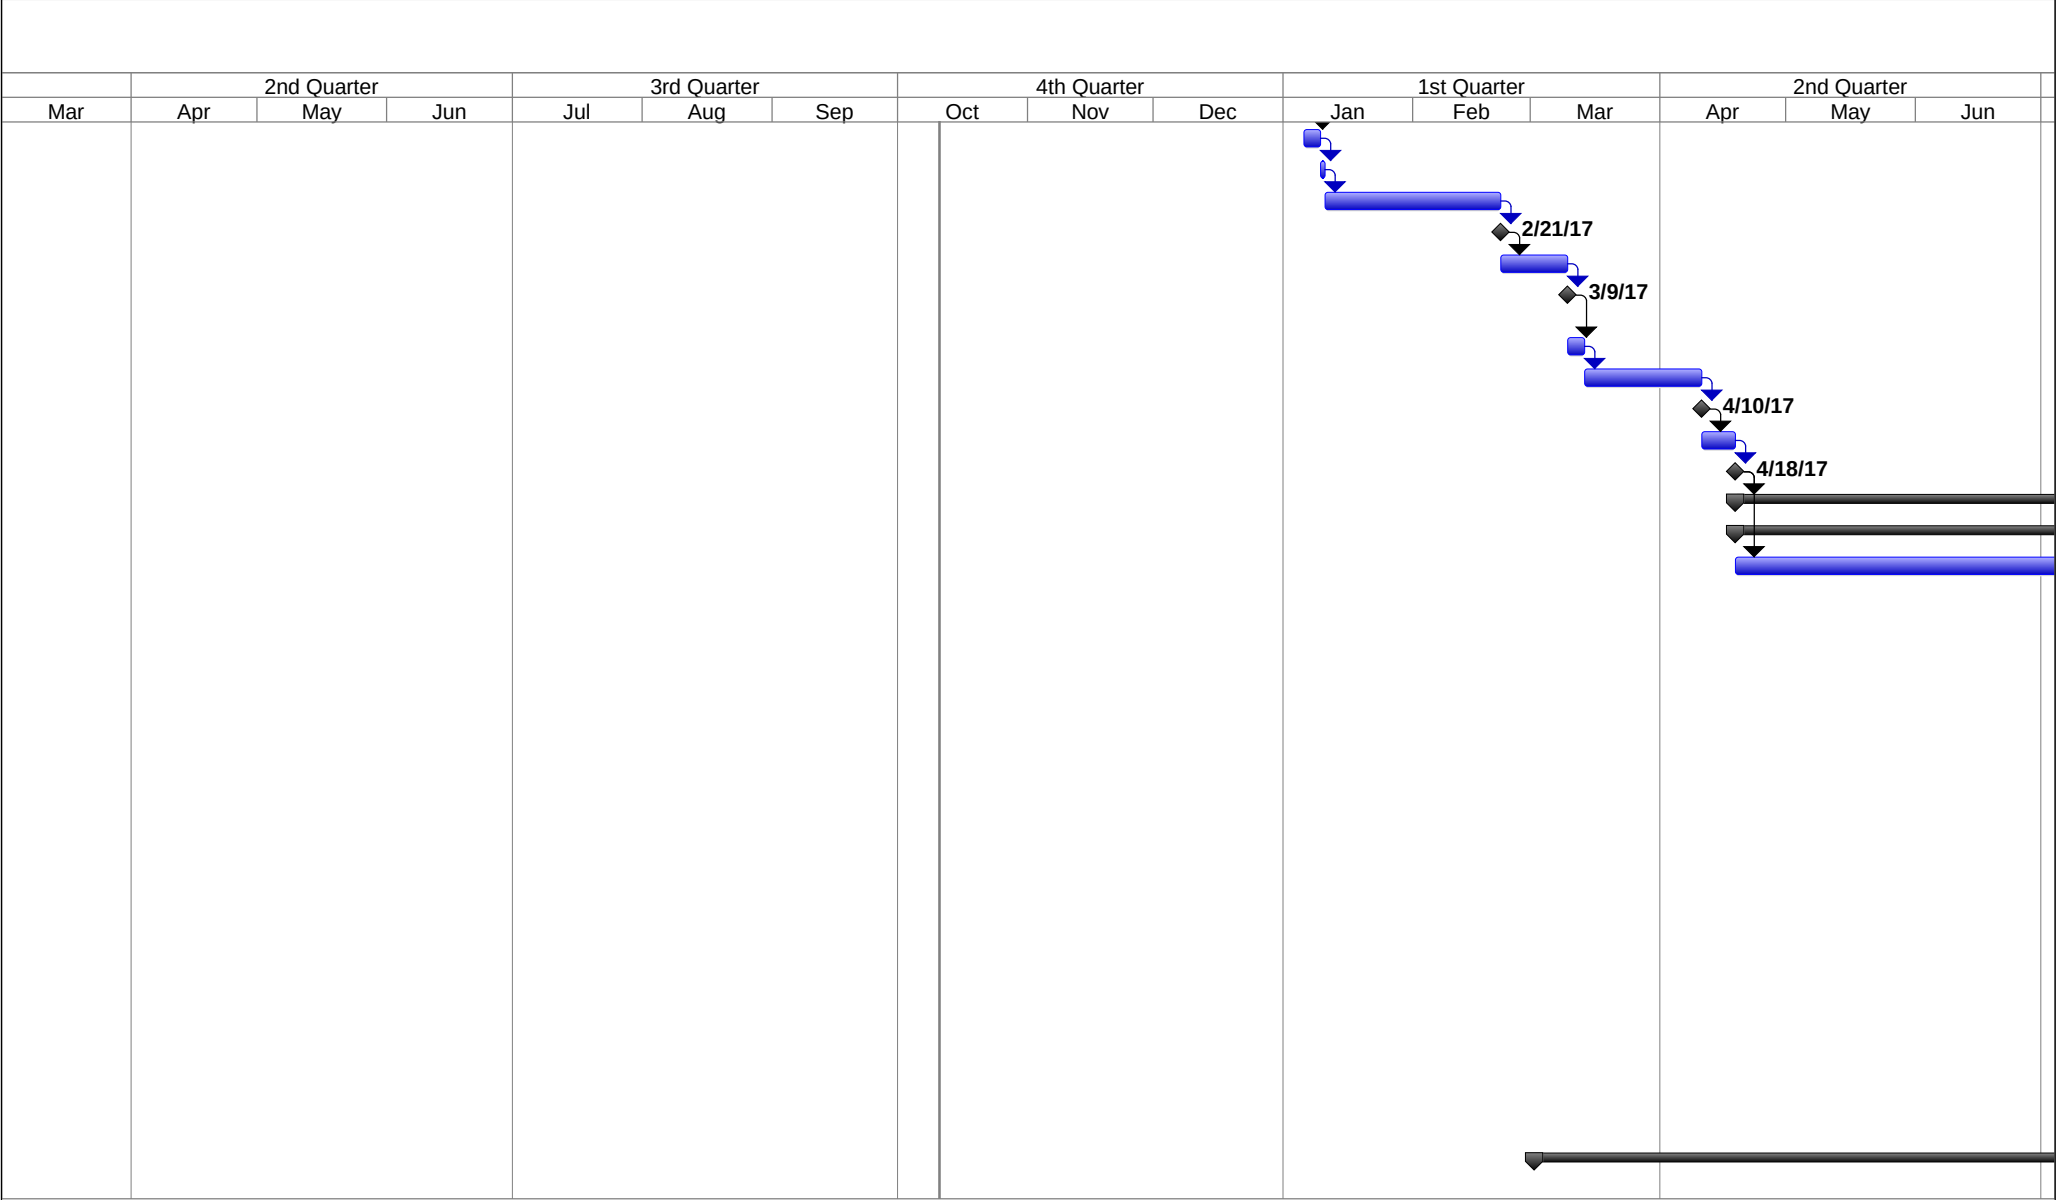


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

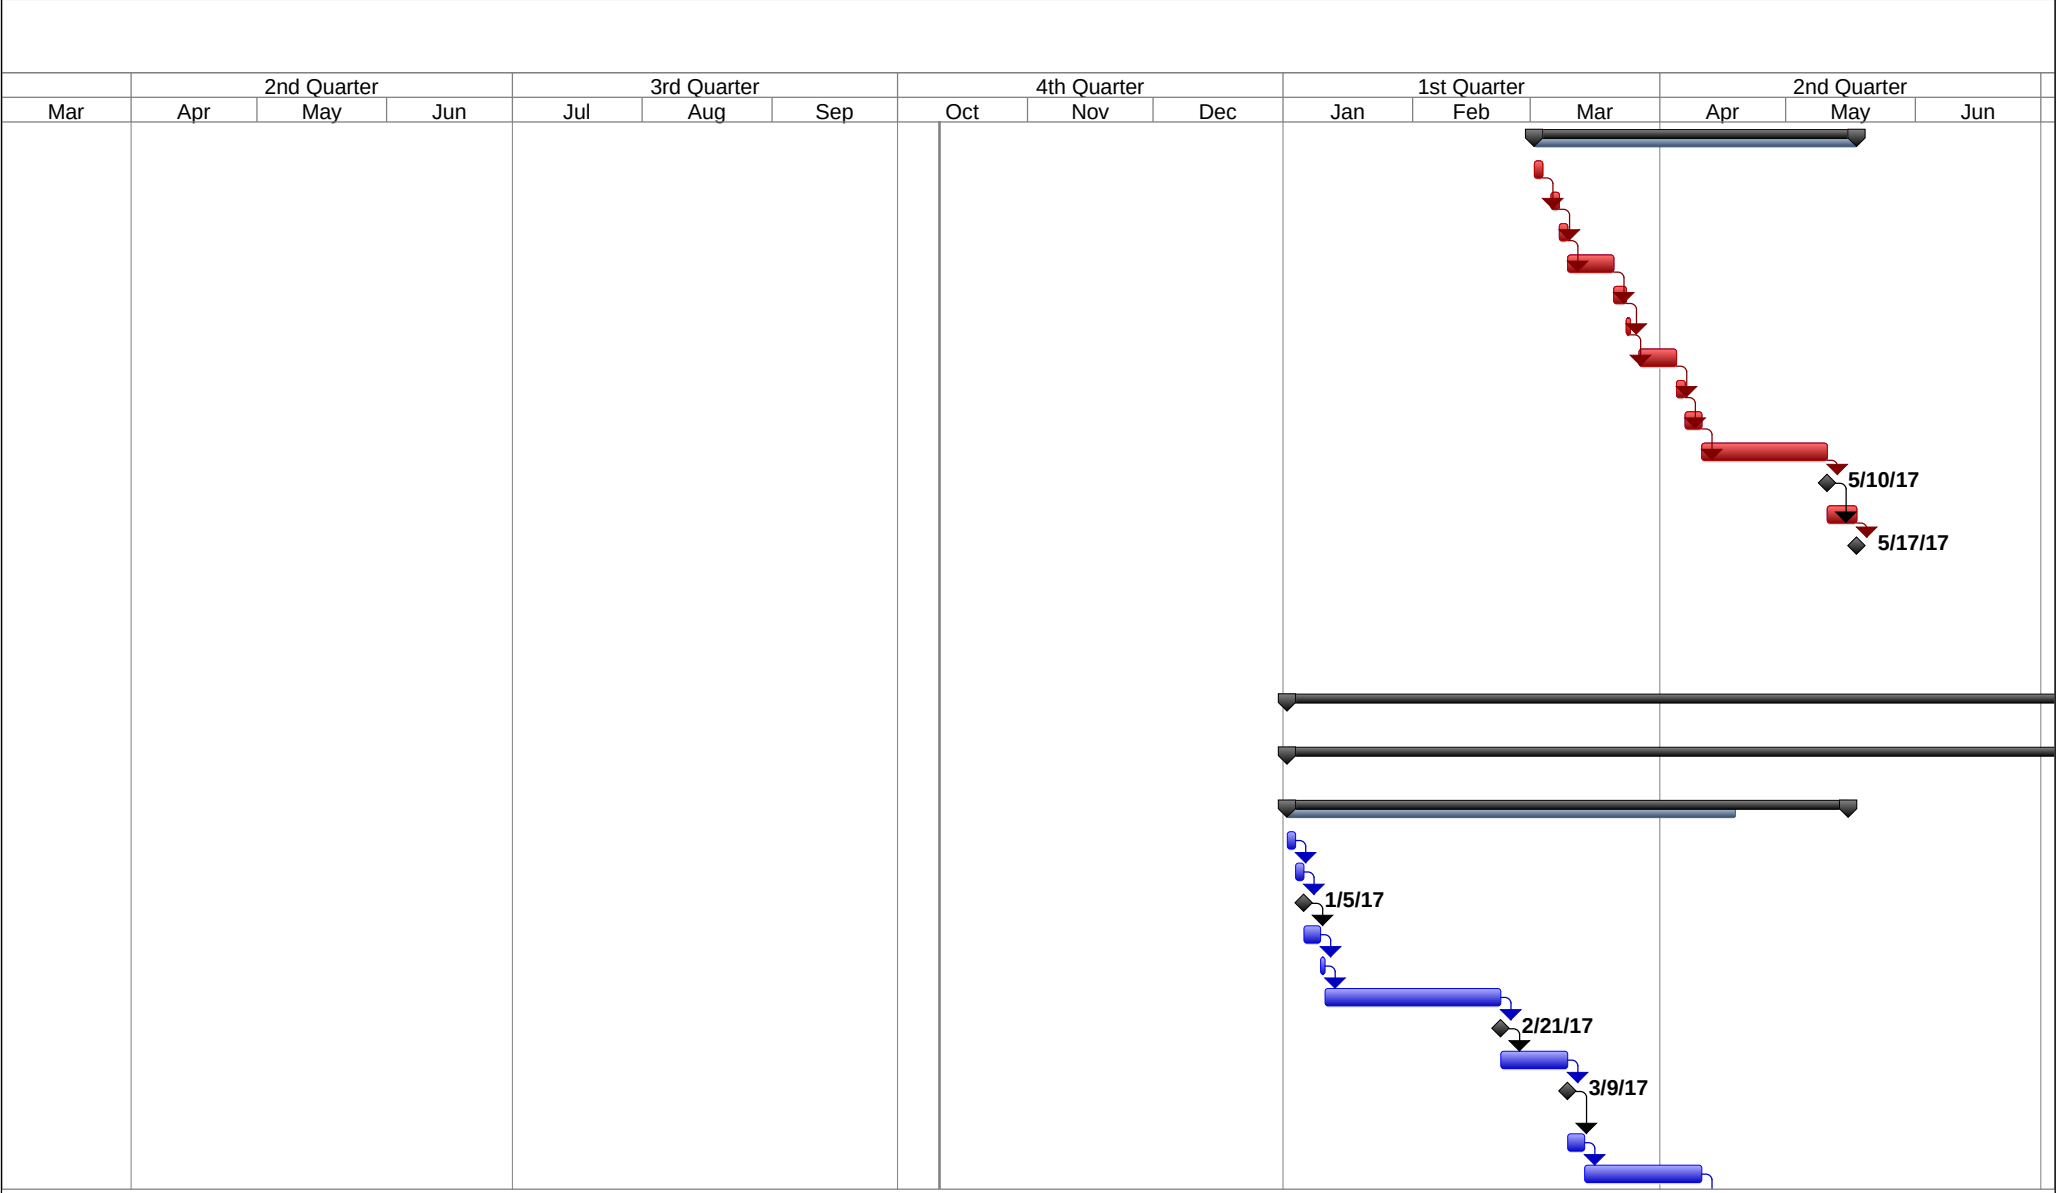





Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

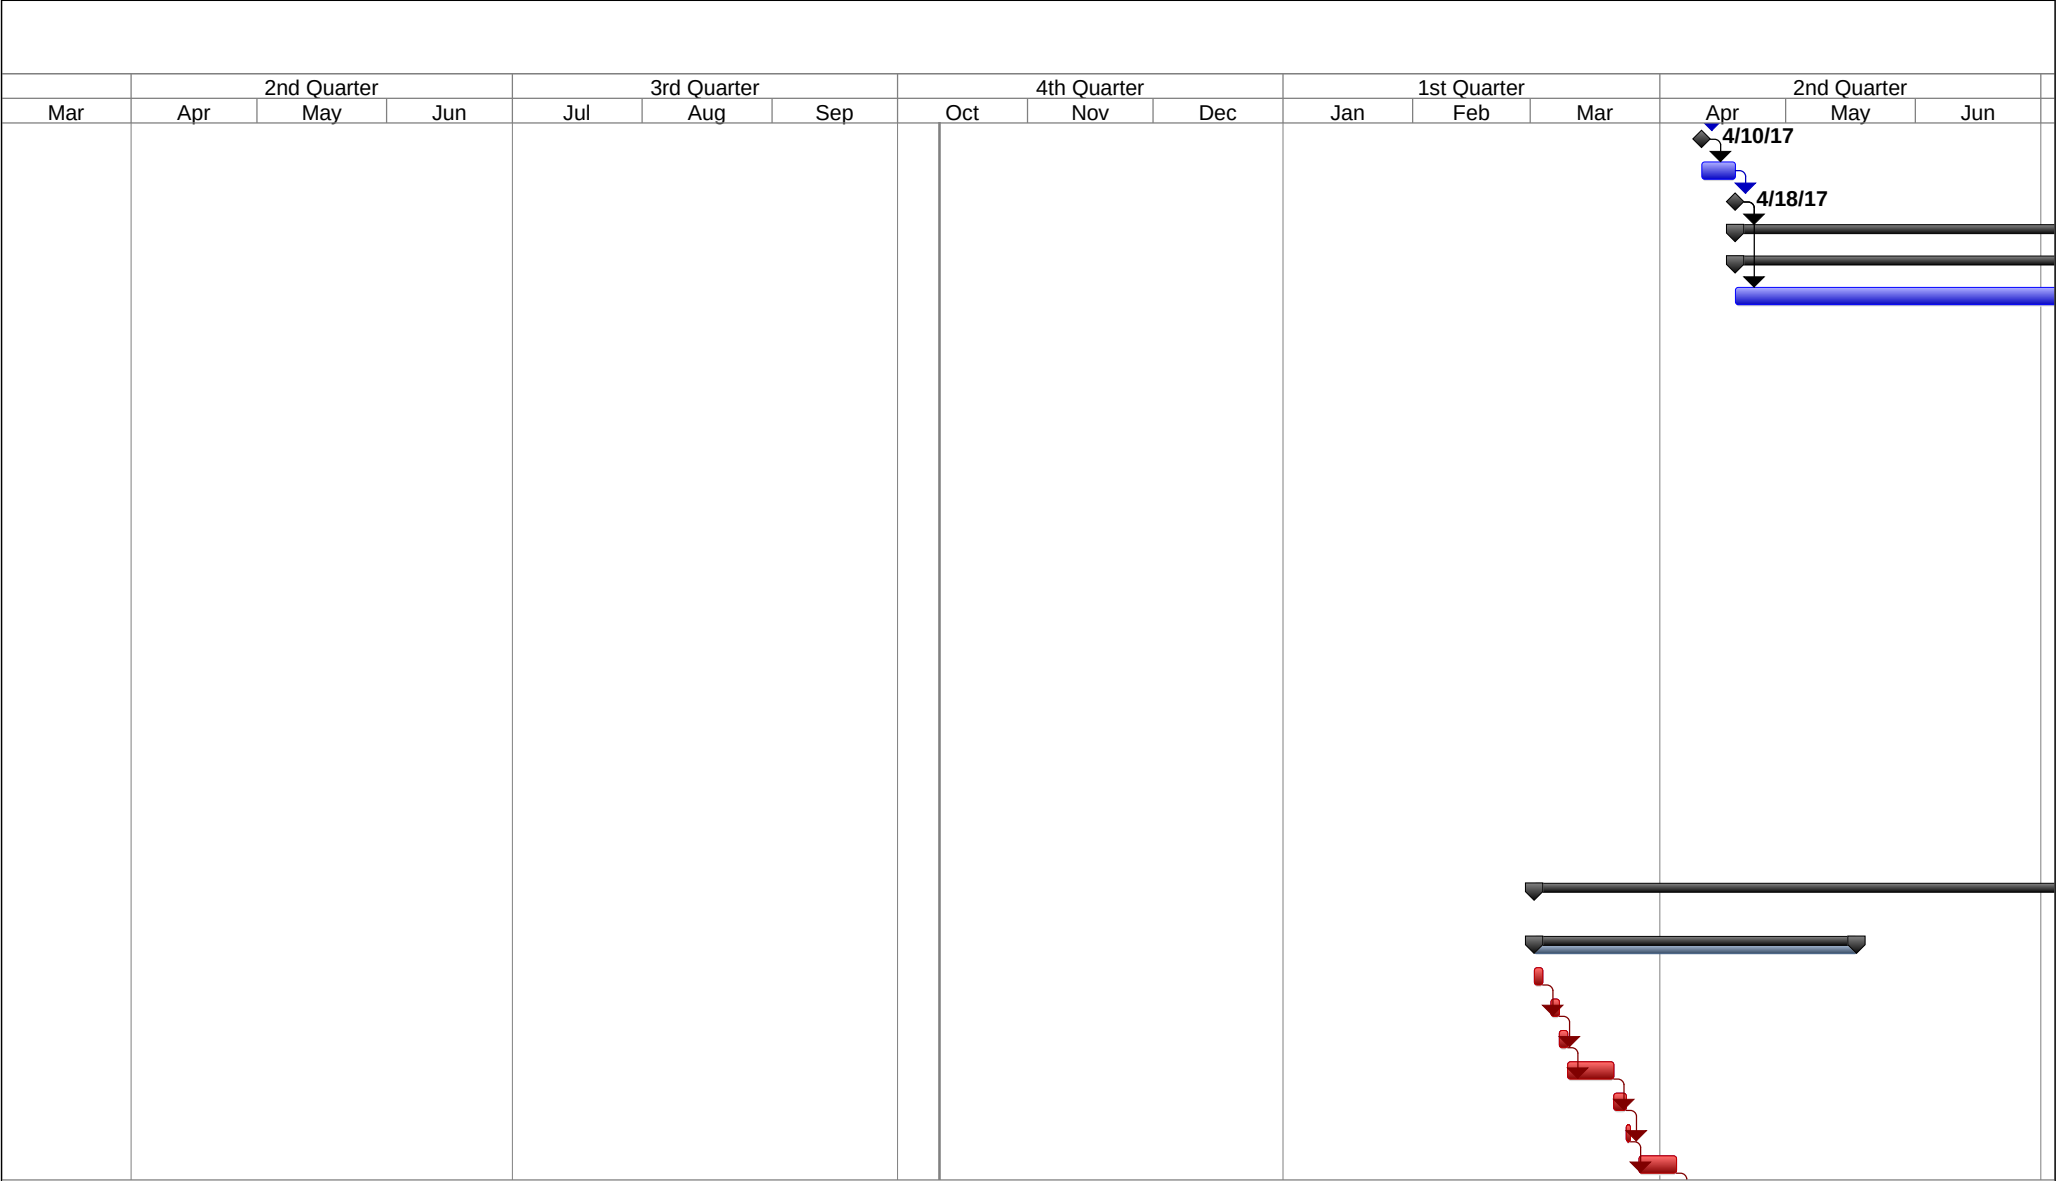


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

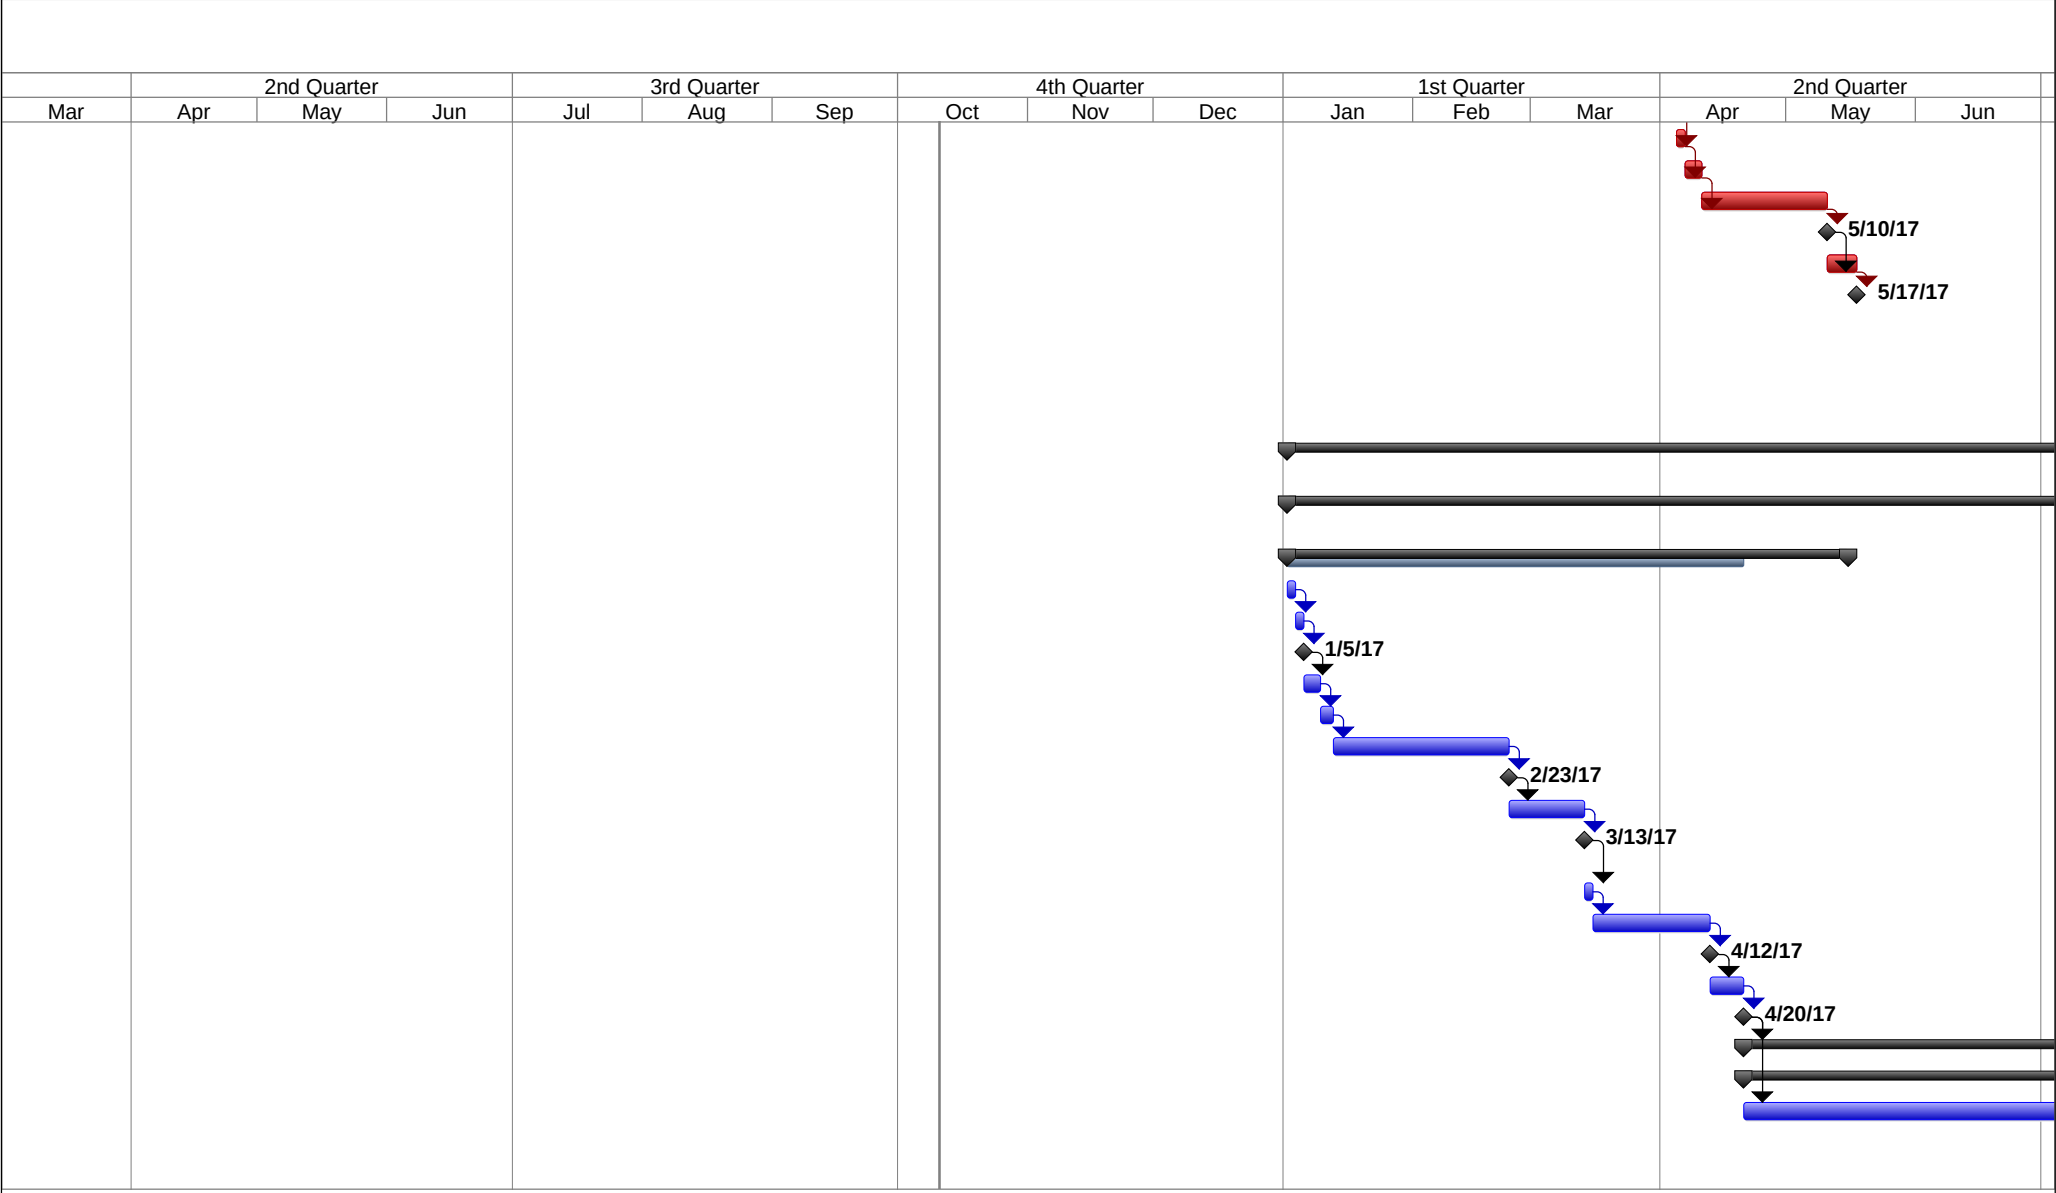


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

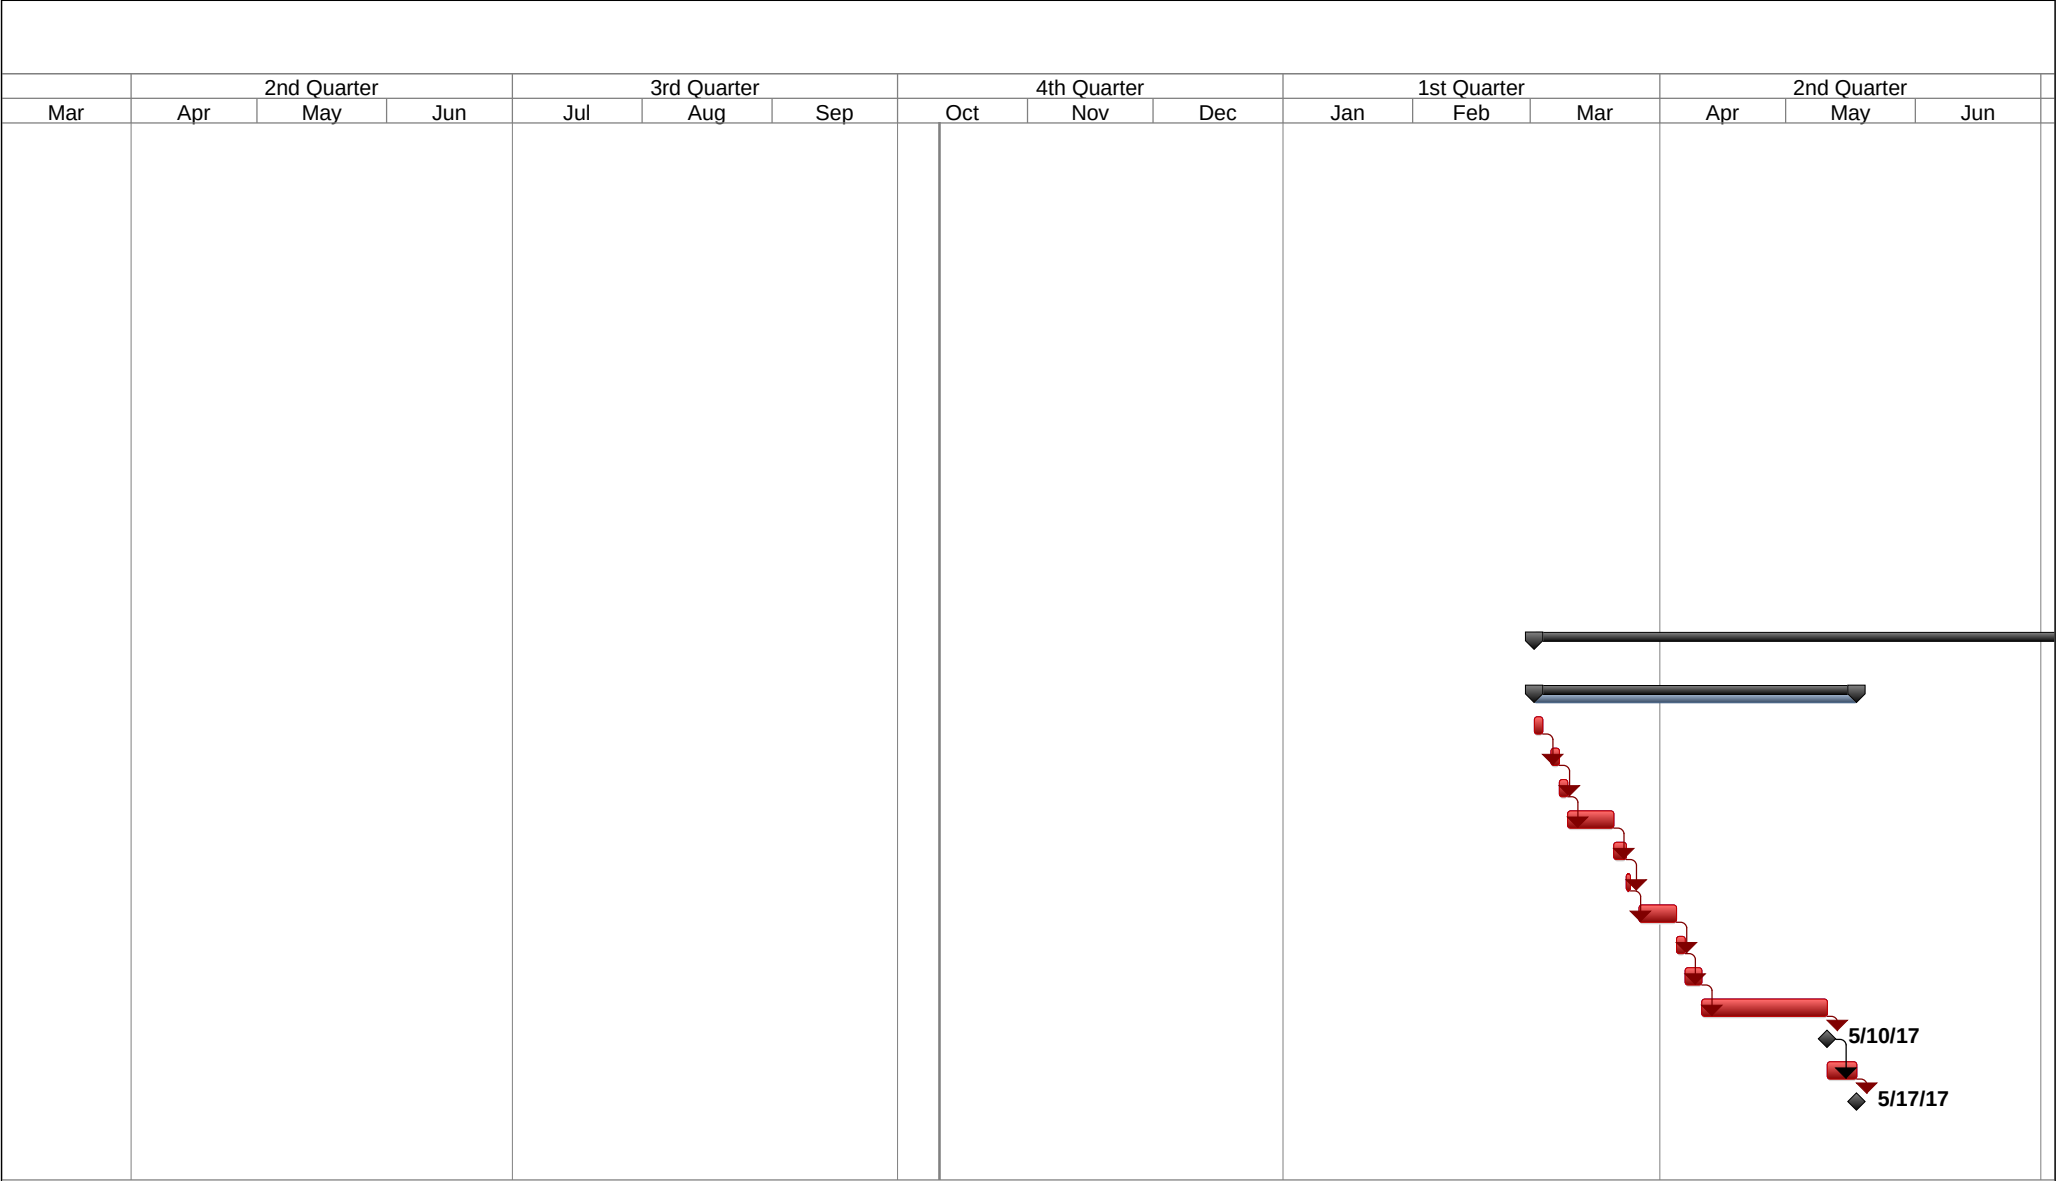


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

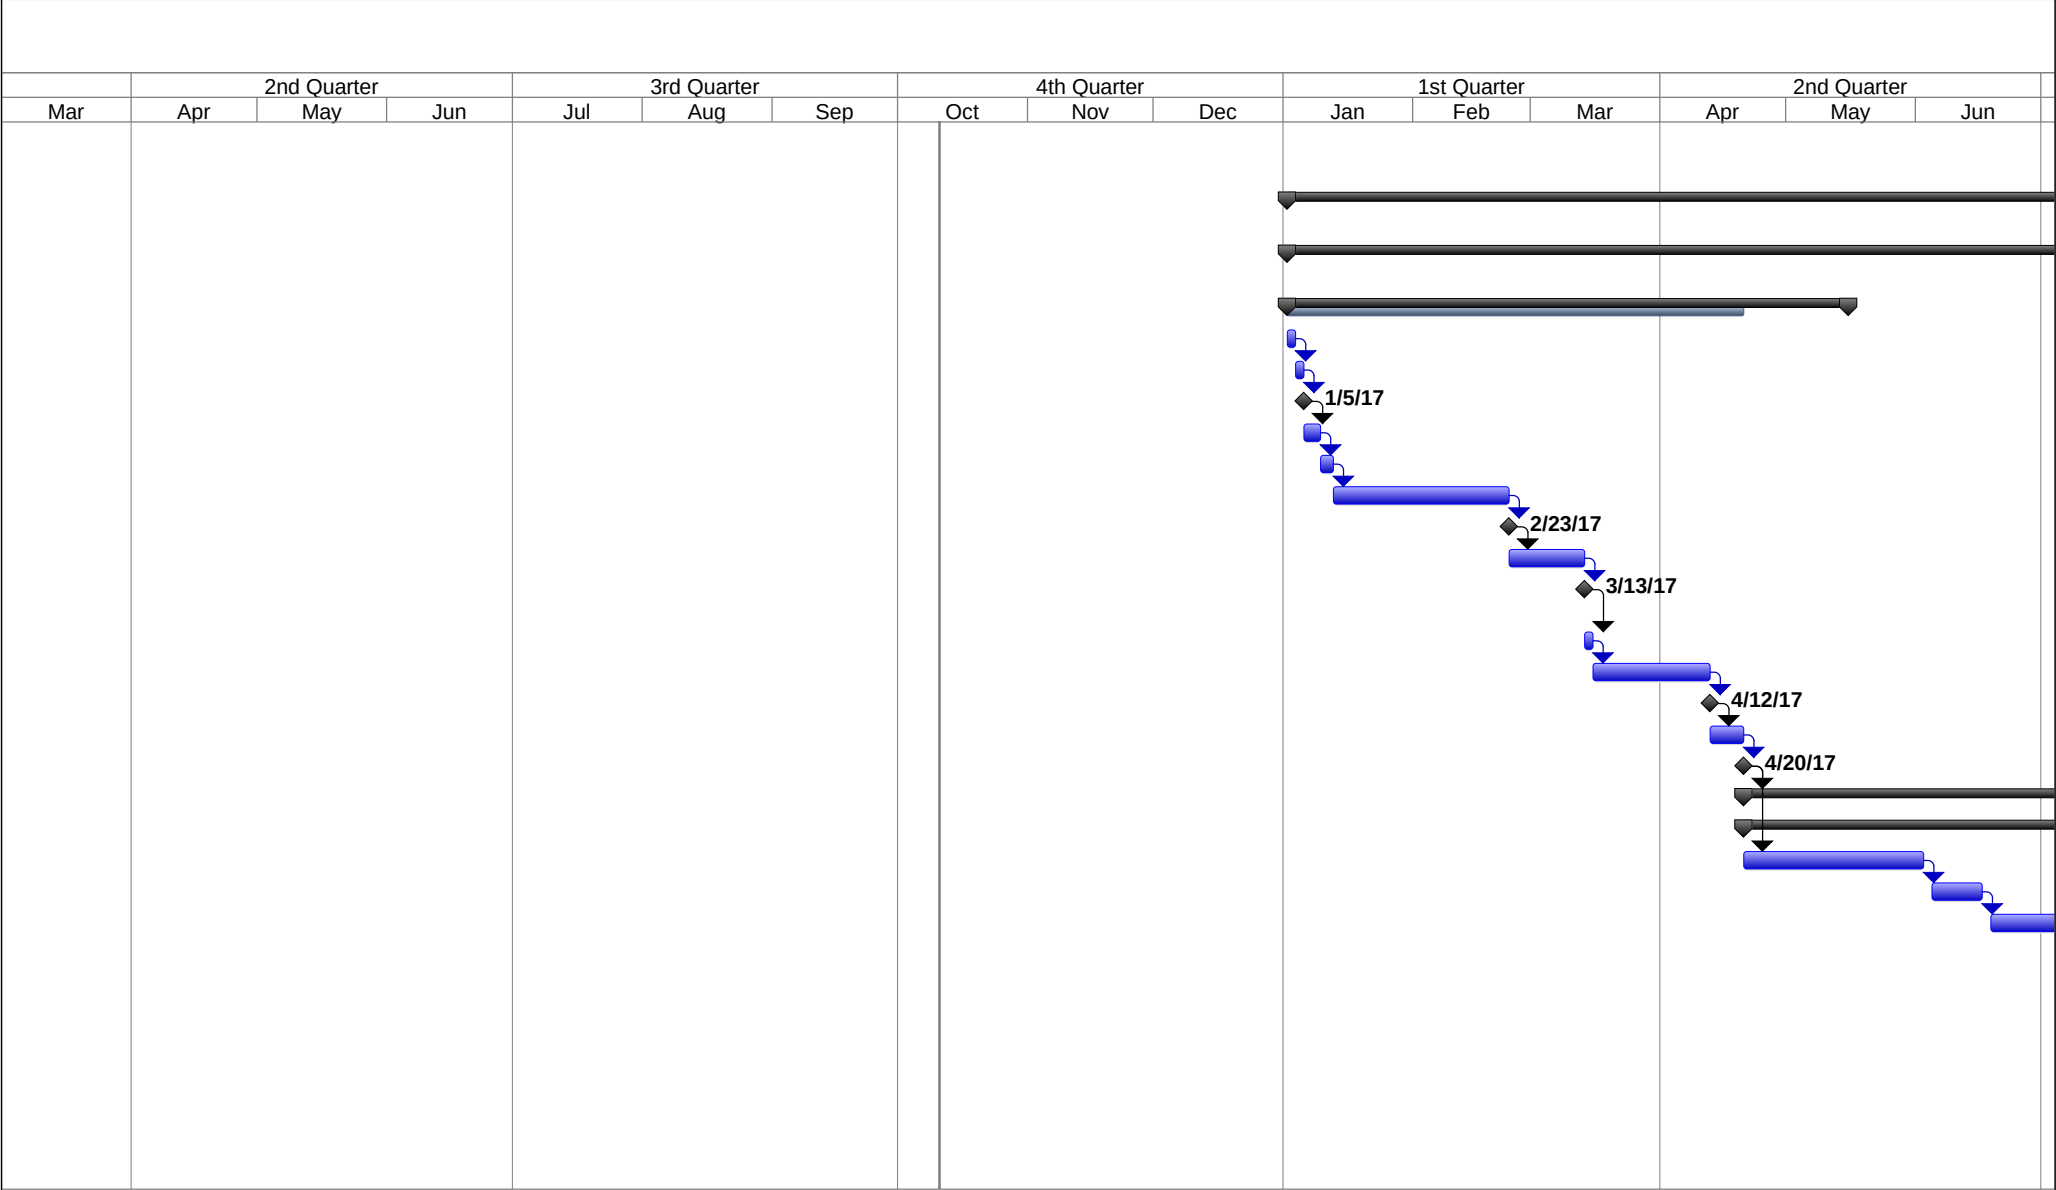


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

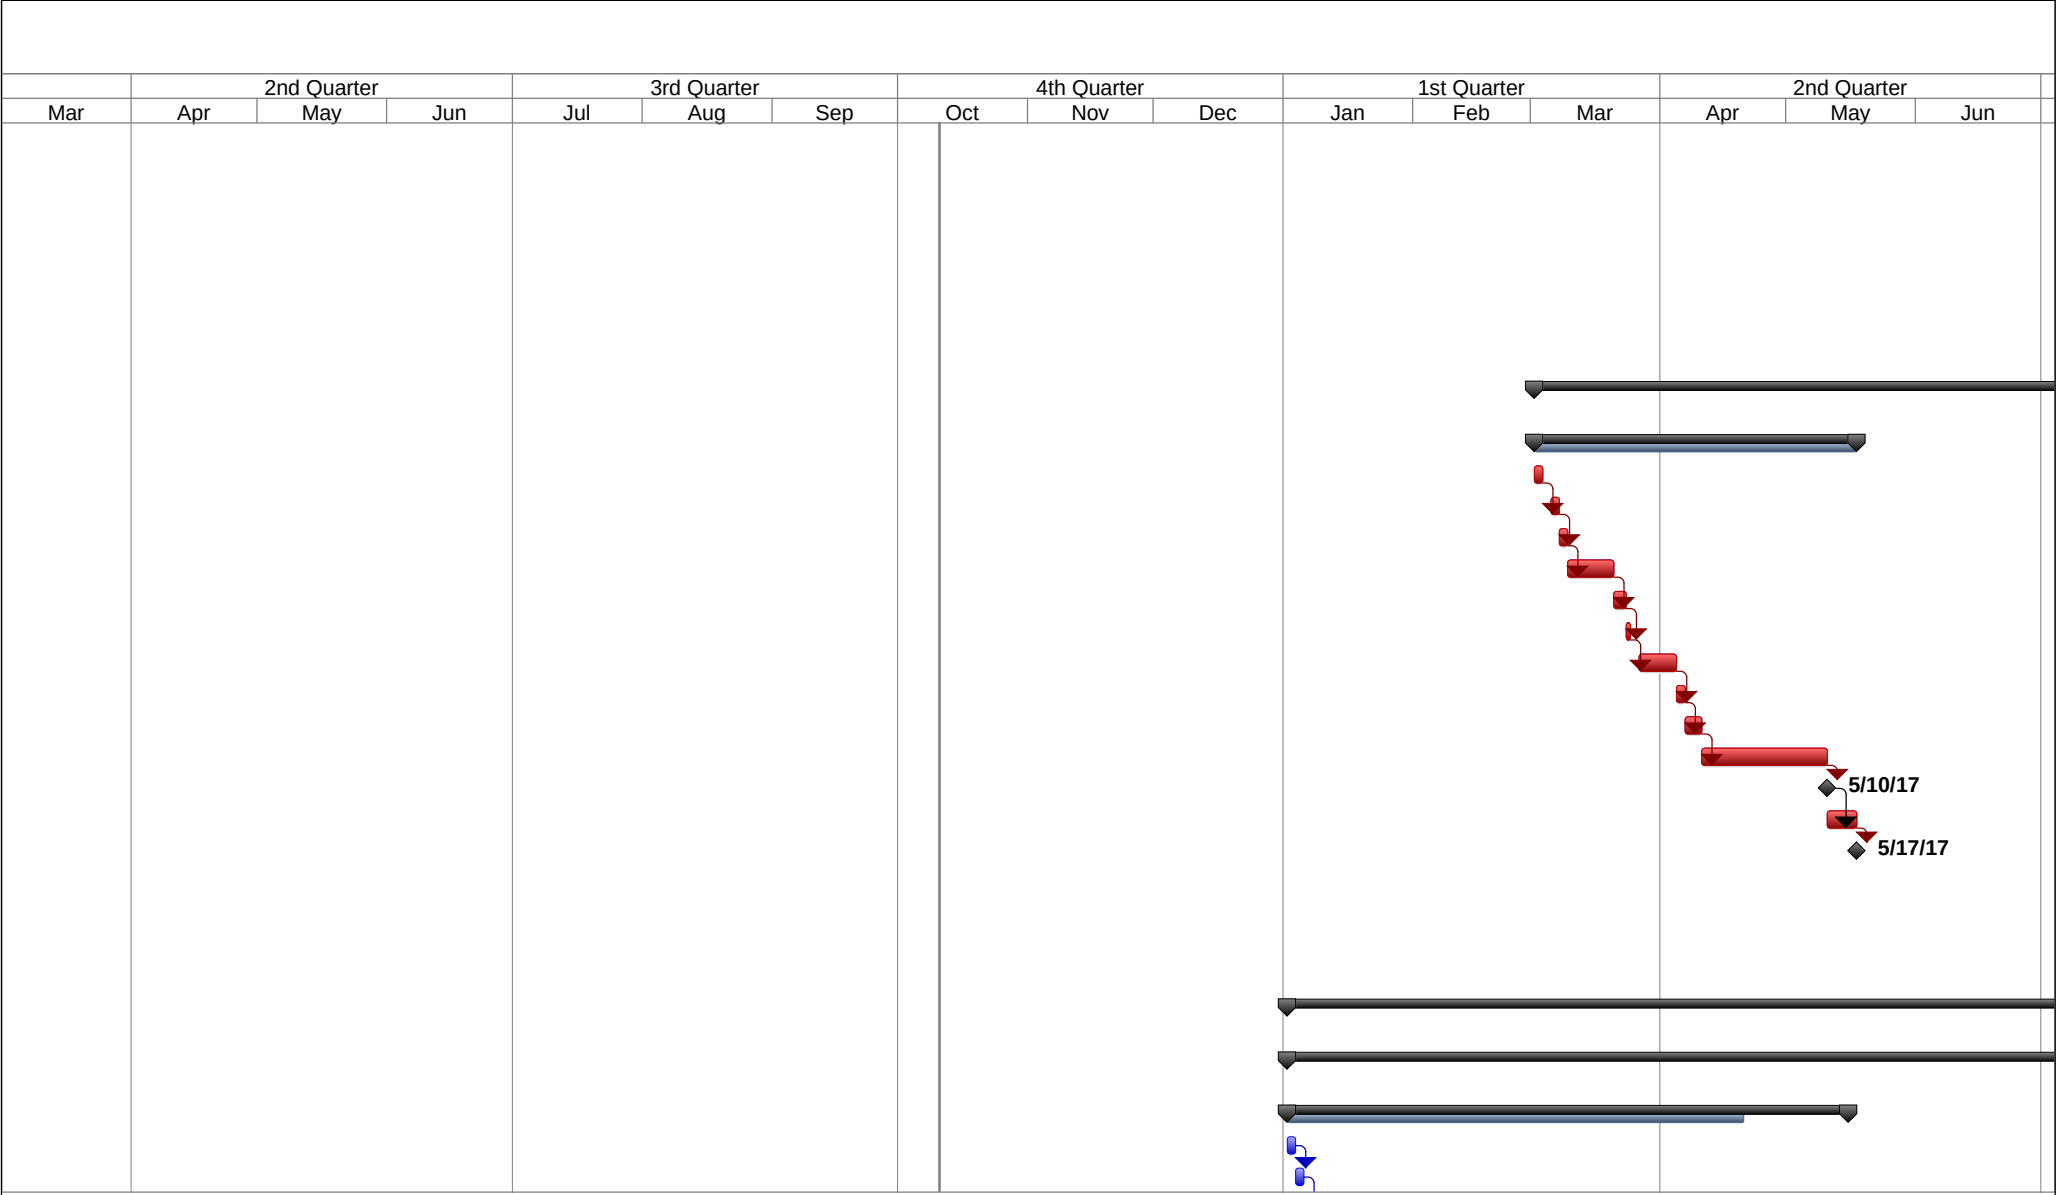

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

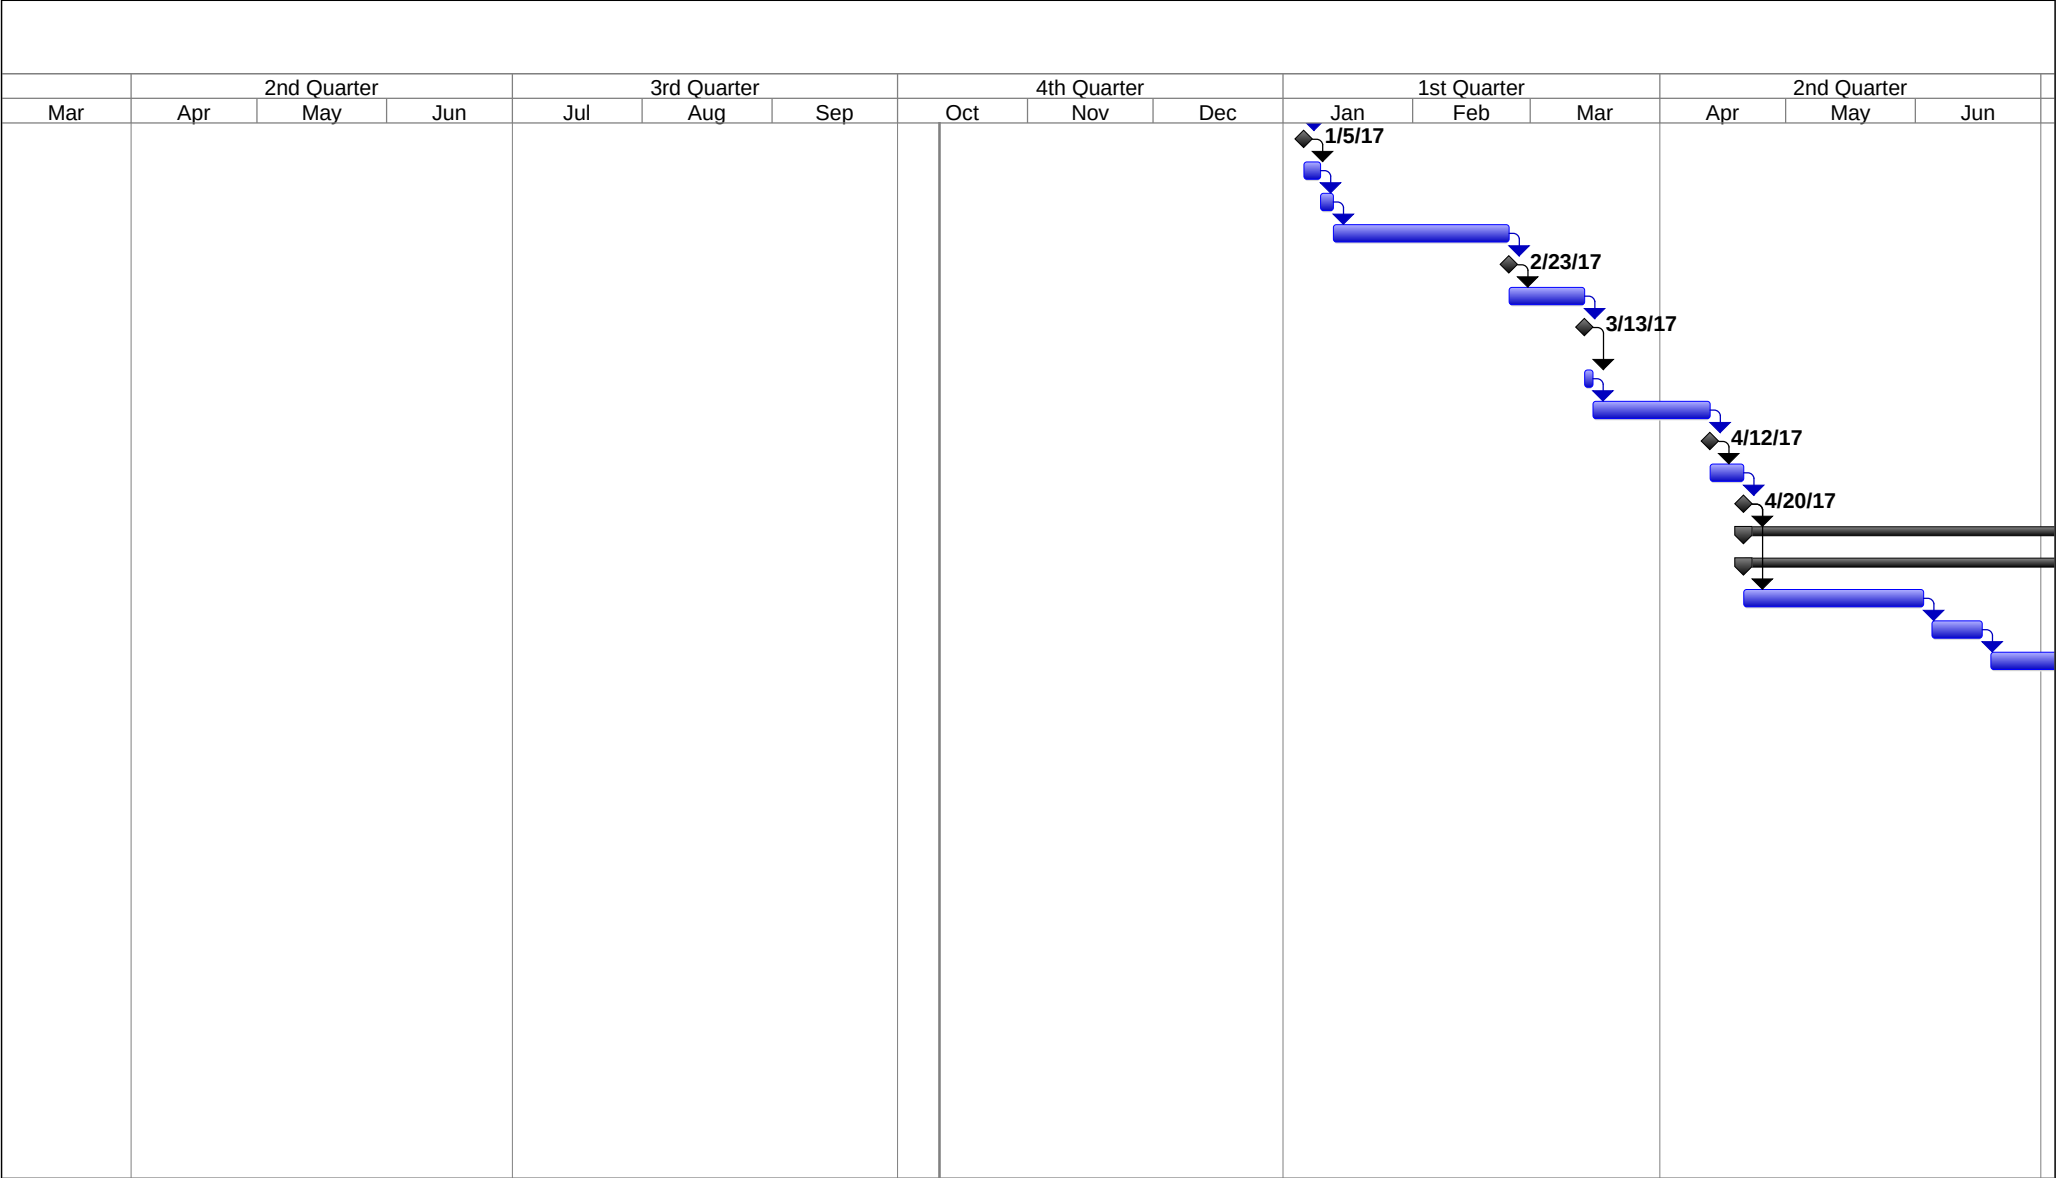

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

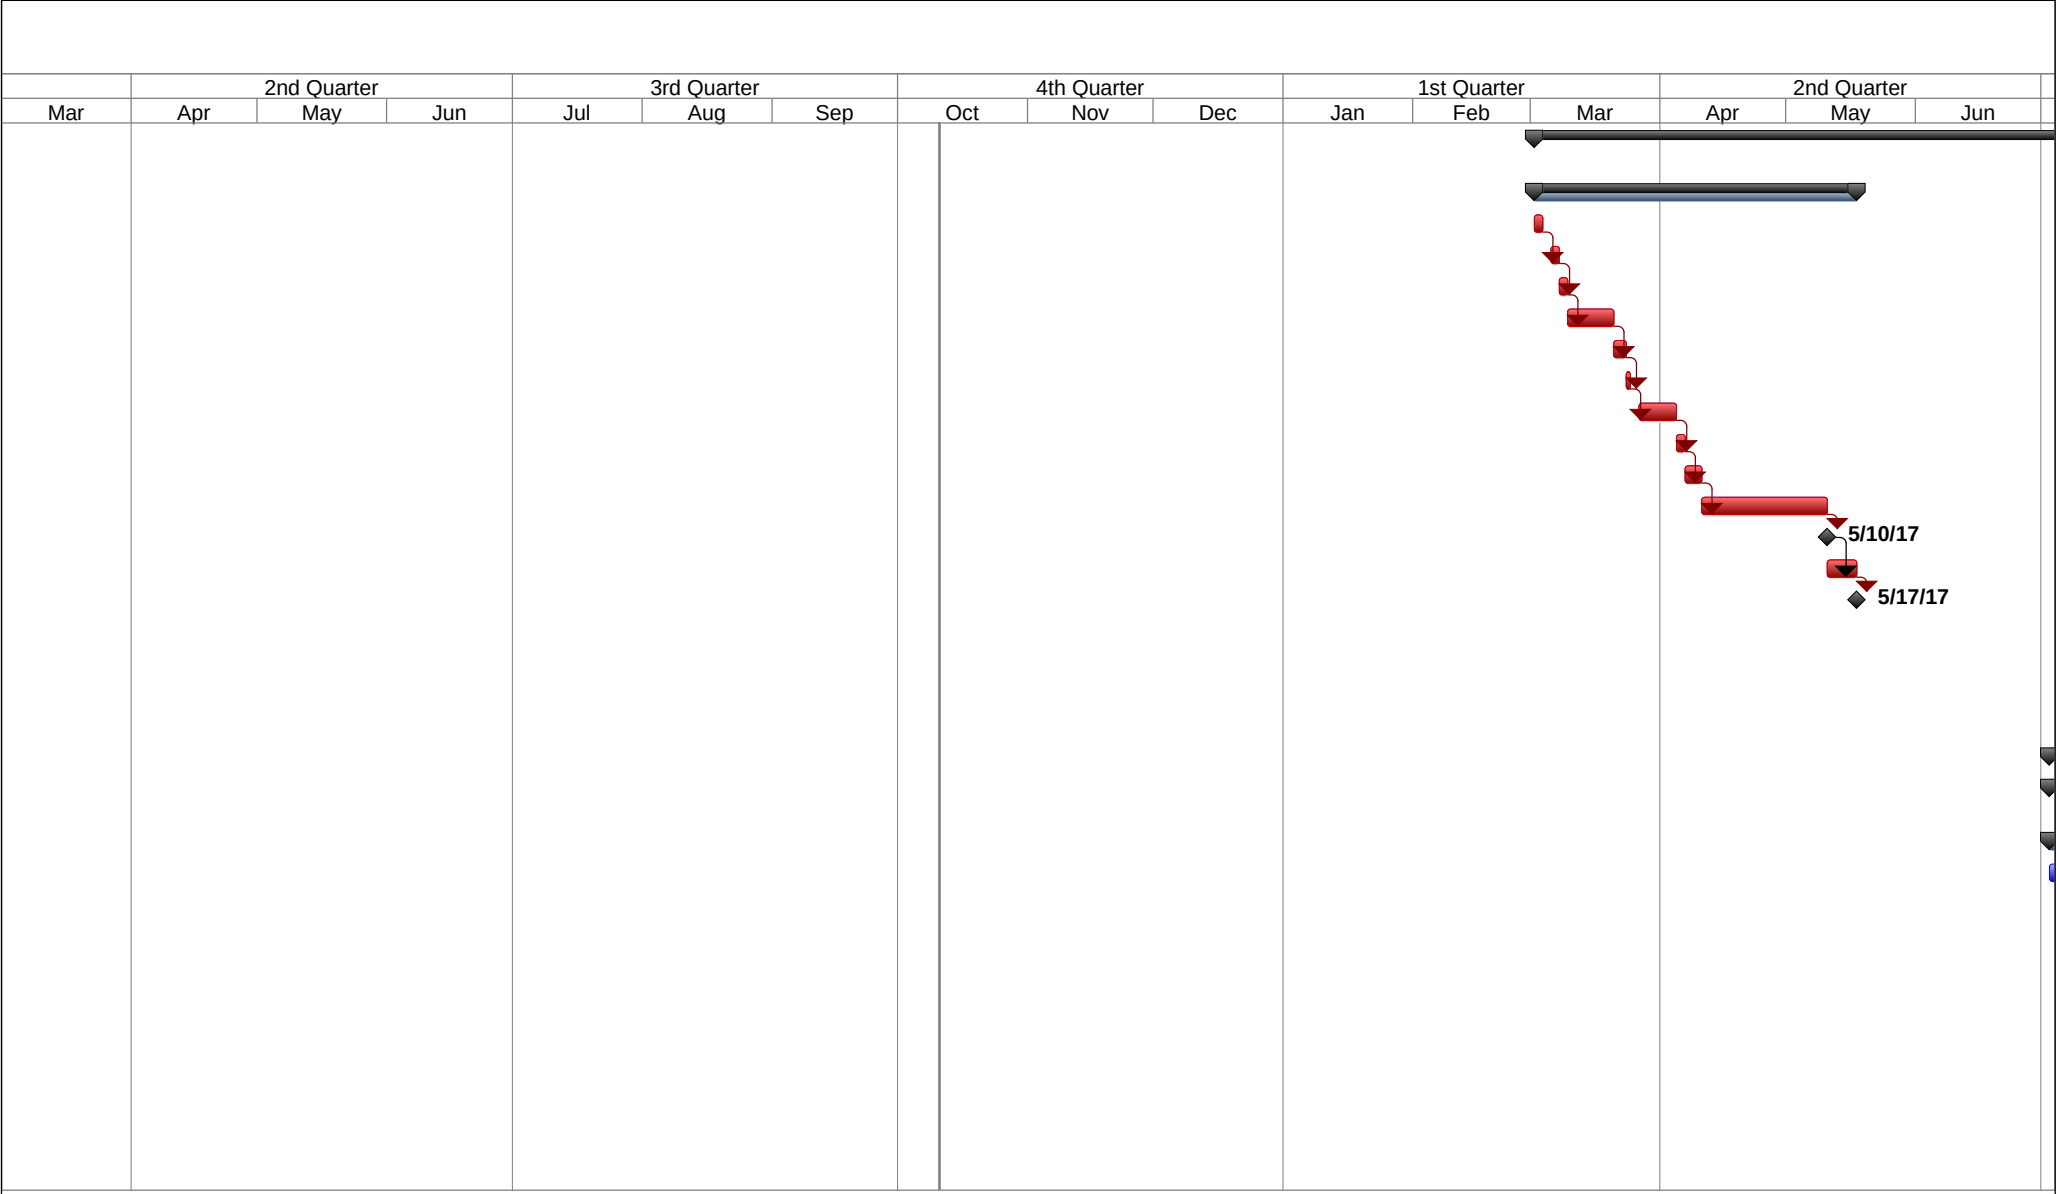

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

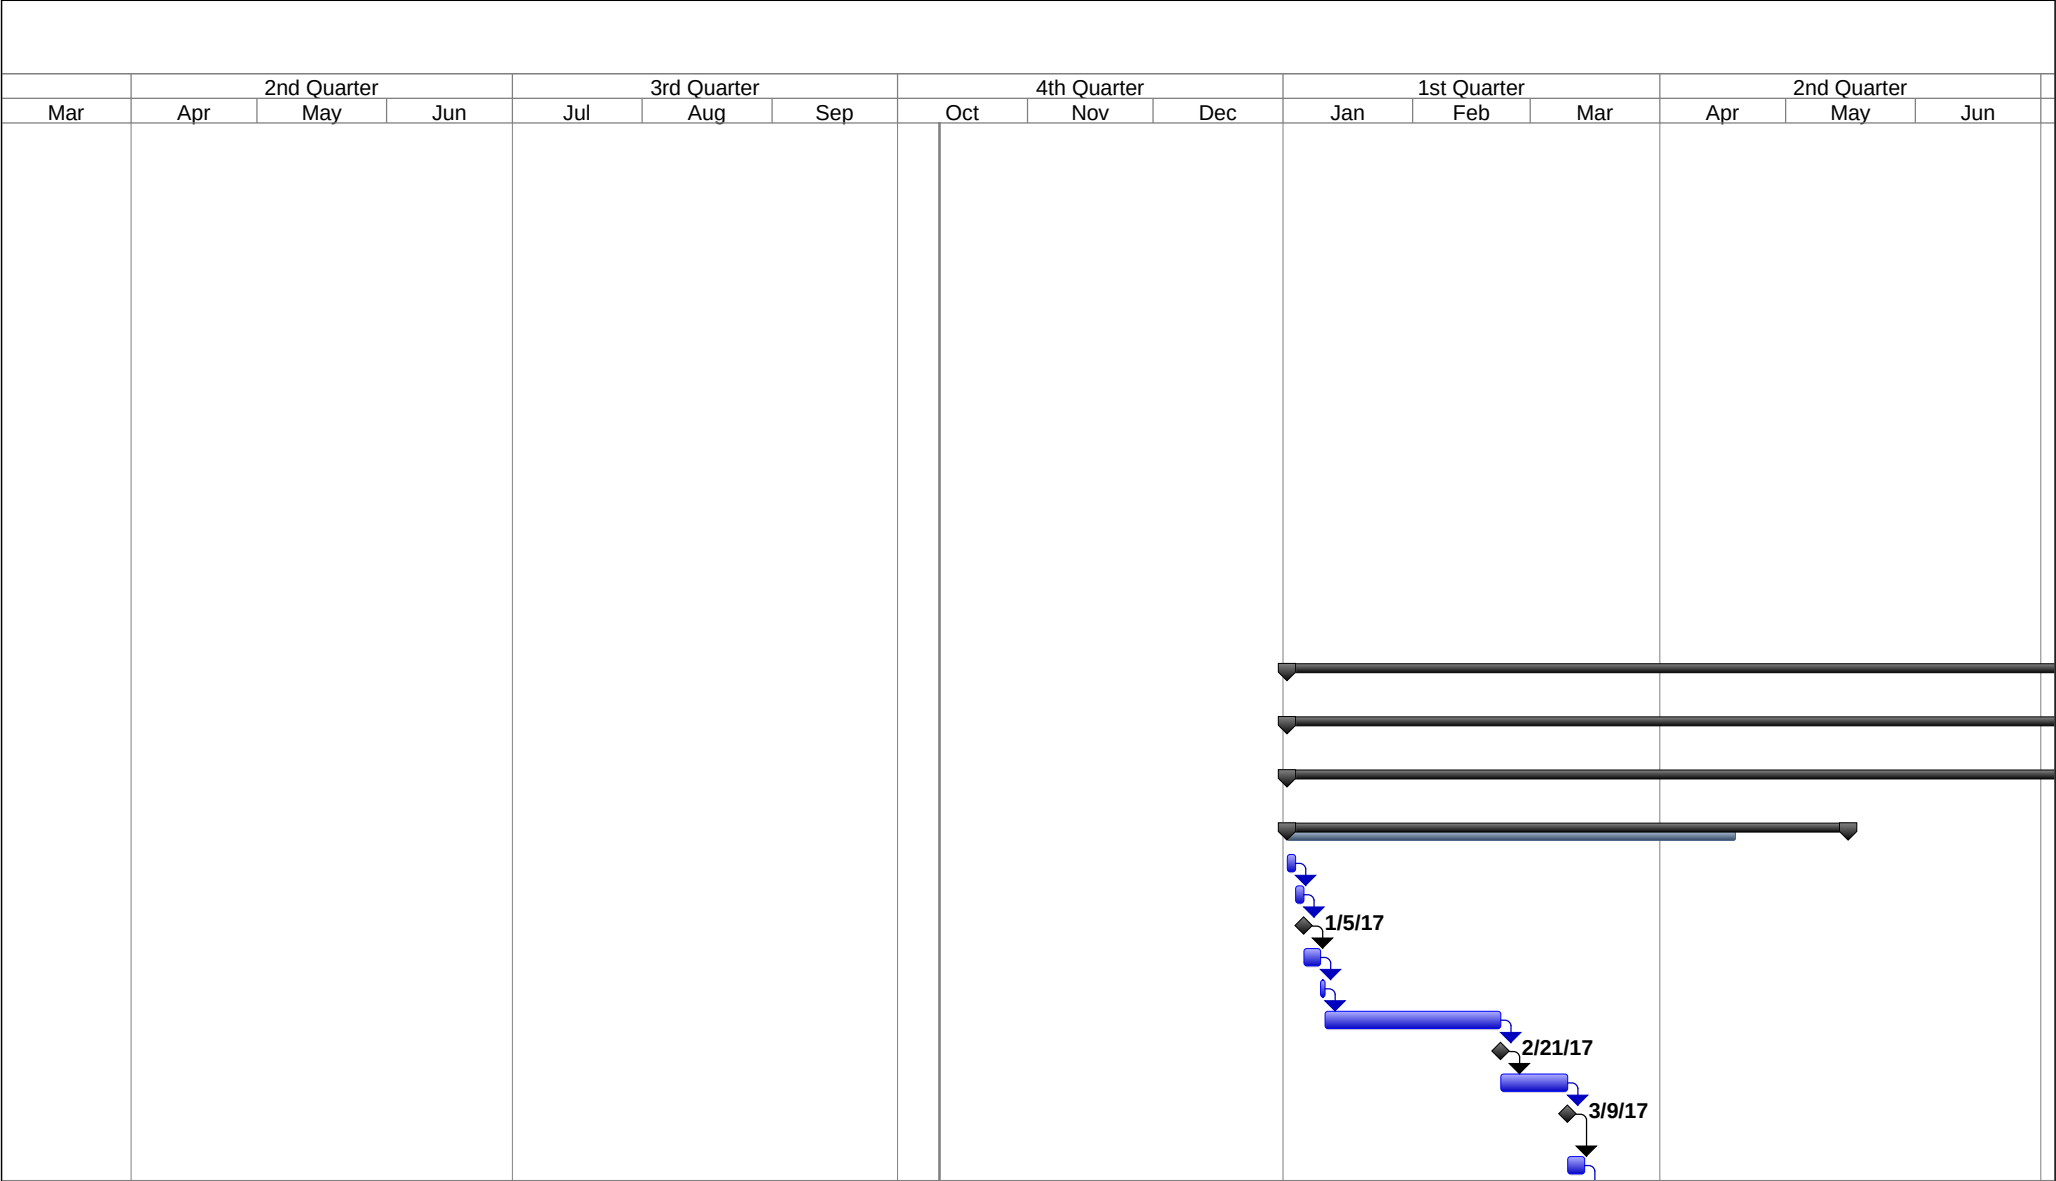

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

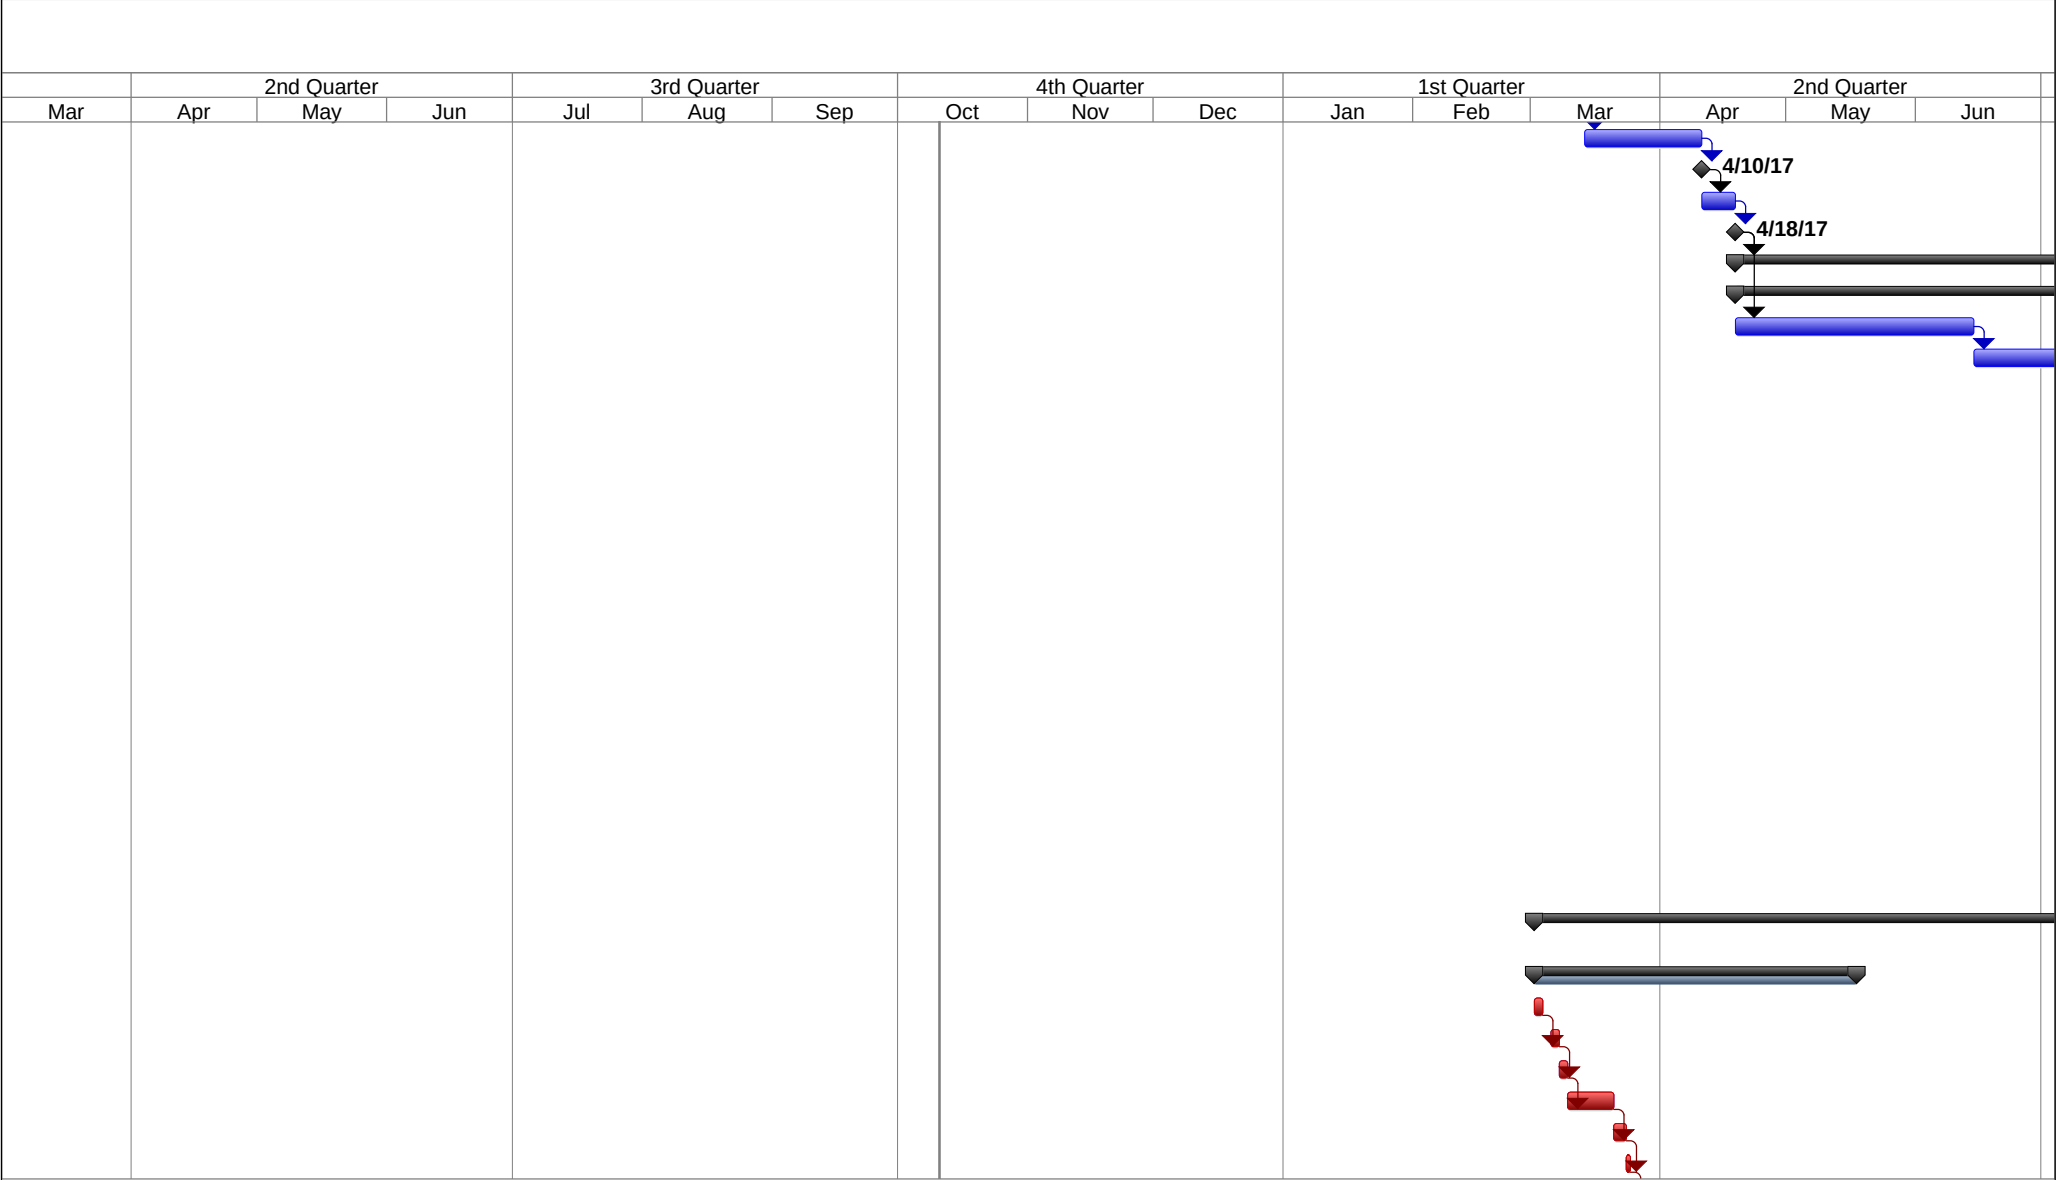


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

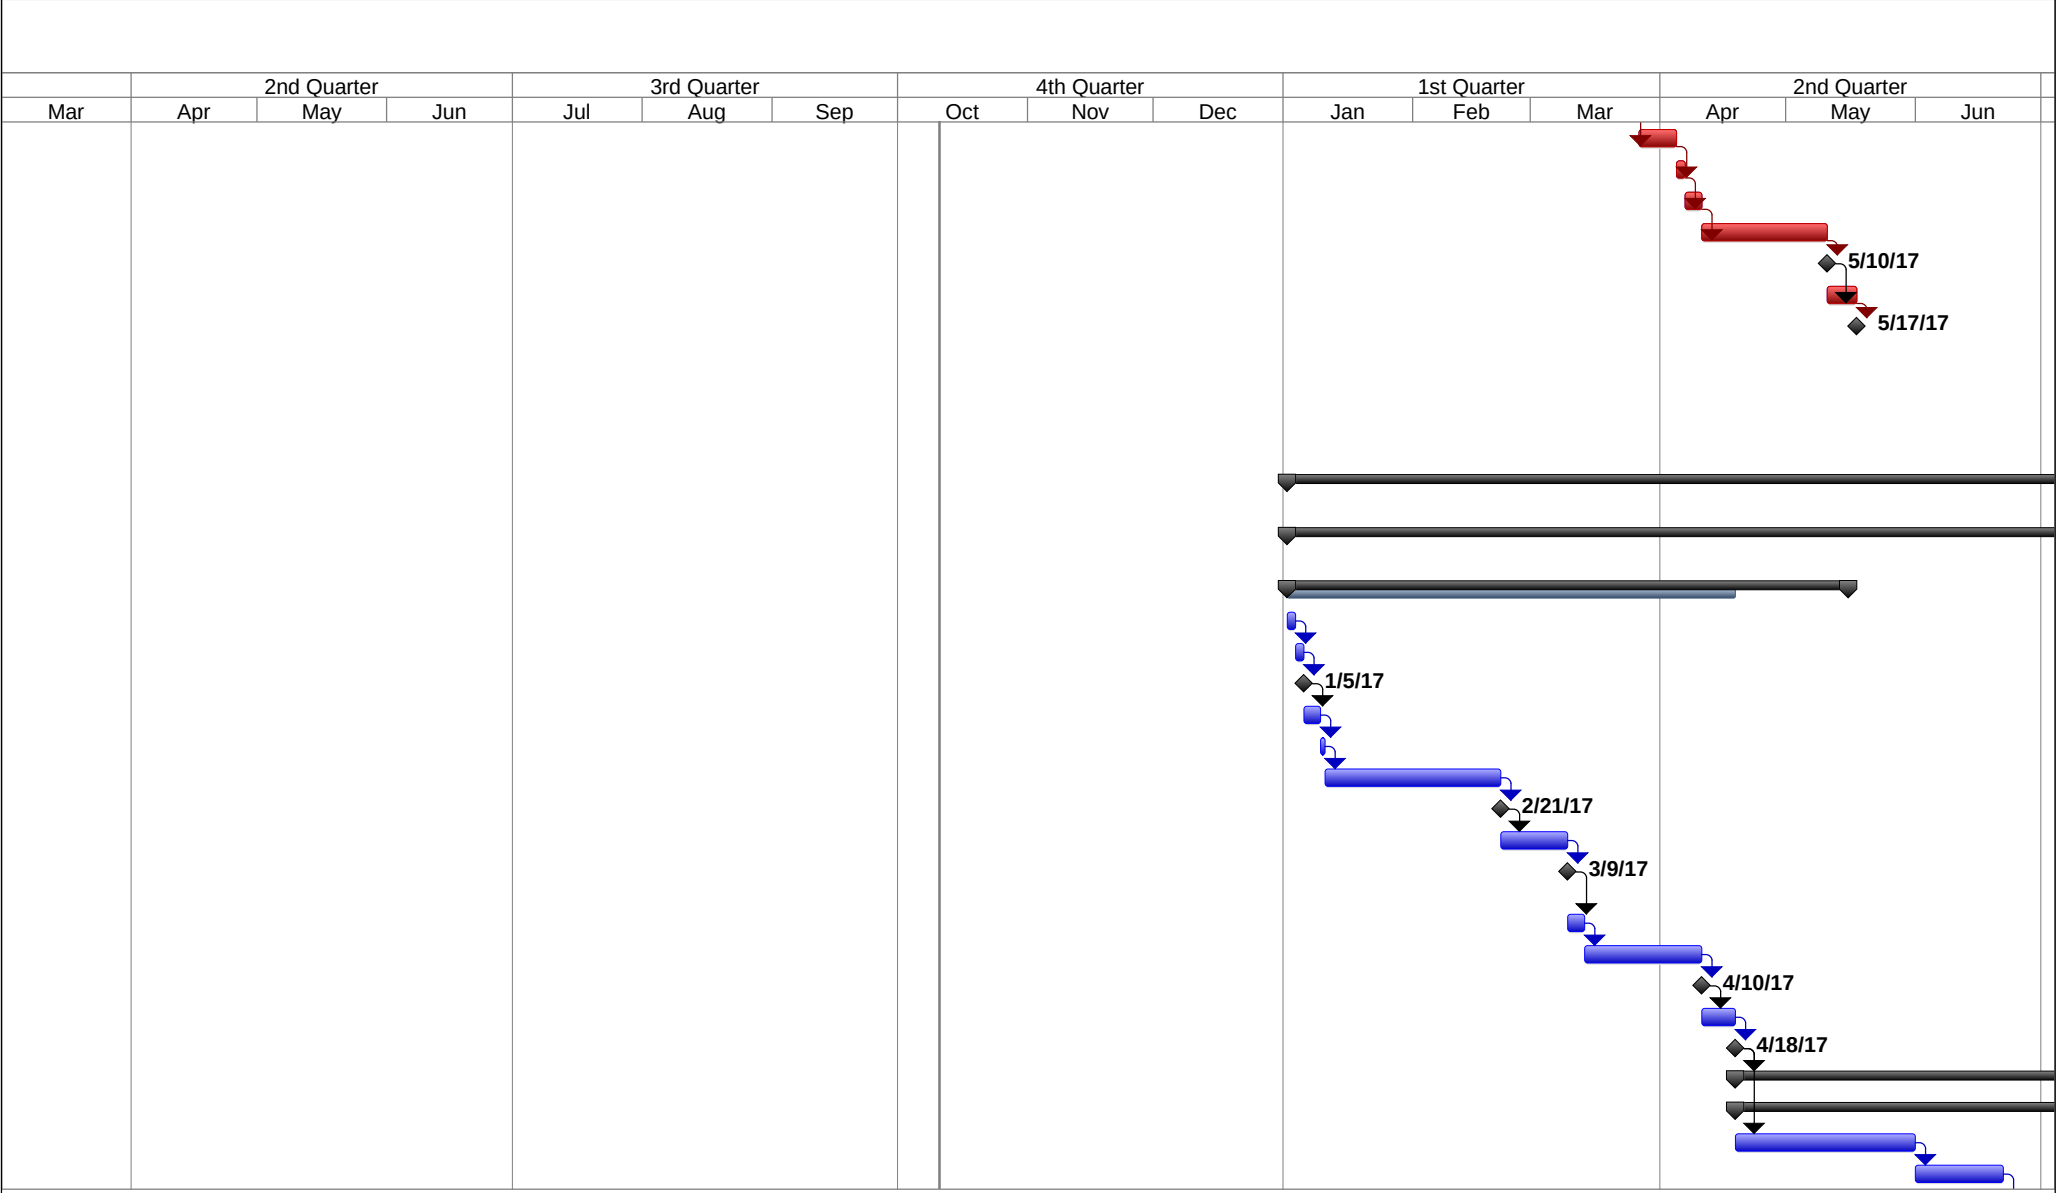




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

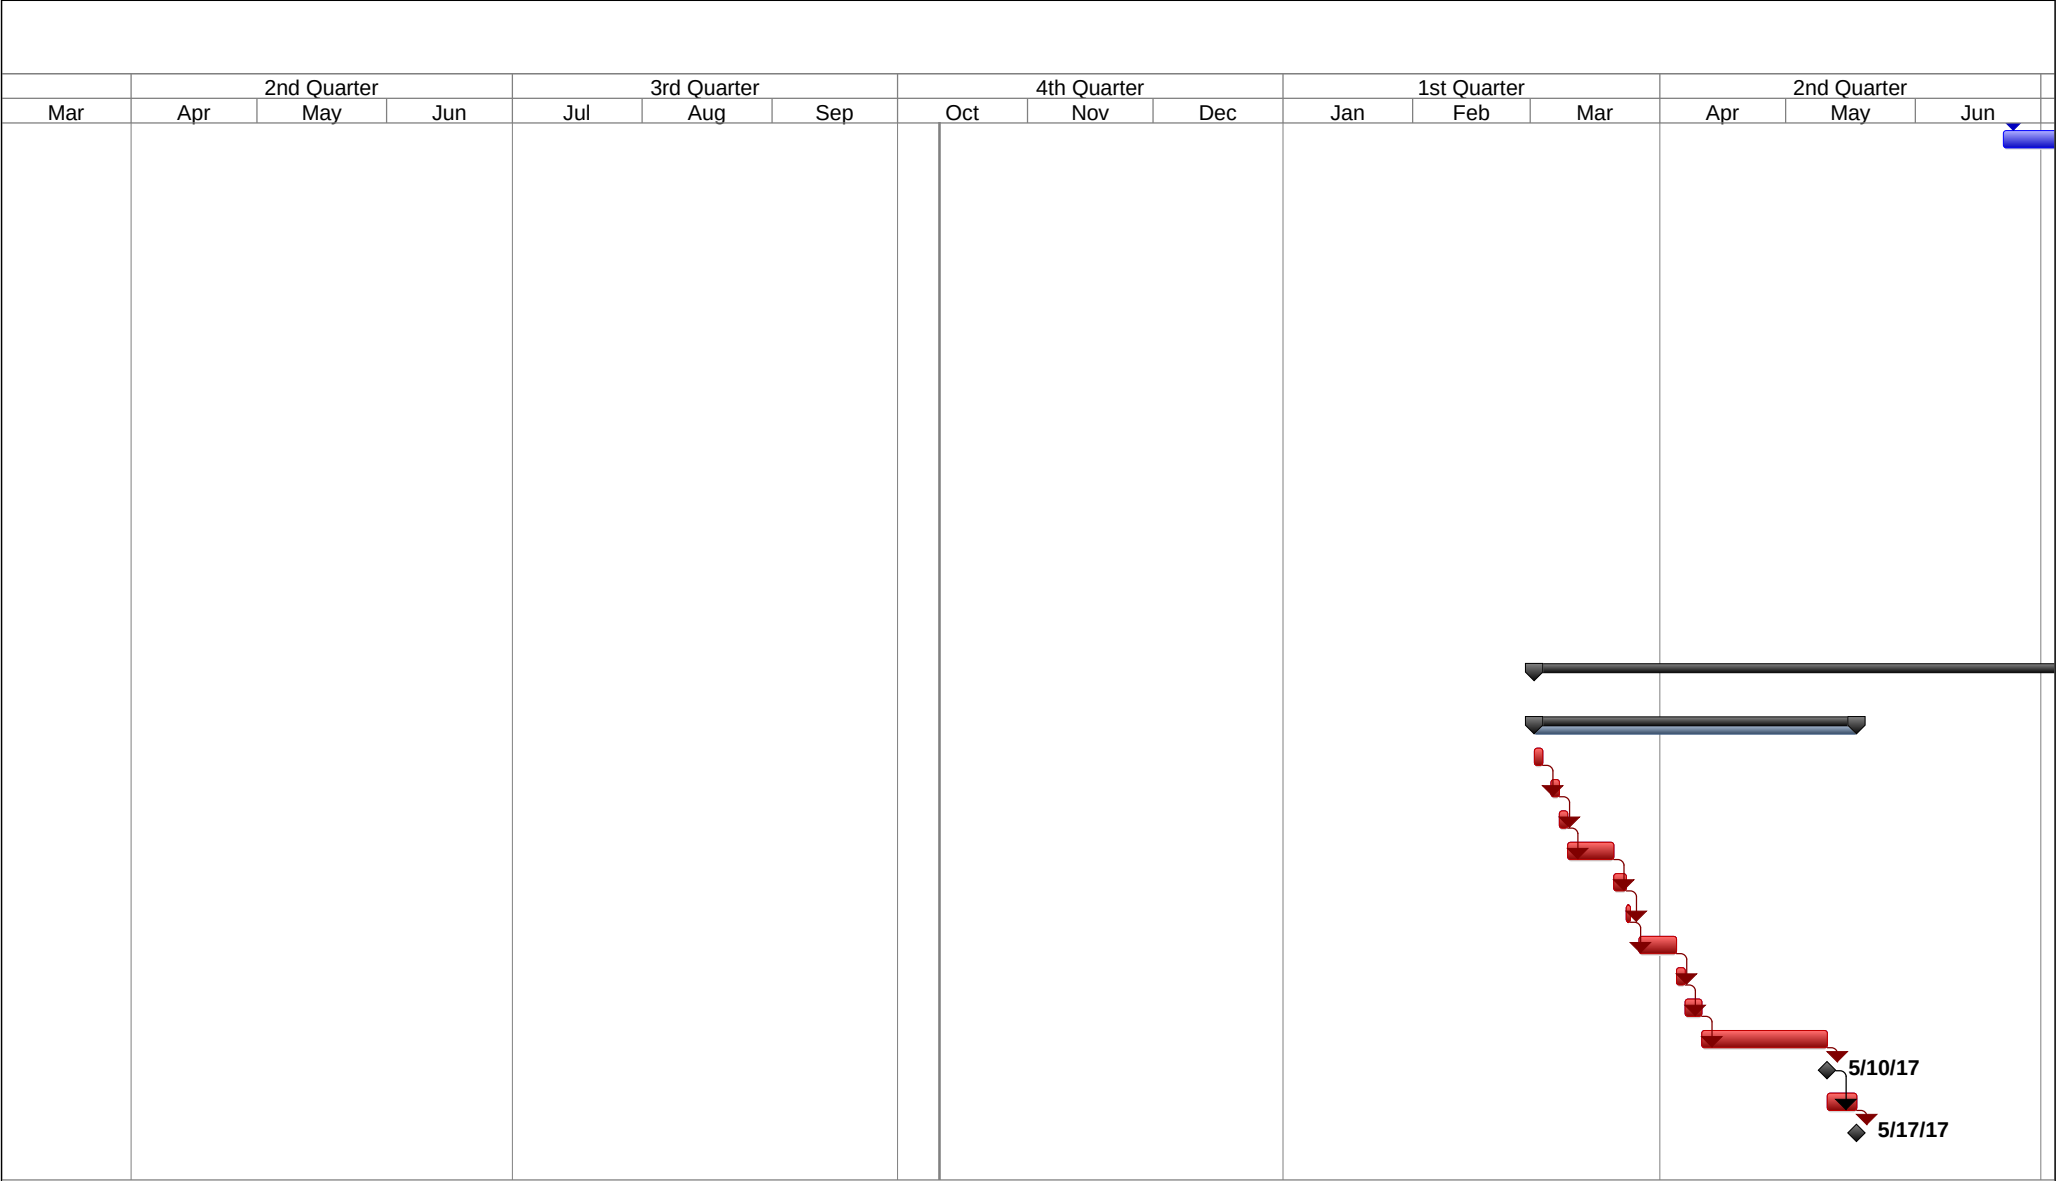

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

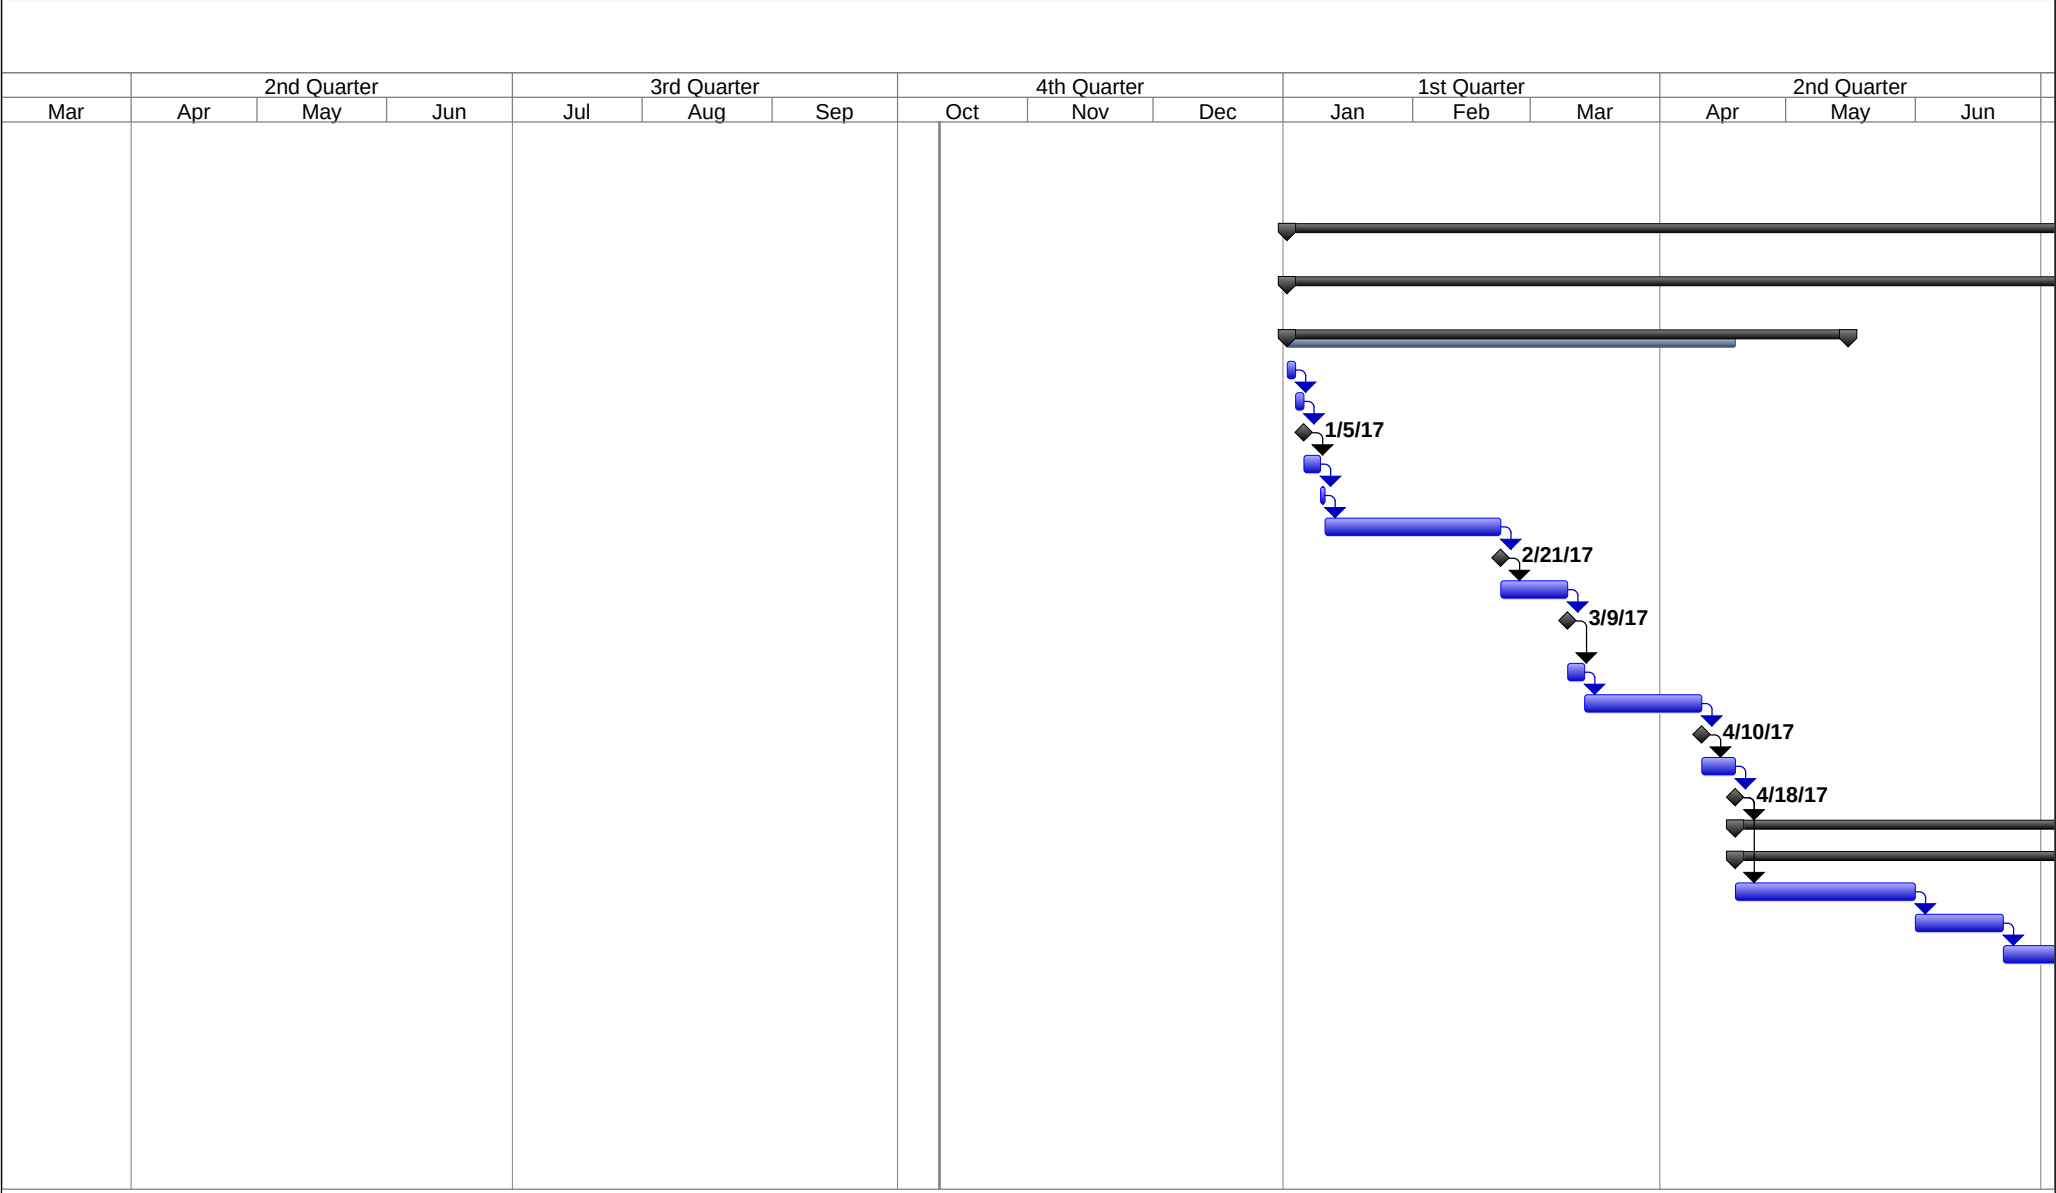

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

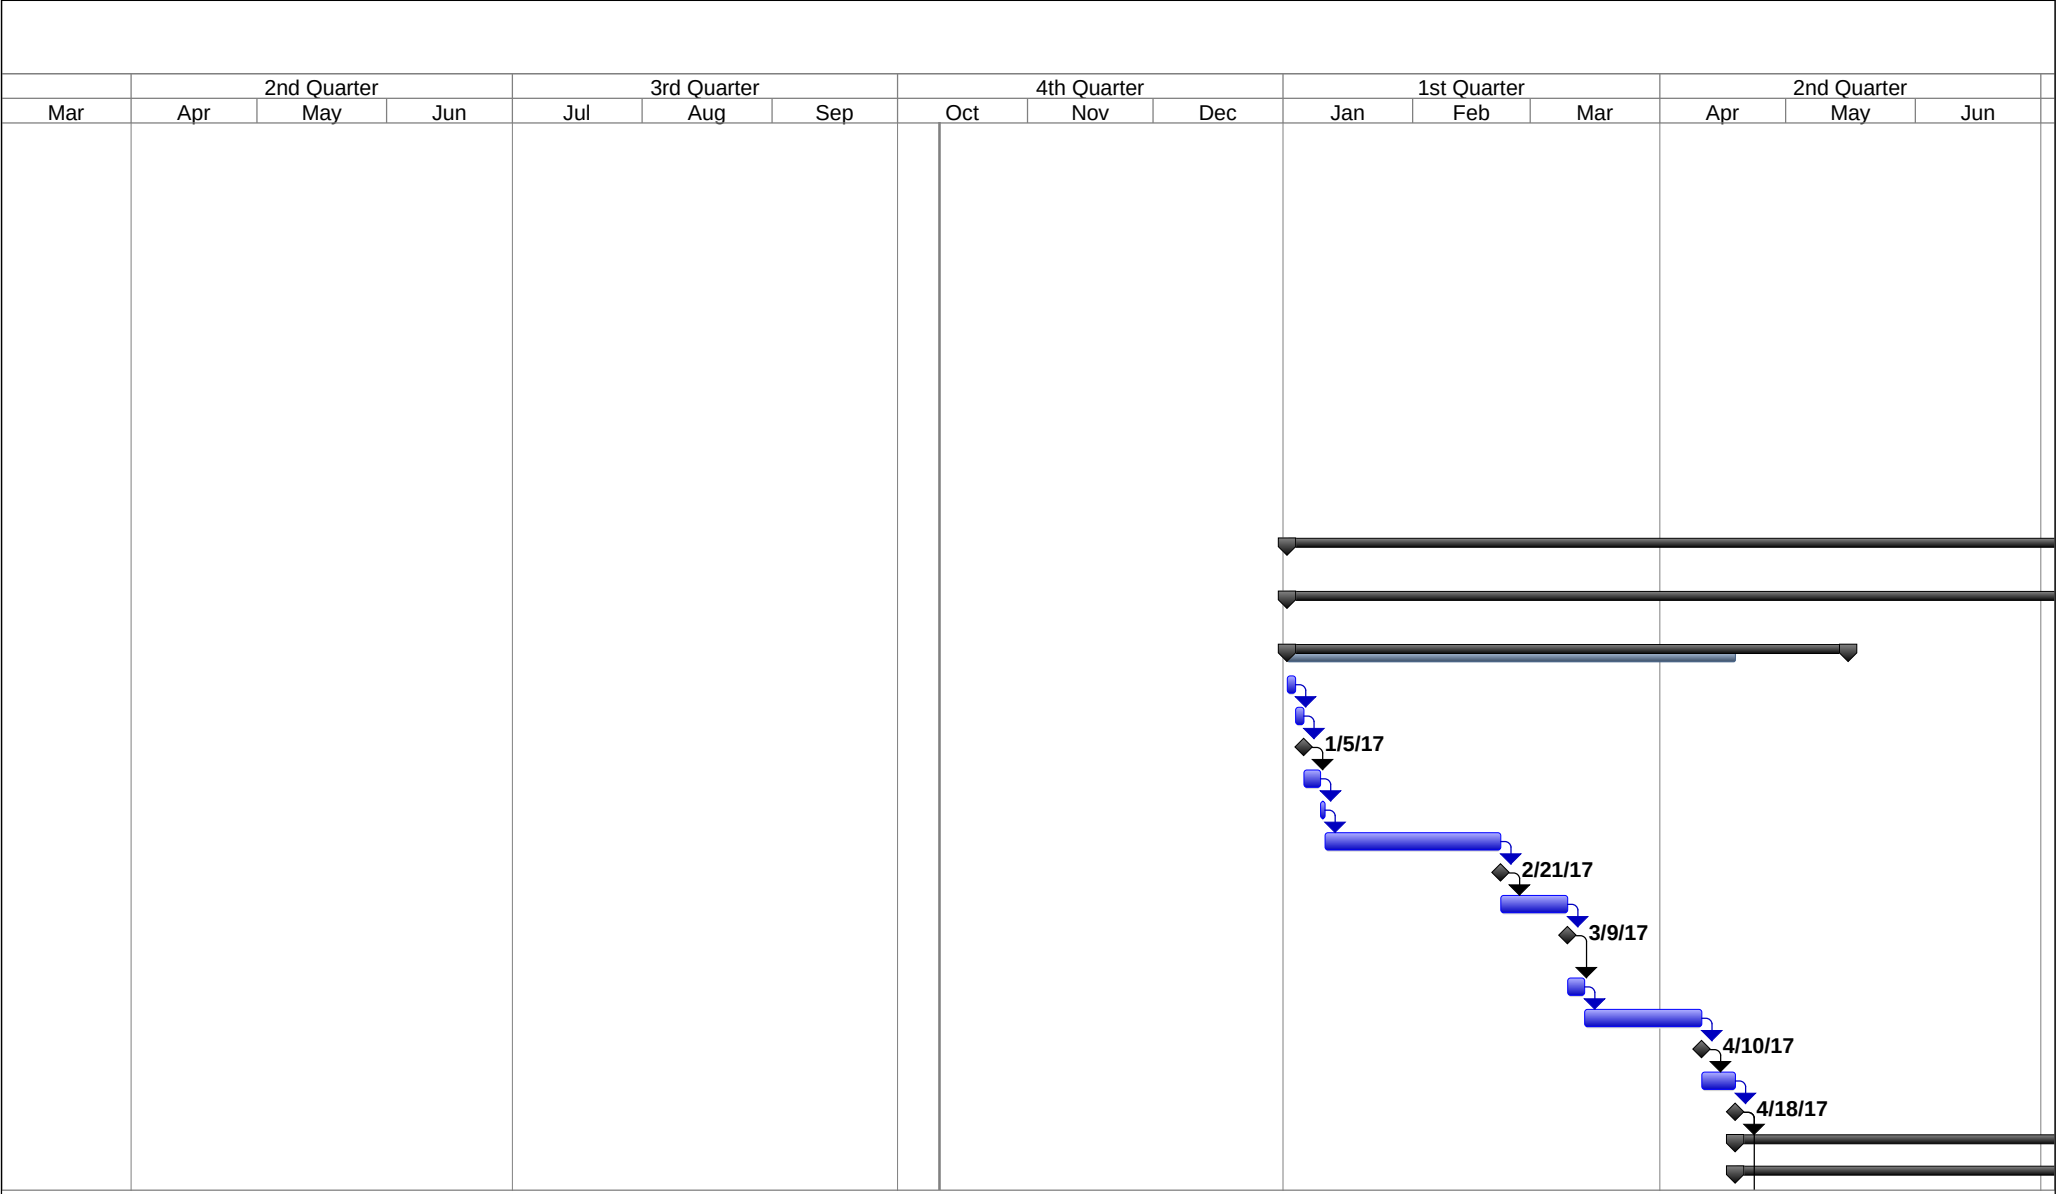


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |  |
| Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Apr         | May | Jun | Jul | Aug         | Sep | Oct | Nov         | Dec | Jan | Feb         | Mar | Apr | May         | Jun |  |
| <p>The Gantt chart displays project tasks and milestones for 2017. The tasks are represented by colored bars: a blue bar for 'Project Kick-off' in April, a black bar for 'Project Planning' in May, a red bar for 'Project Execution' in June, and a red bar for 'Project Closure' in July. A red arrow indicates a sequence of tasks from June to July, ending at a milestone labeled '5/10/17'.</p> |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

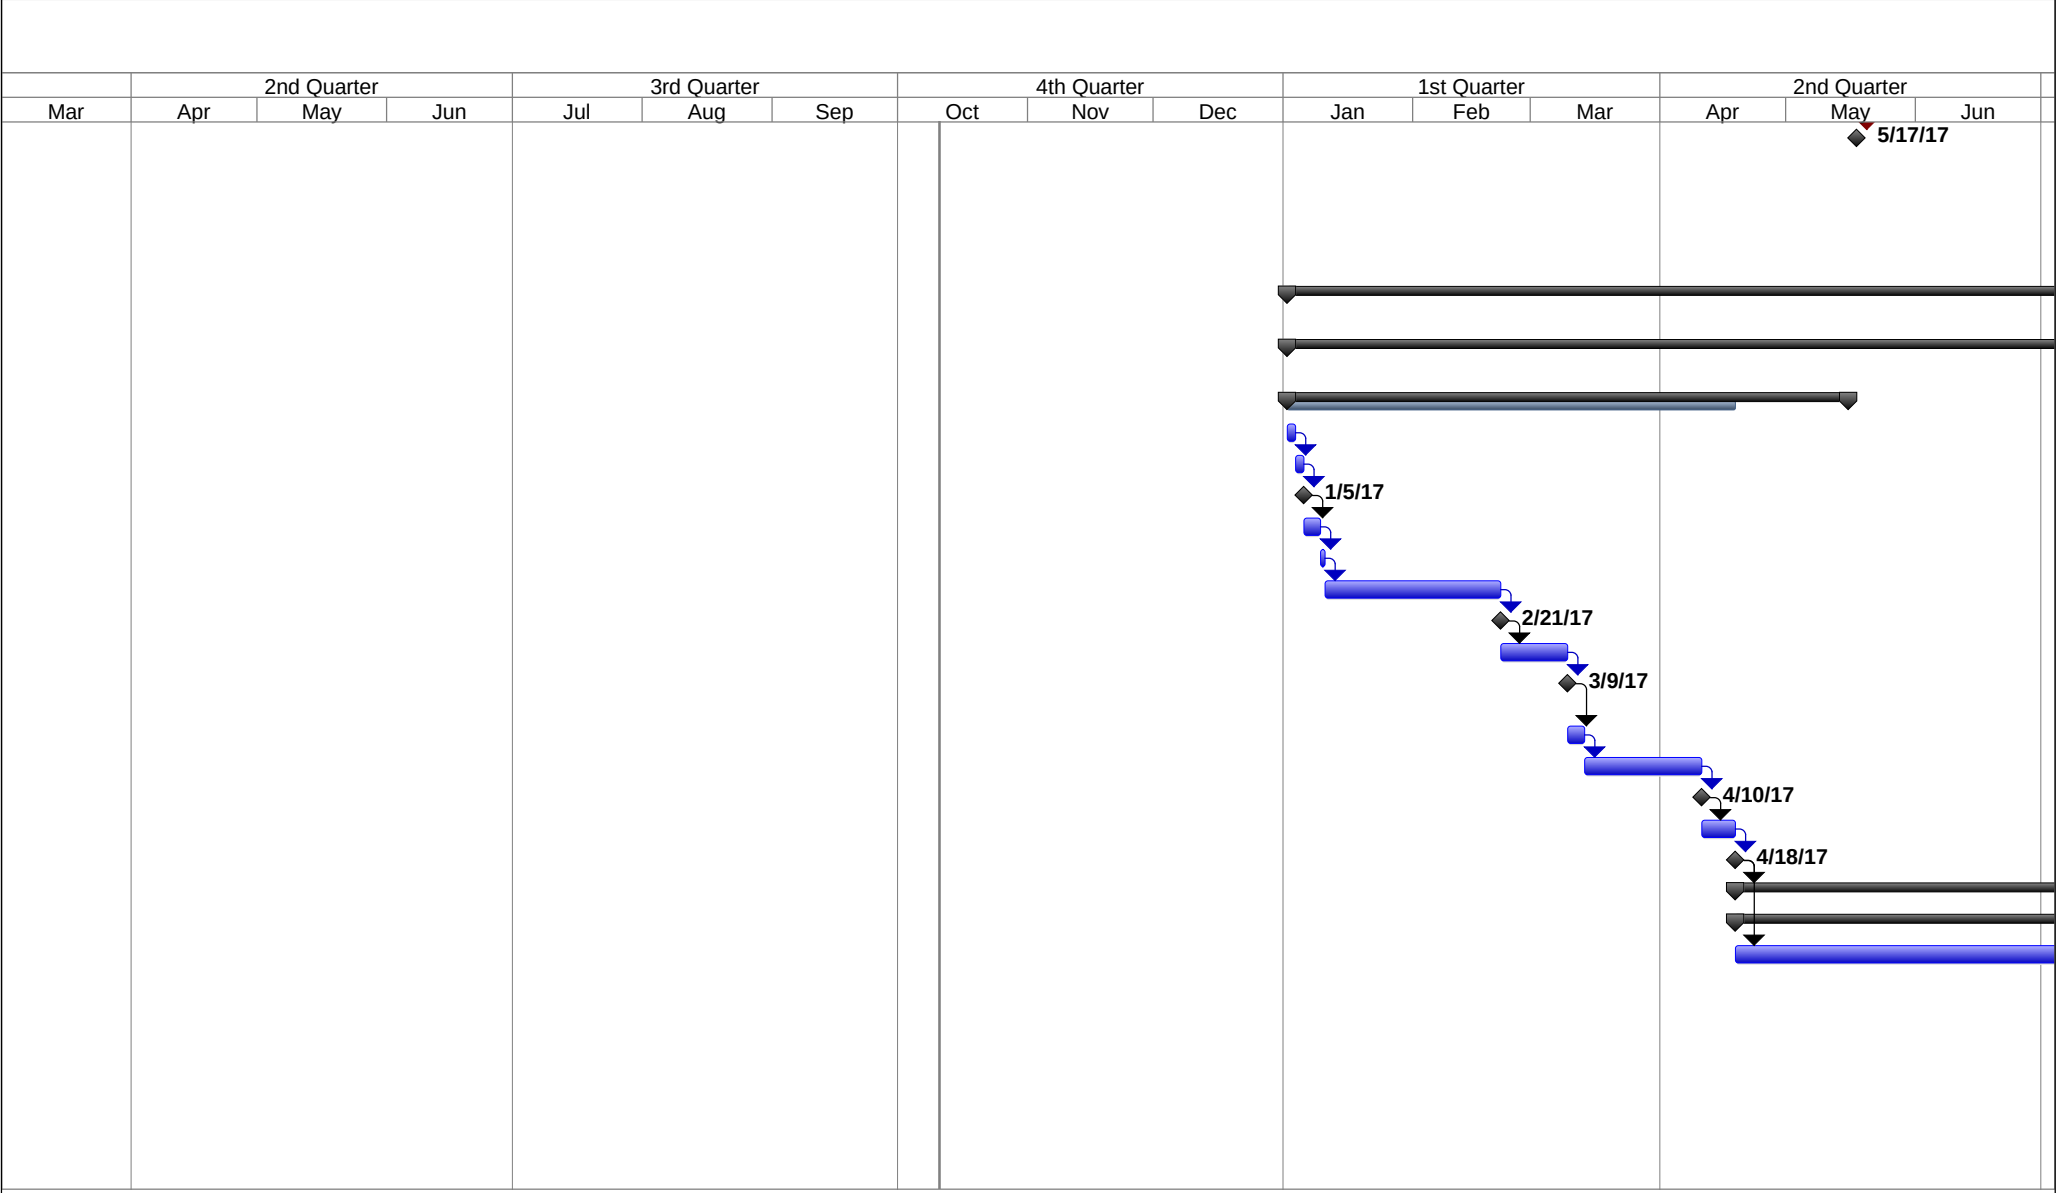


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

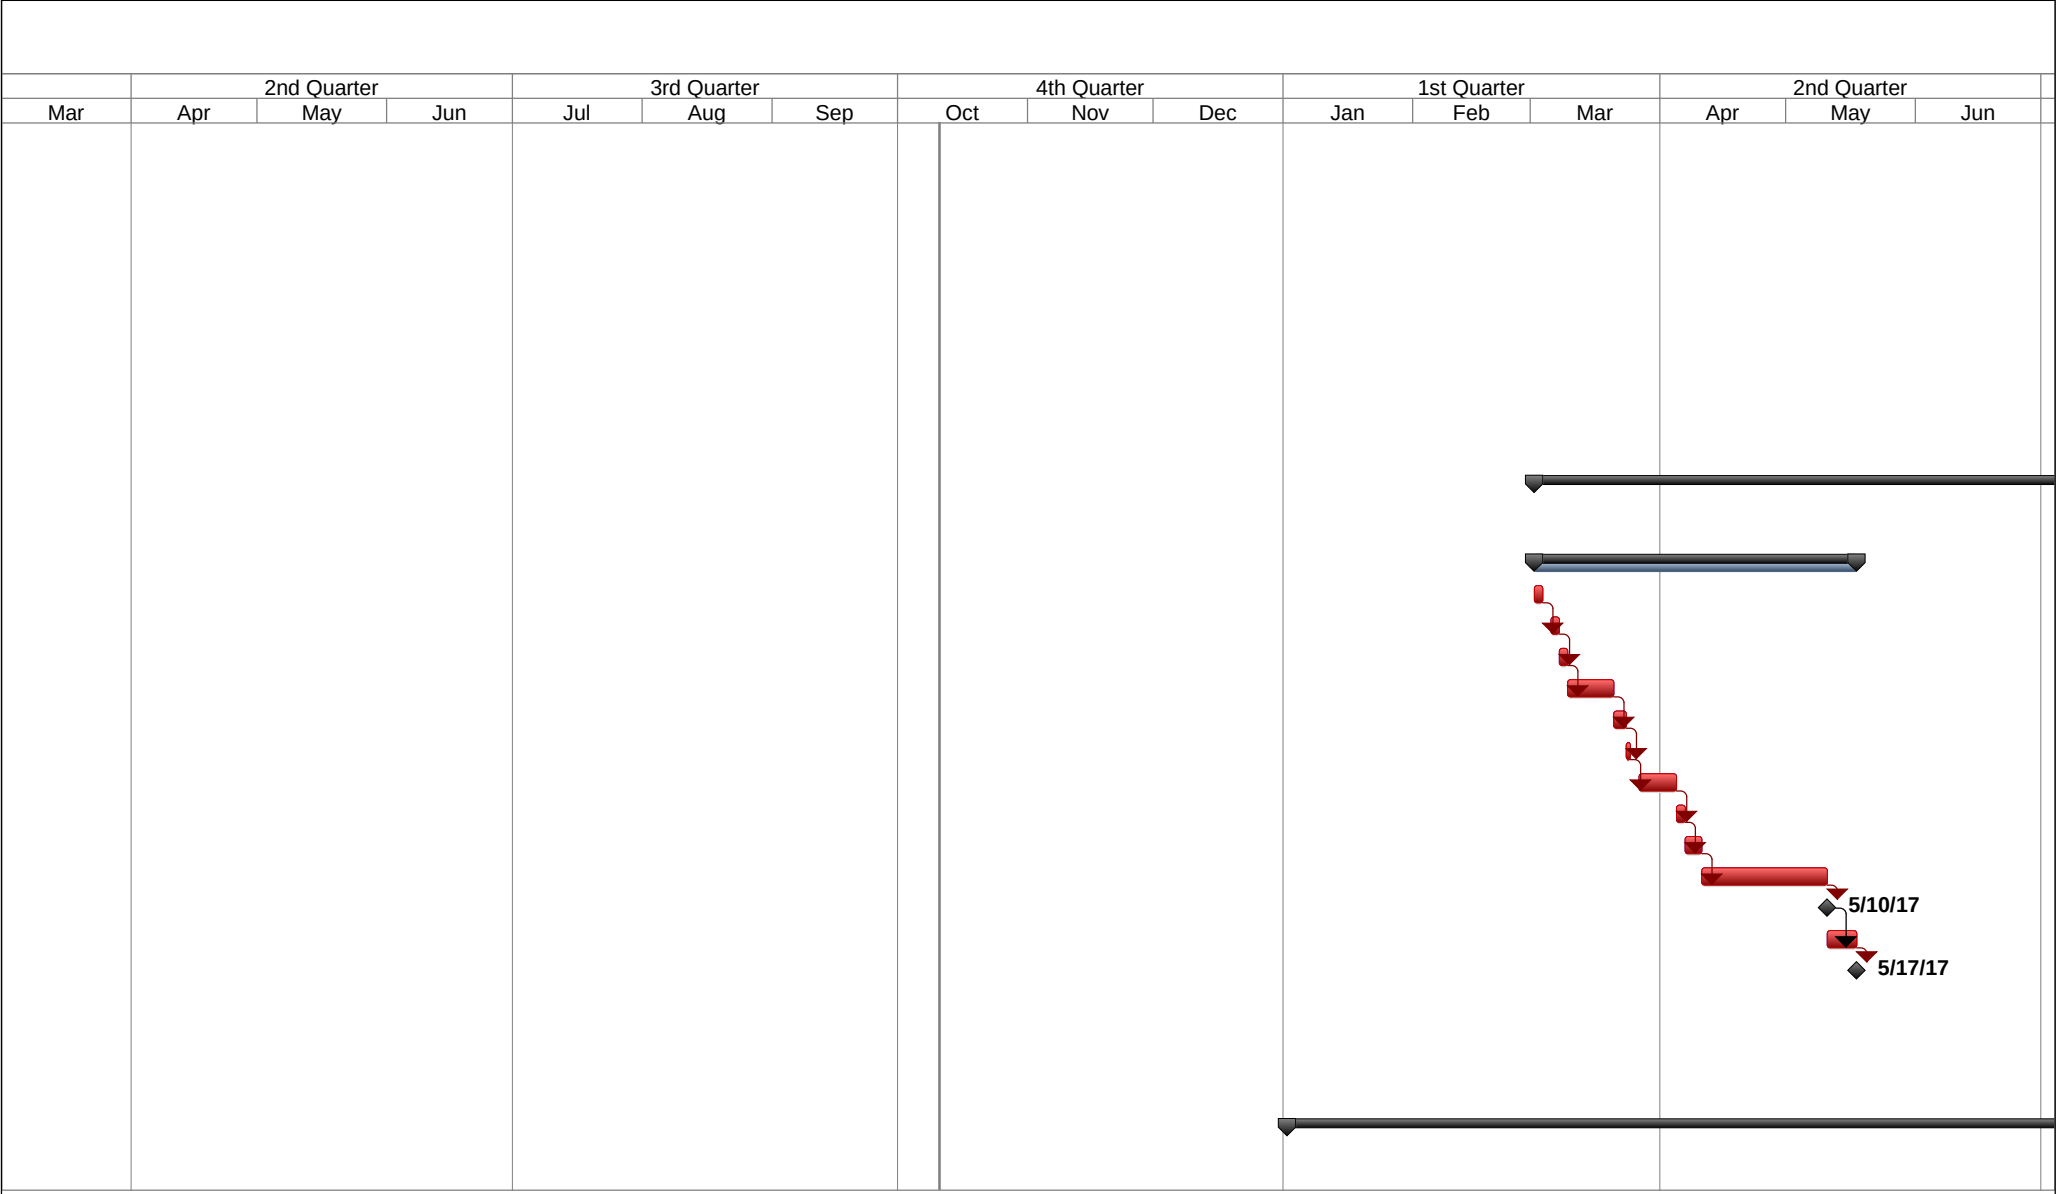


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

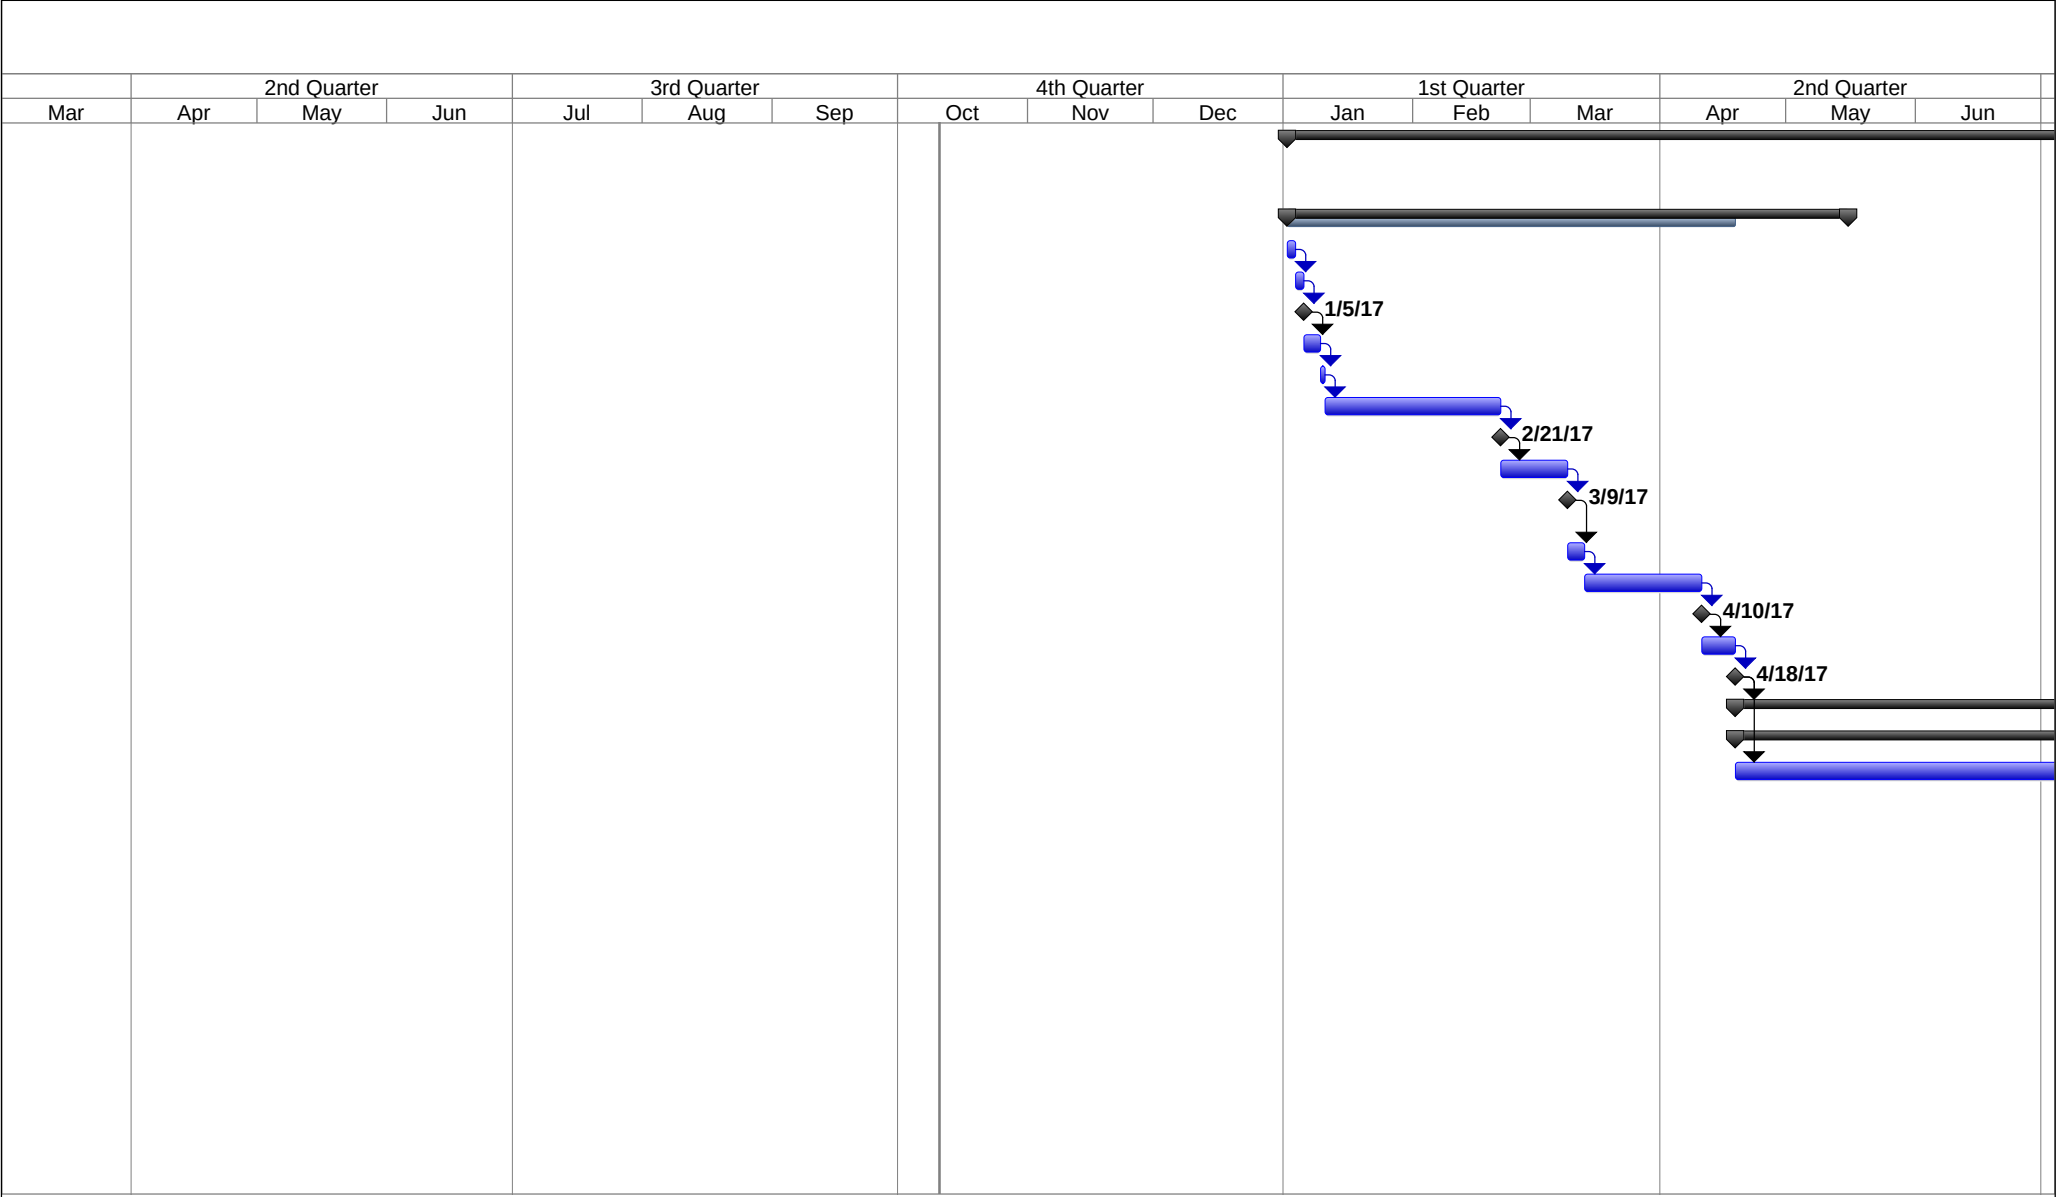


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

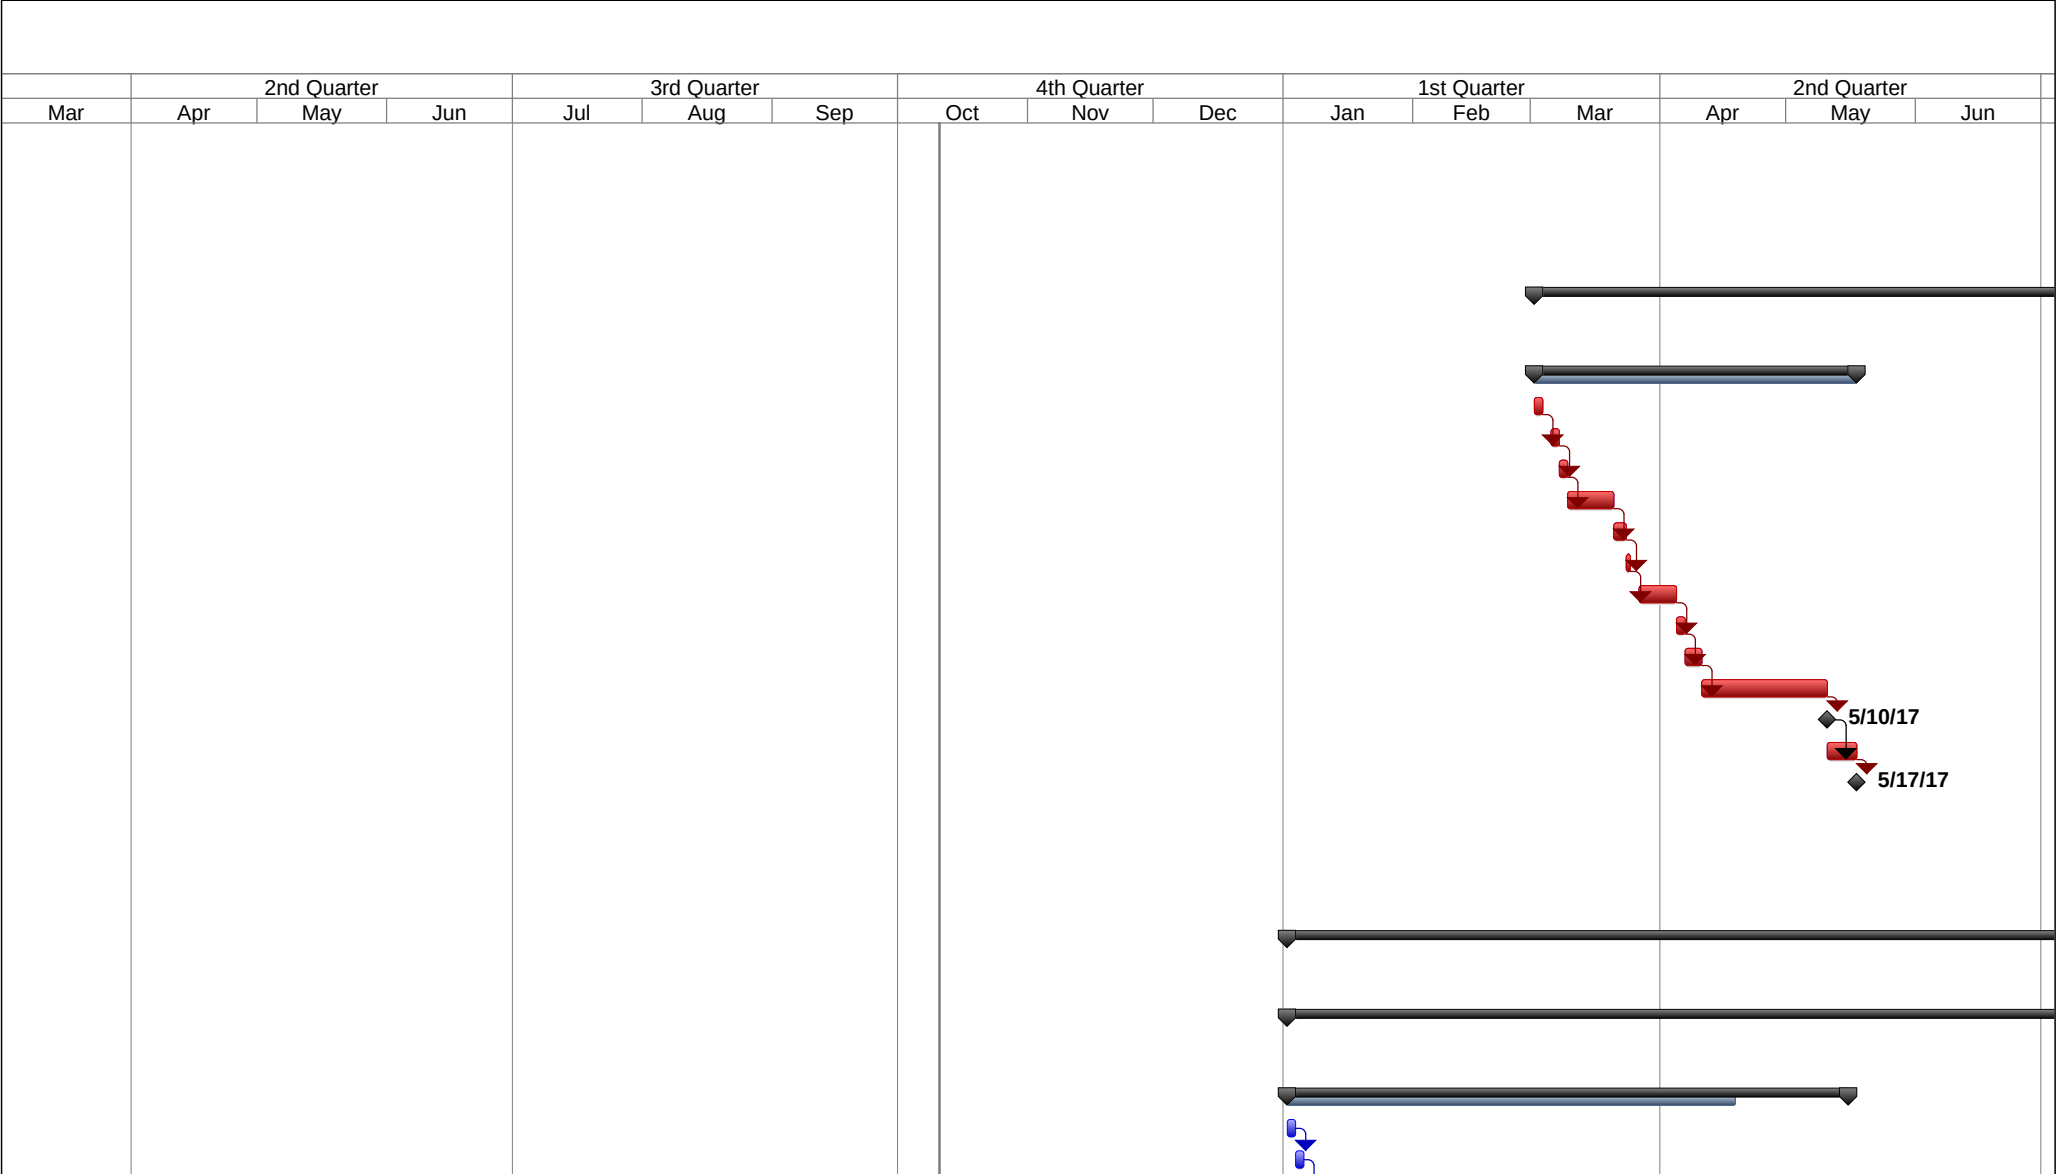

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

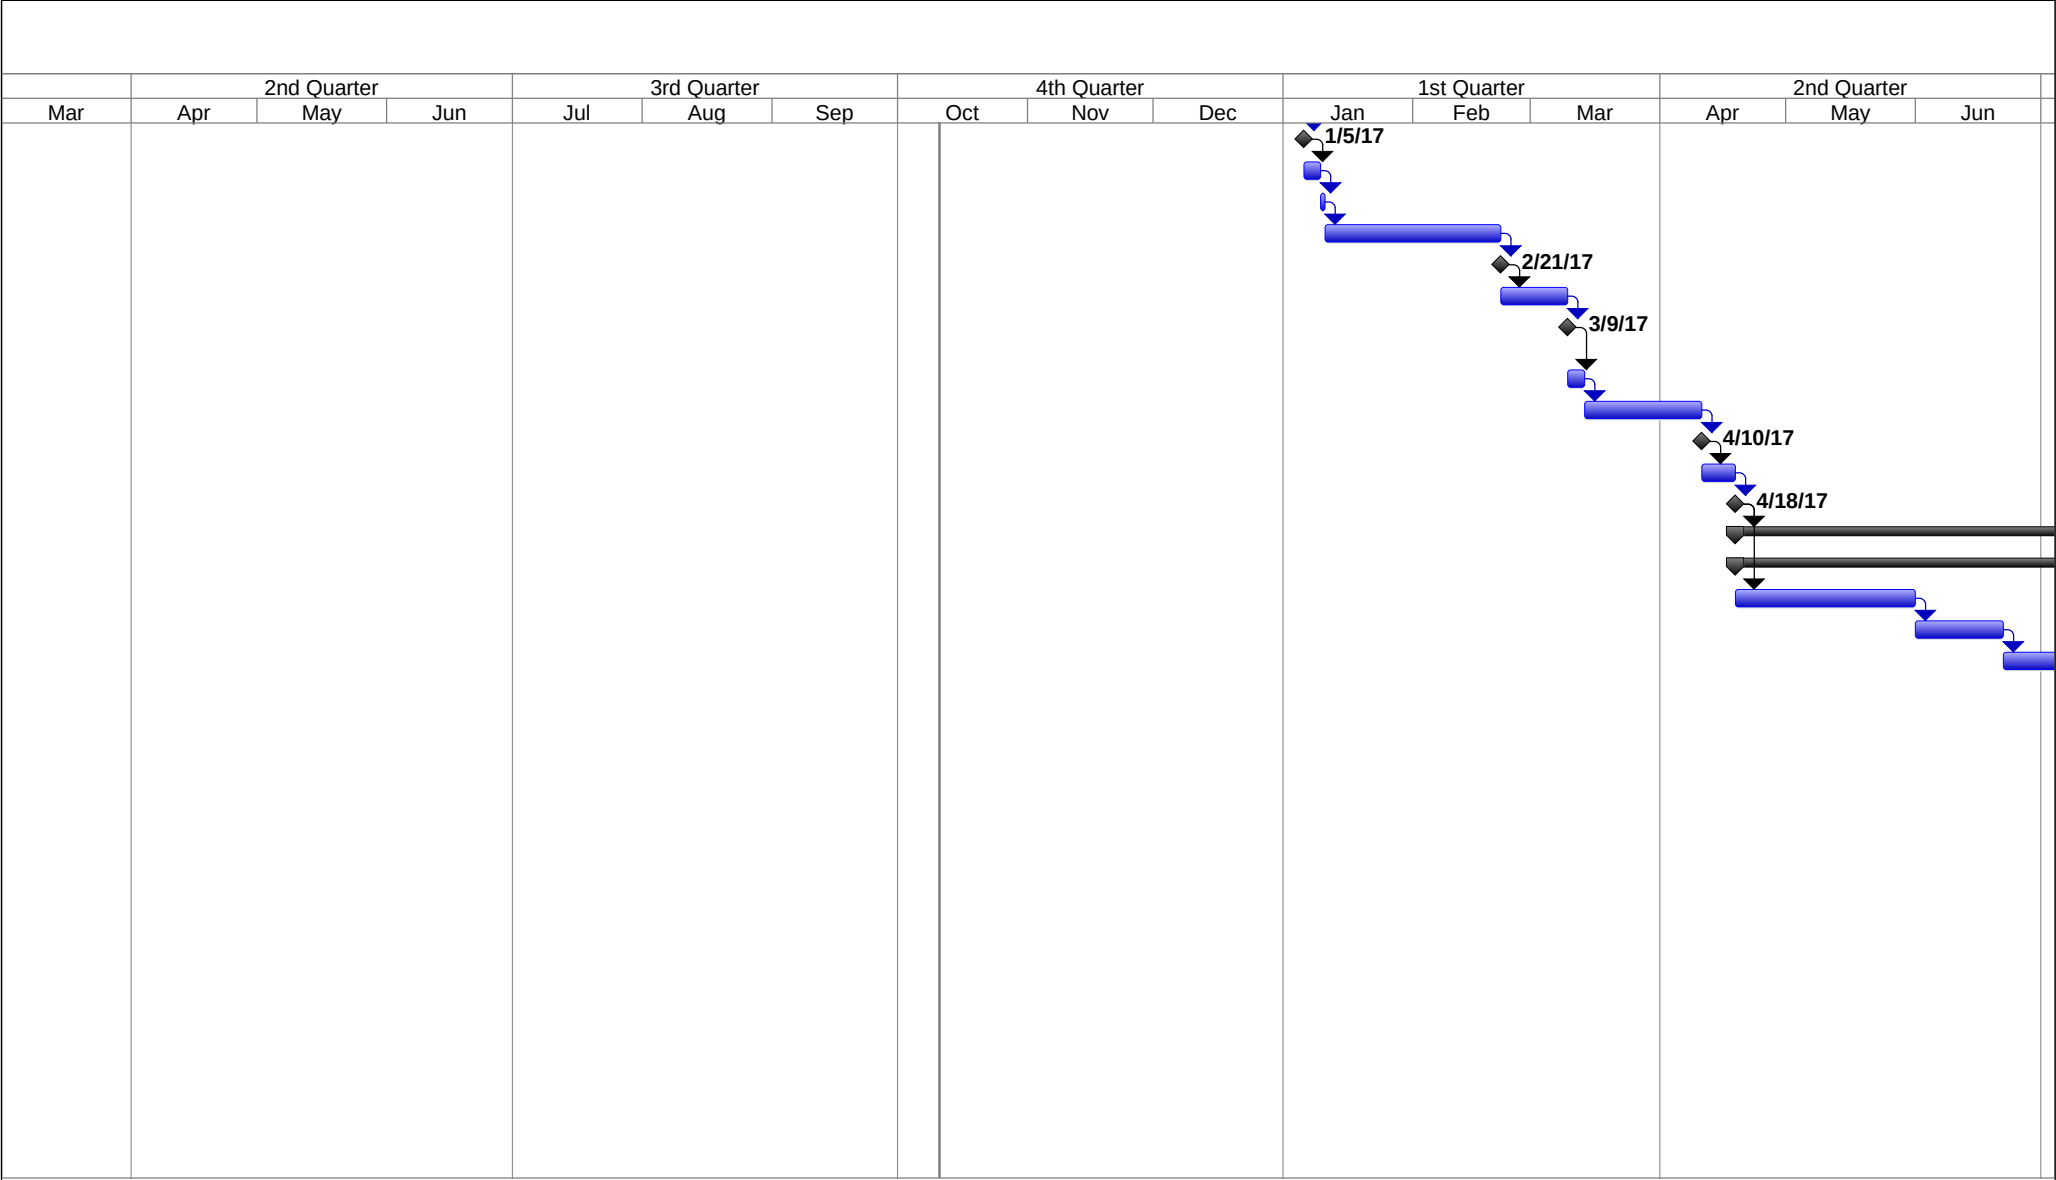

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

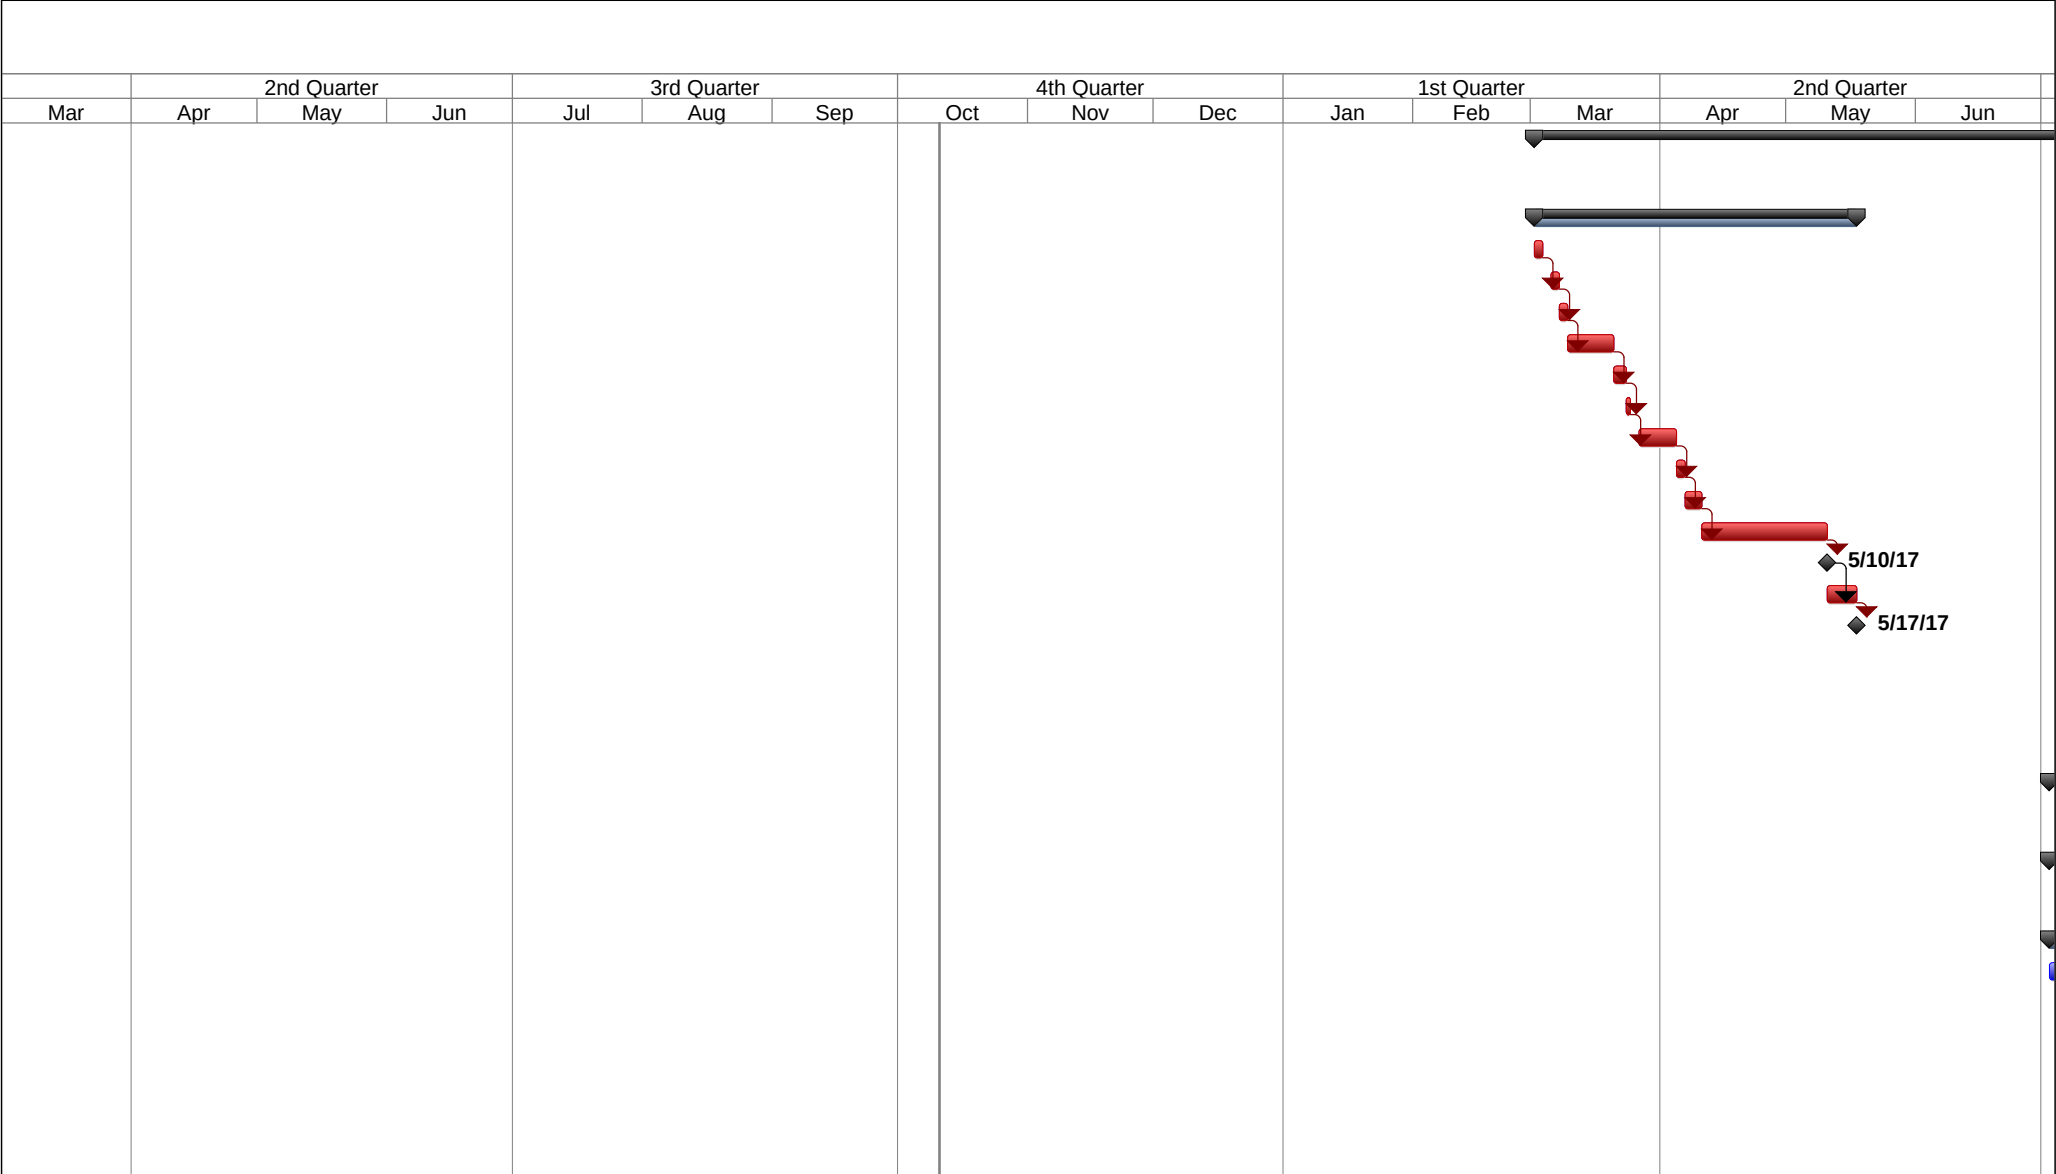

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |  |  |  |
| Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Apr | May         | Jun | Jul | Aug | Sep         | Oct | Nov | Dec         | Jan | Feb | Mar         | Apr | May | Jun         |  |  |  |
| <p>The Gantt chart displays a project schedule for 2017, organized by quarters. The timeline spans from March to June. Three primary horizontal bars are visible: a top bar extending from January to June, a middle bar from January to May, and a bottom bar from January to June. A detailed task sequence is shown in the bottom right, starting in January and ending in June, with dates 1/5/17, 2/21/17, 3/9/17, and 4/10/17 marked.</p> |     |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |  |  |  |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

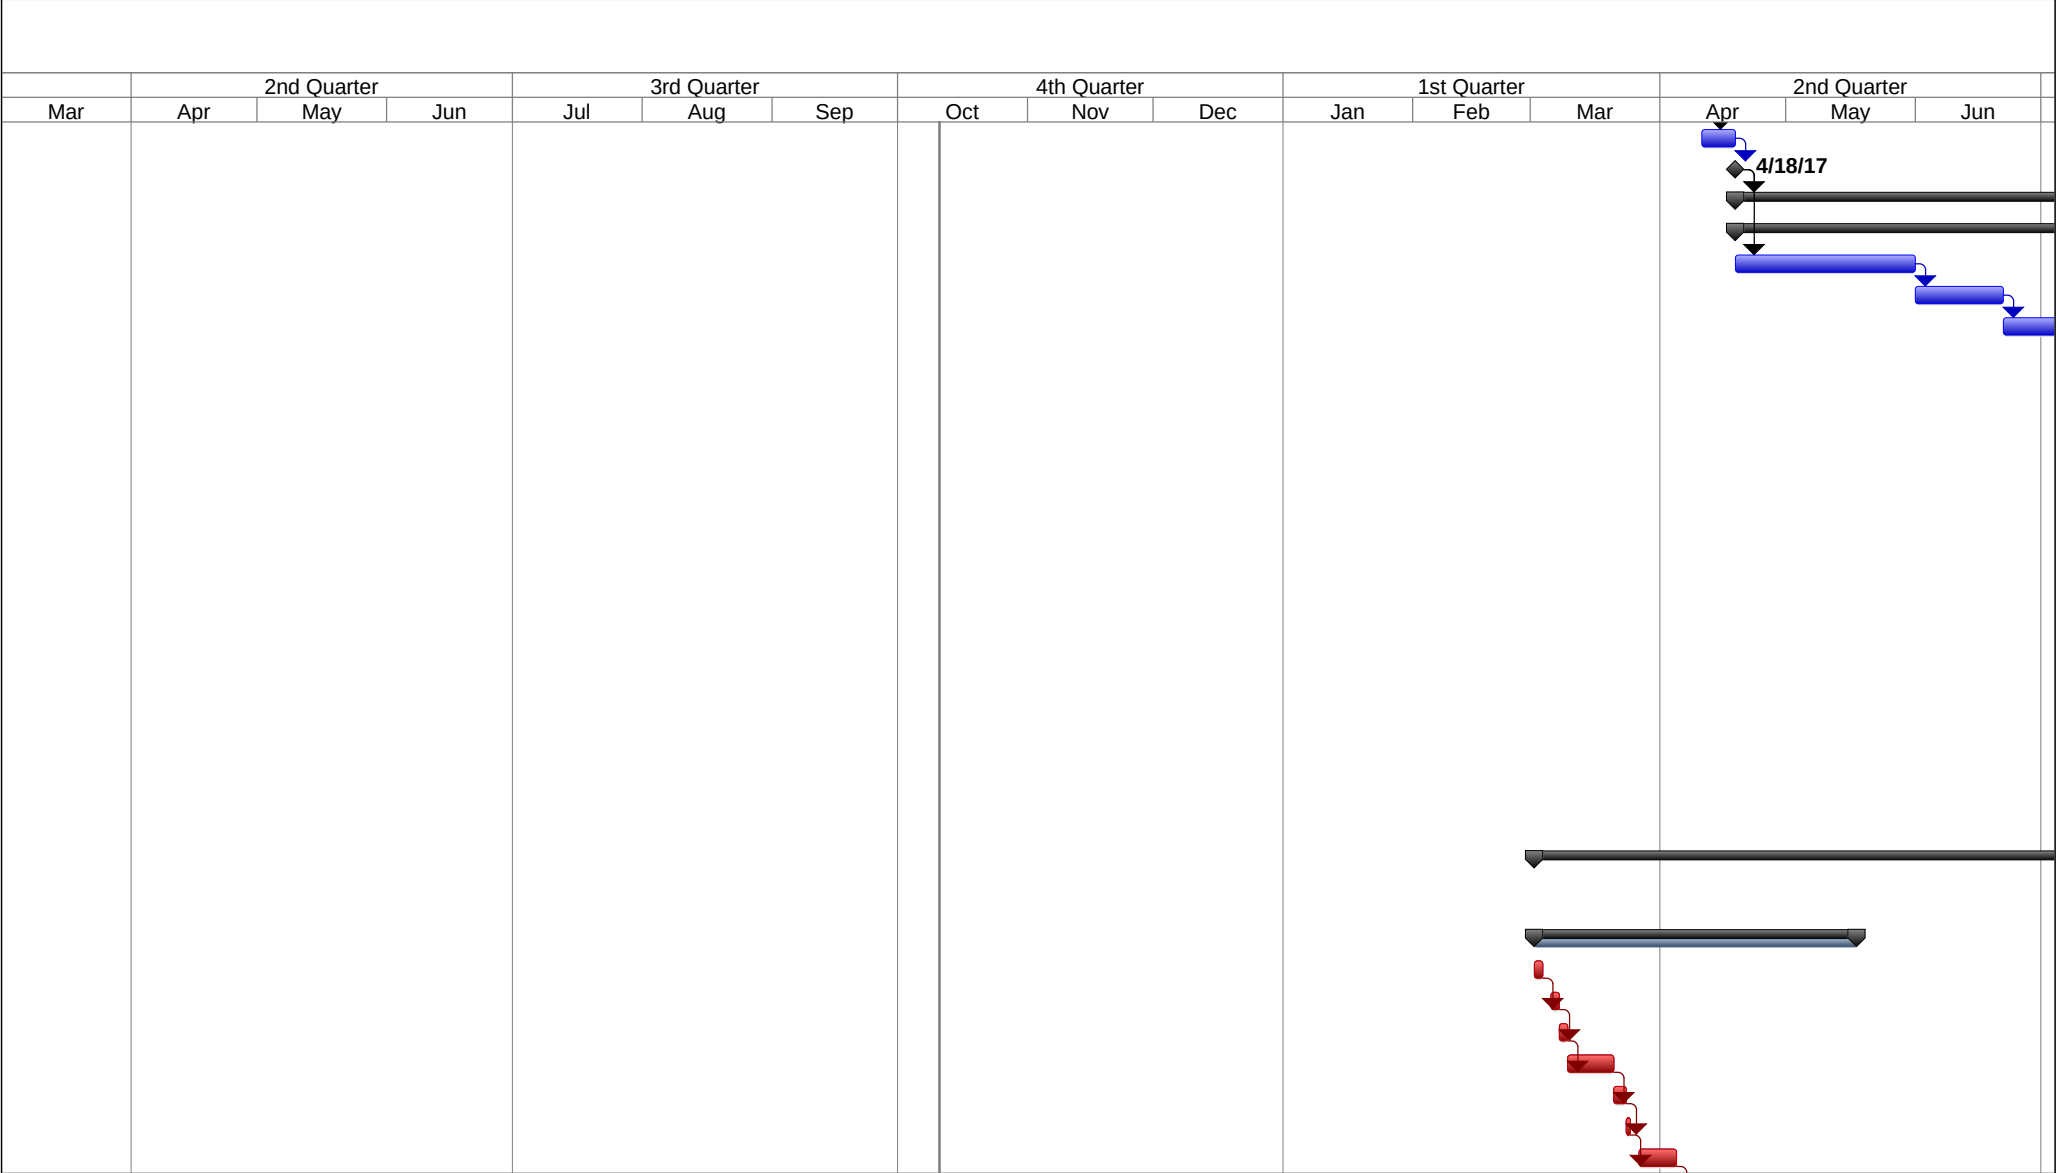

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter                                                                         |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar                                                                                 | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|  |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


| 2nd Quarter |     |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Mar         | Apr | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun |
|             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


[illegible]




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

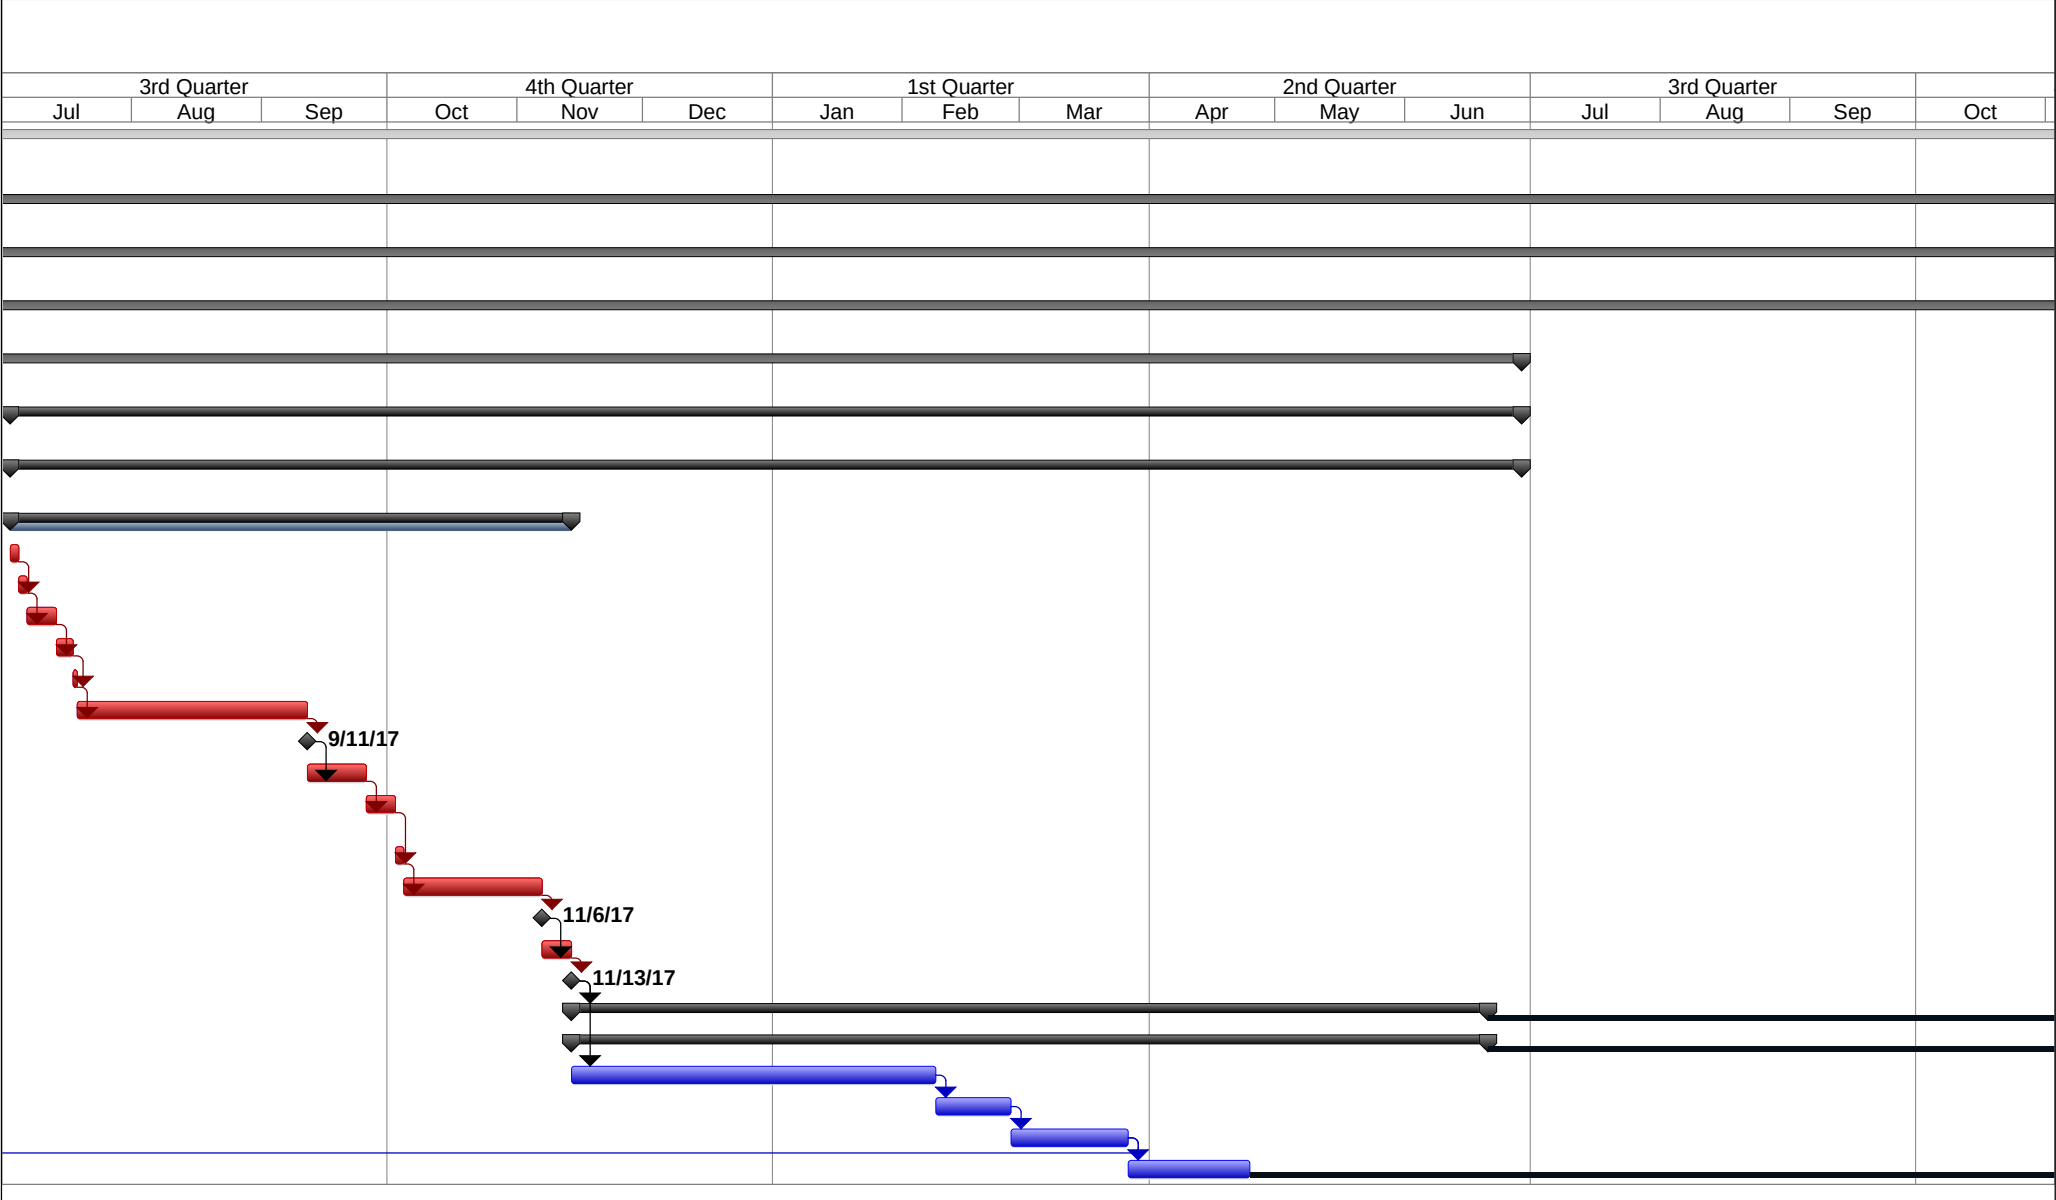

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

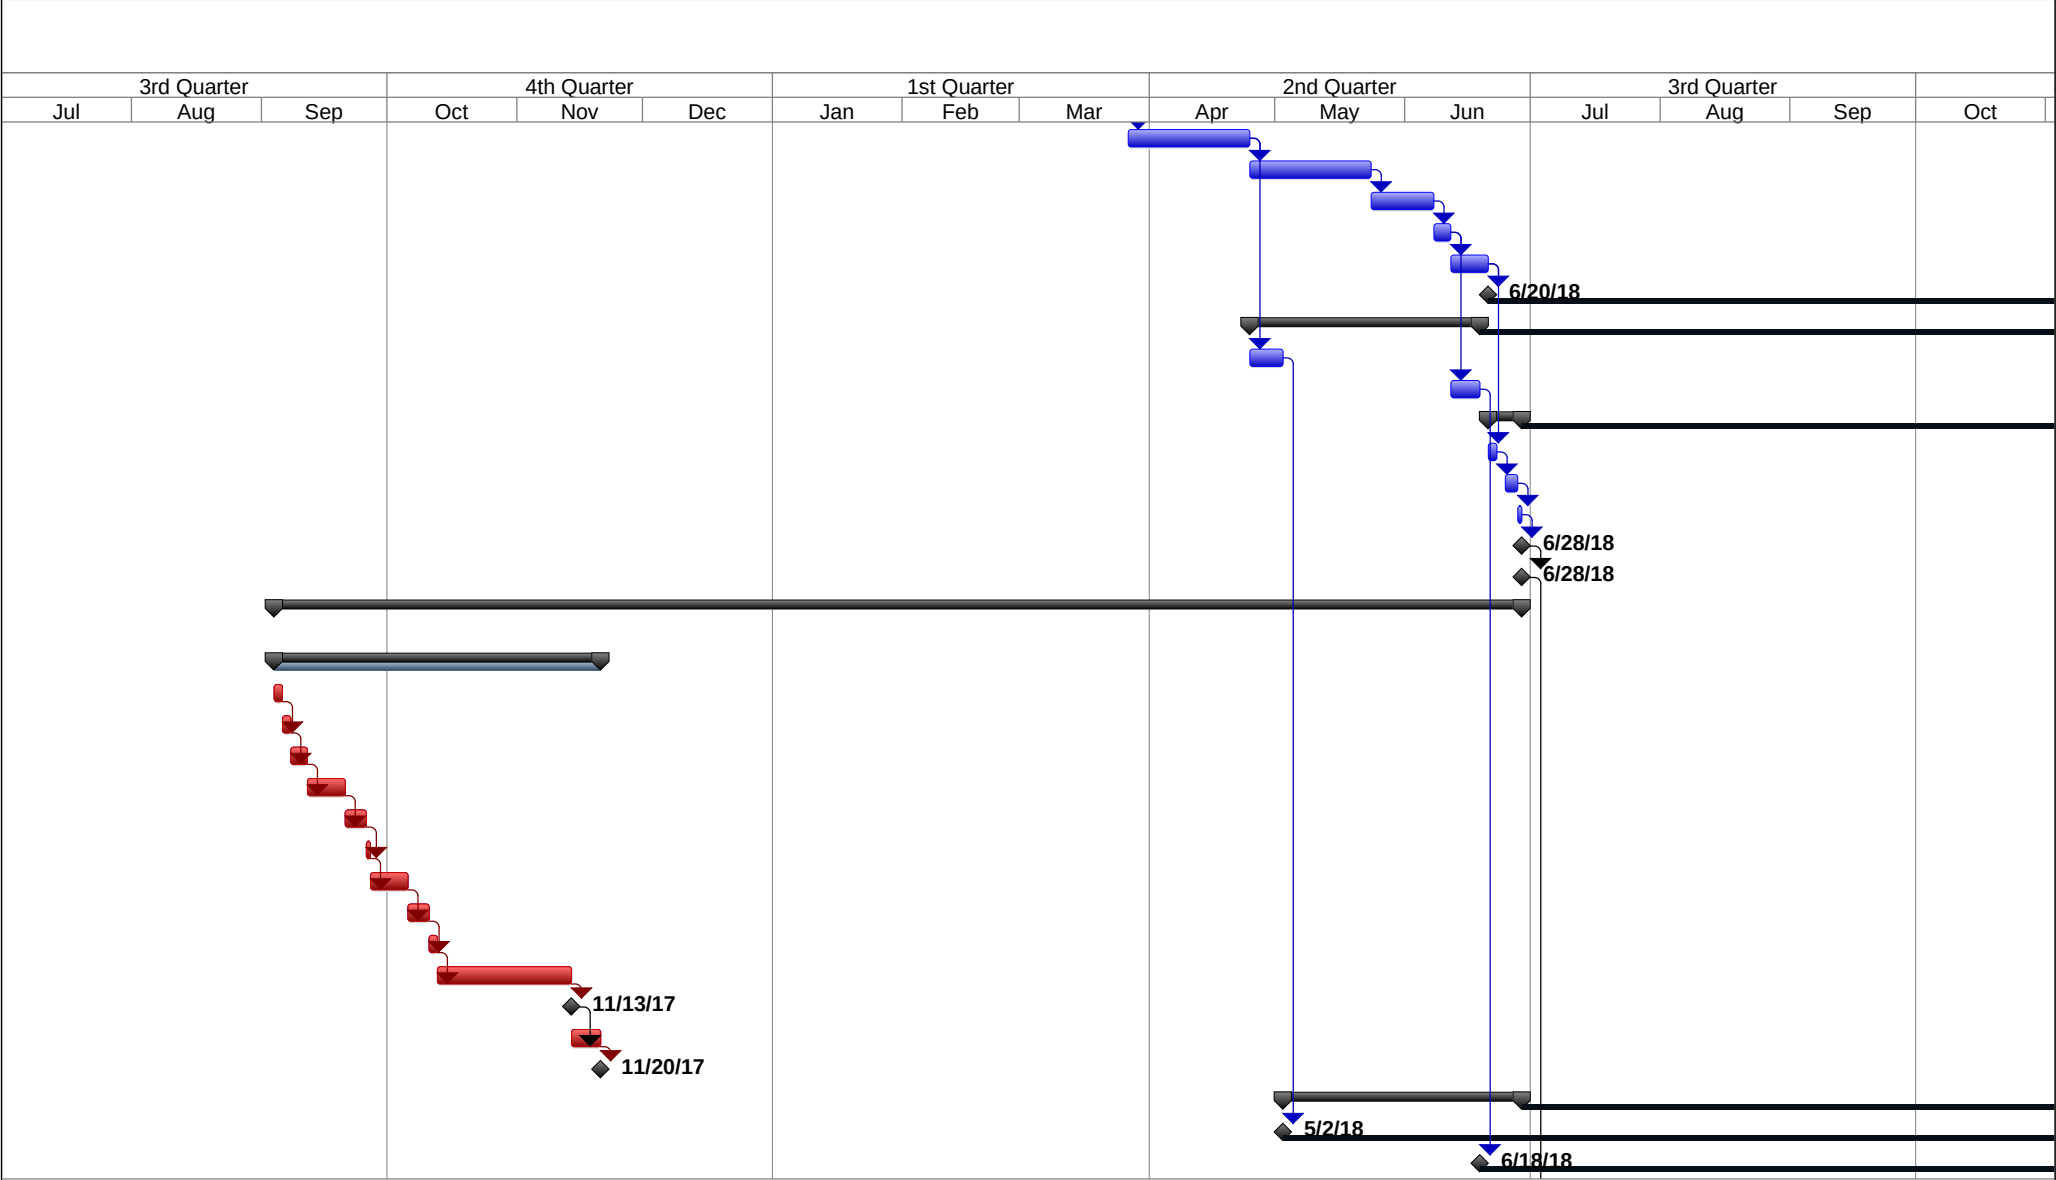


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

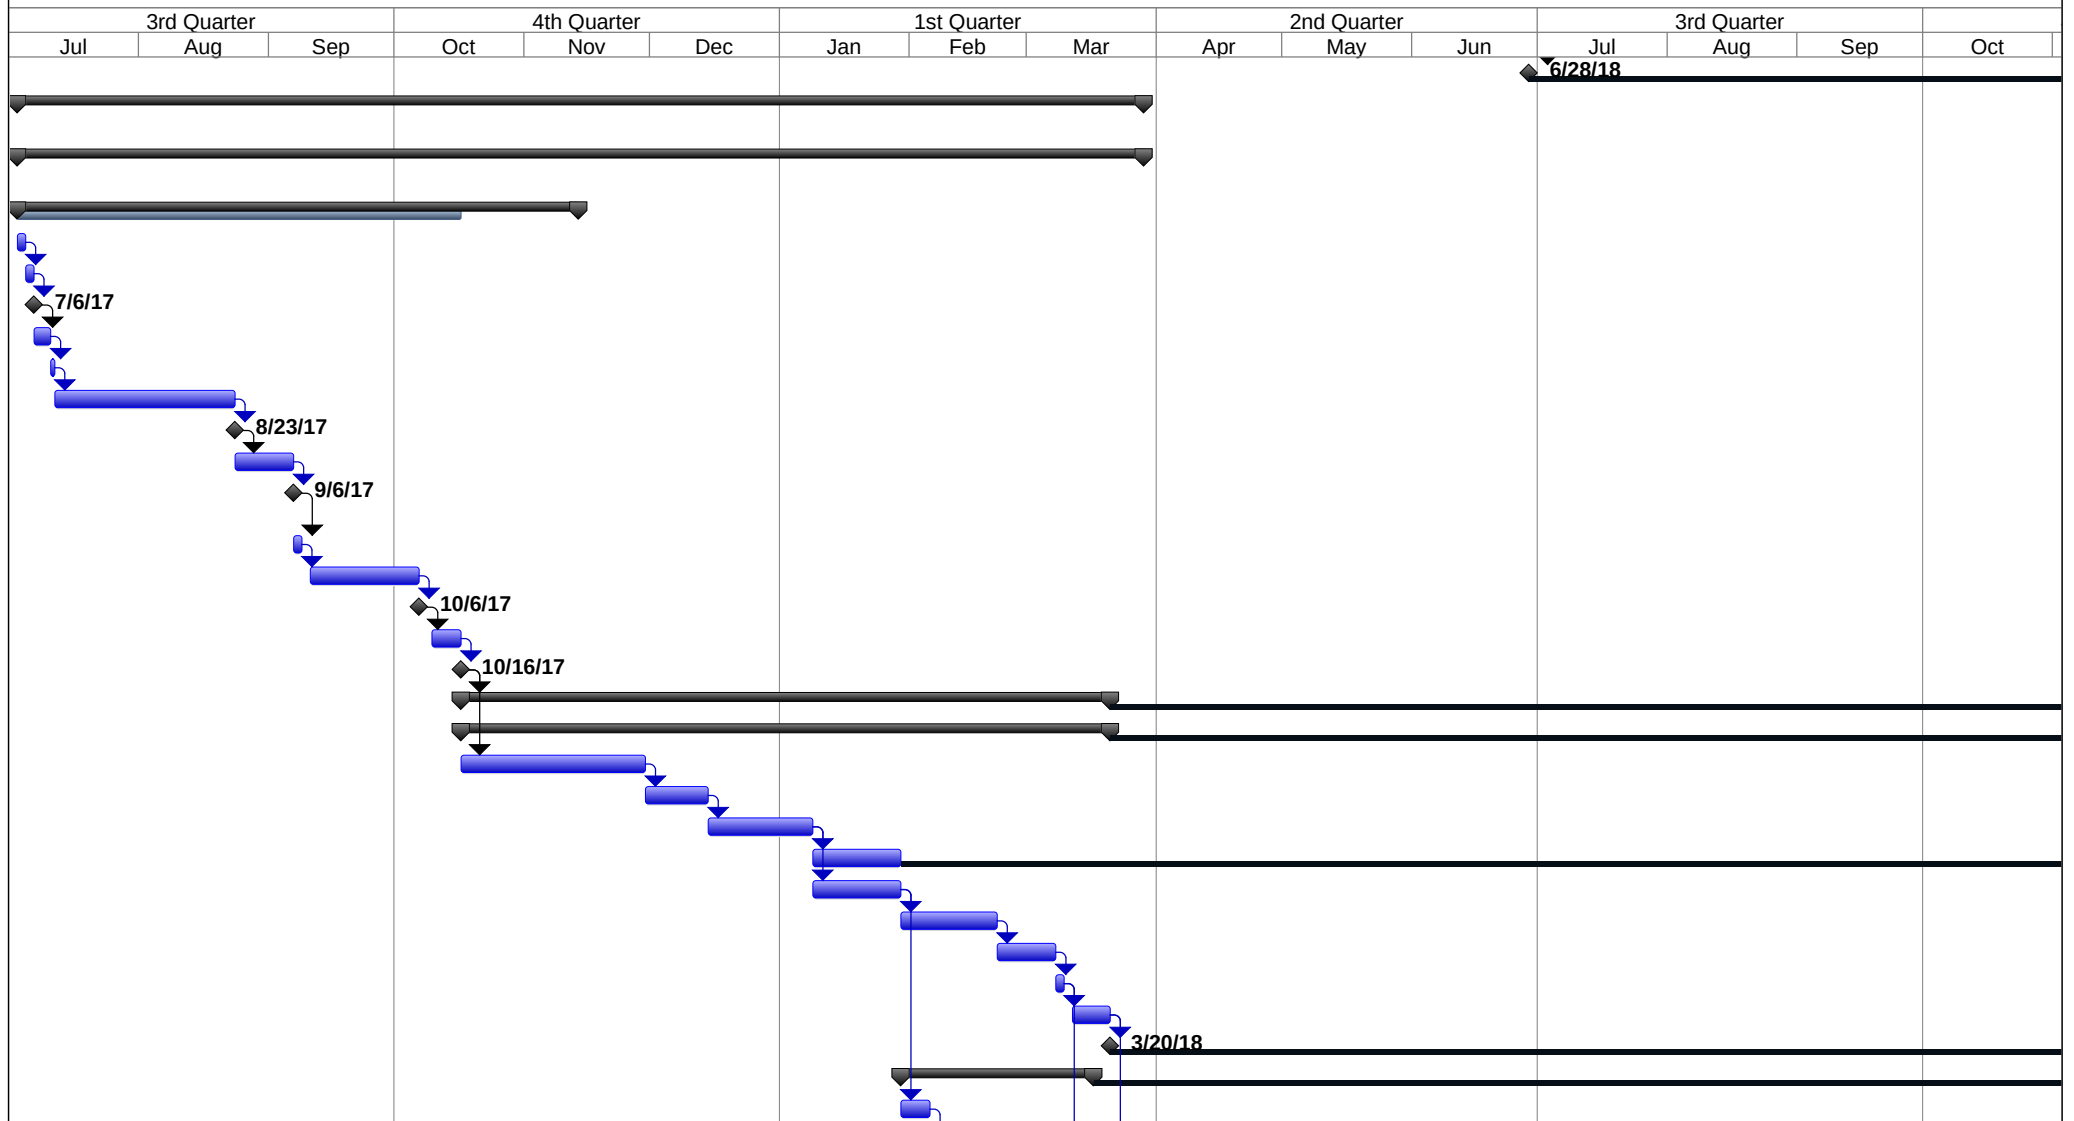




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

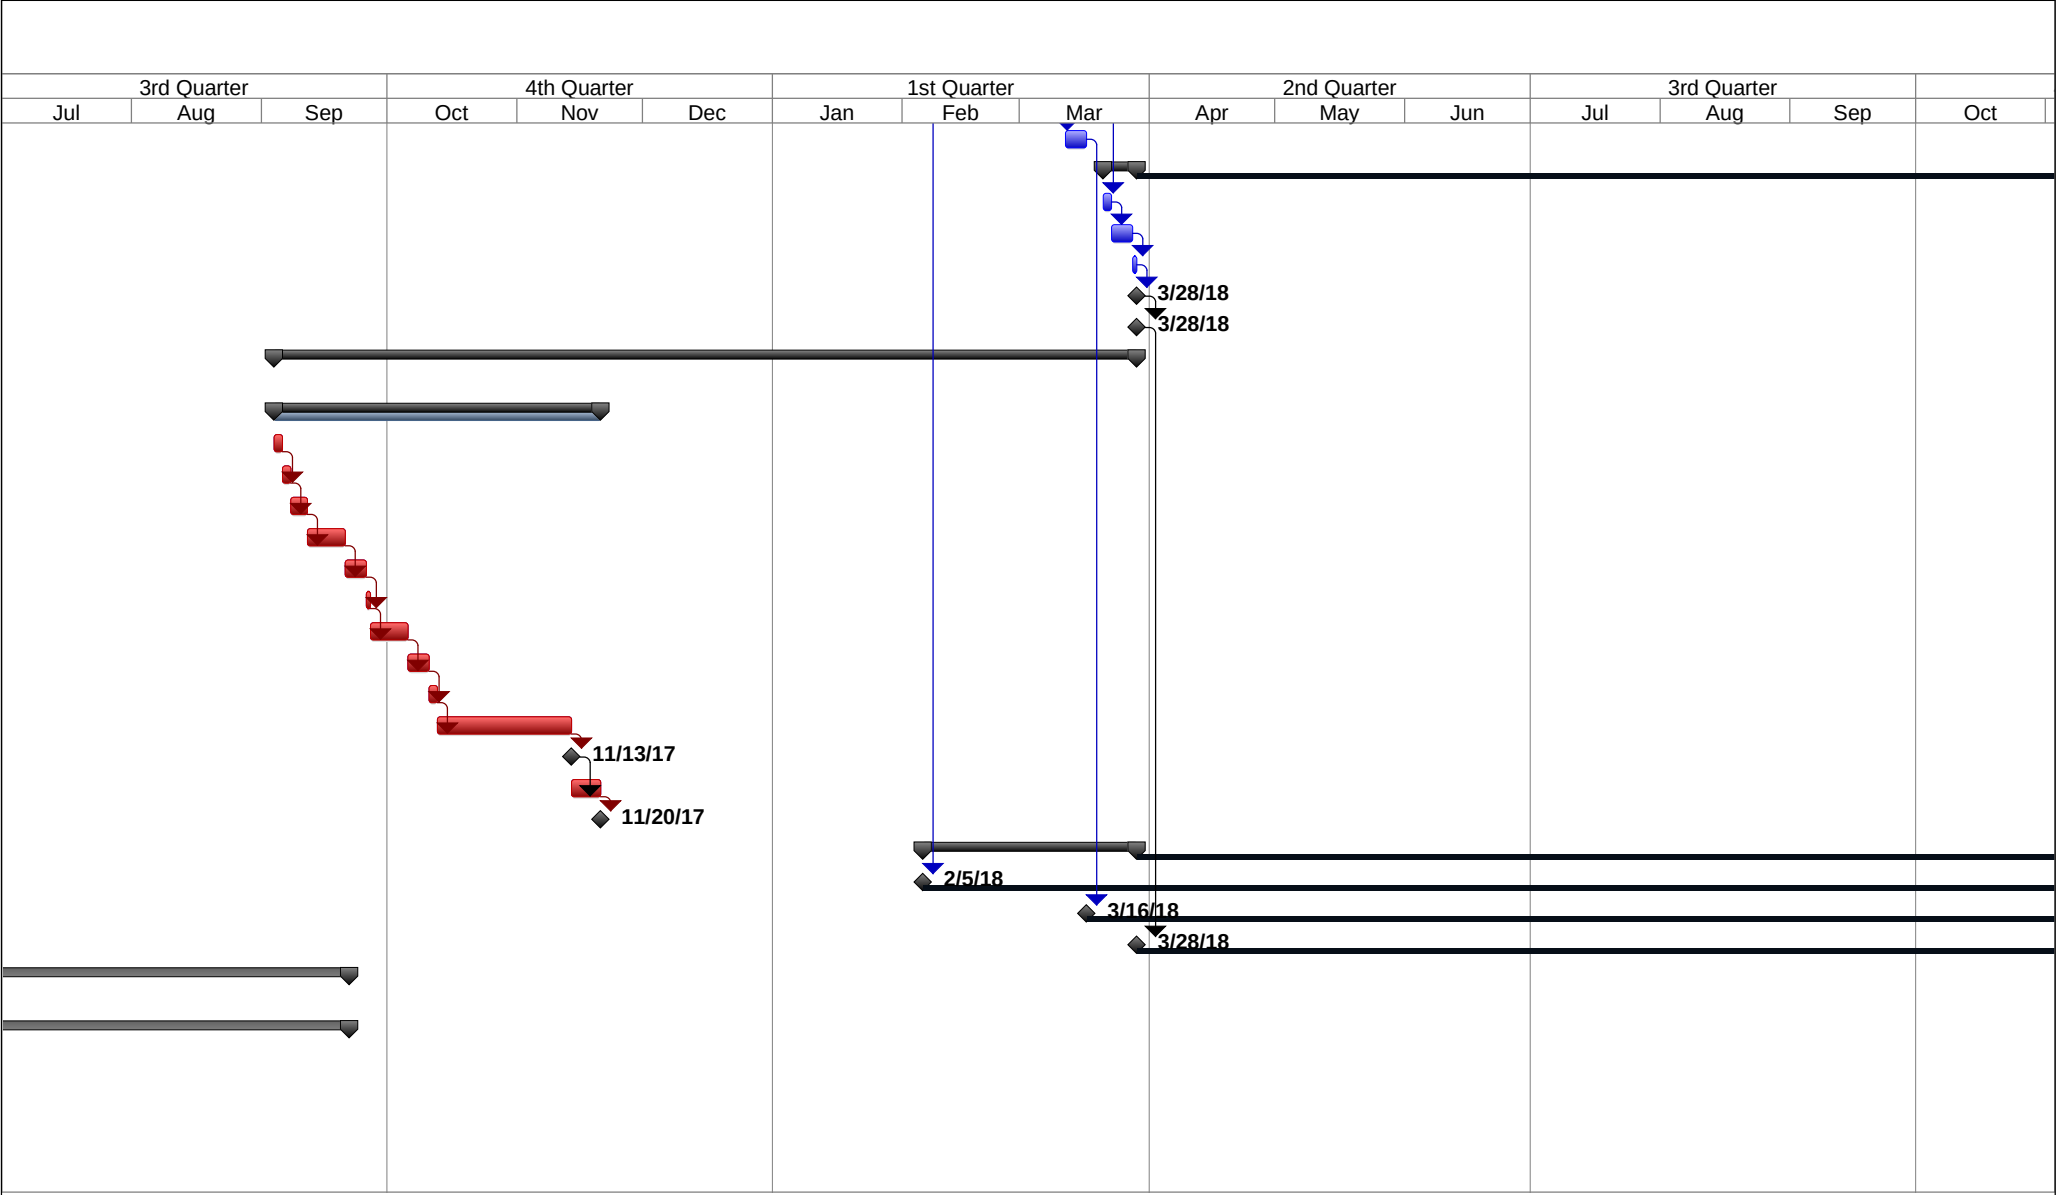


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

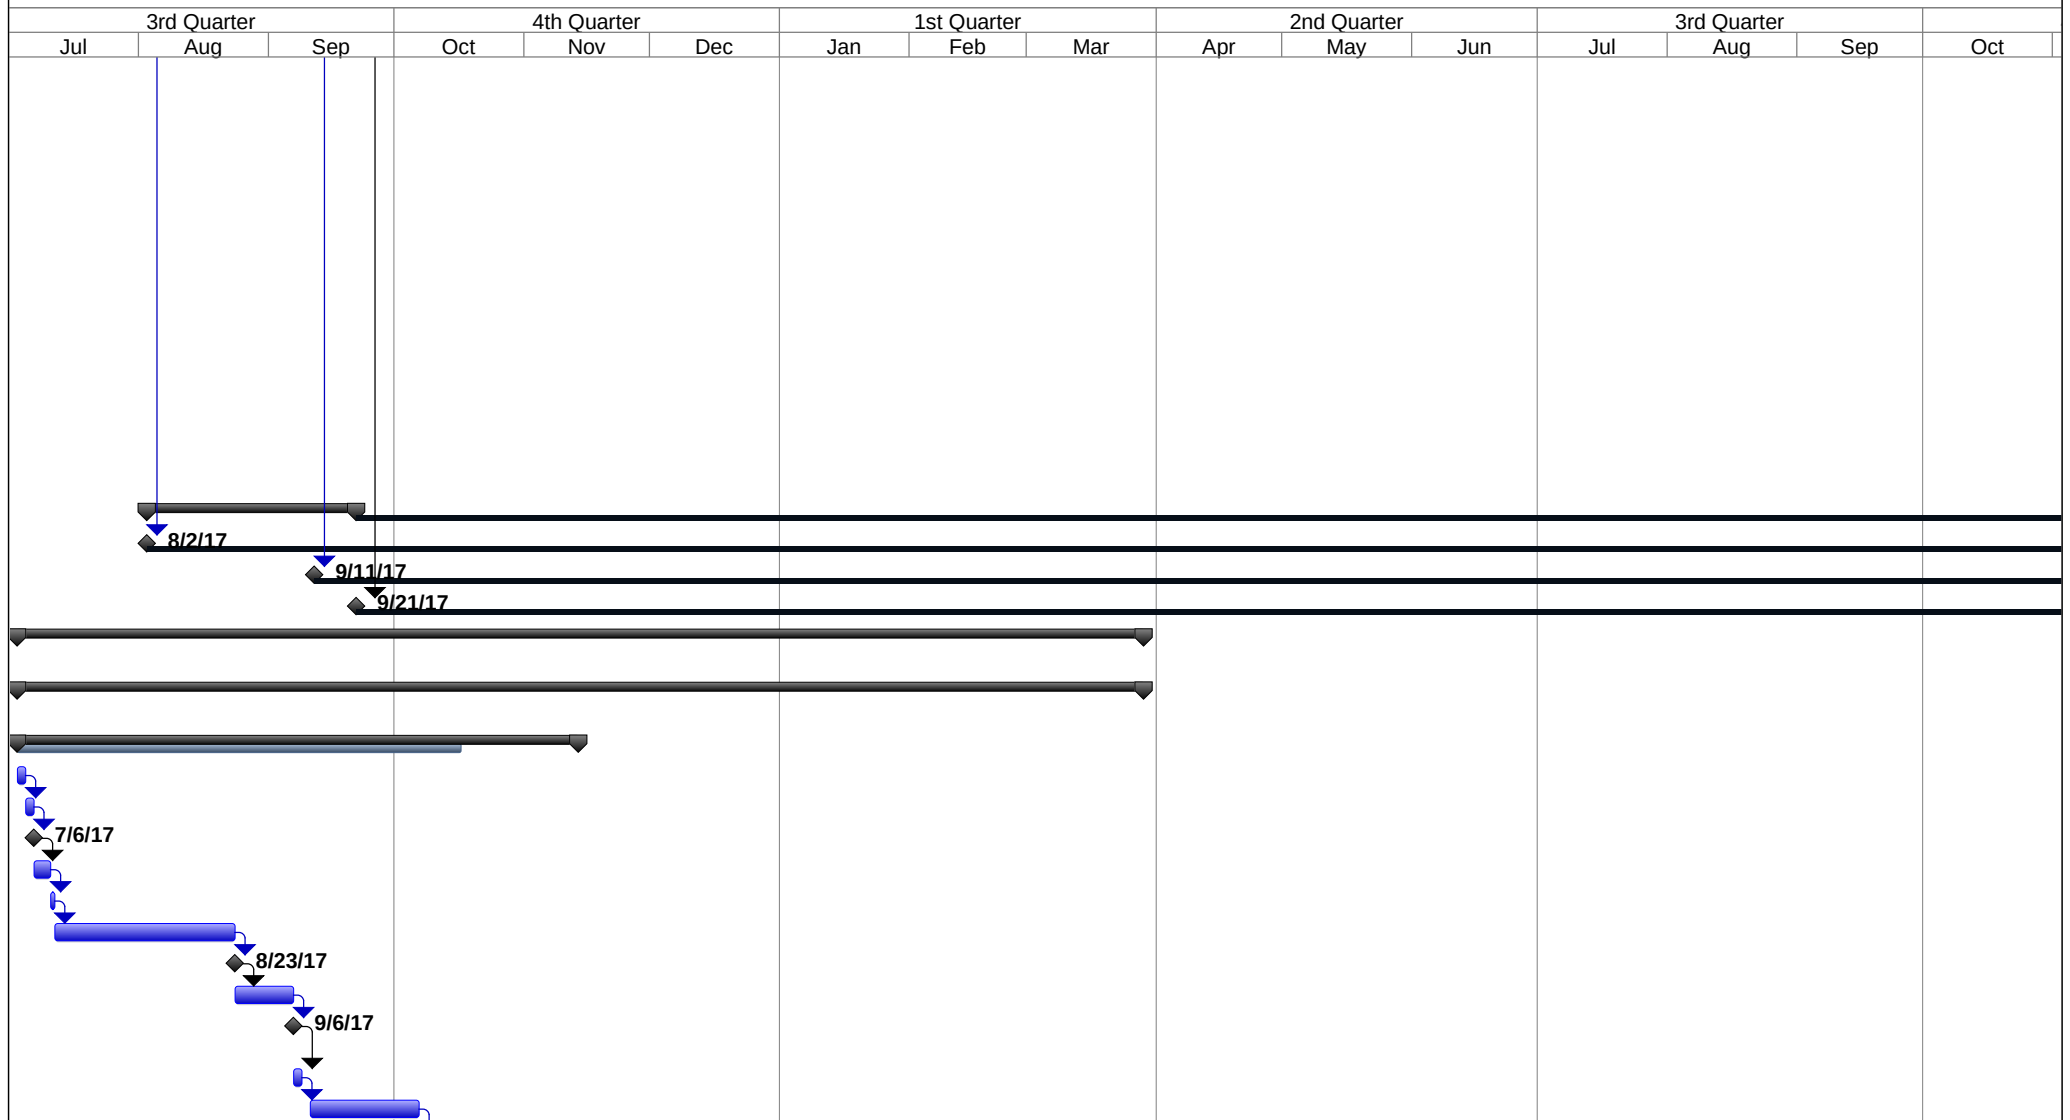

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

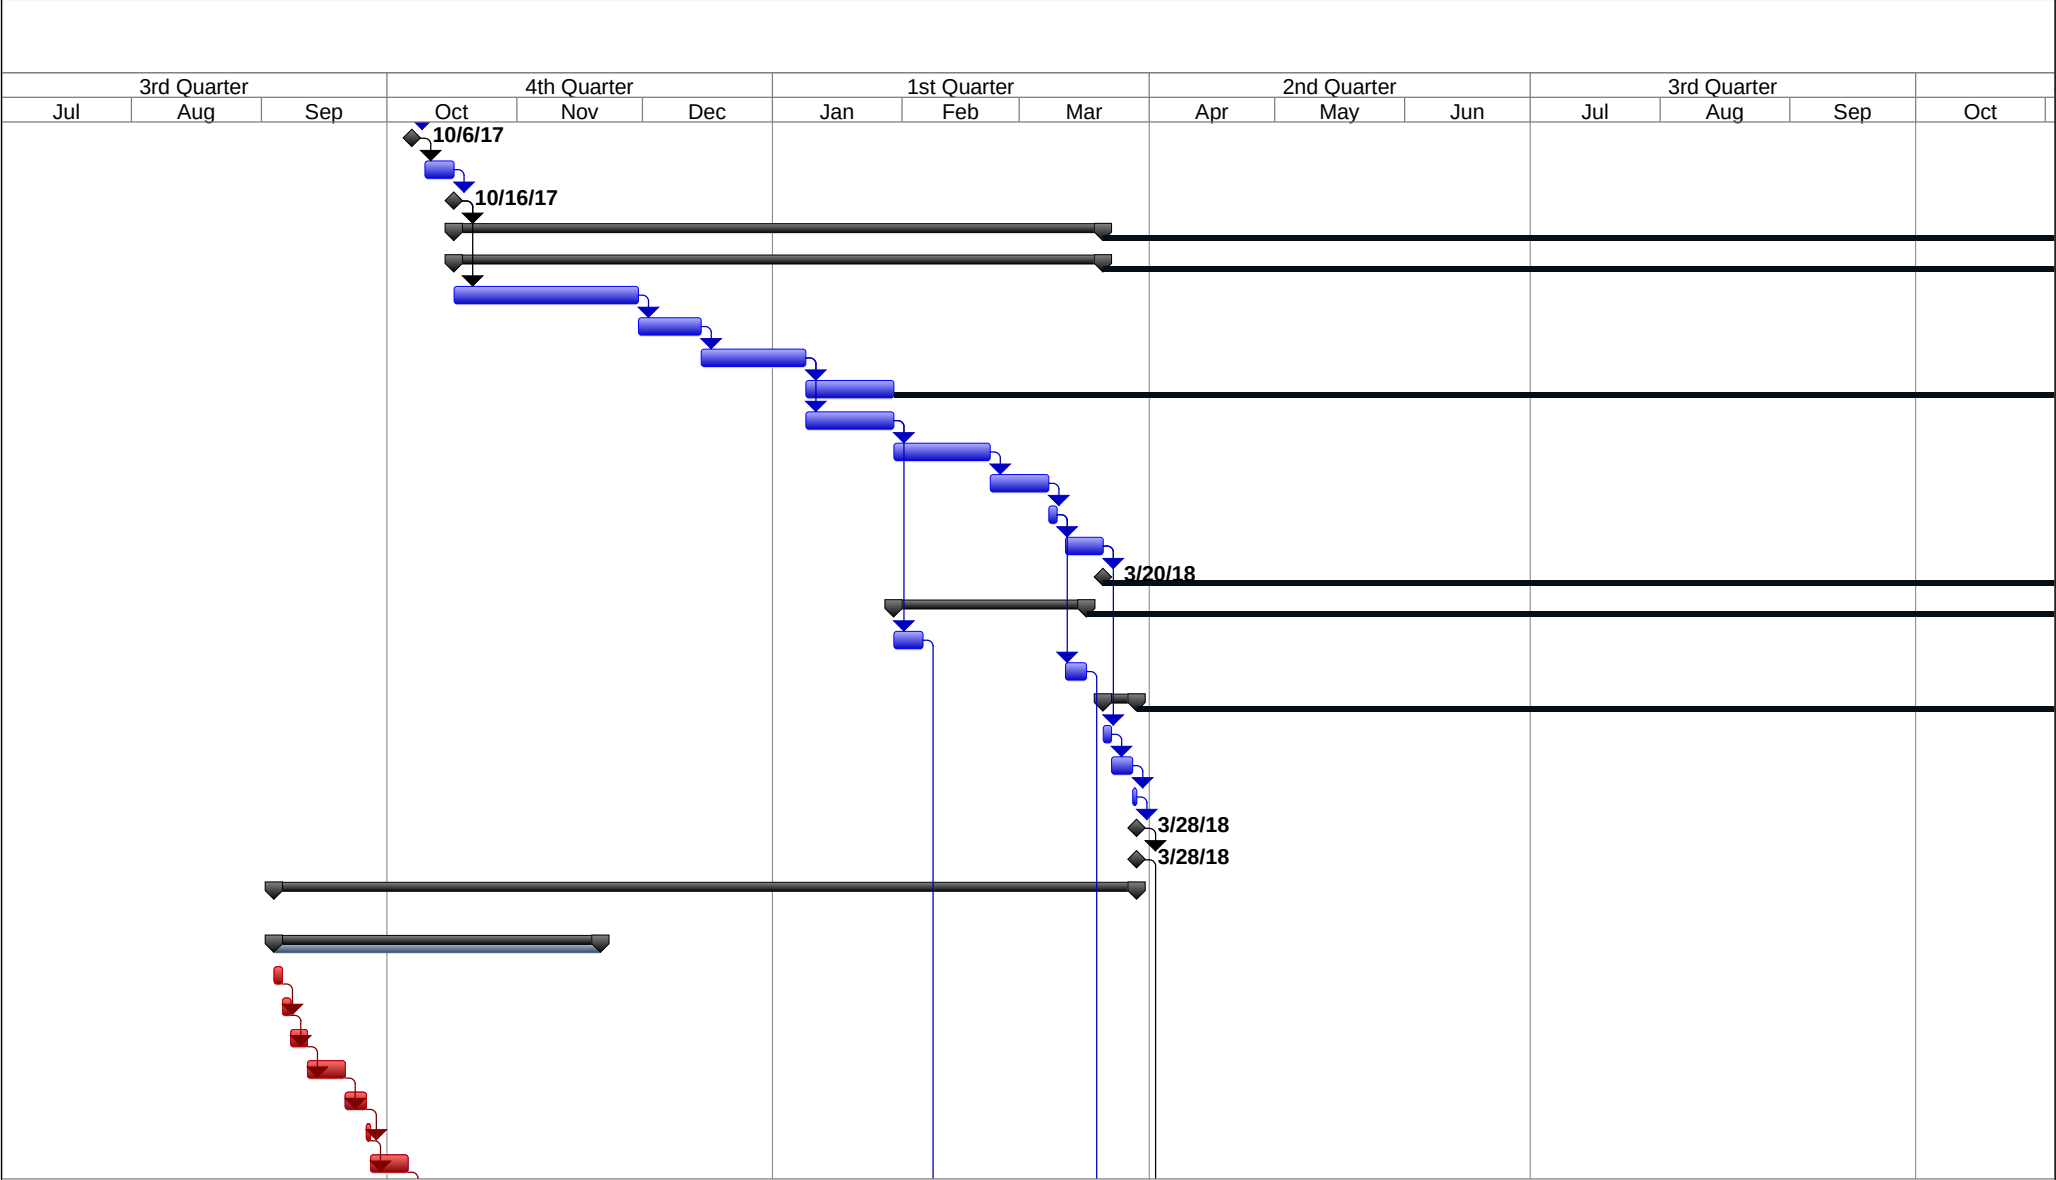


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

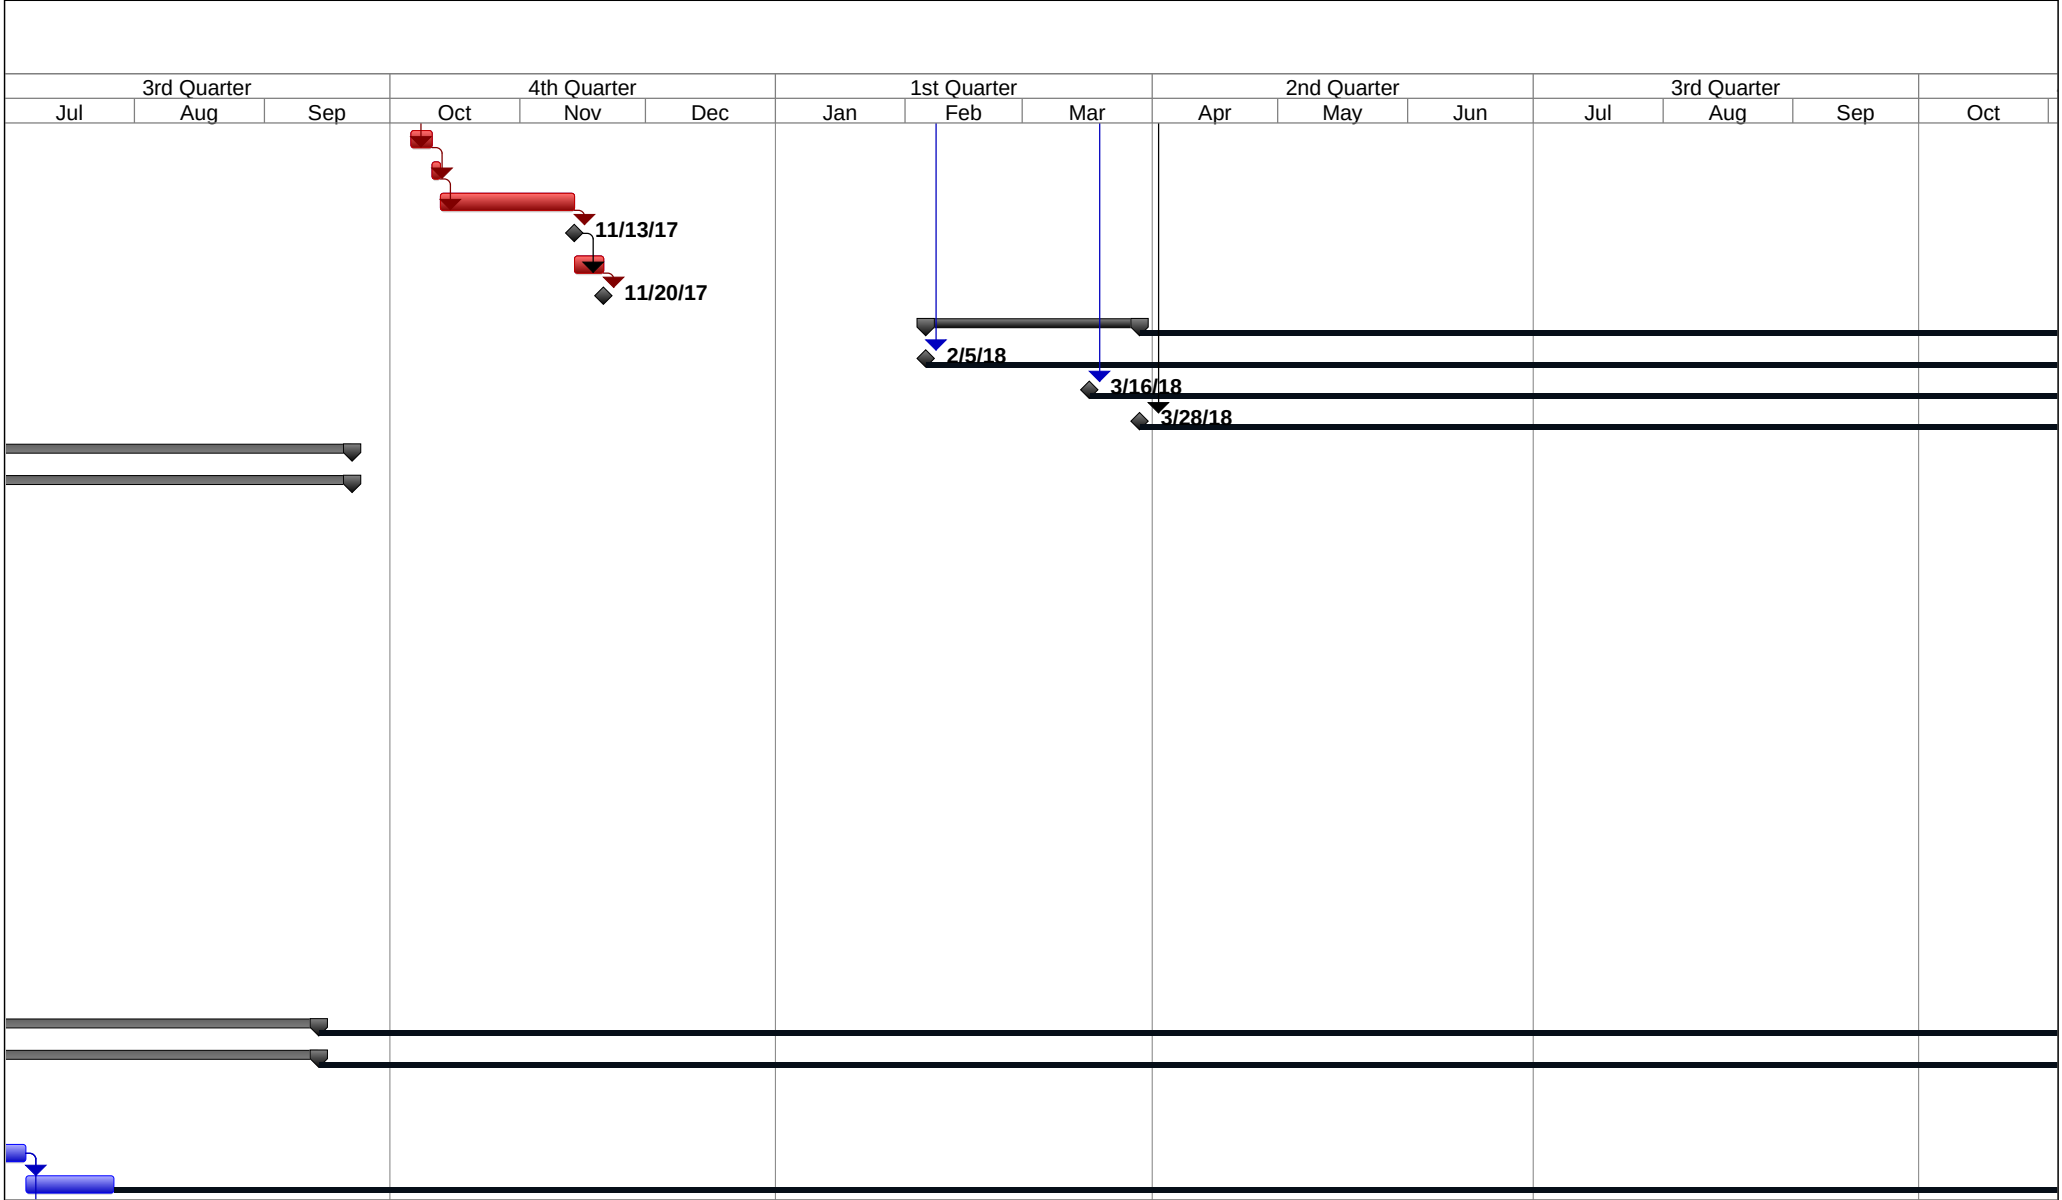


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

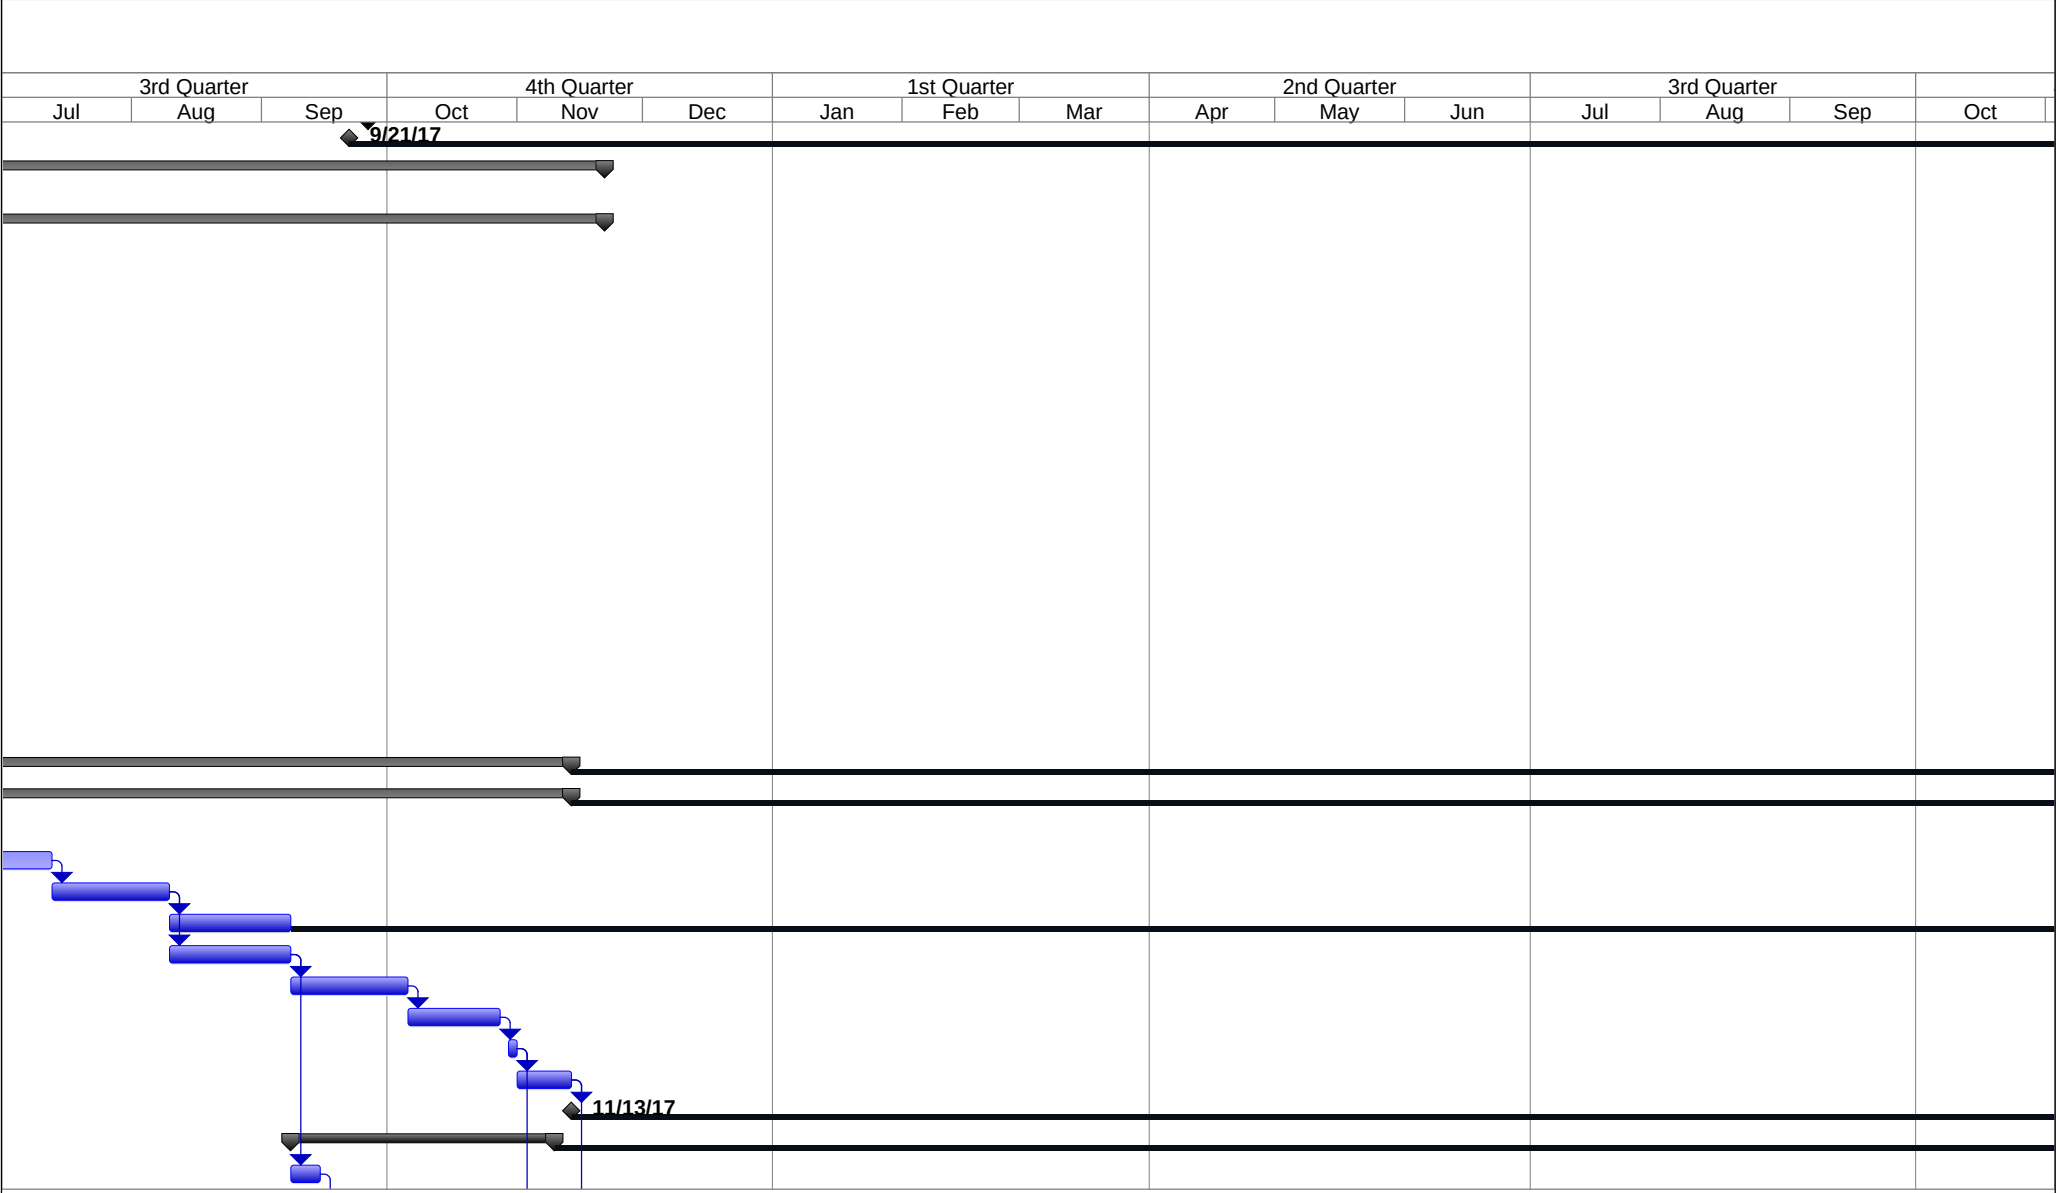


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

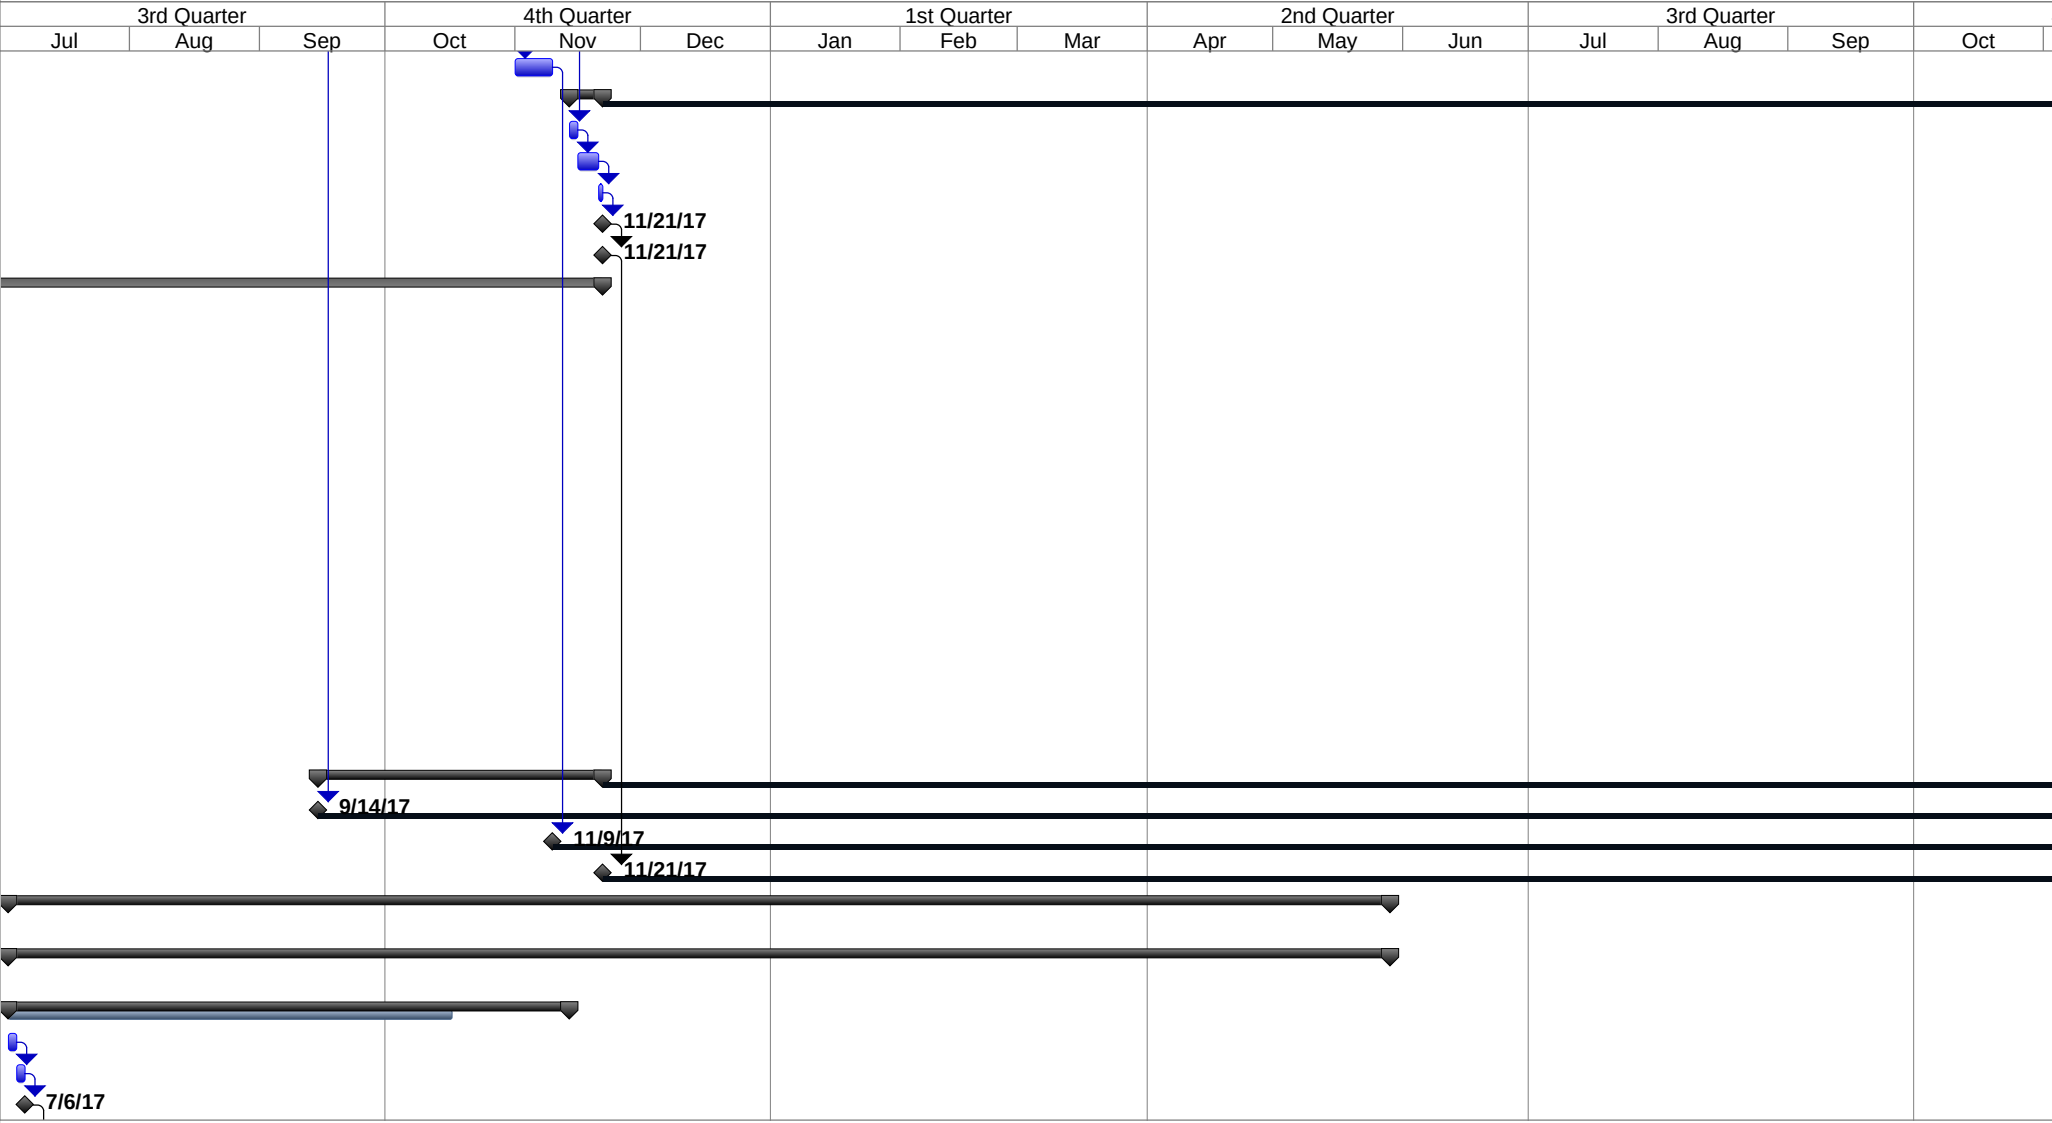





Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

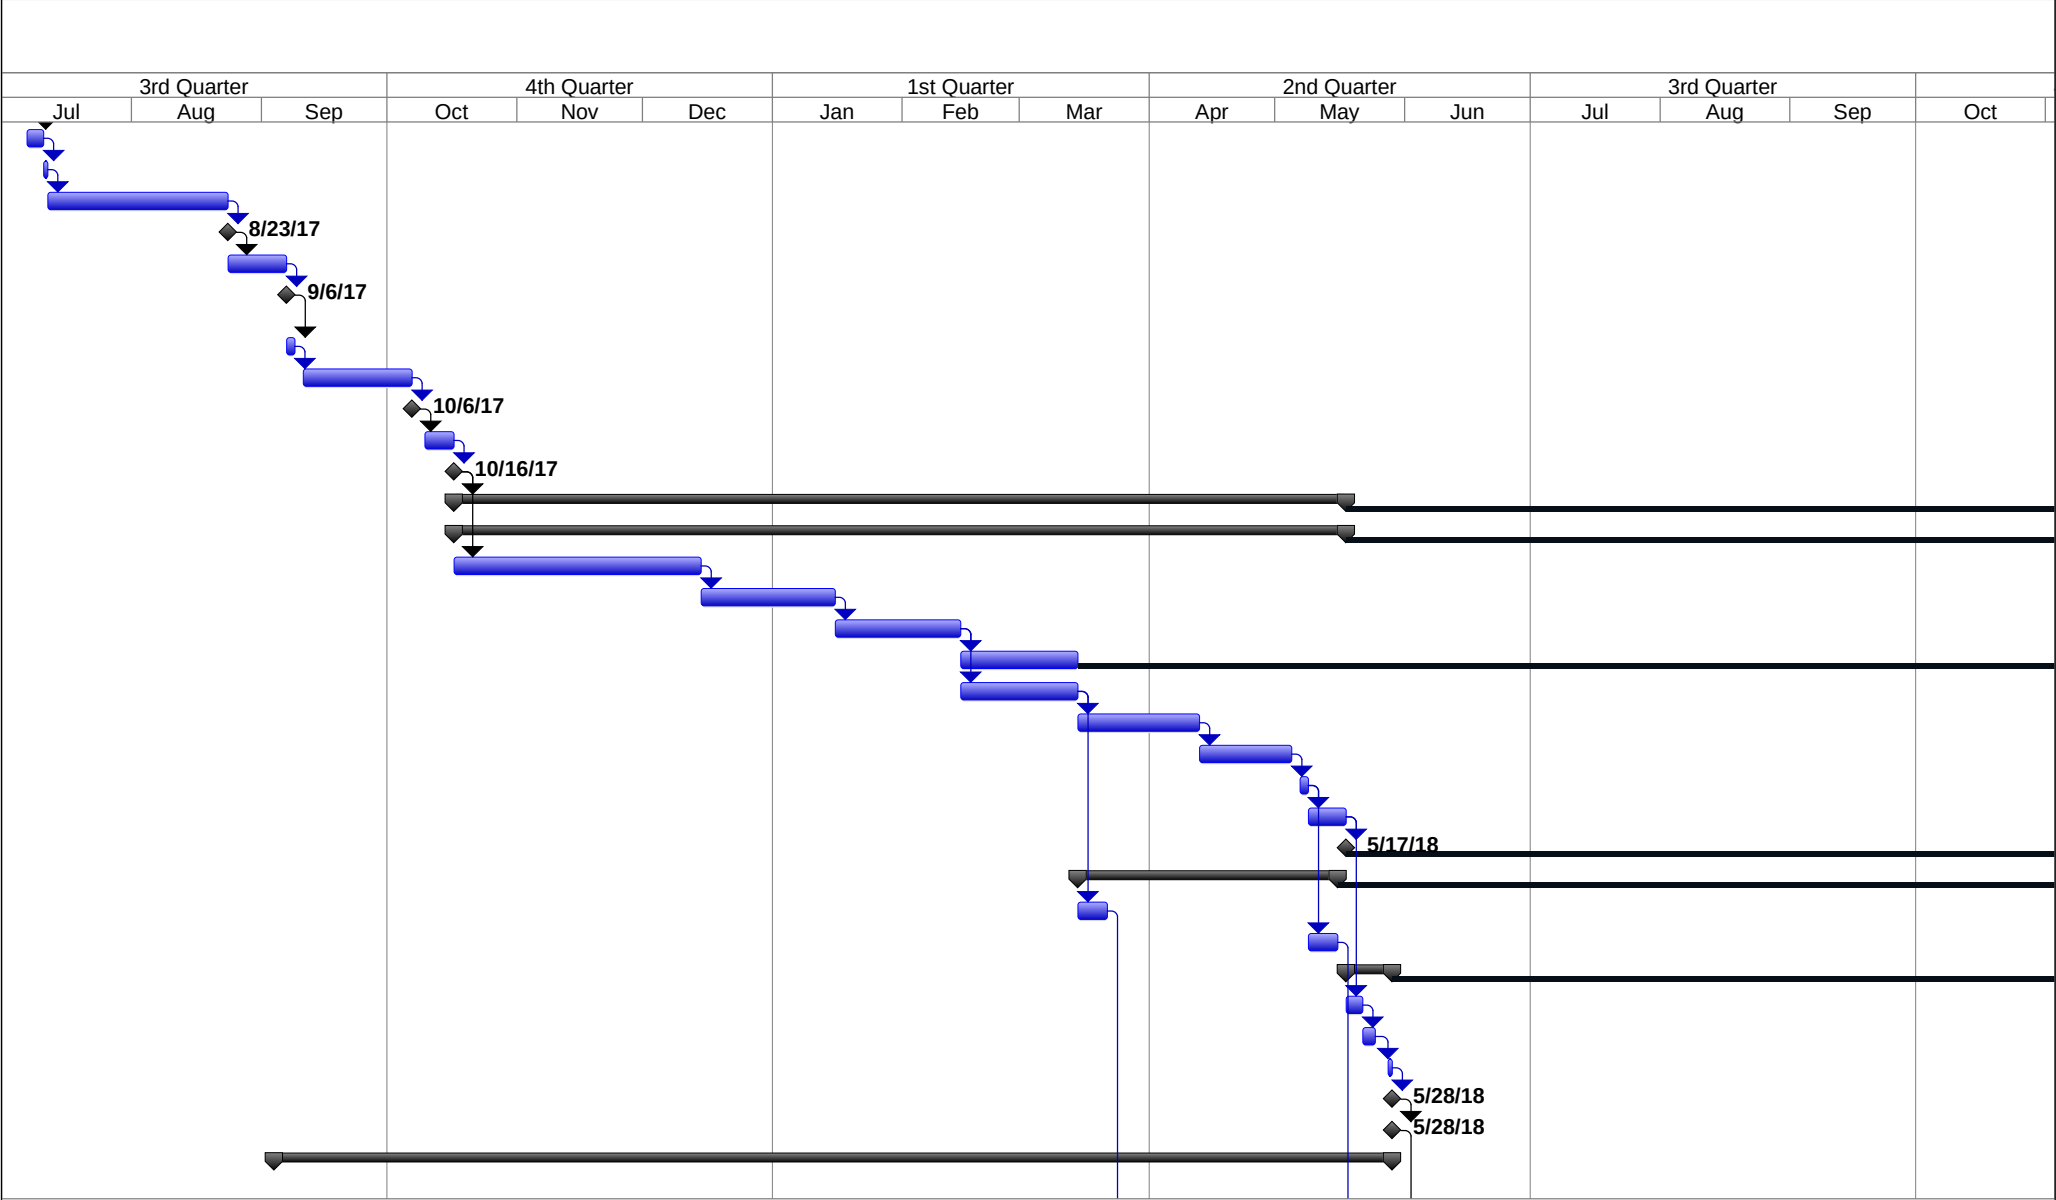


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

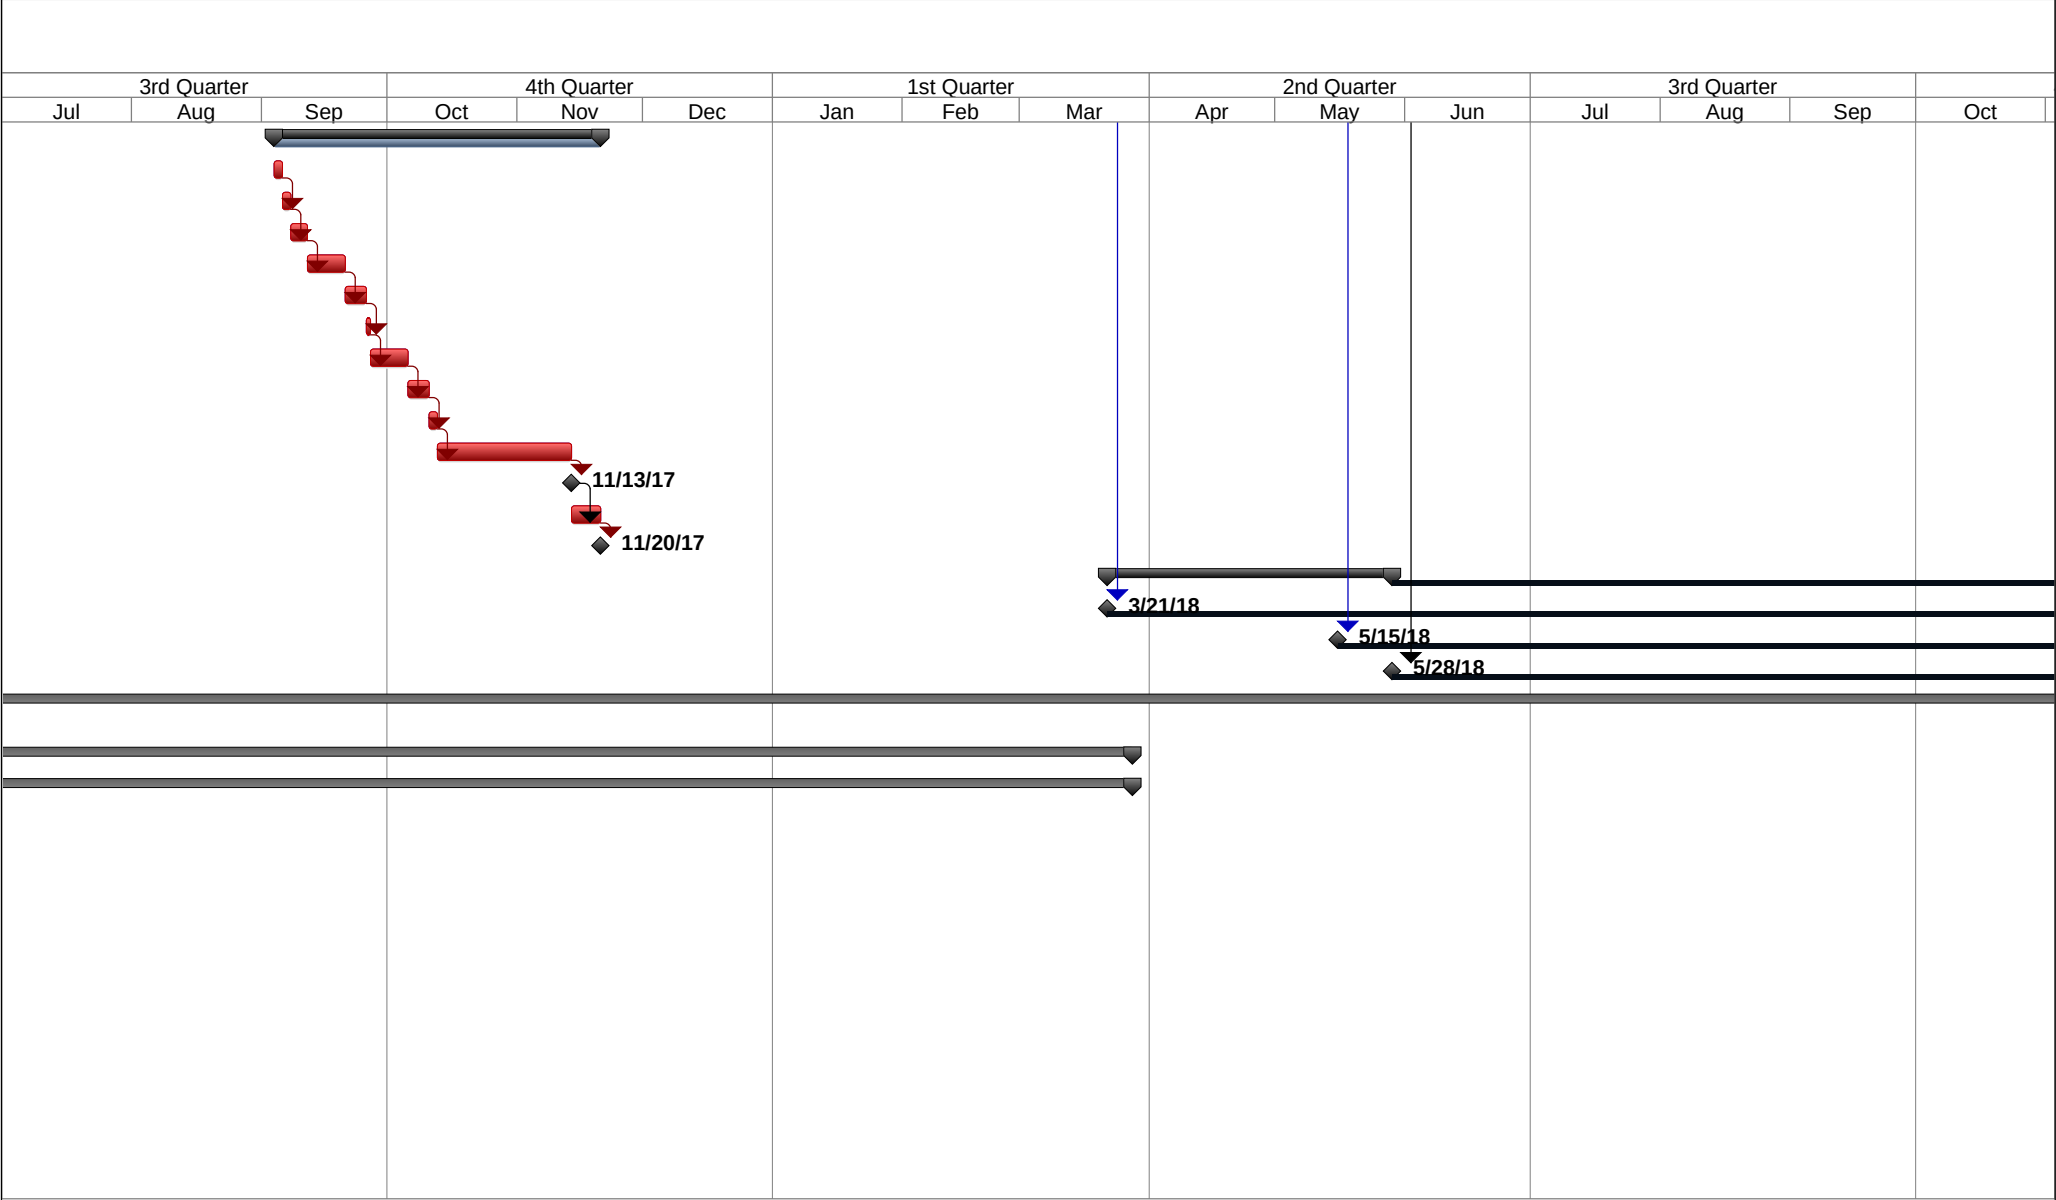


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

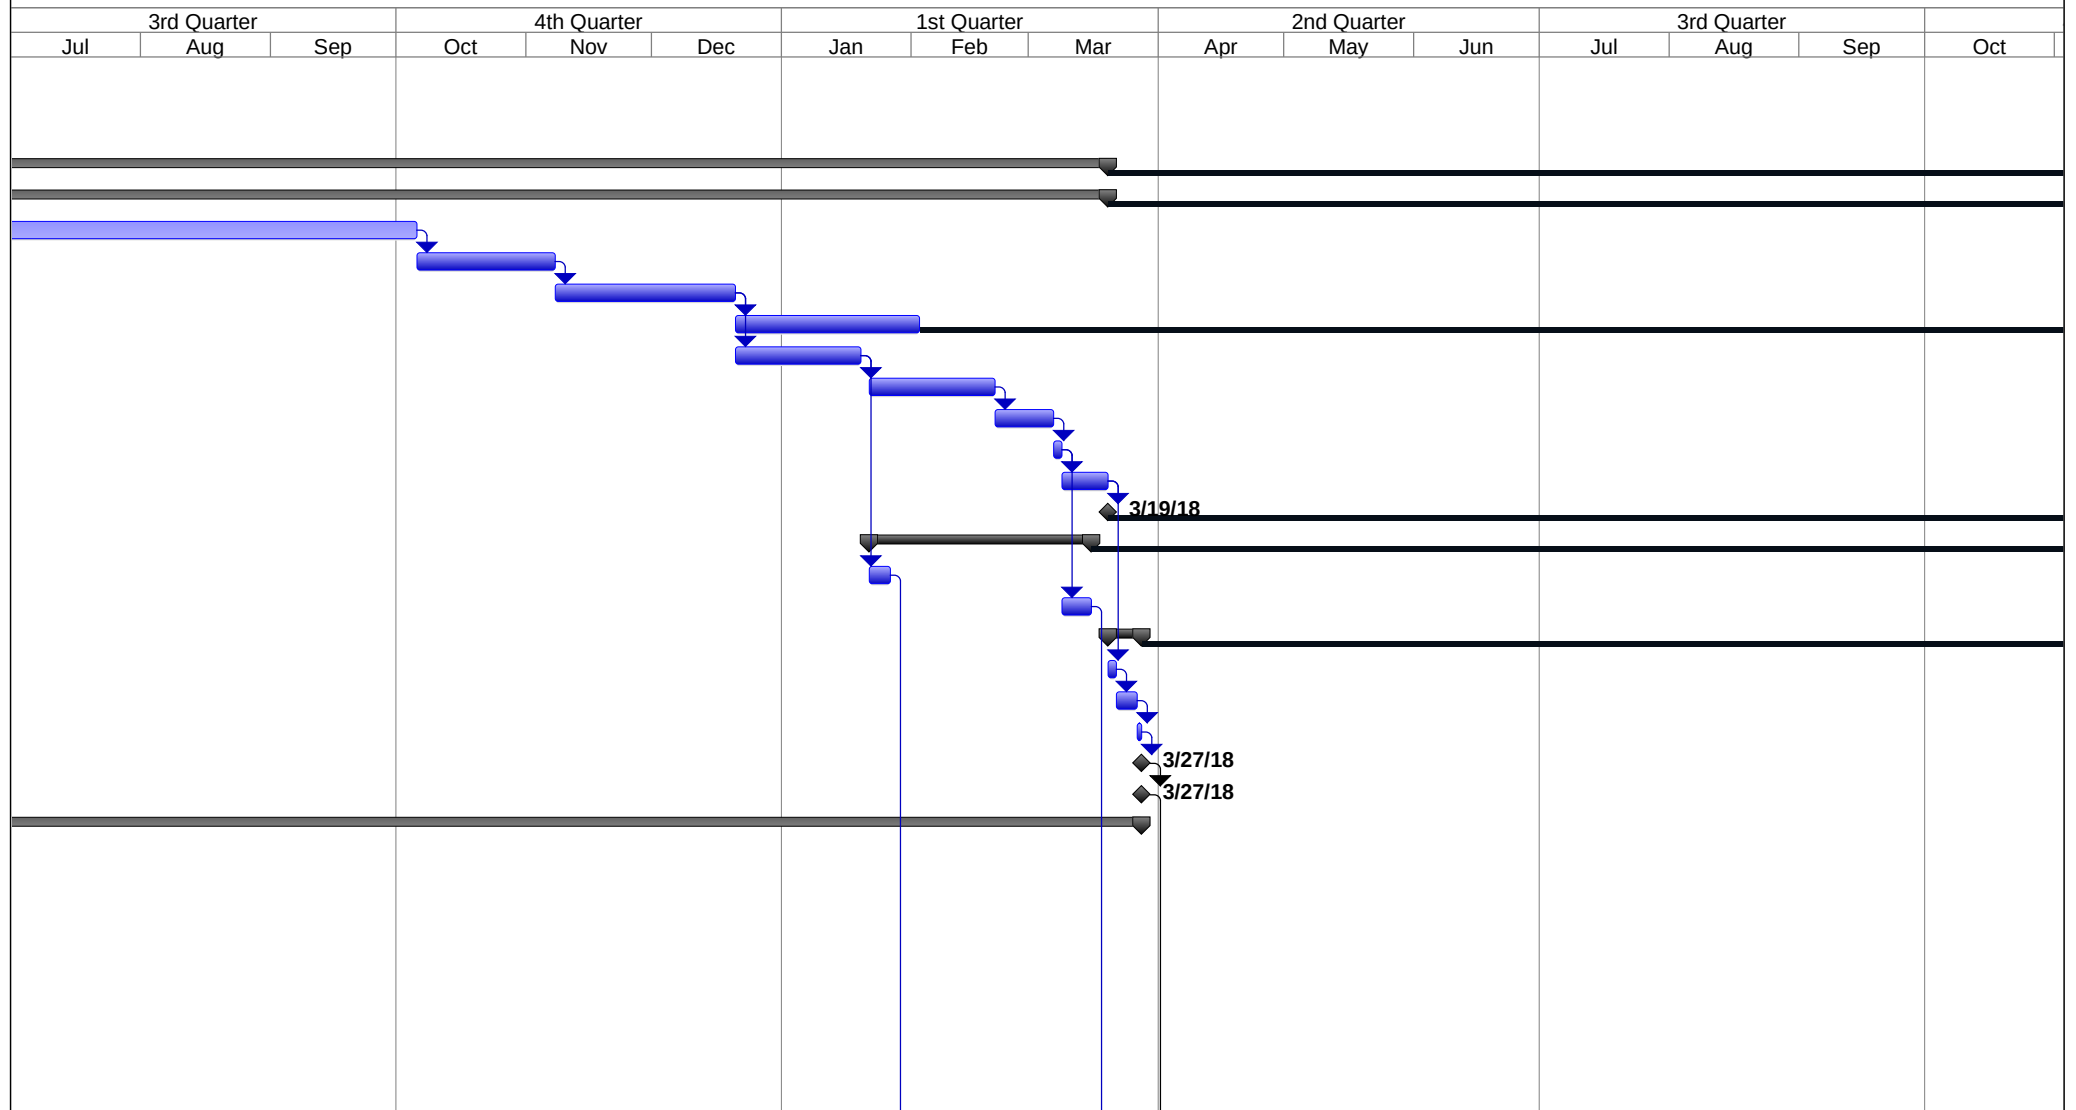


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

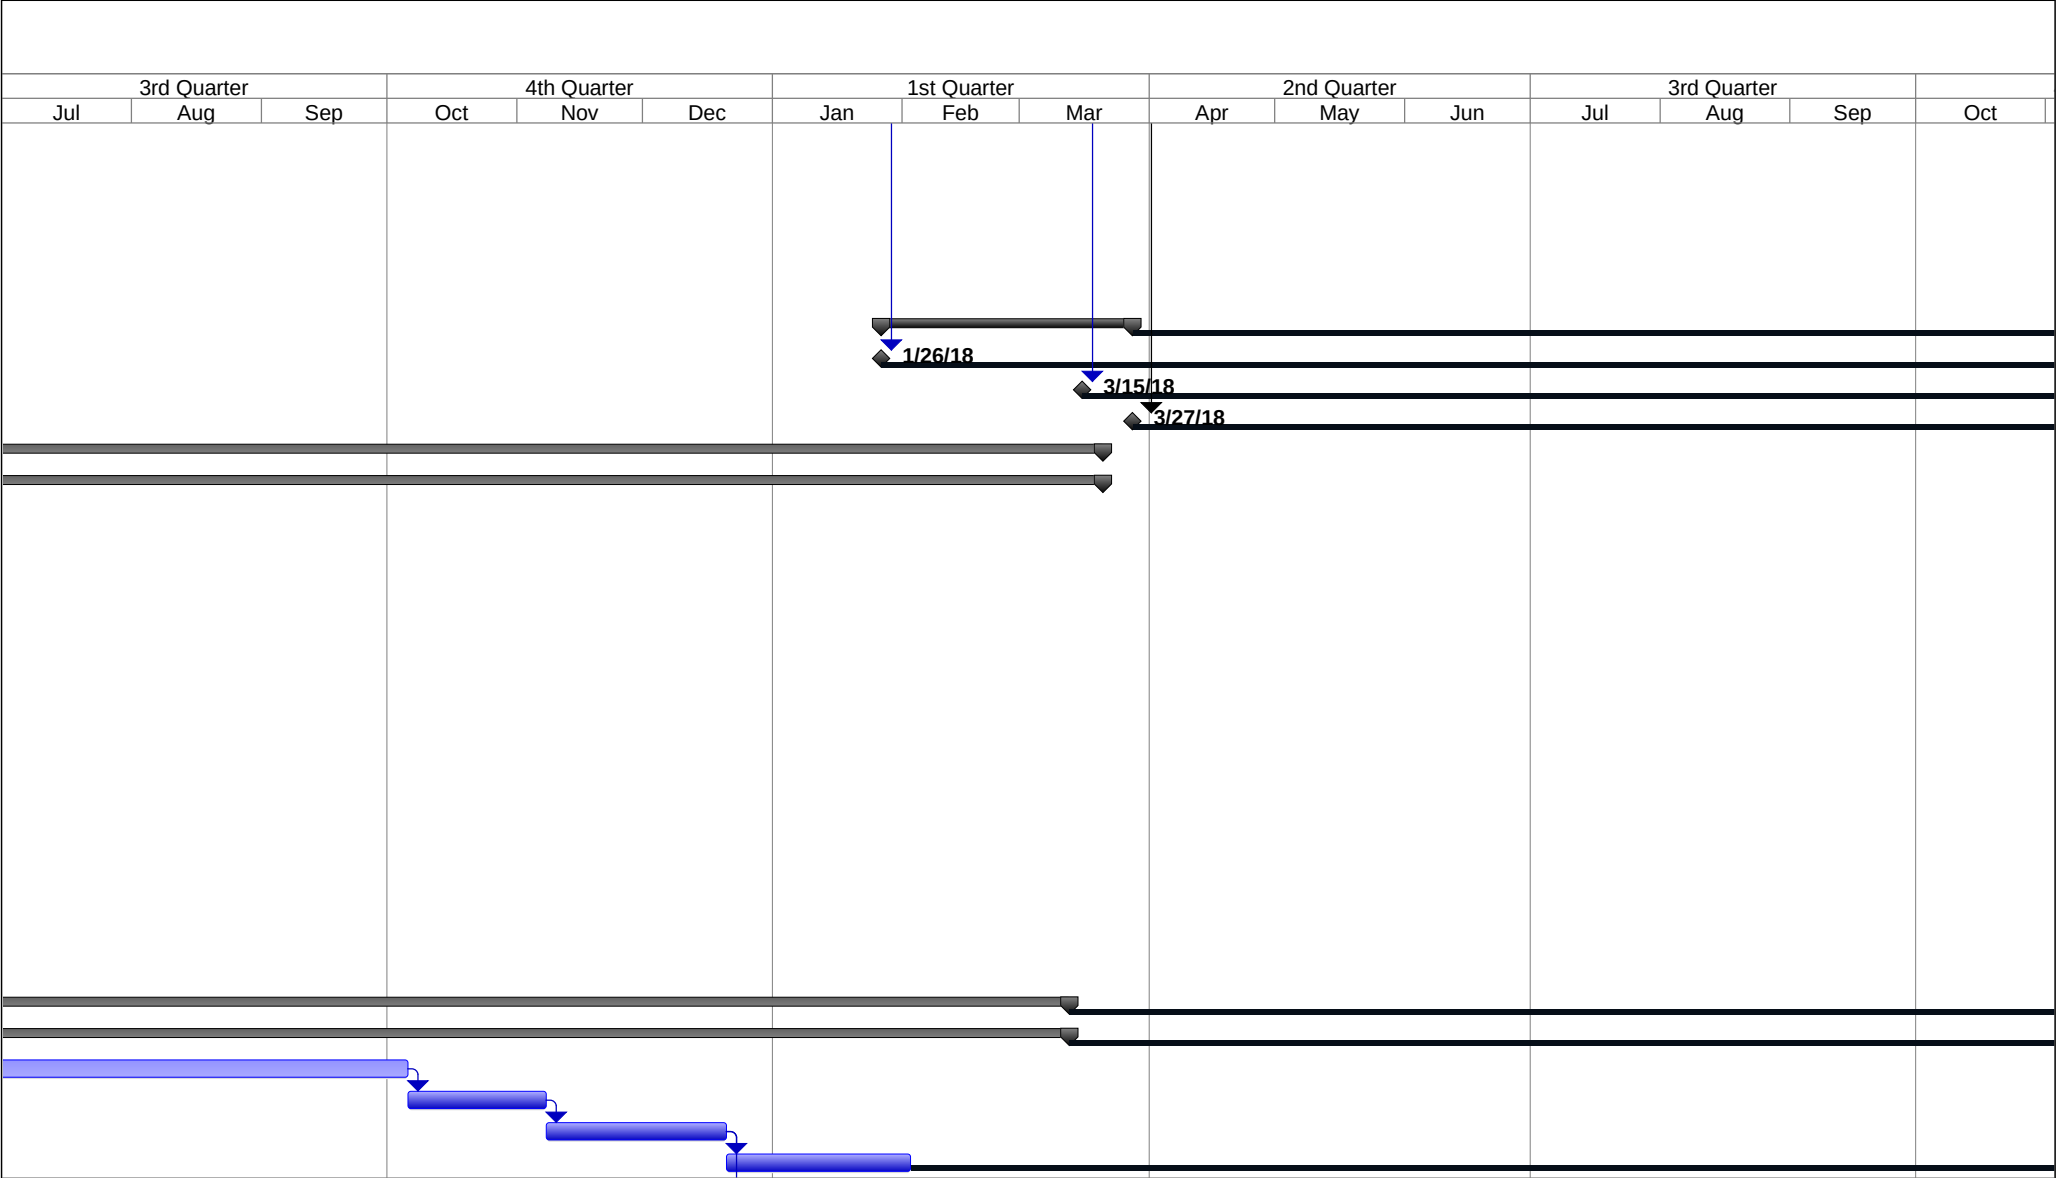

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

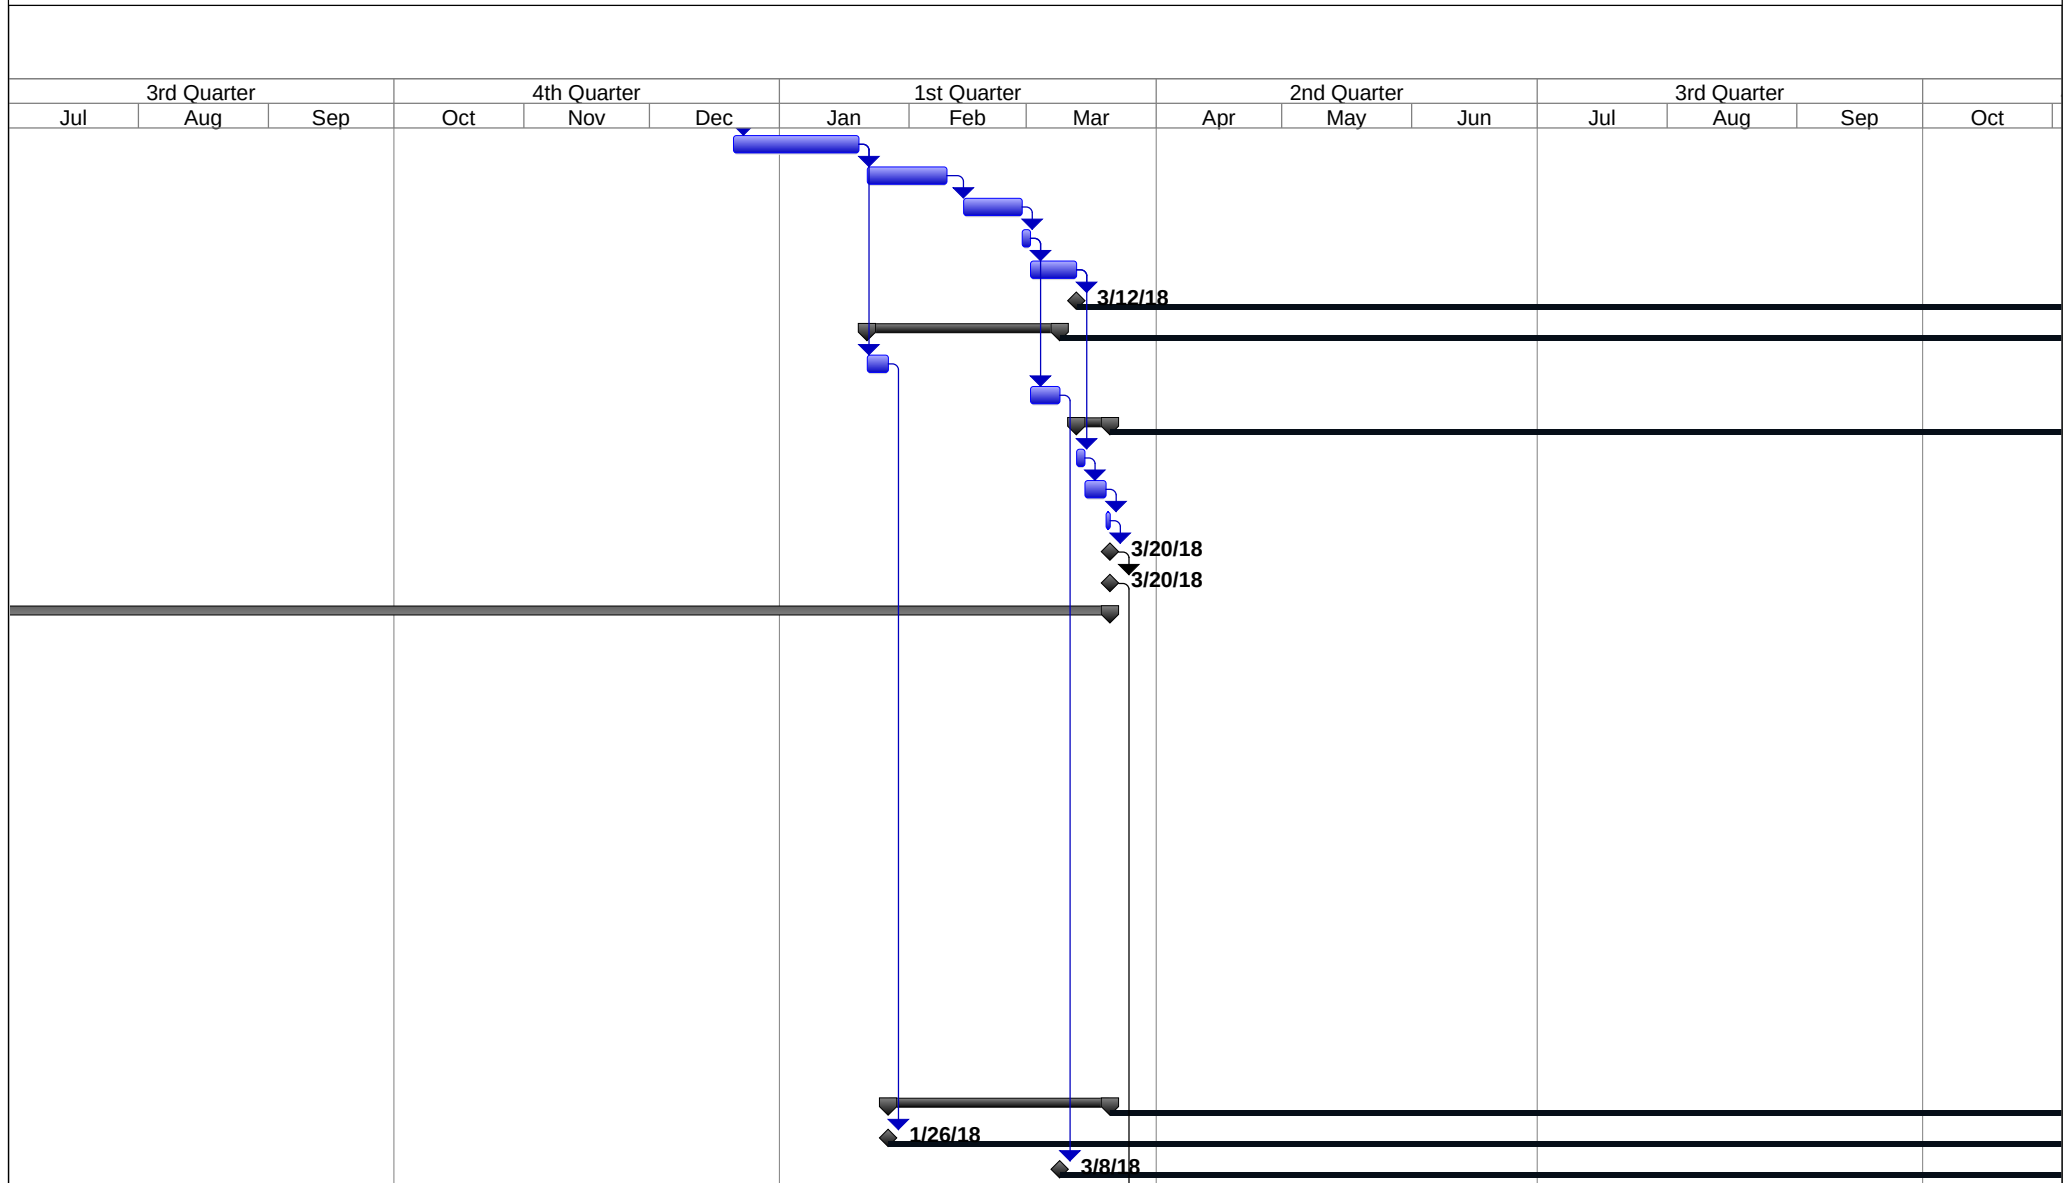


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

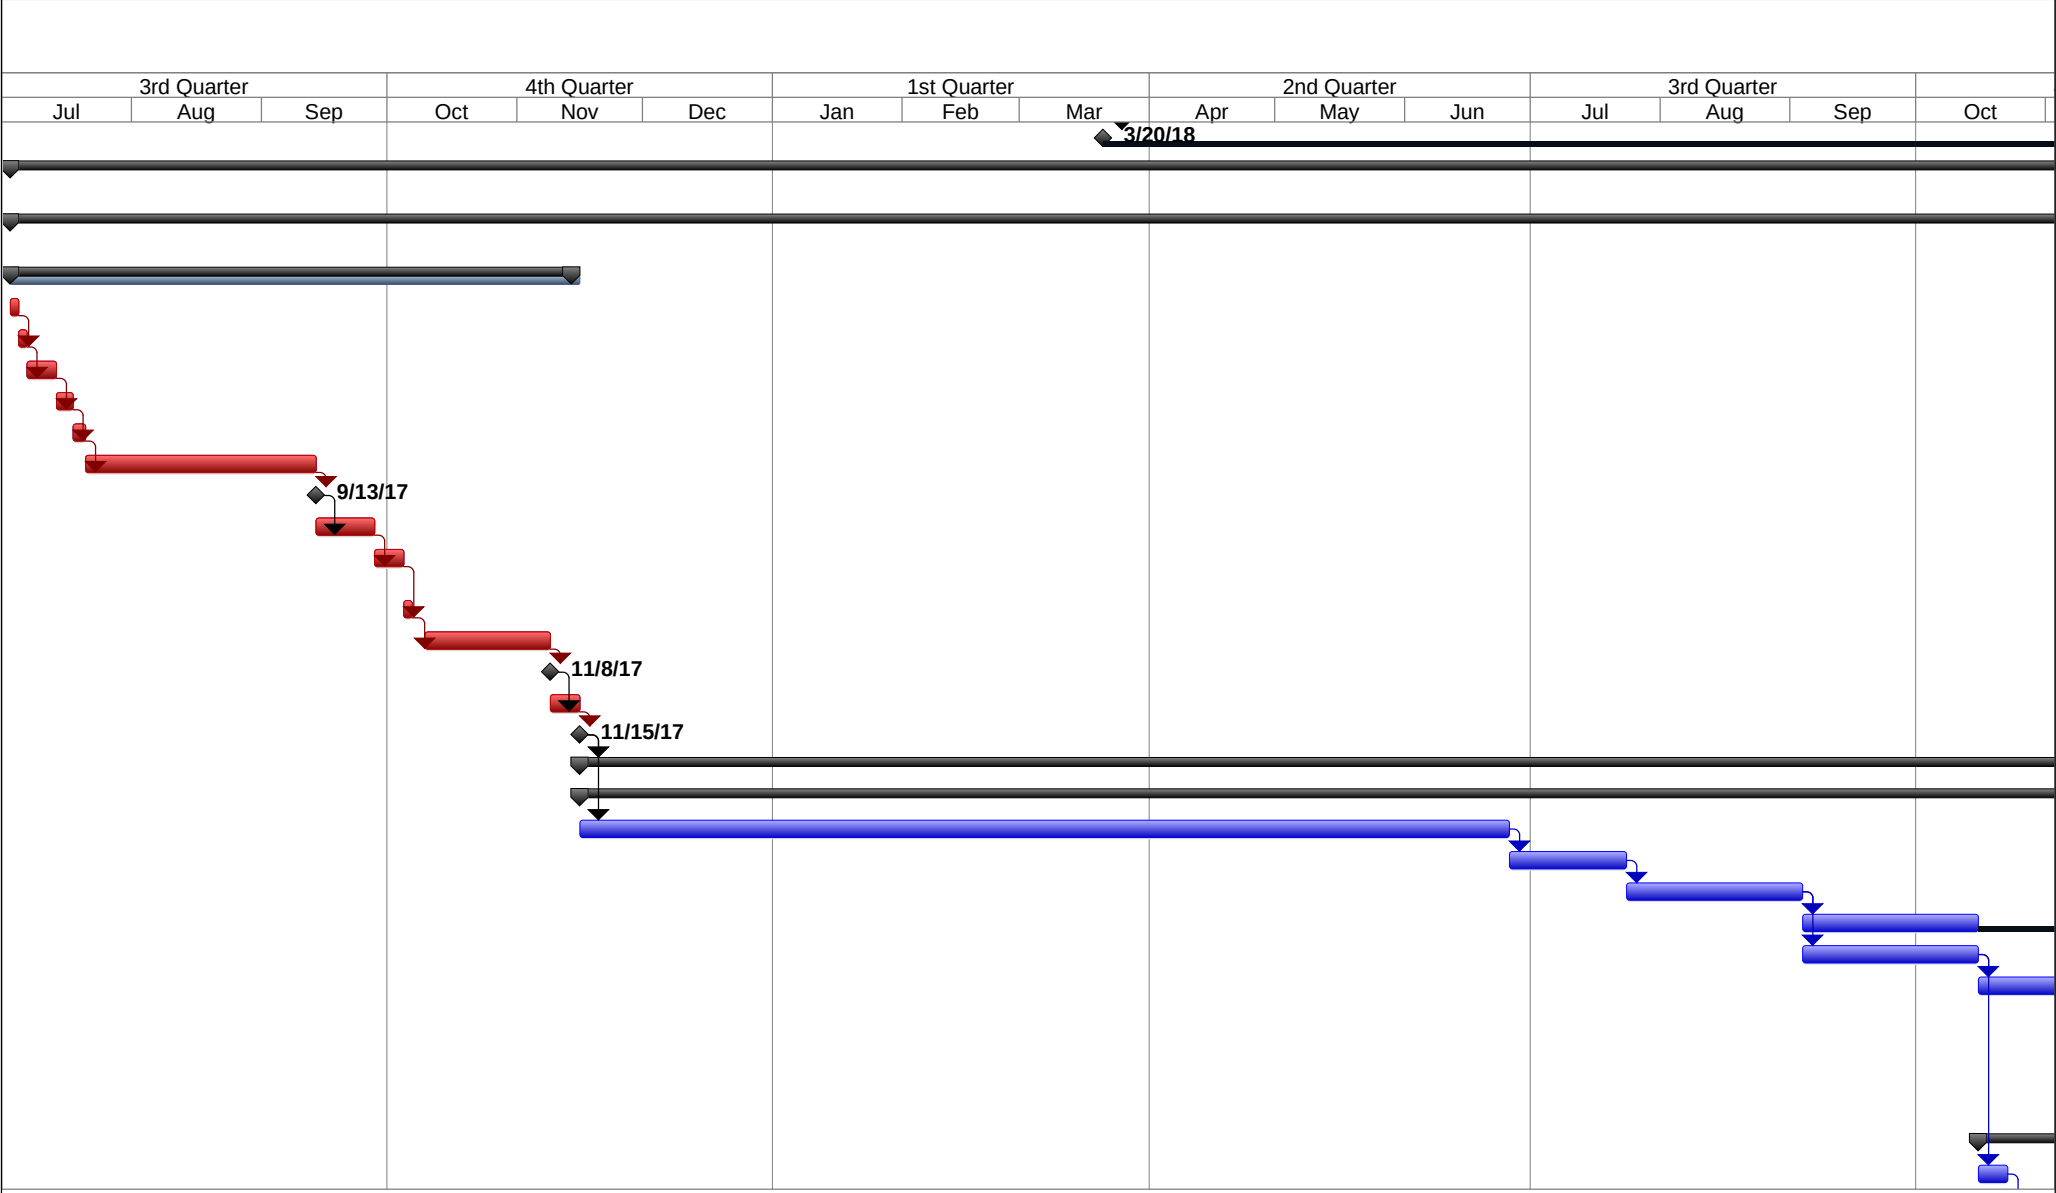




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

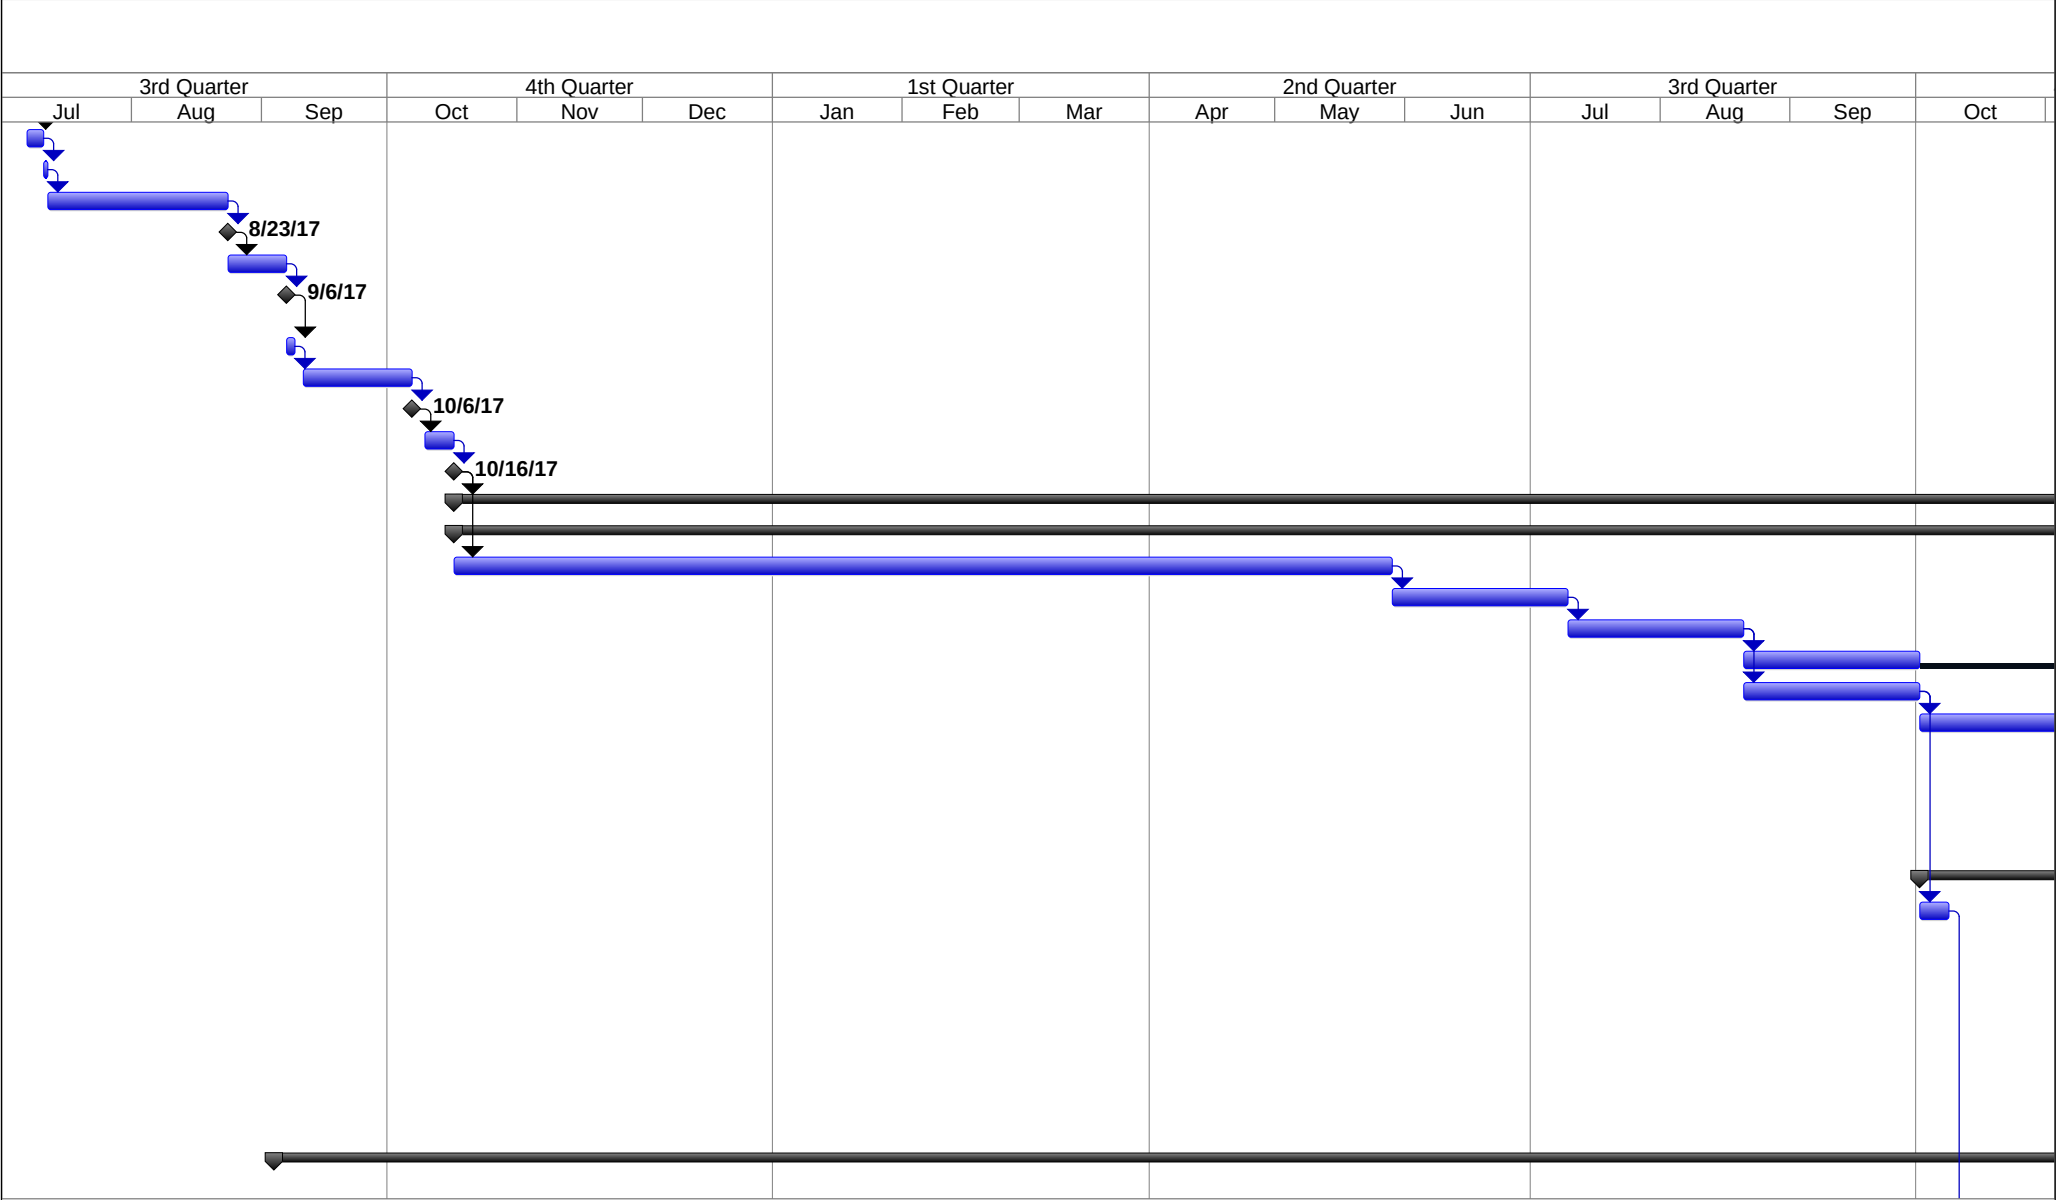




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

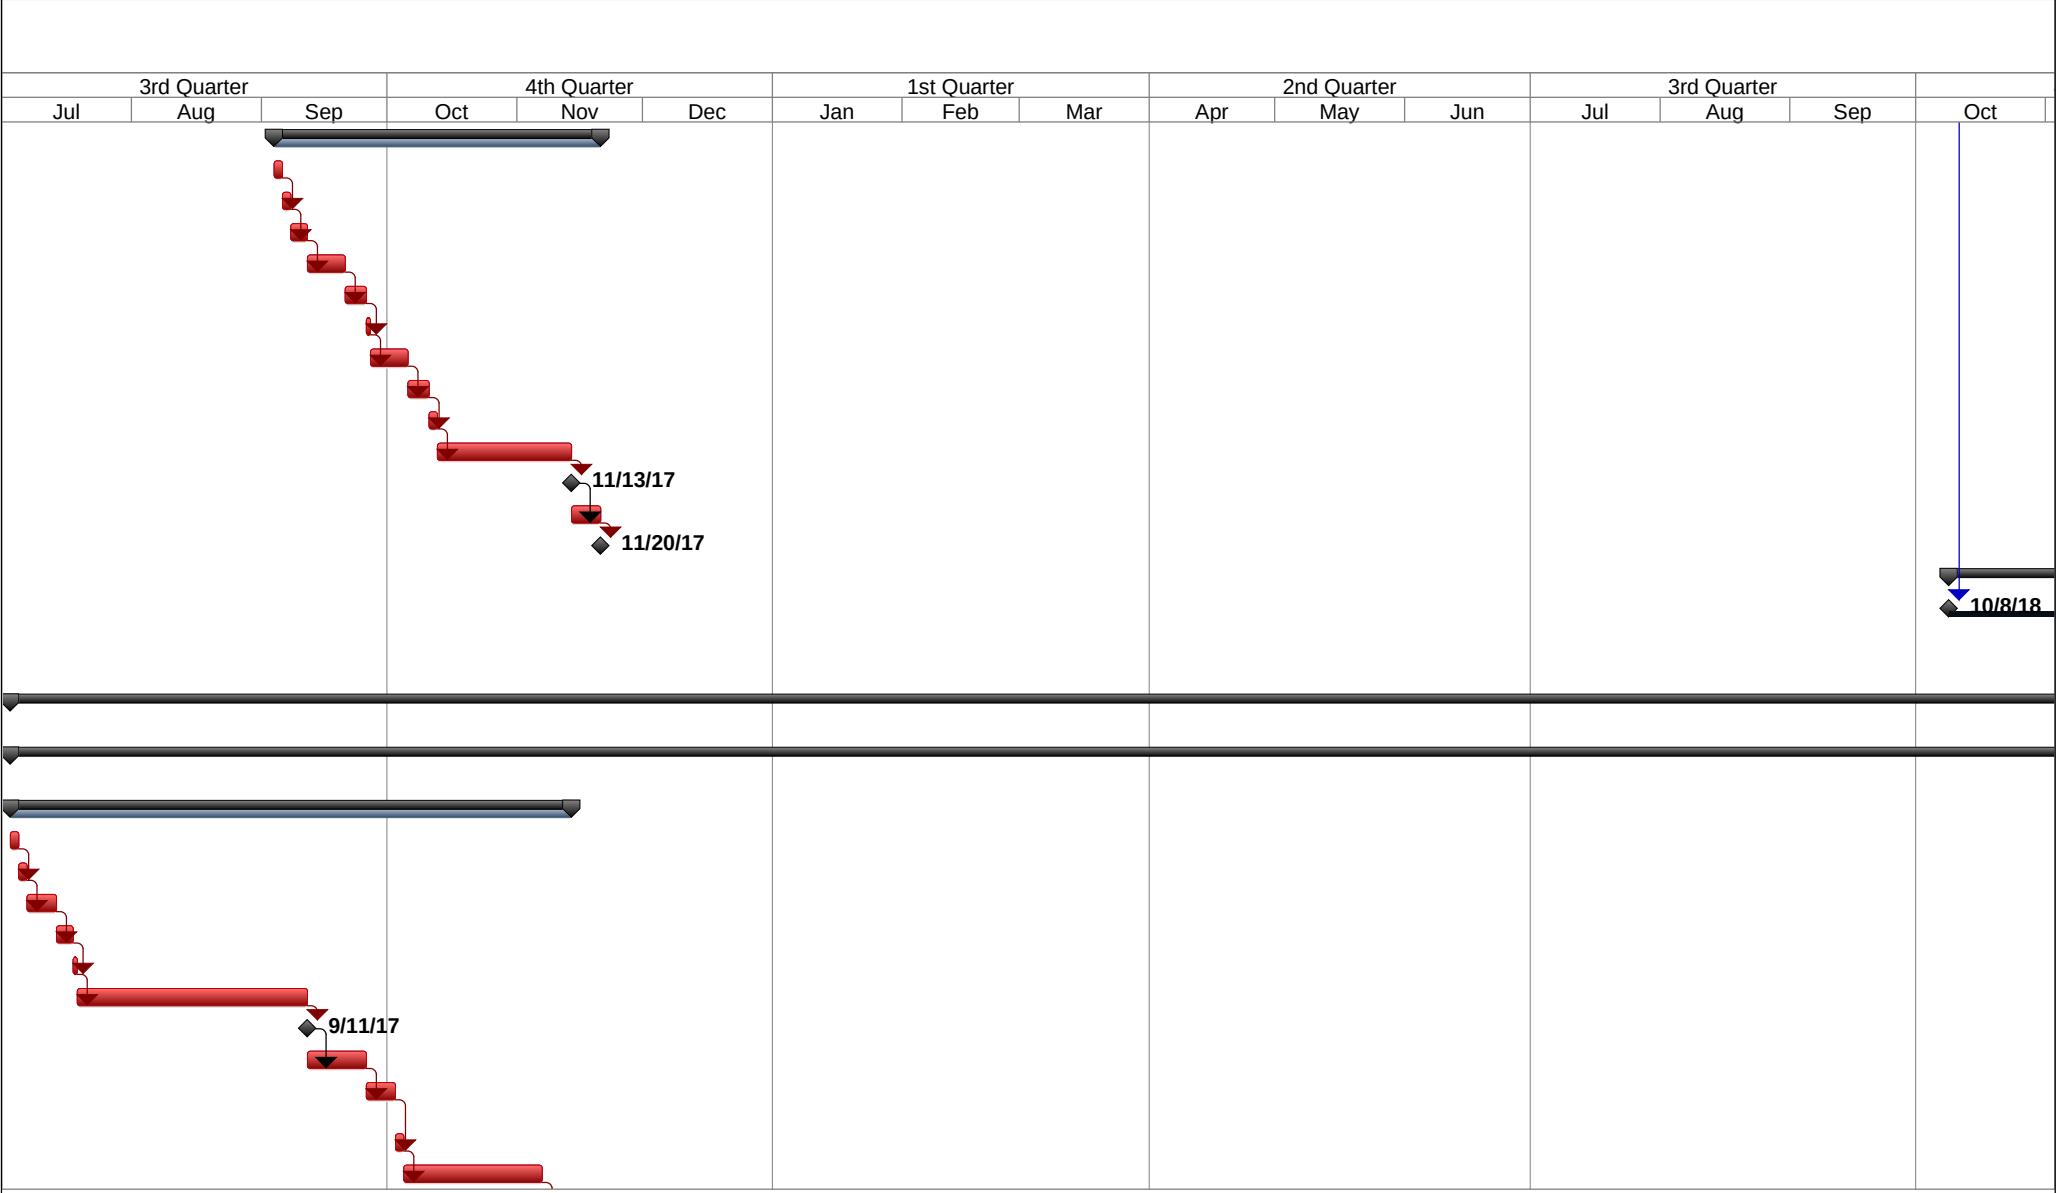


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

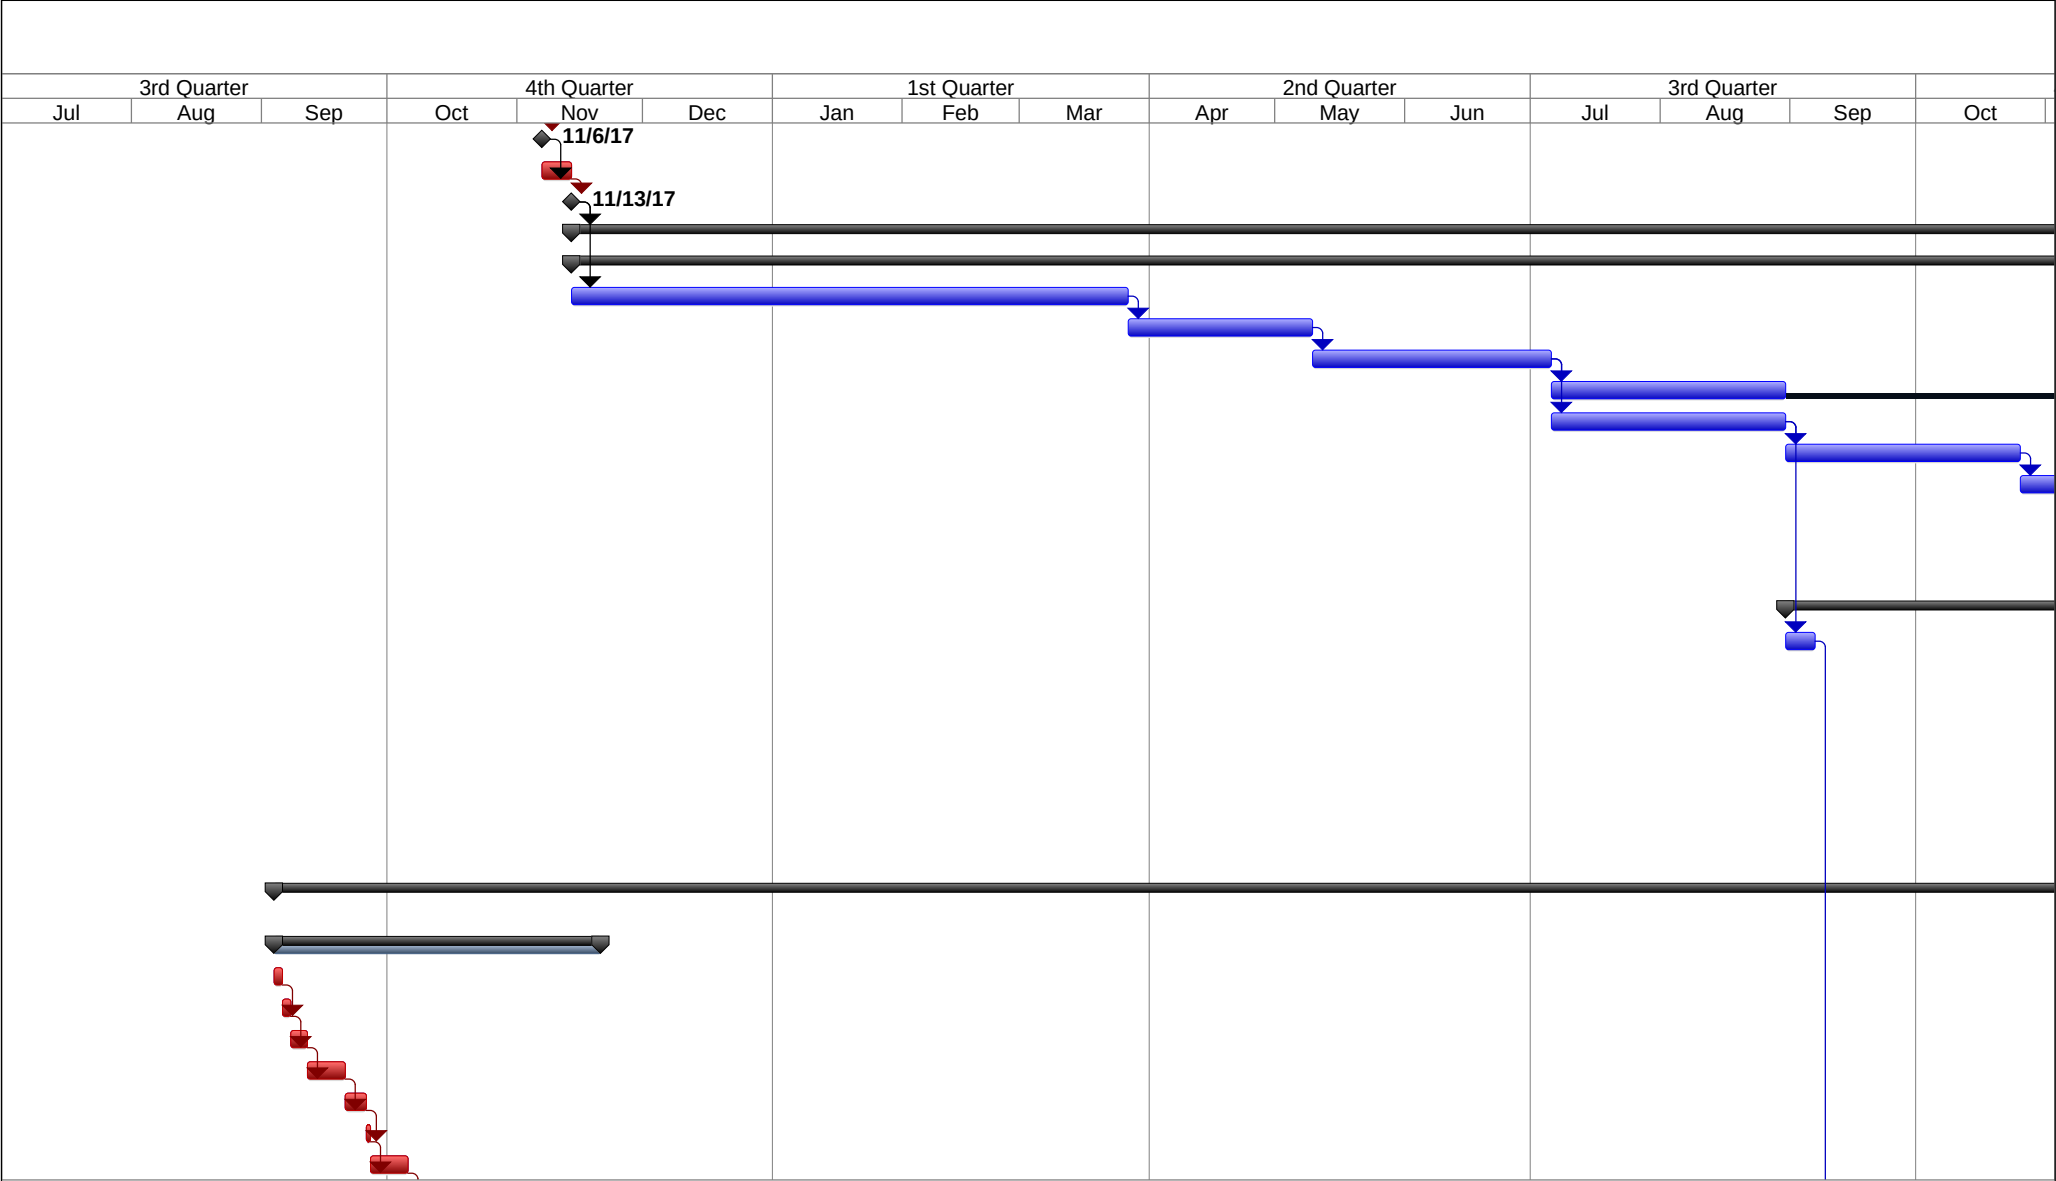





Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

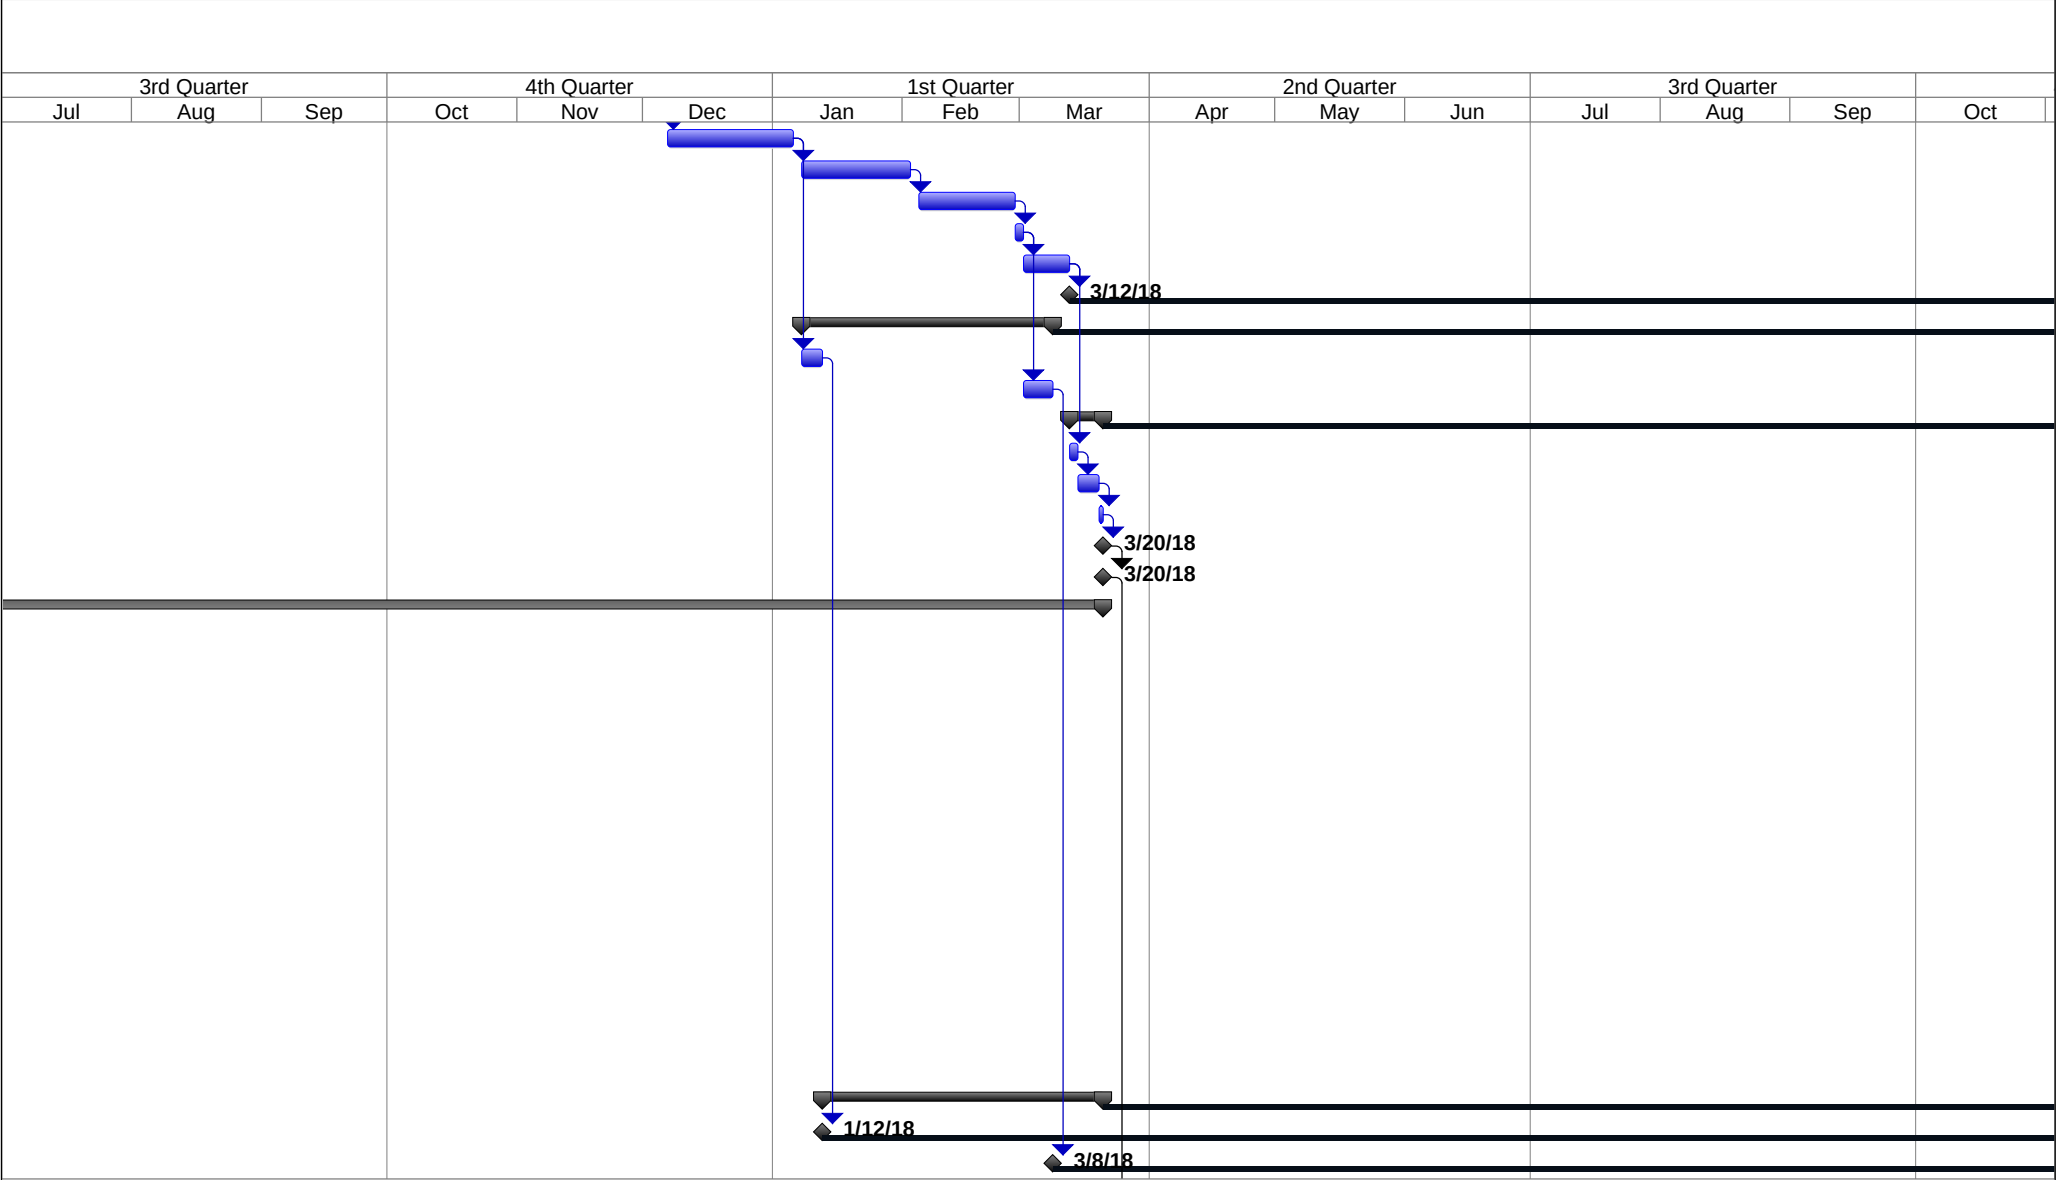

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

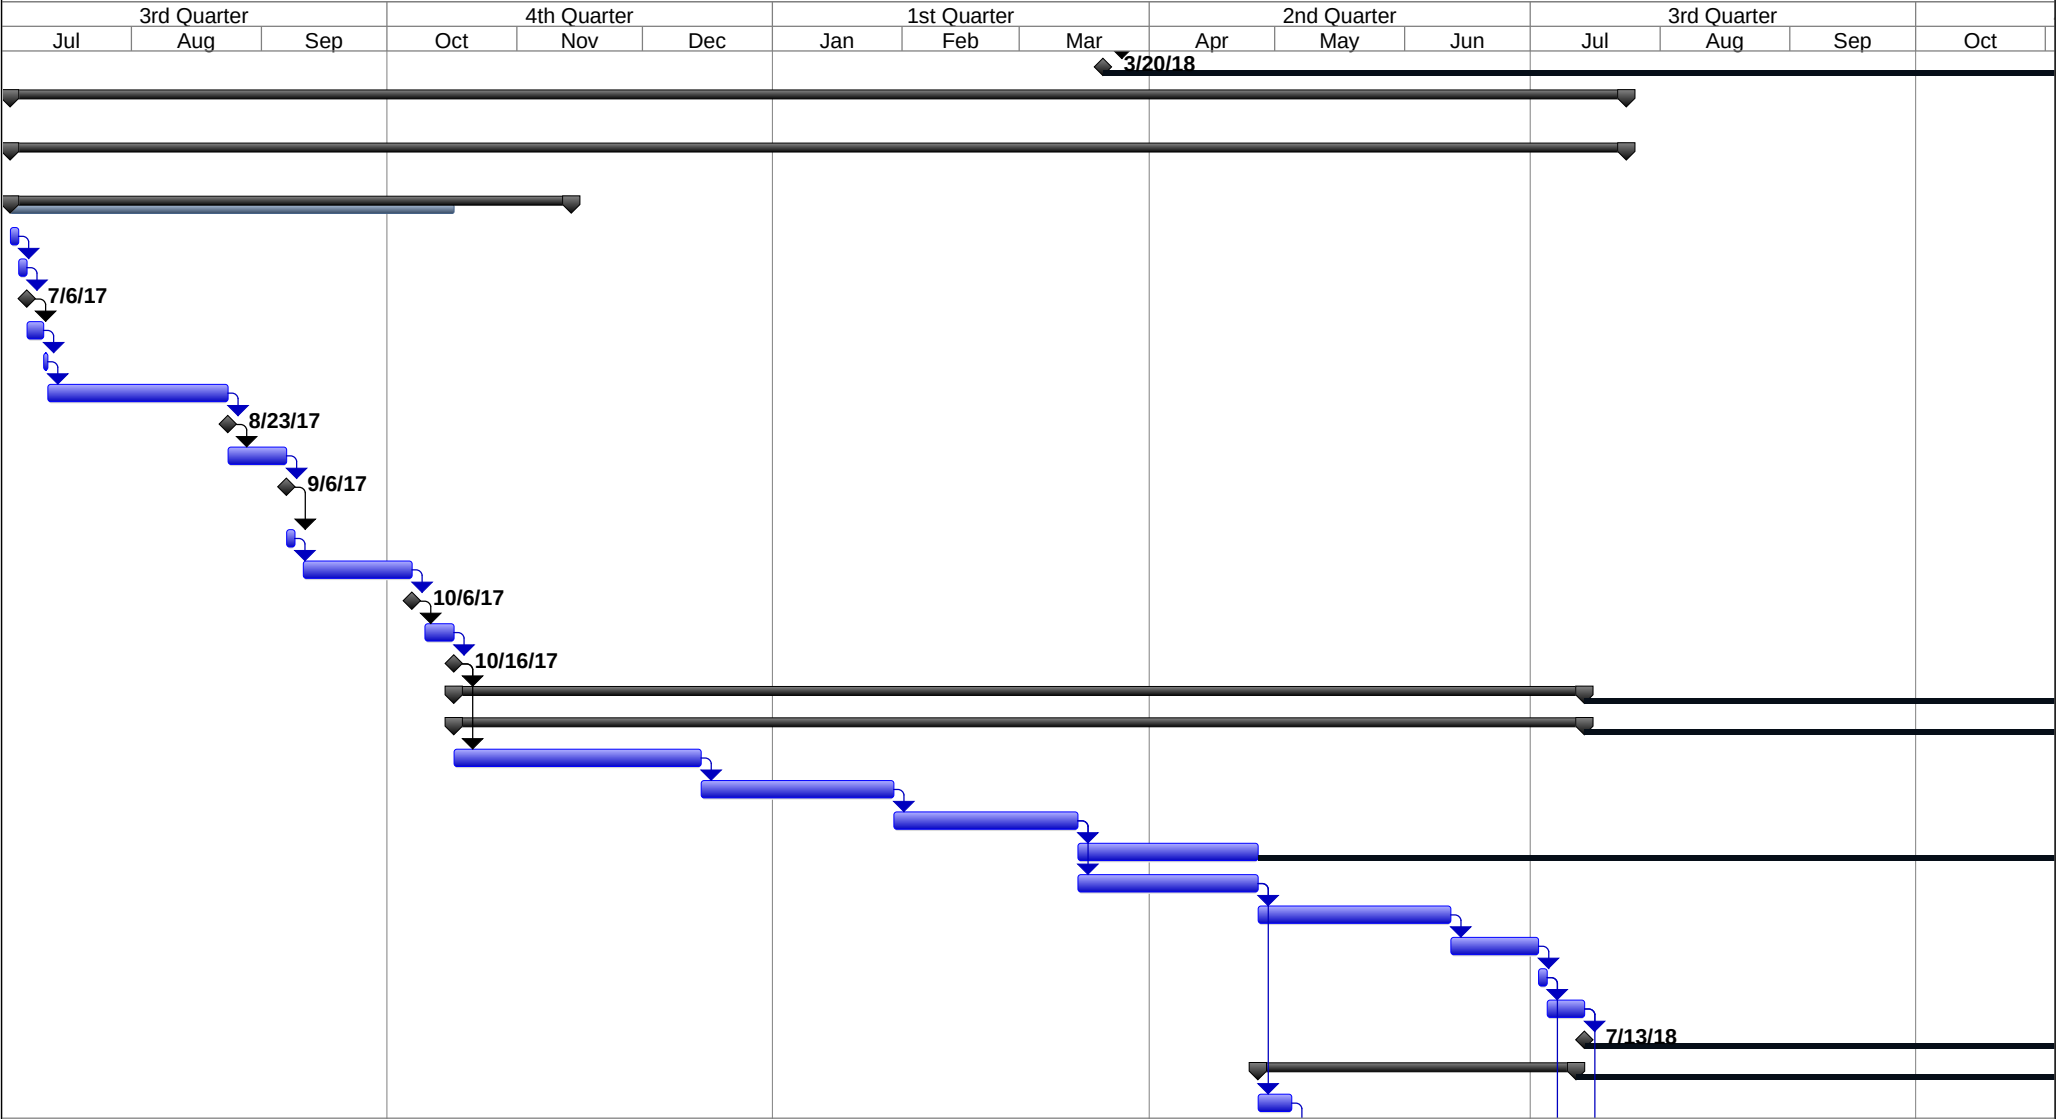

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

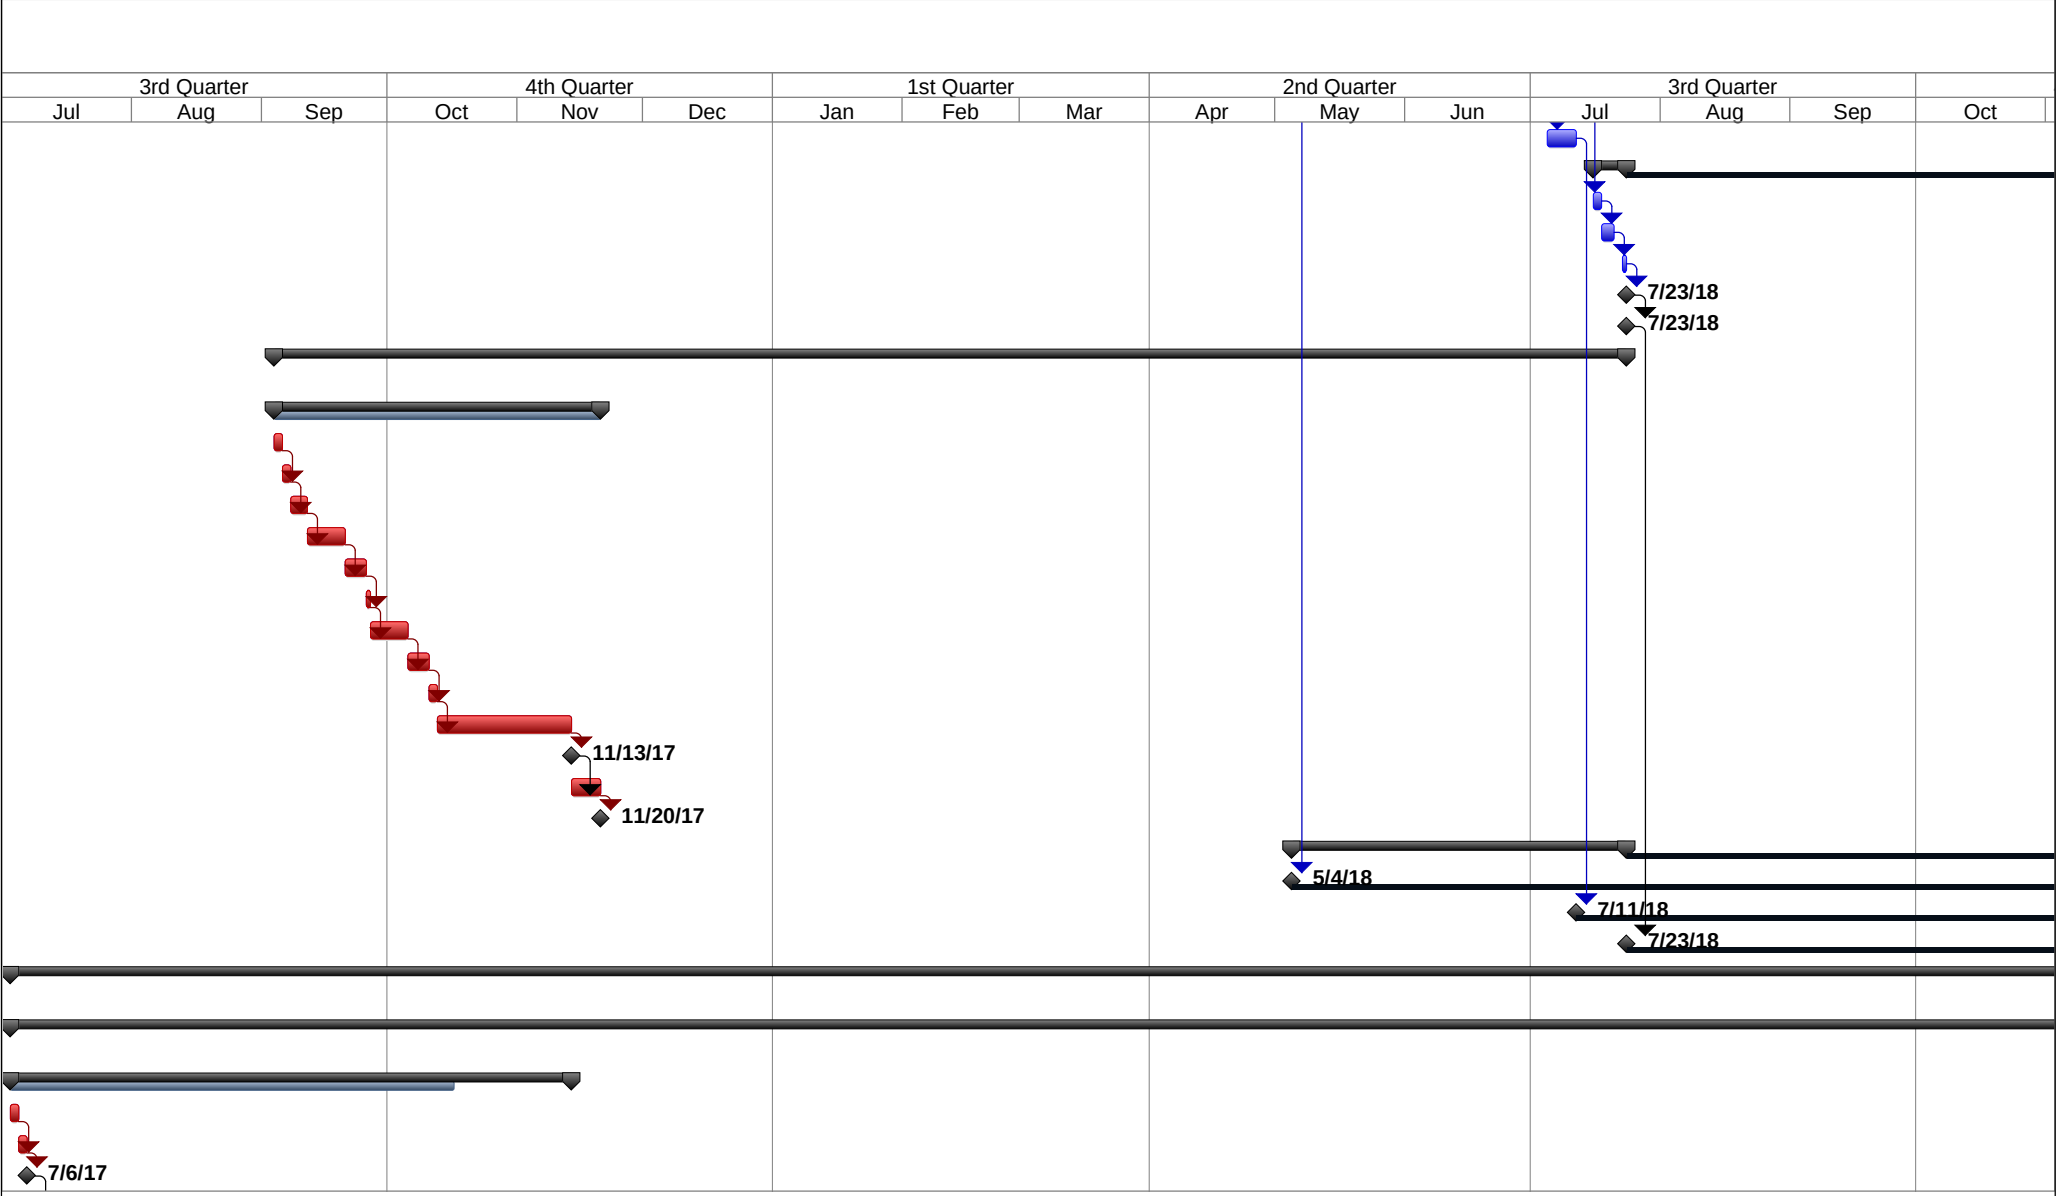










Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

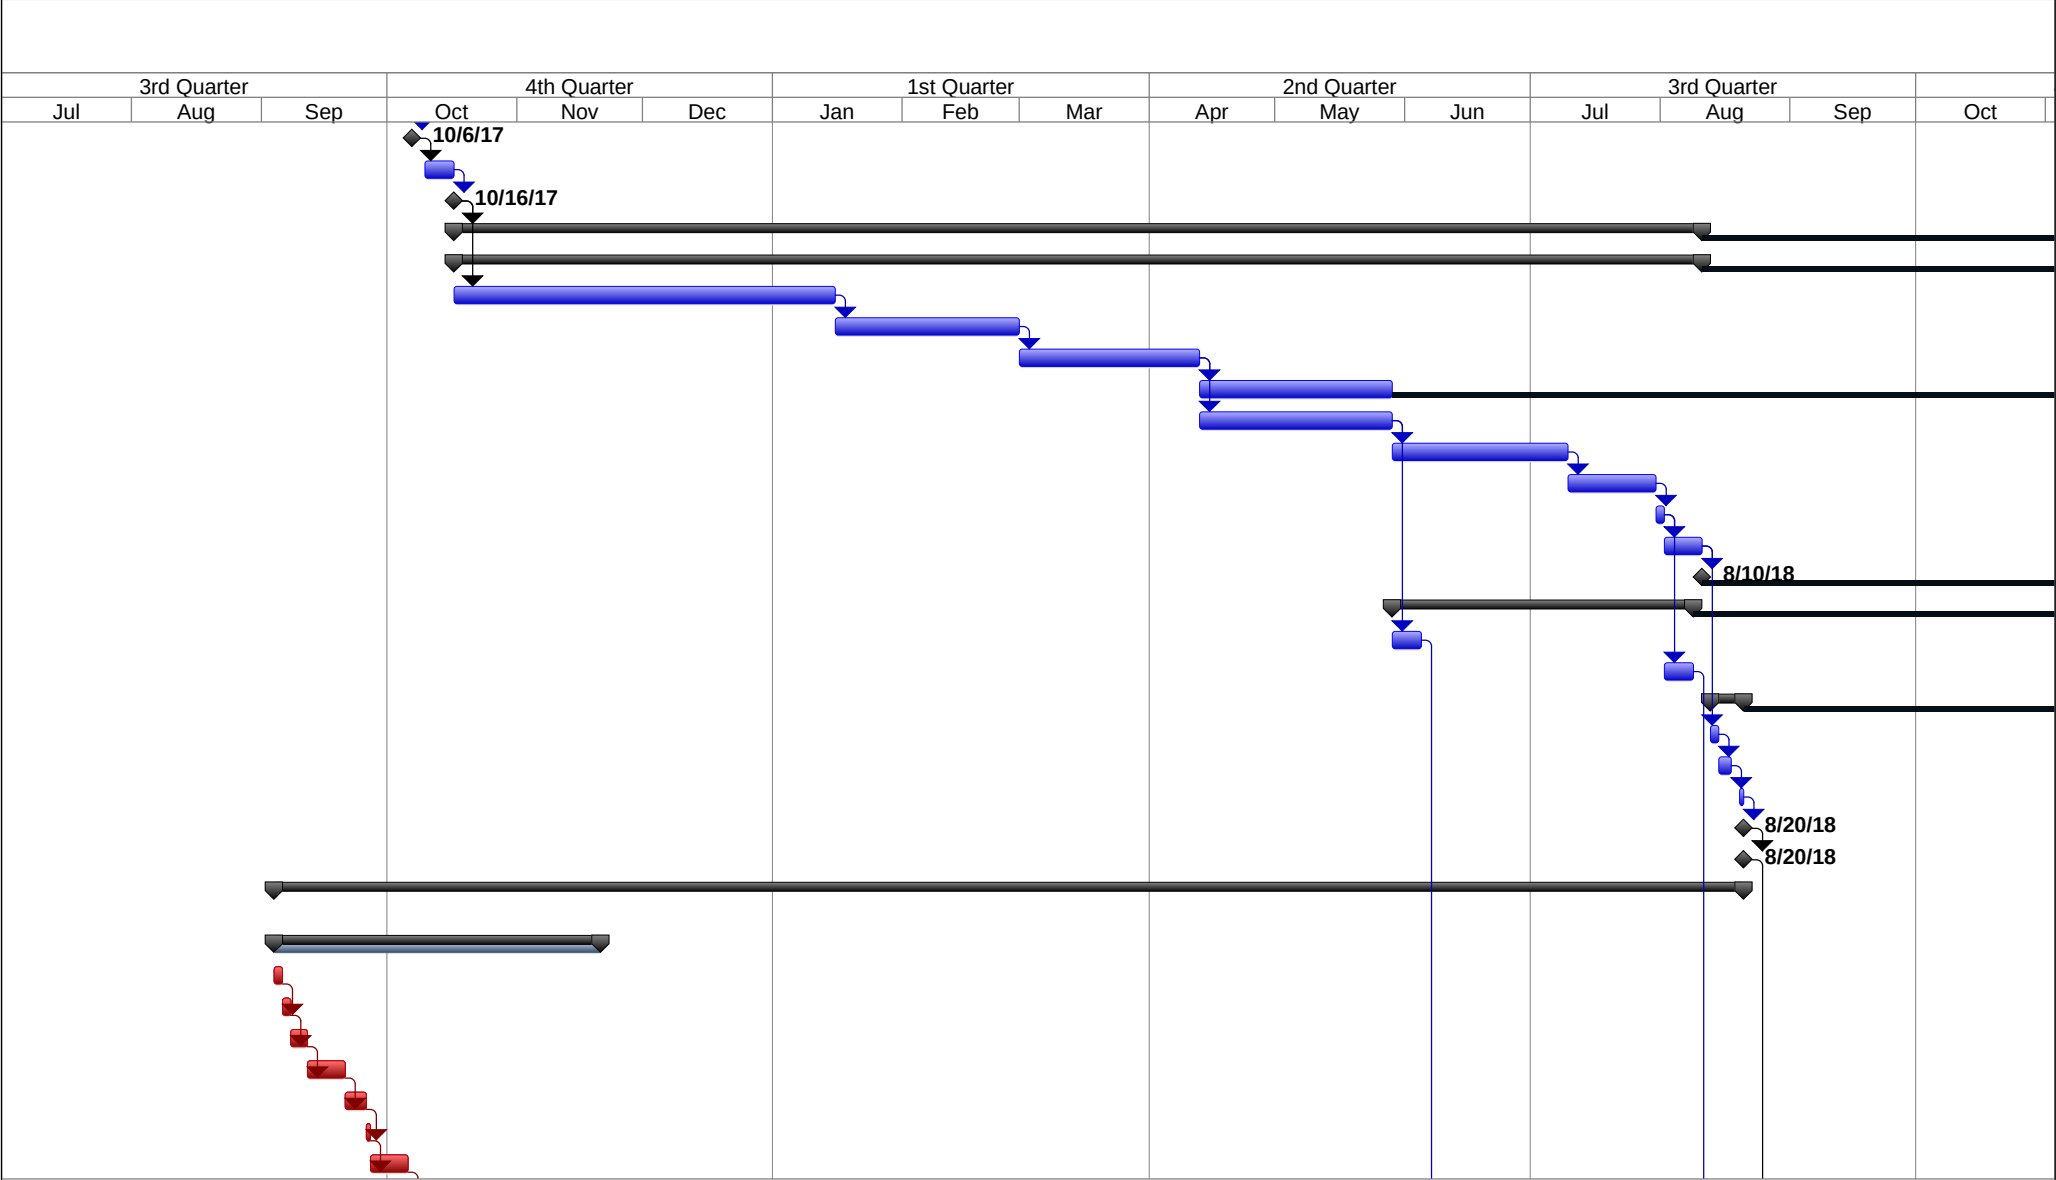

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

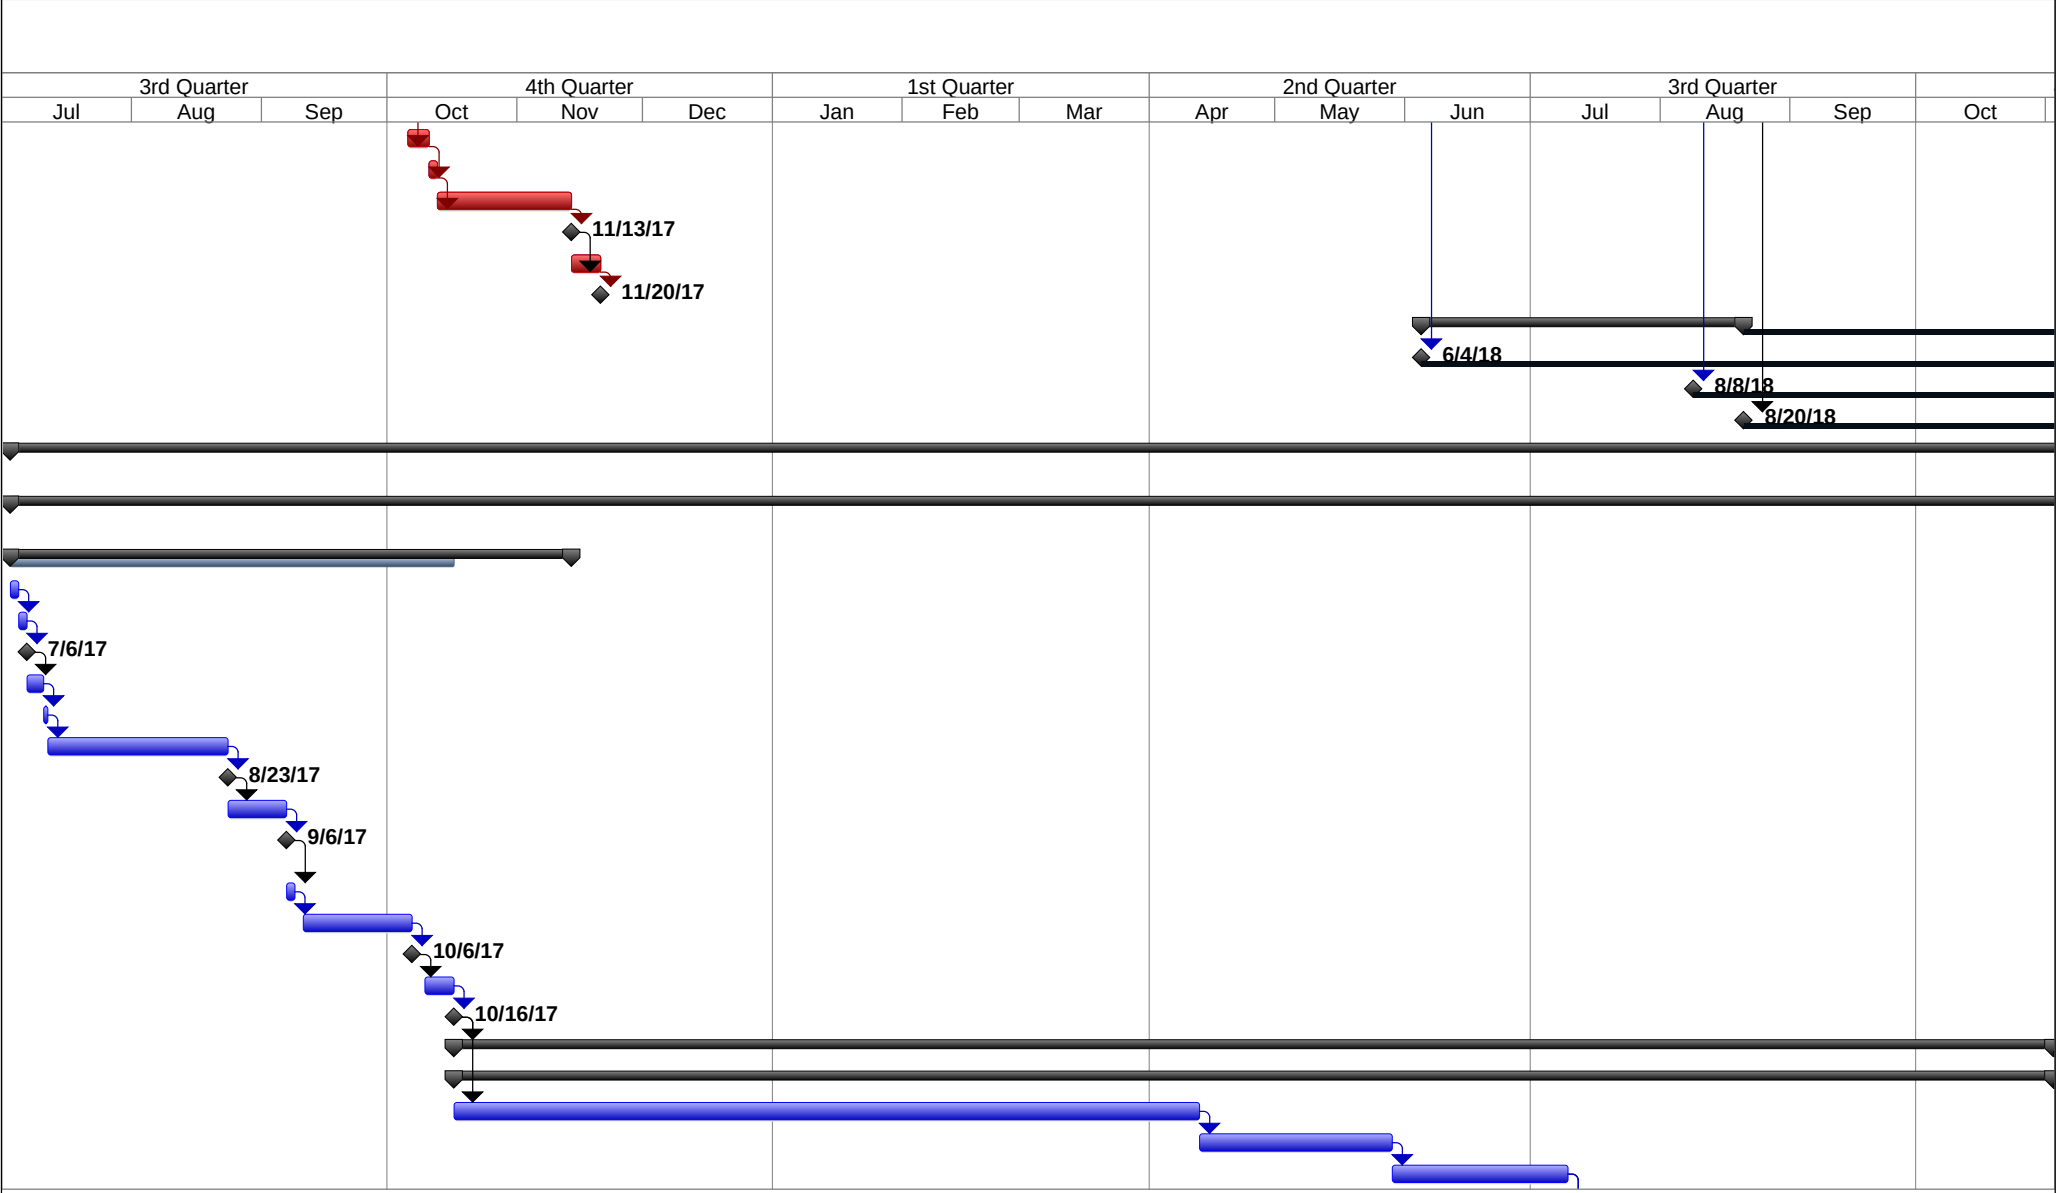


## Plan Operativo Anual, POA

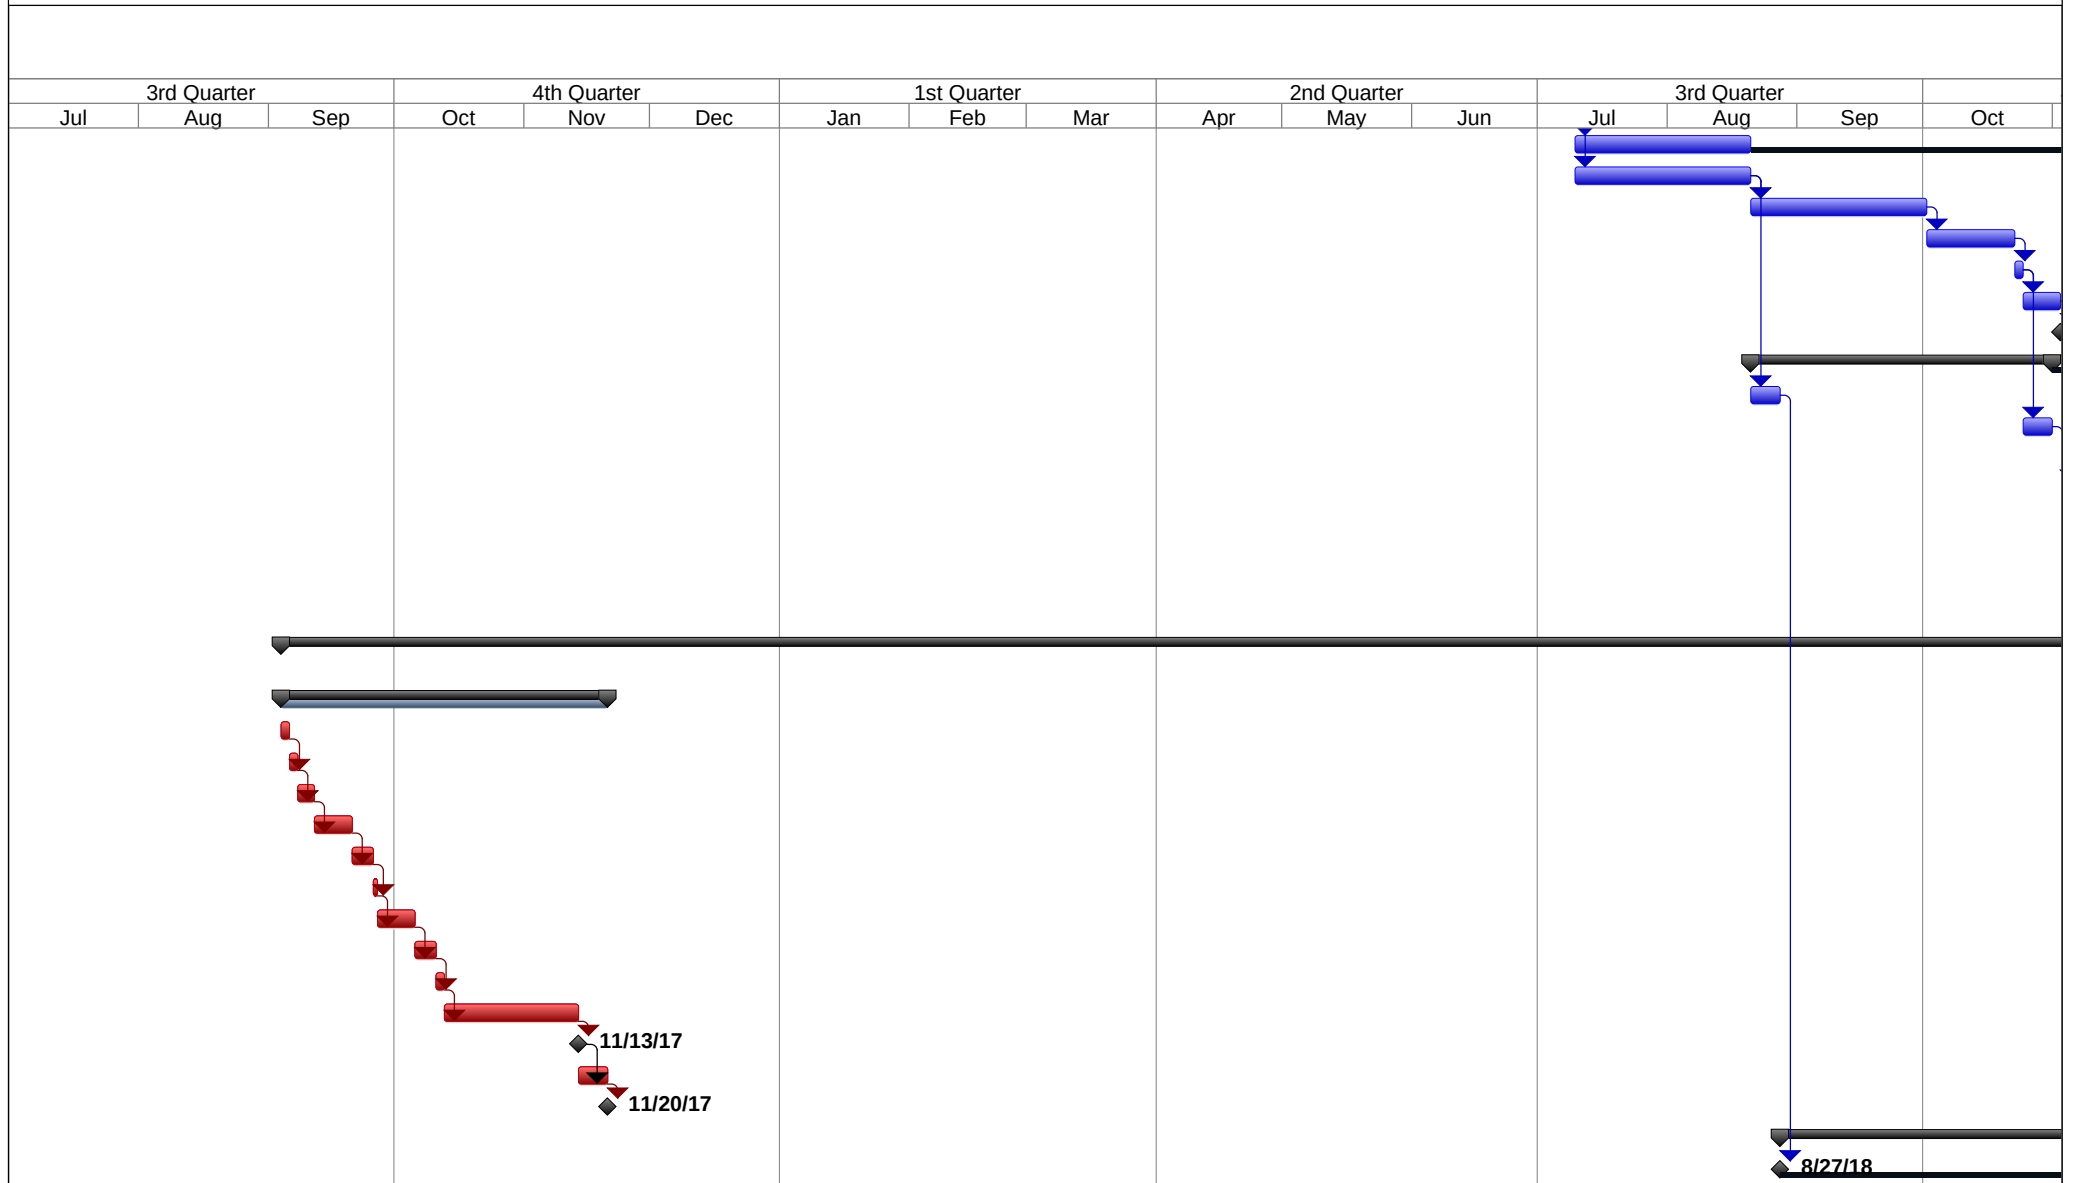





Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

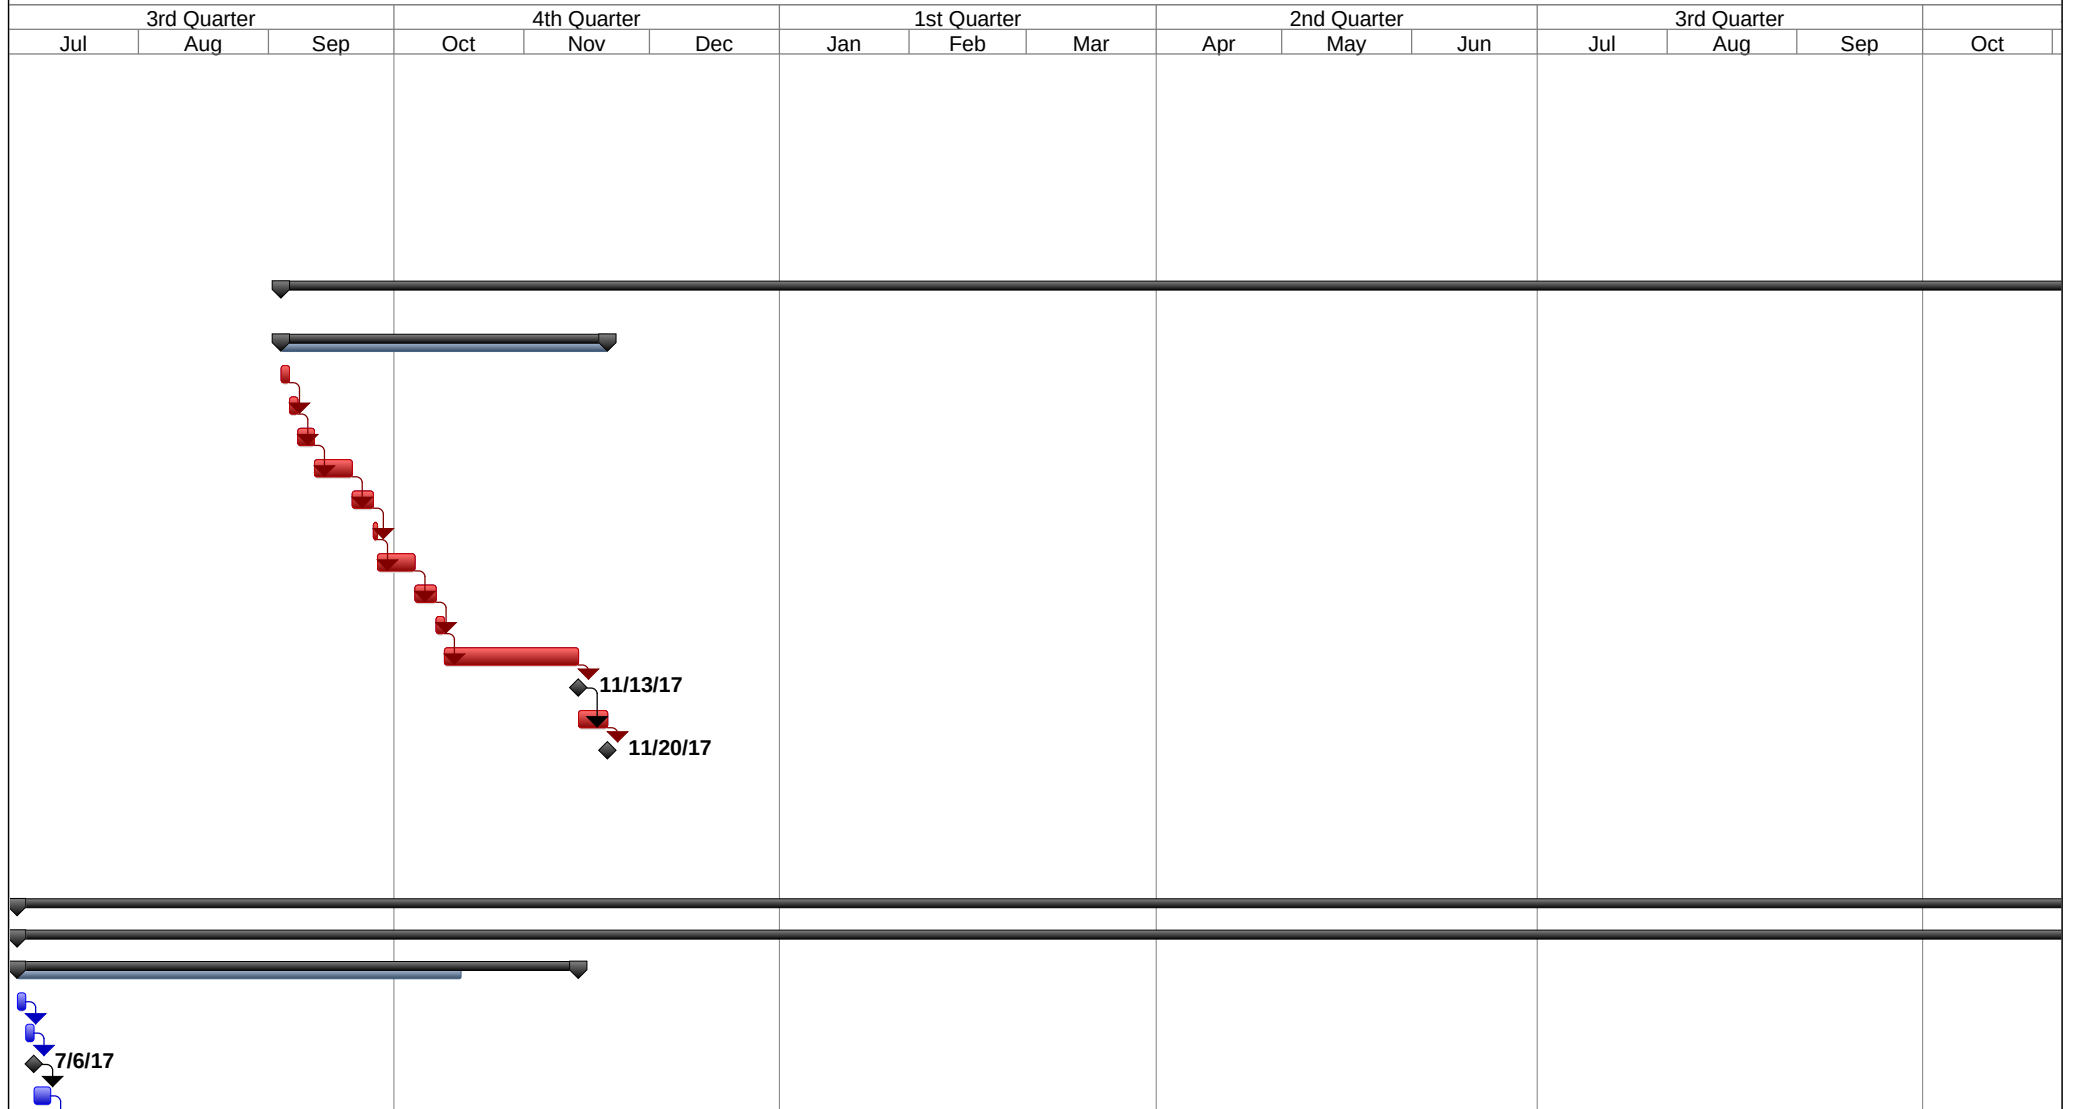


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

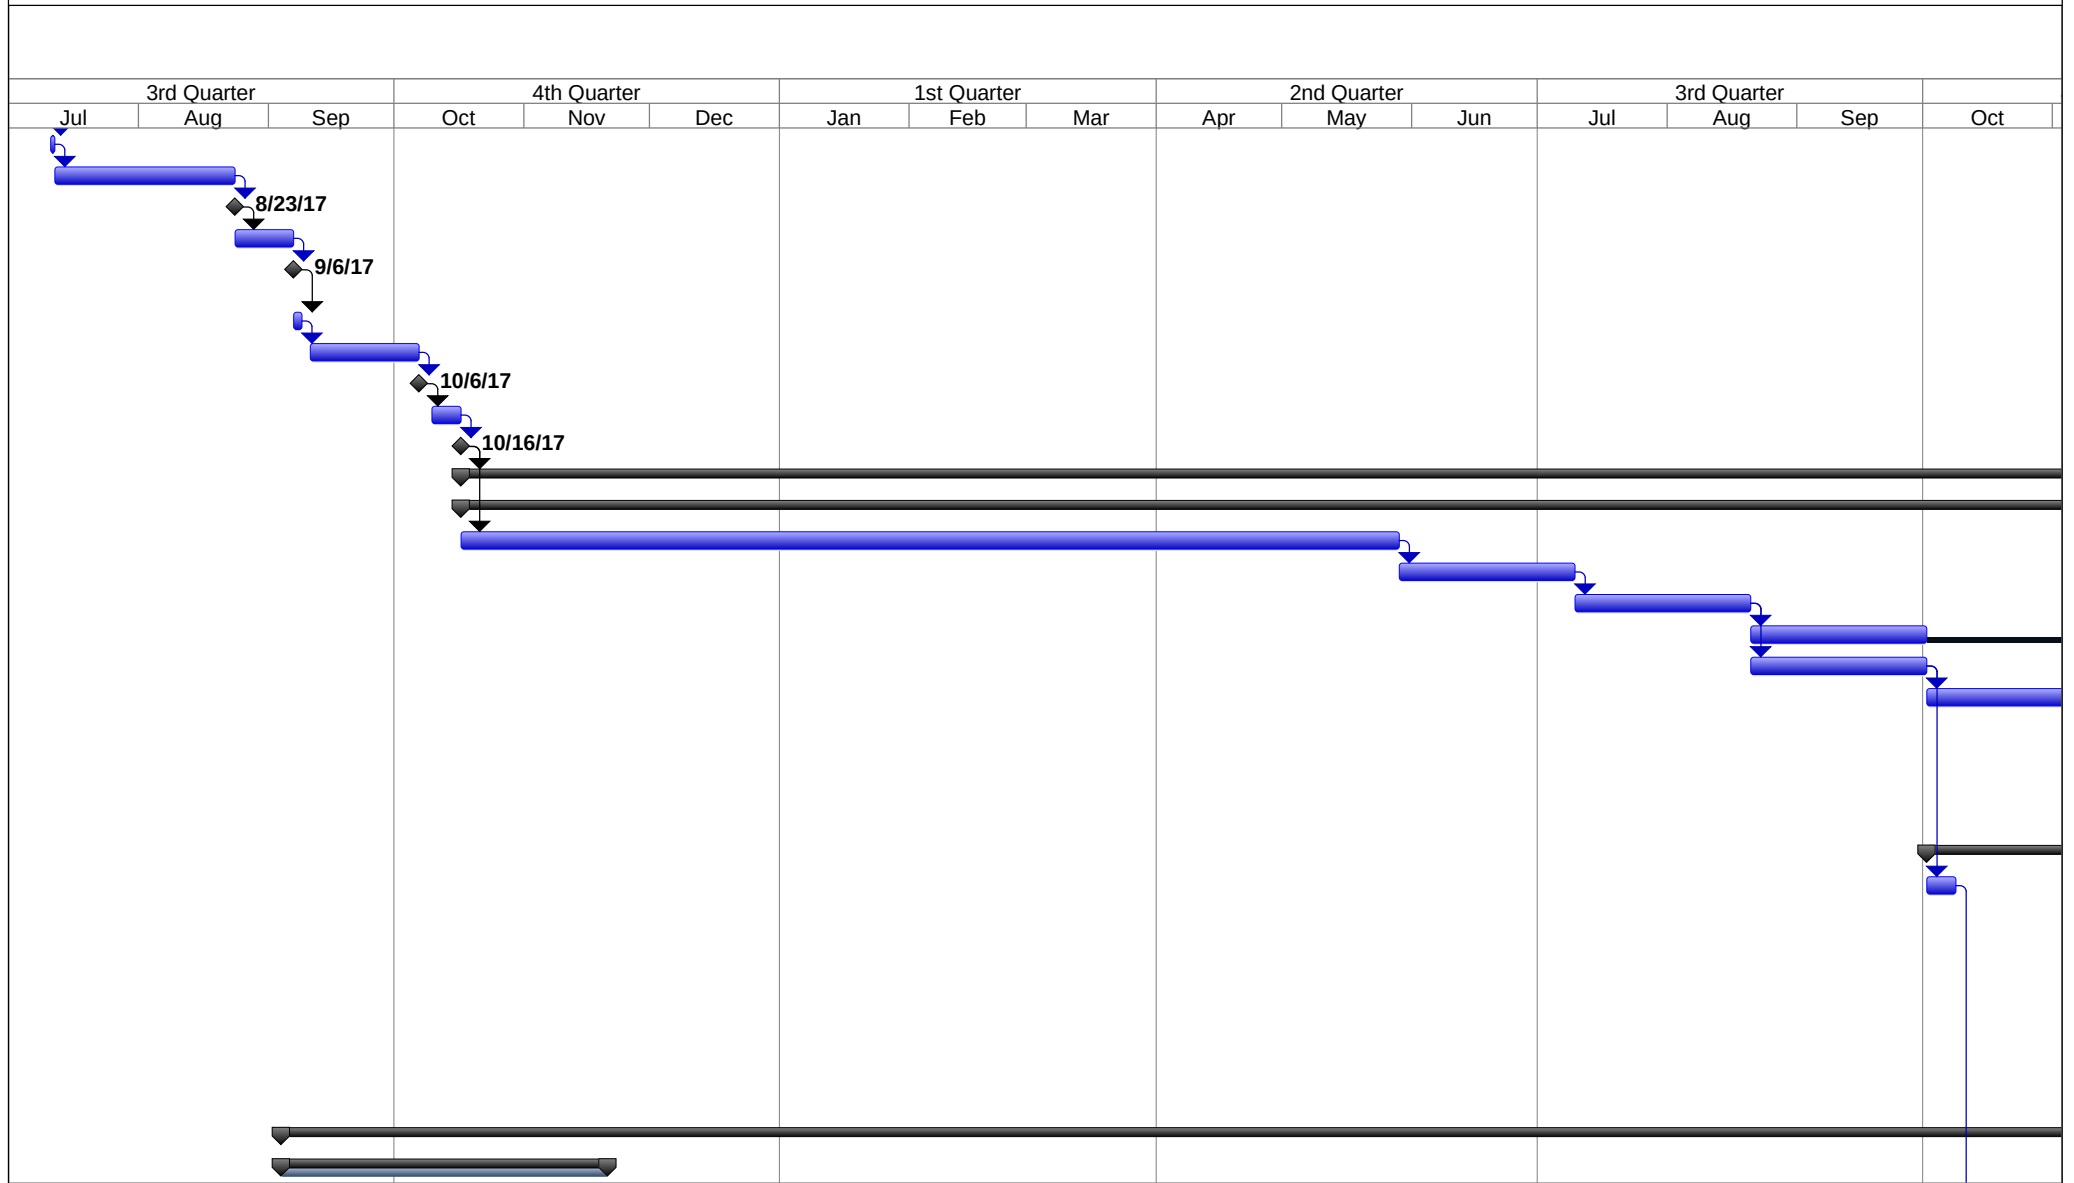

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

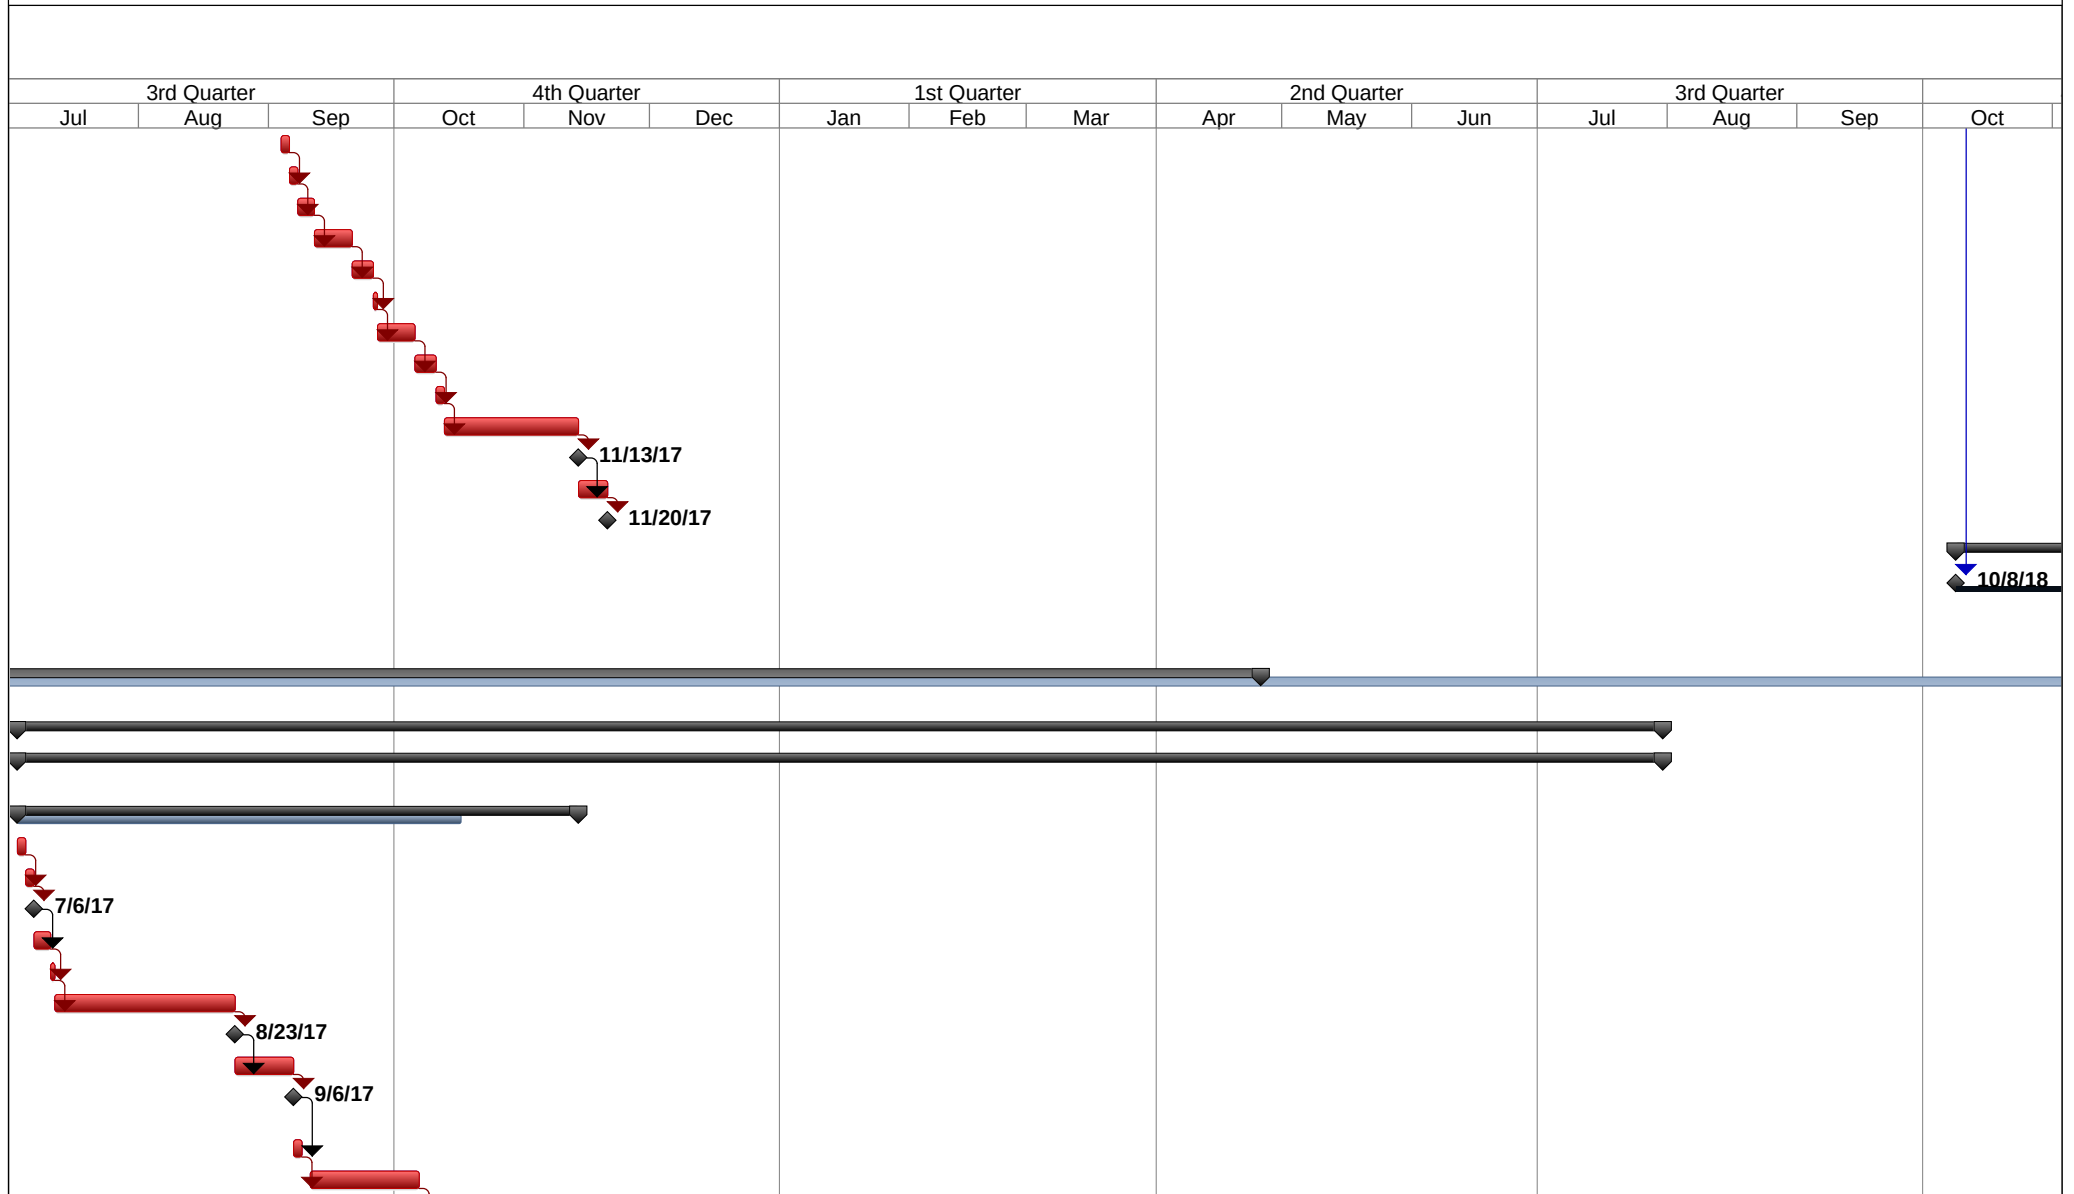


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

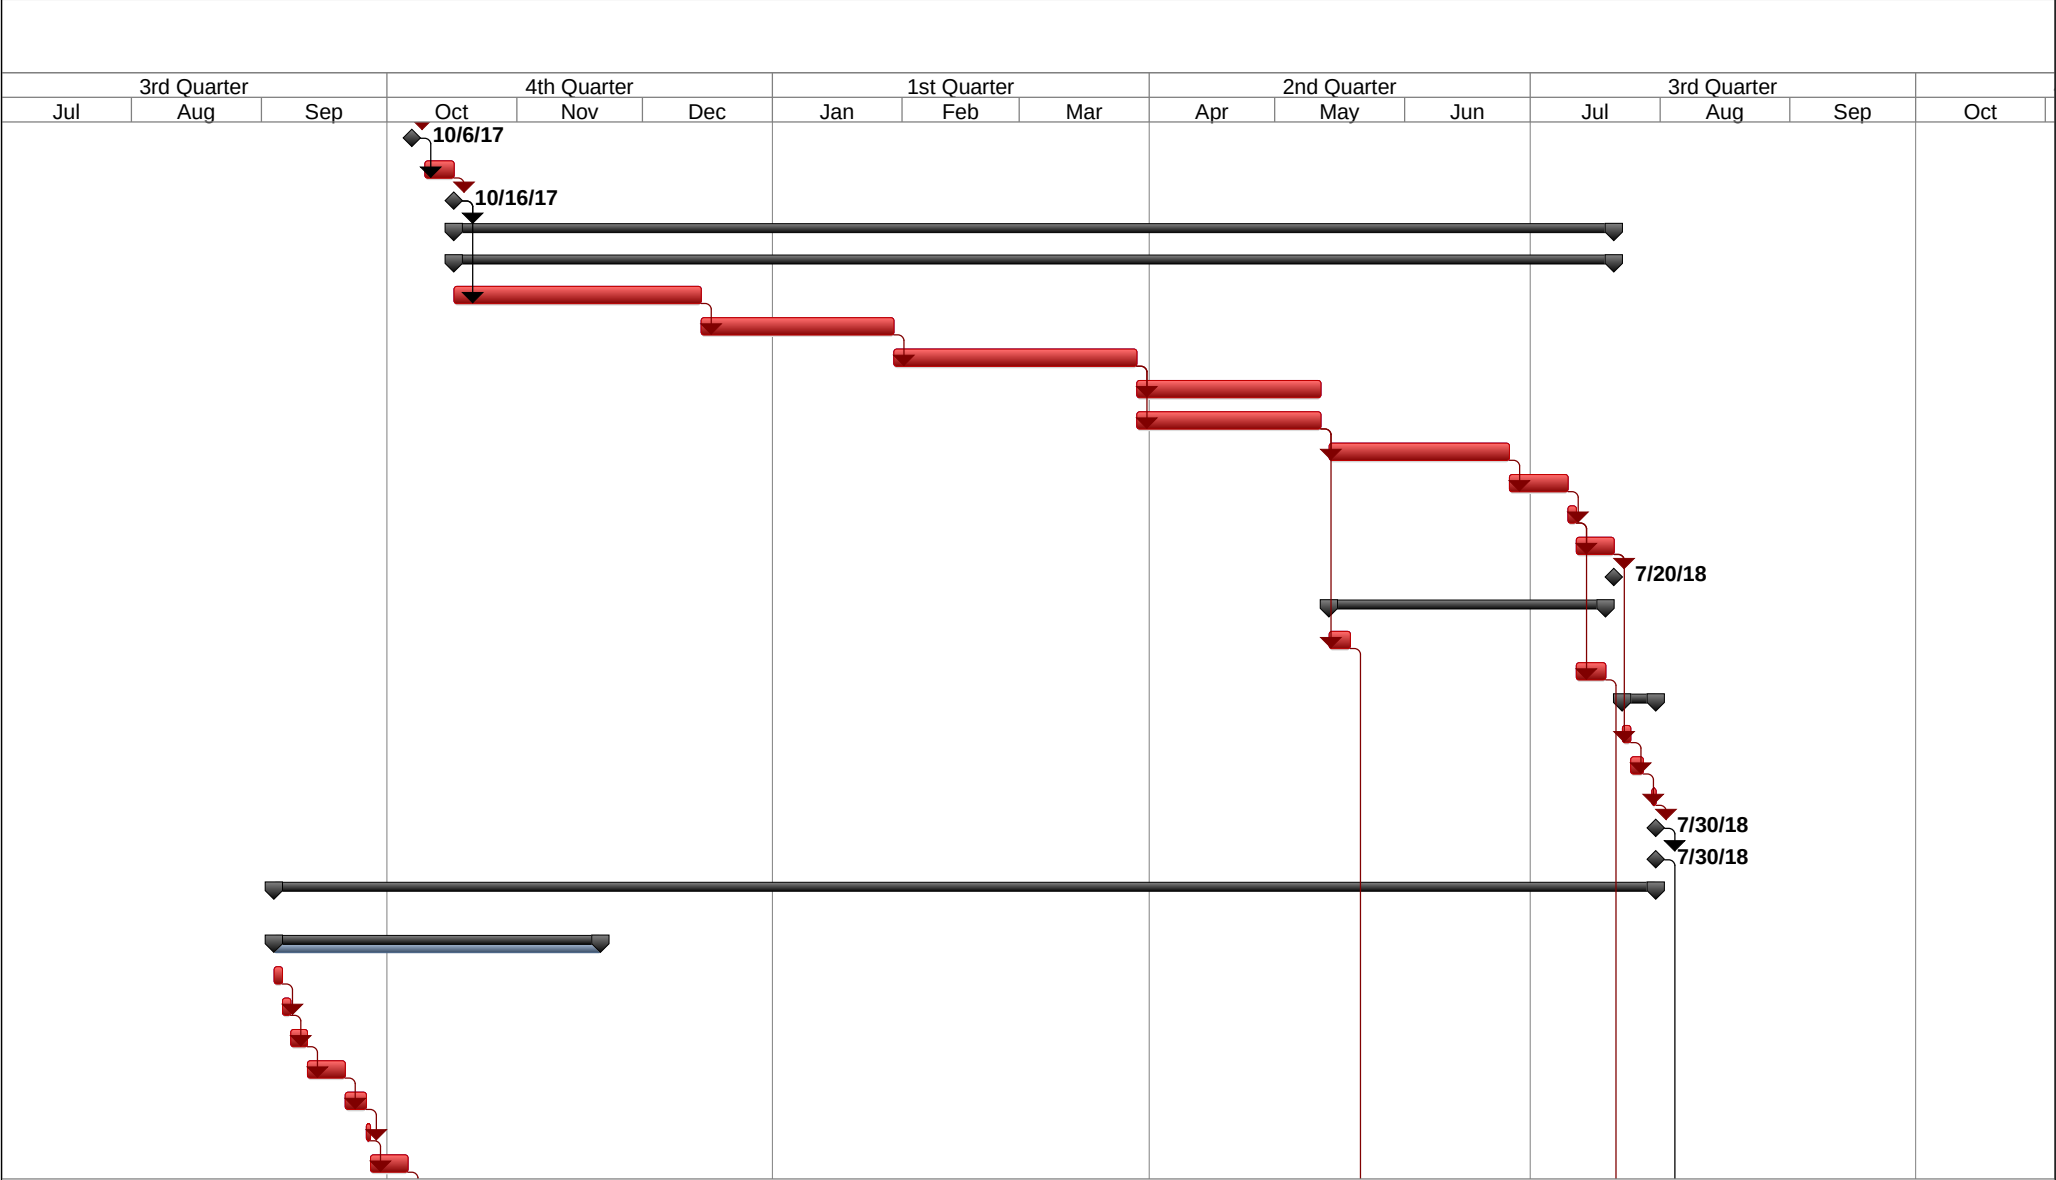




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

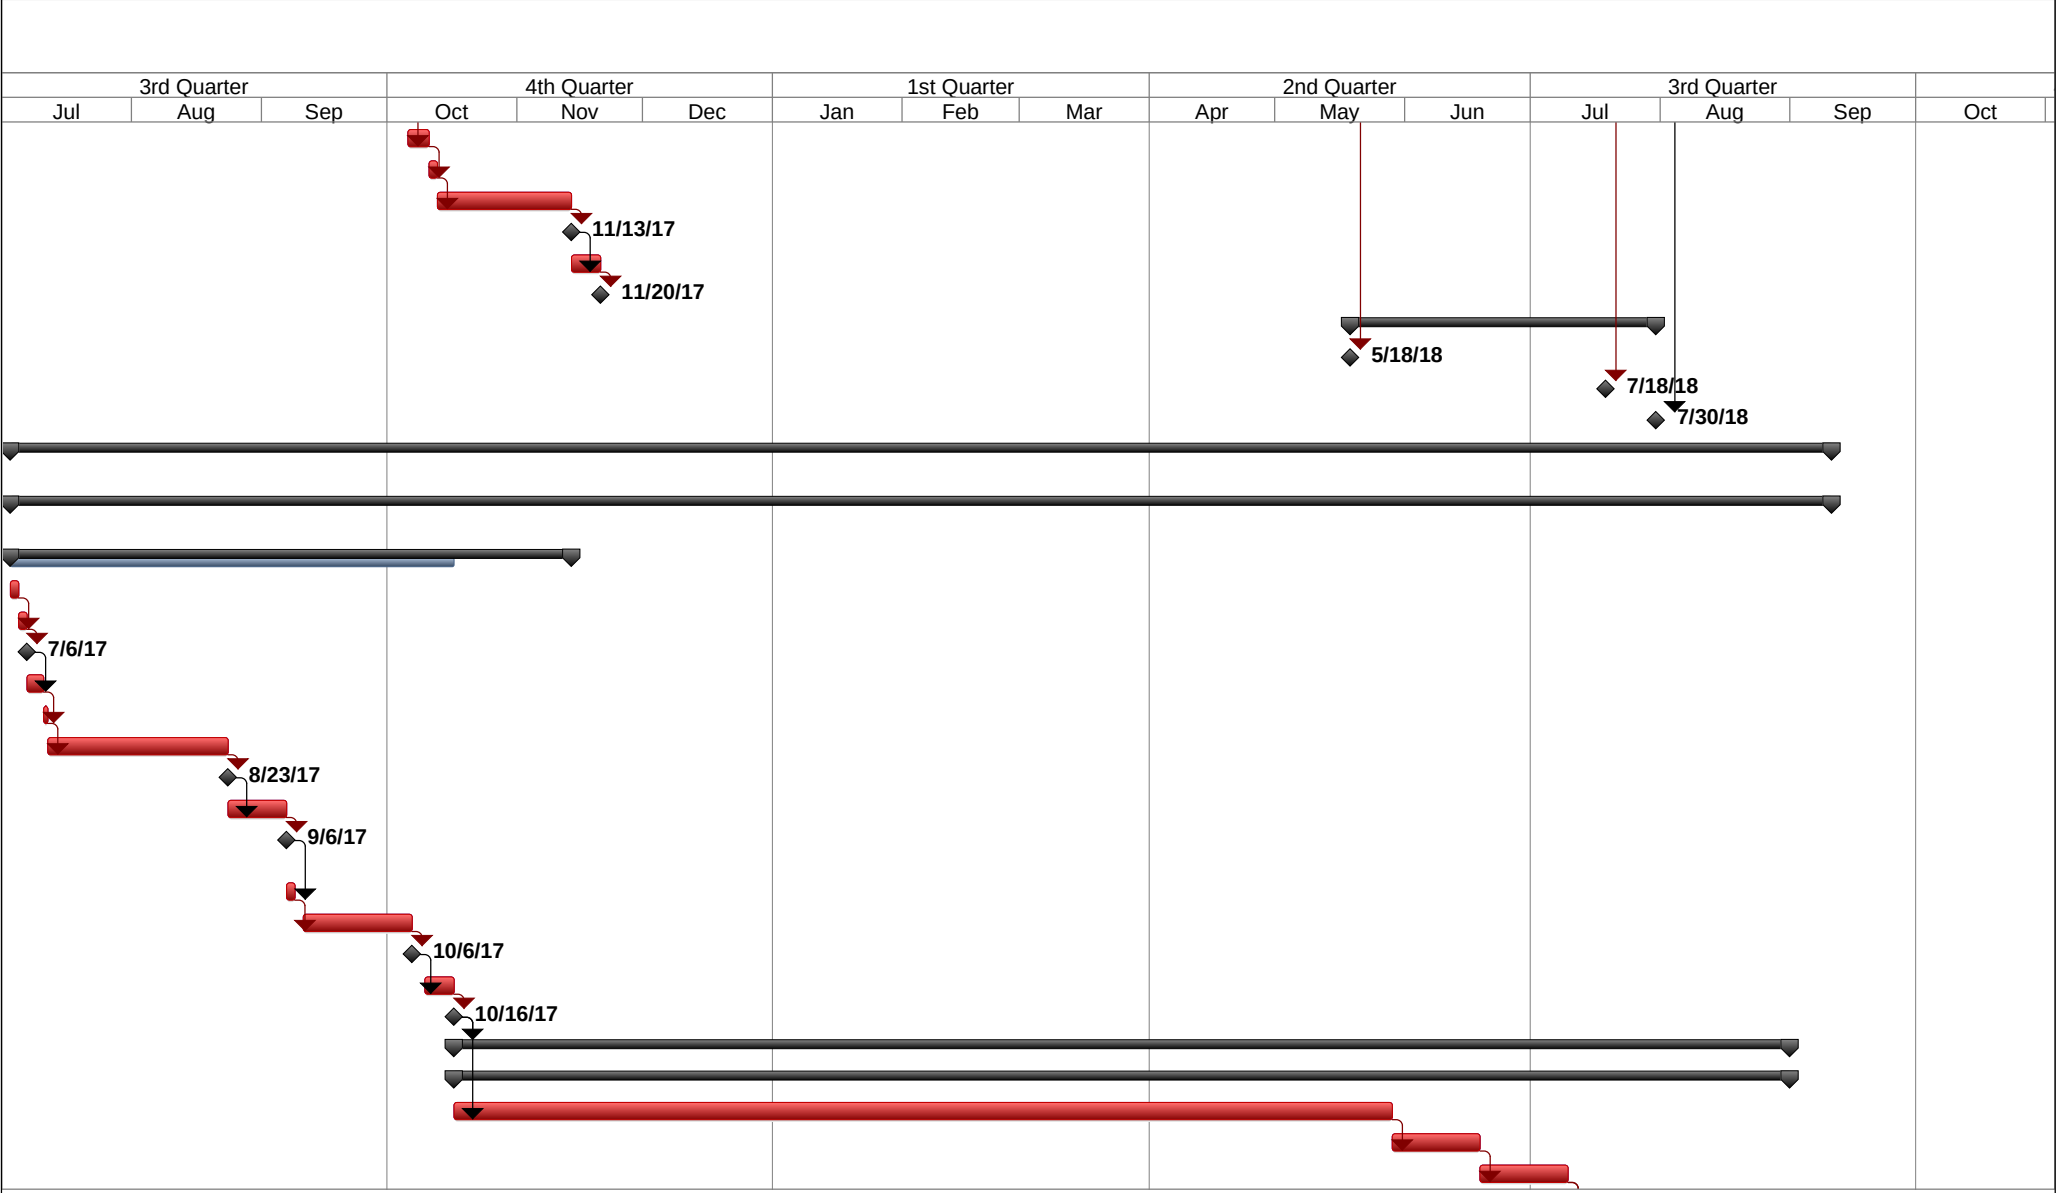




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

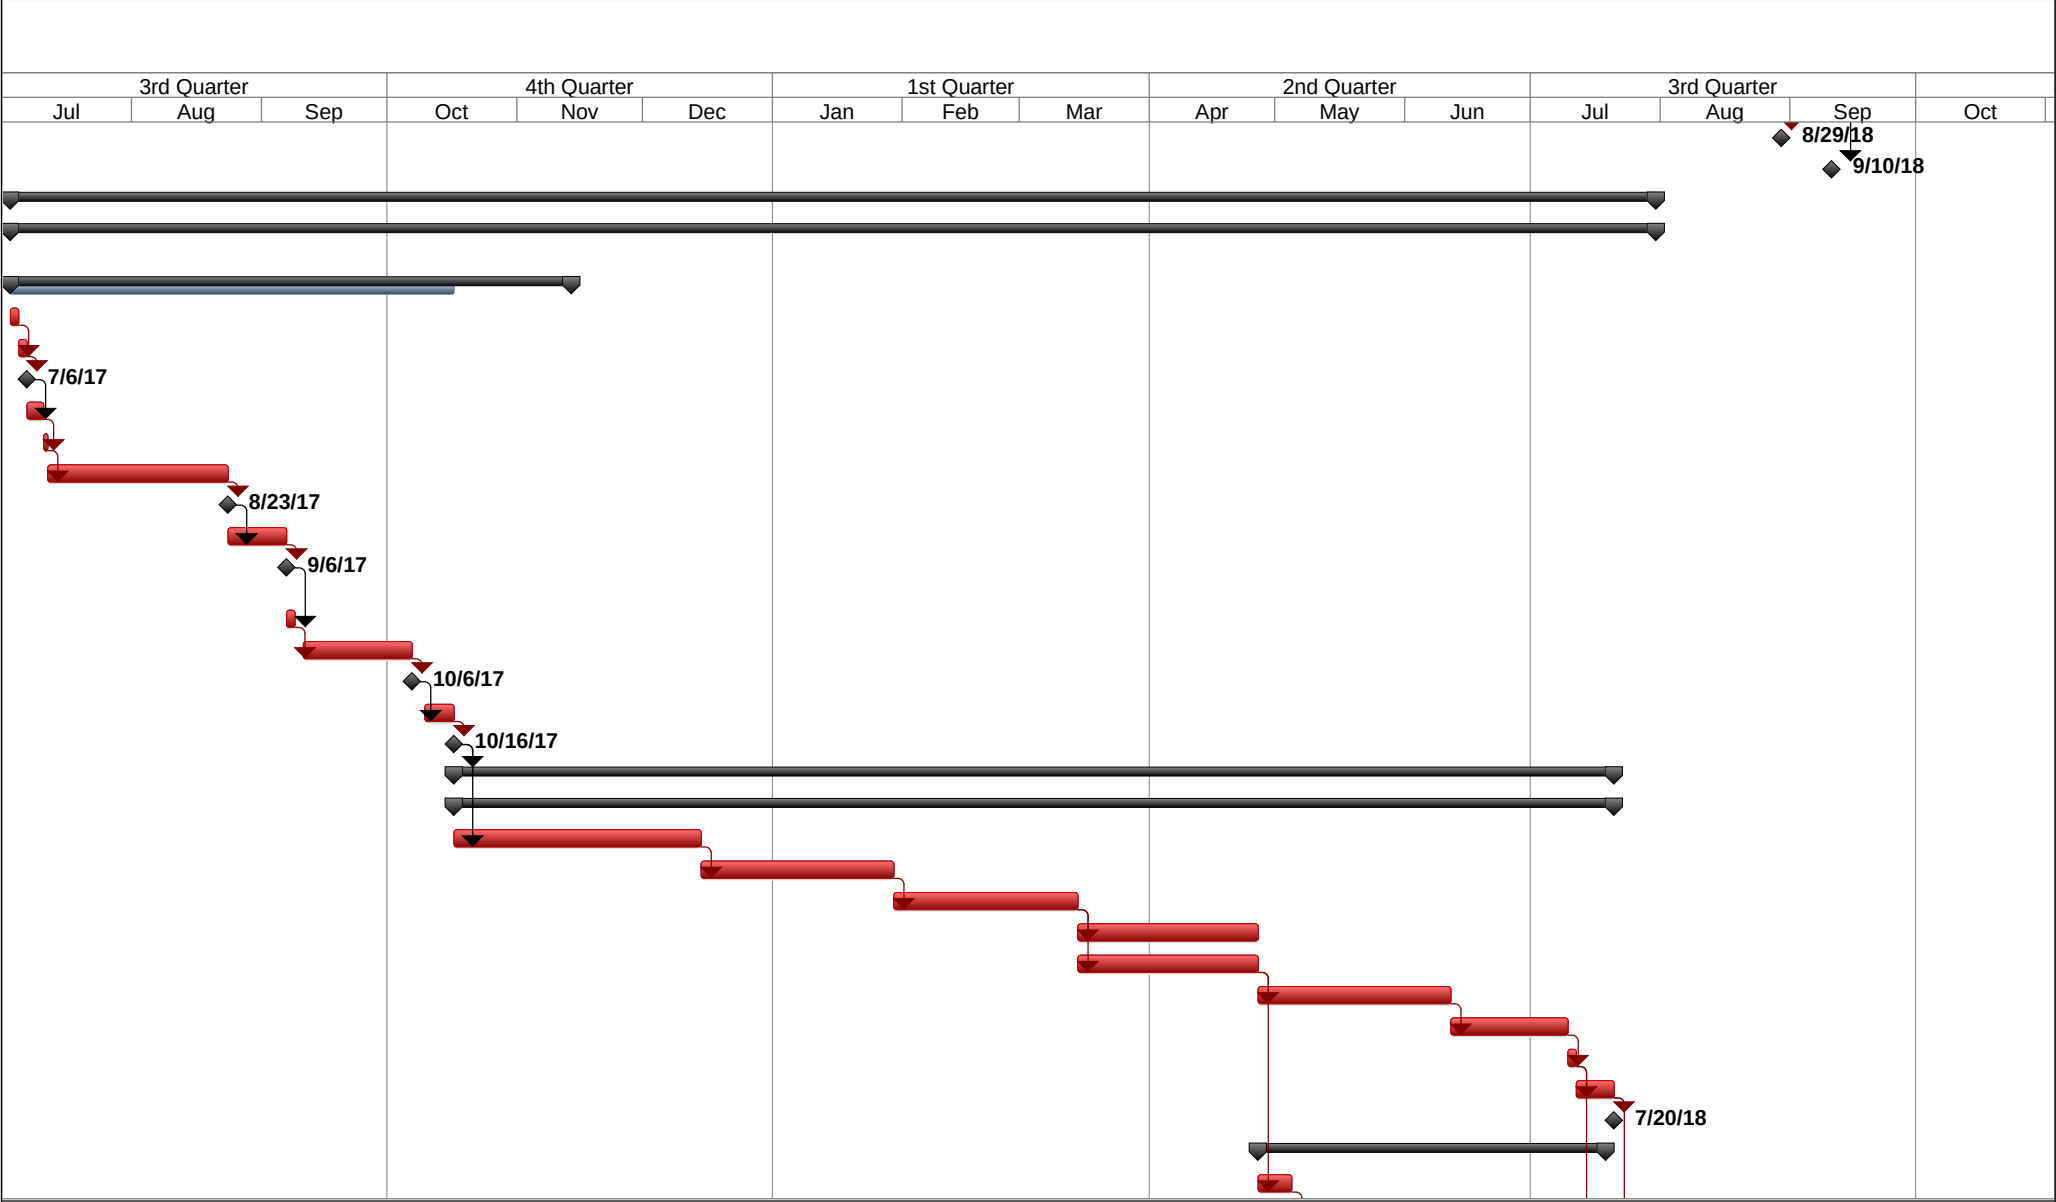




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

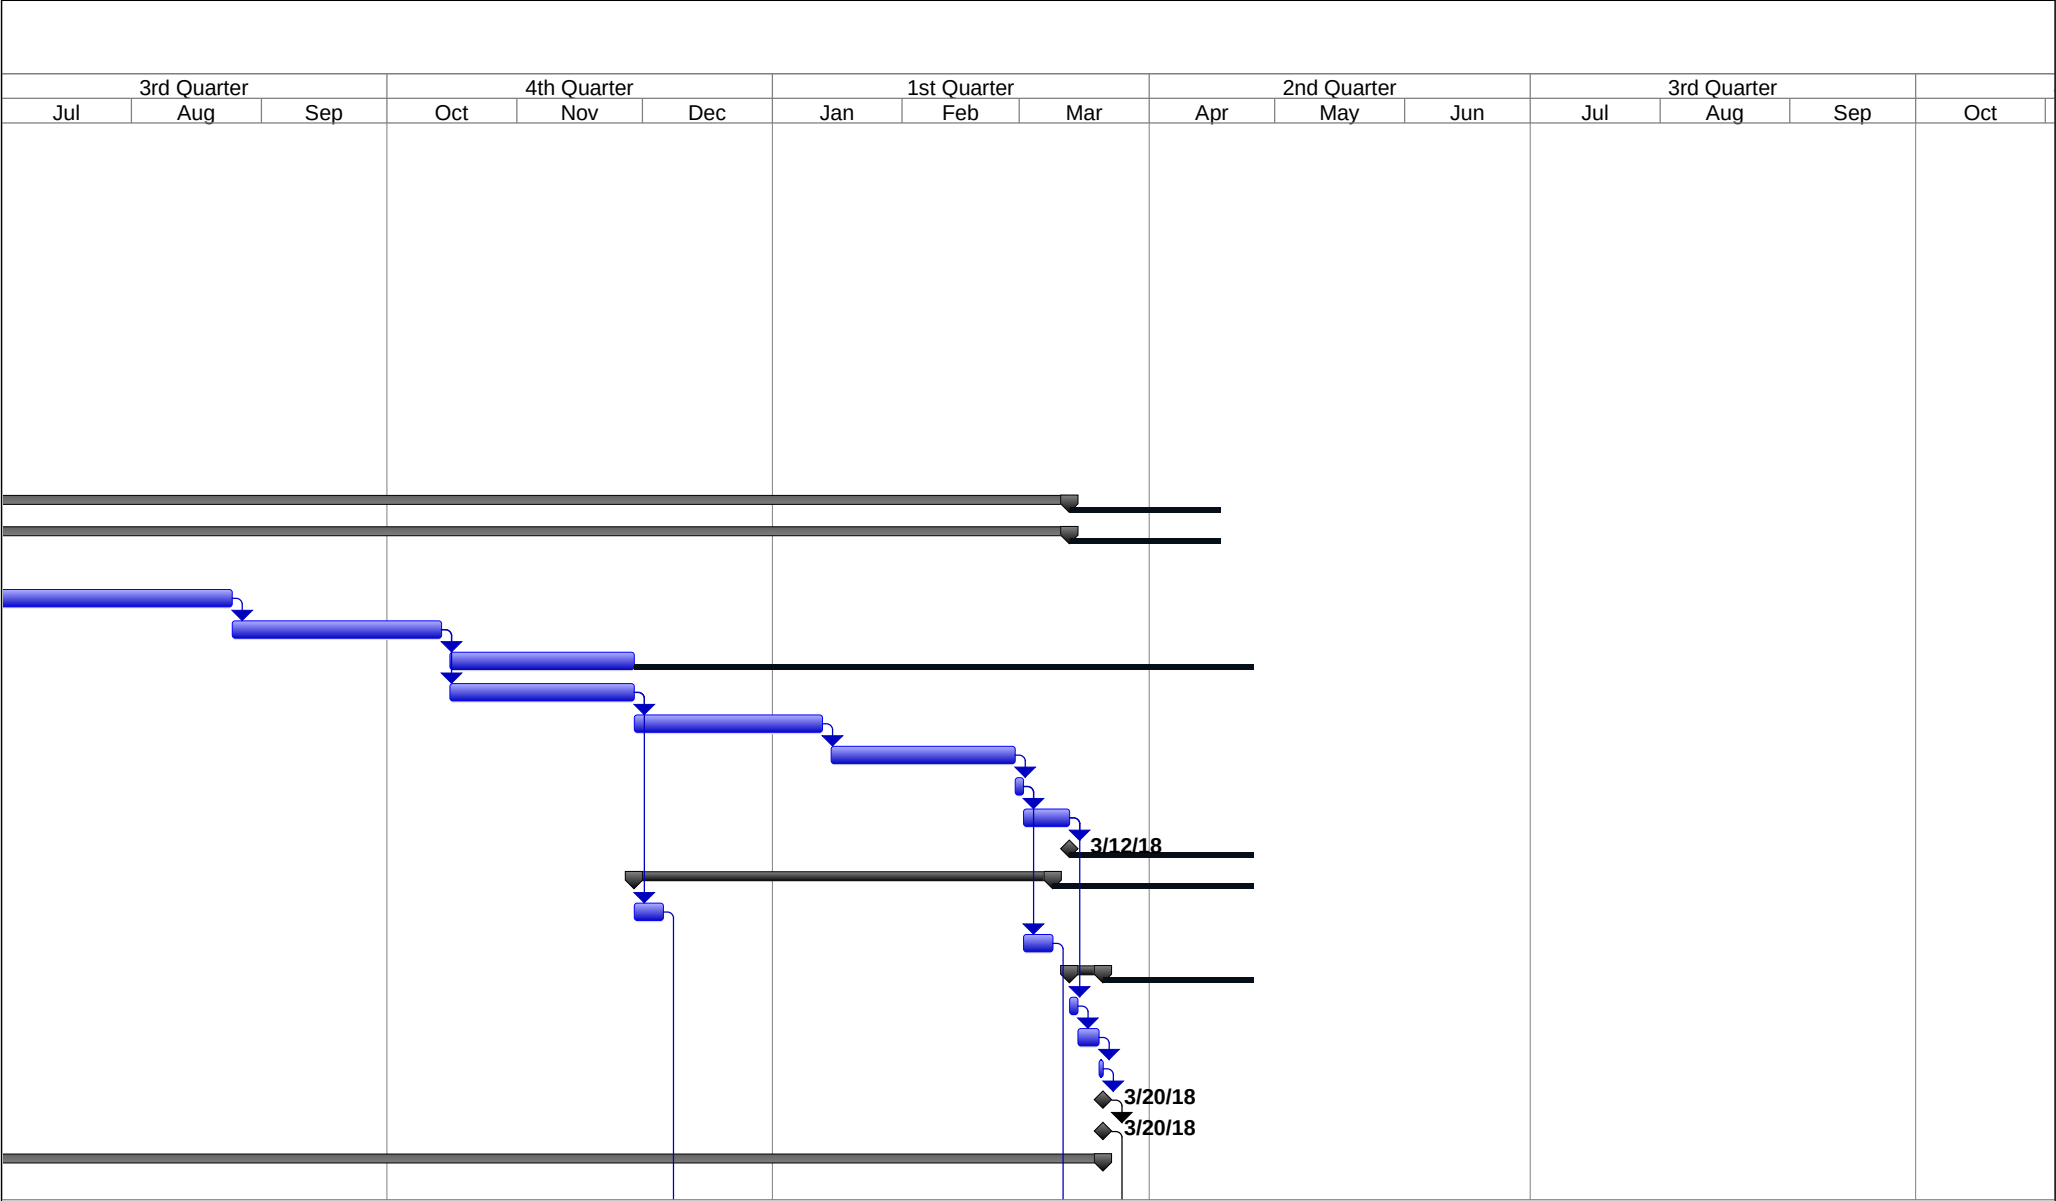


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

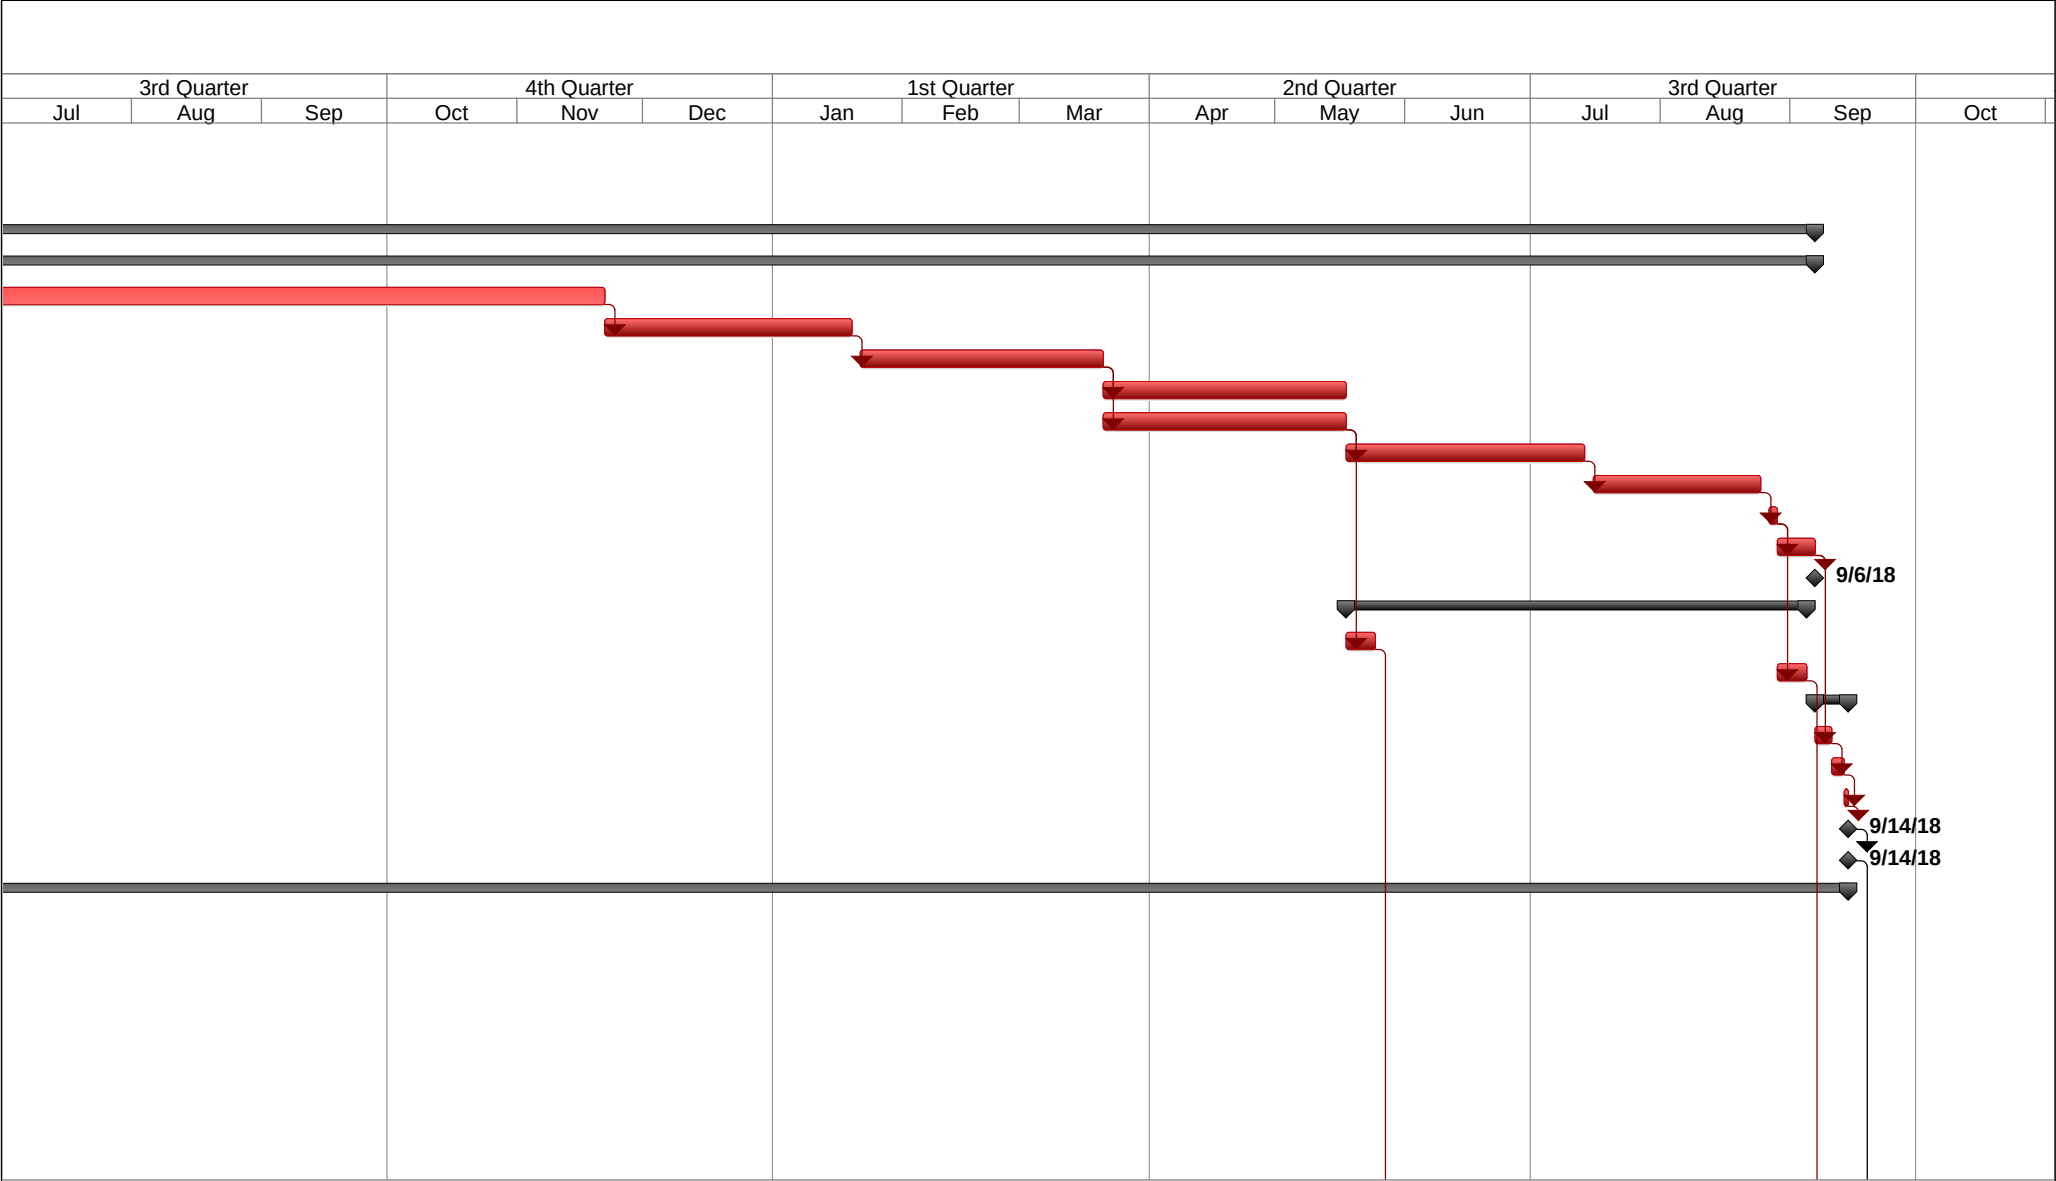


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

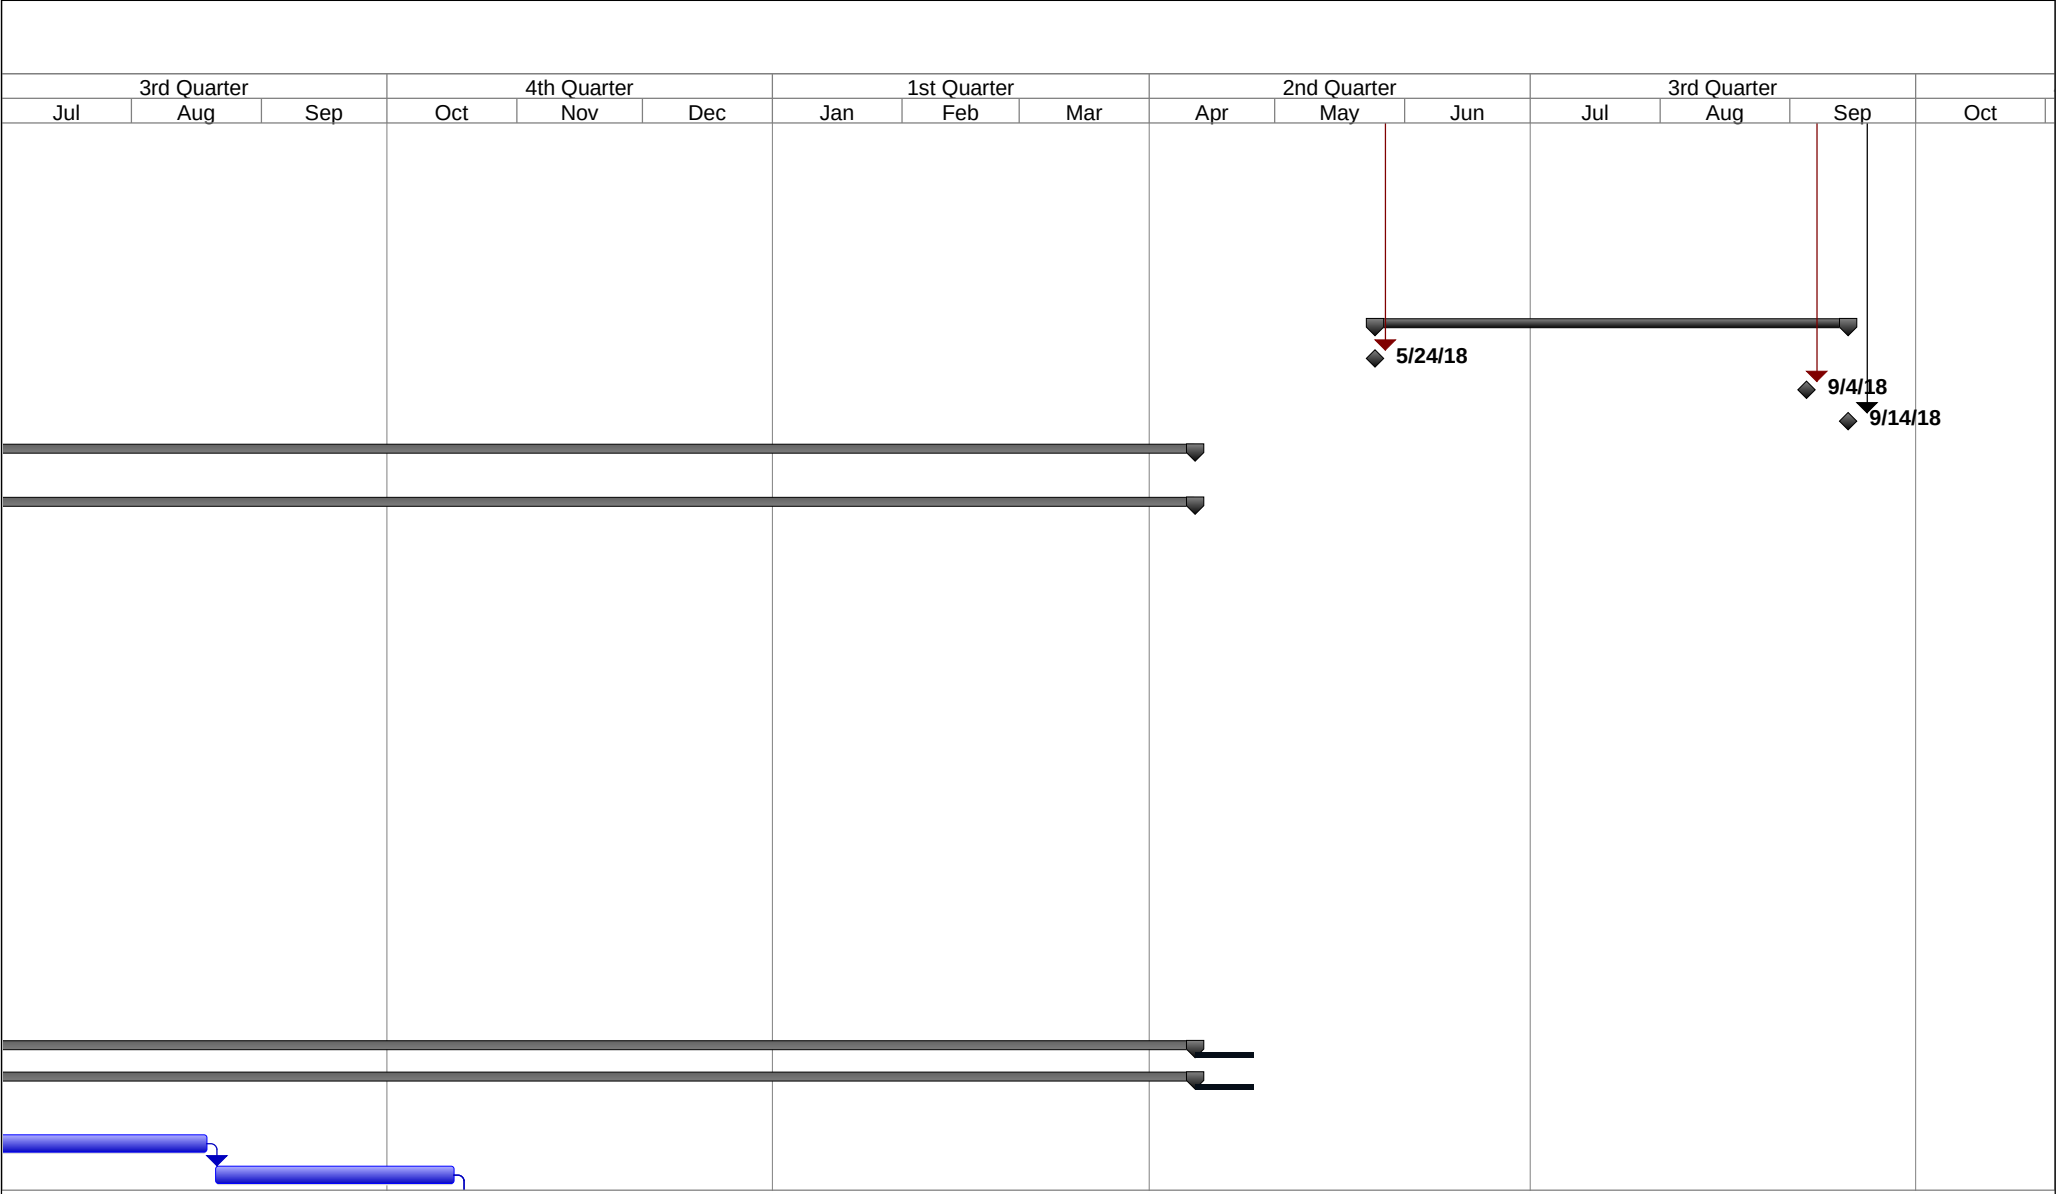



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

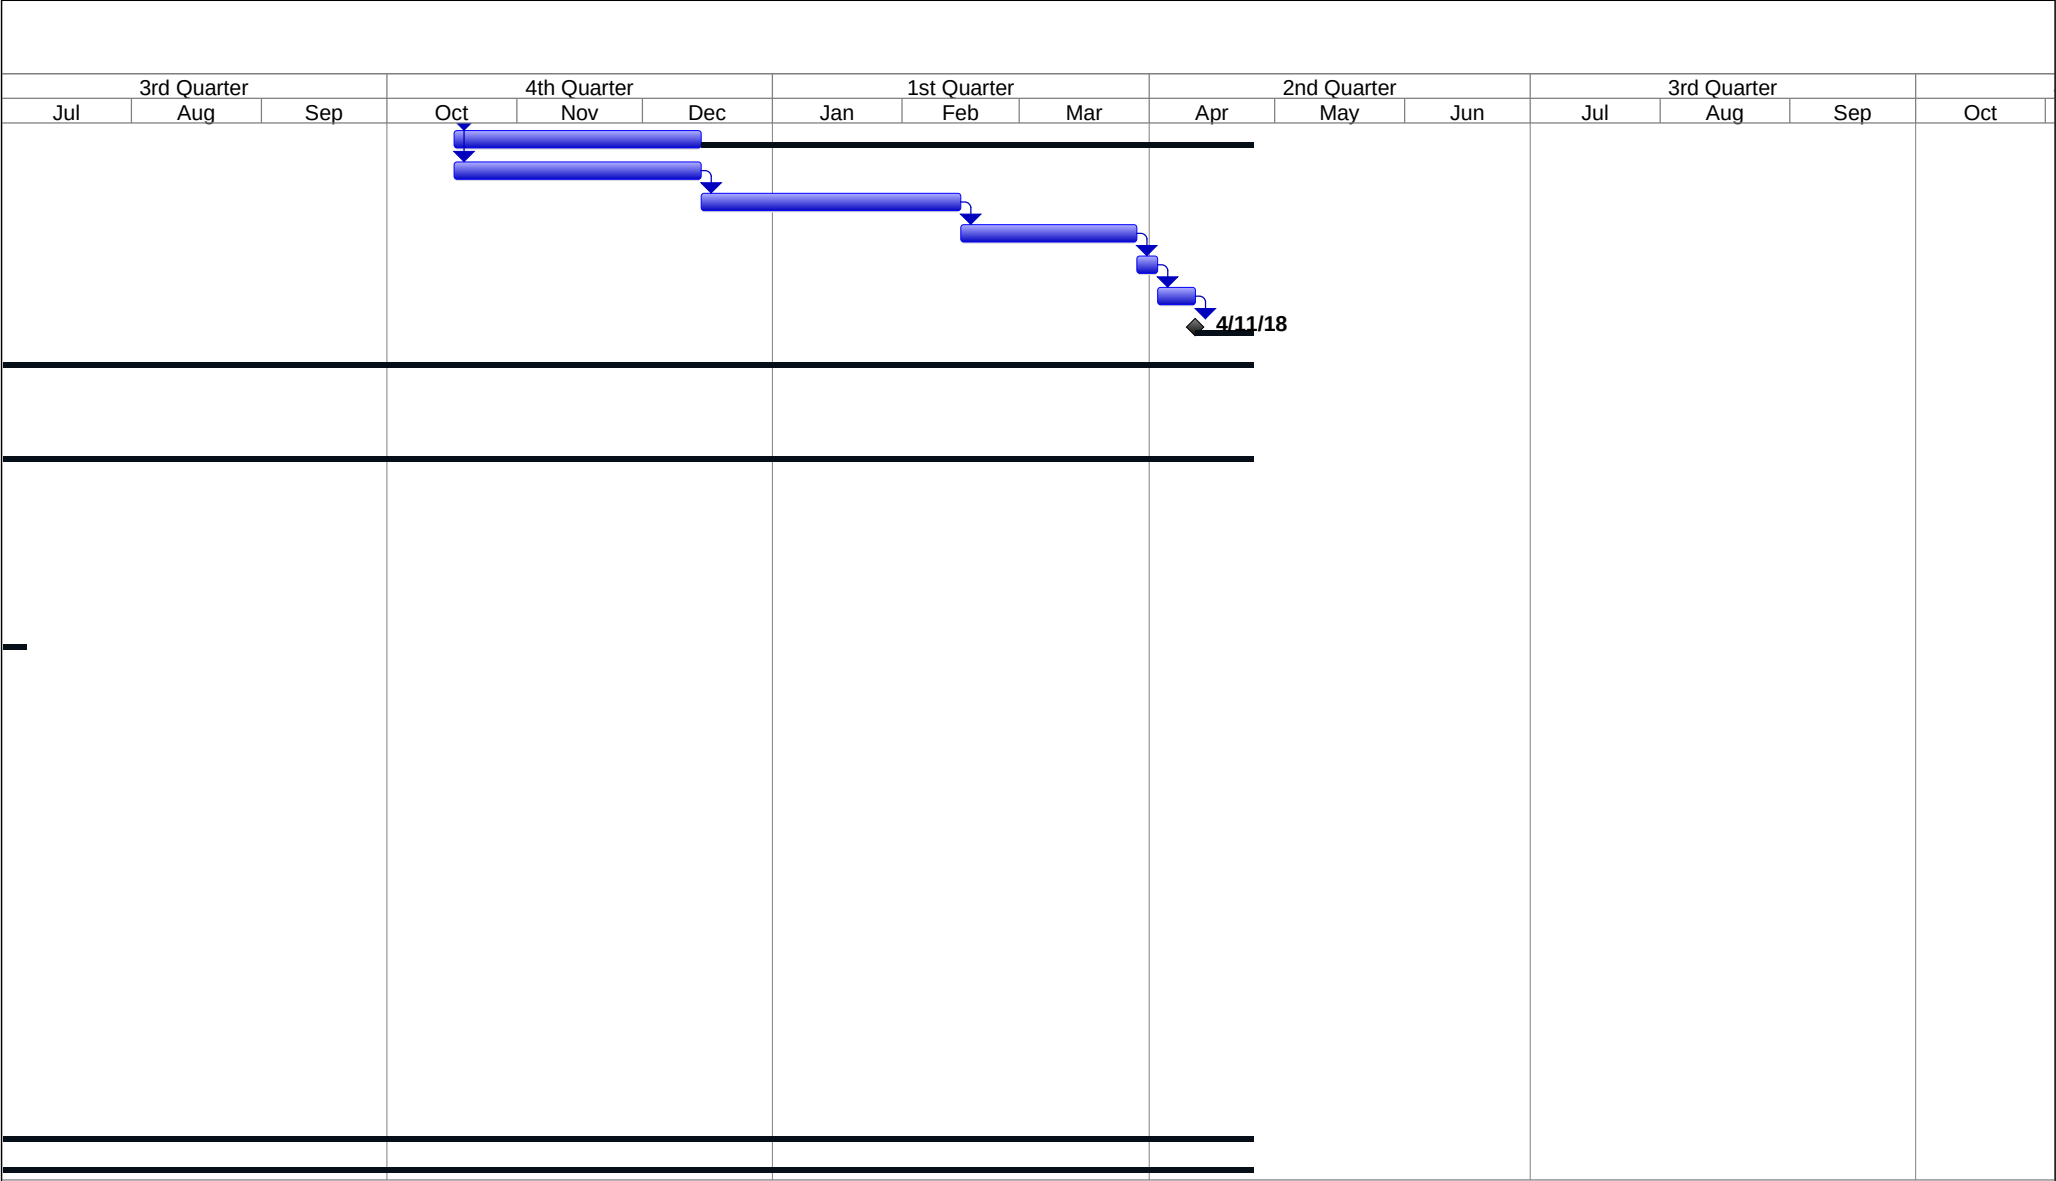


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


| 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |
|             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |     |




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

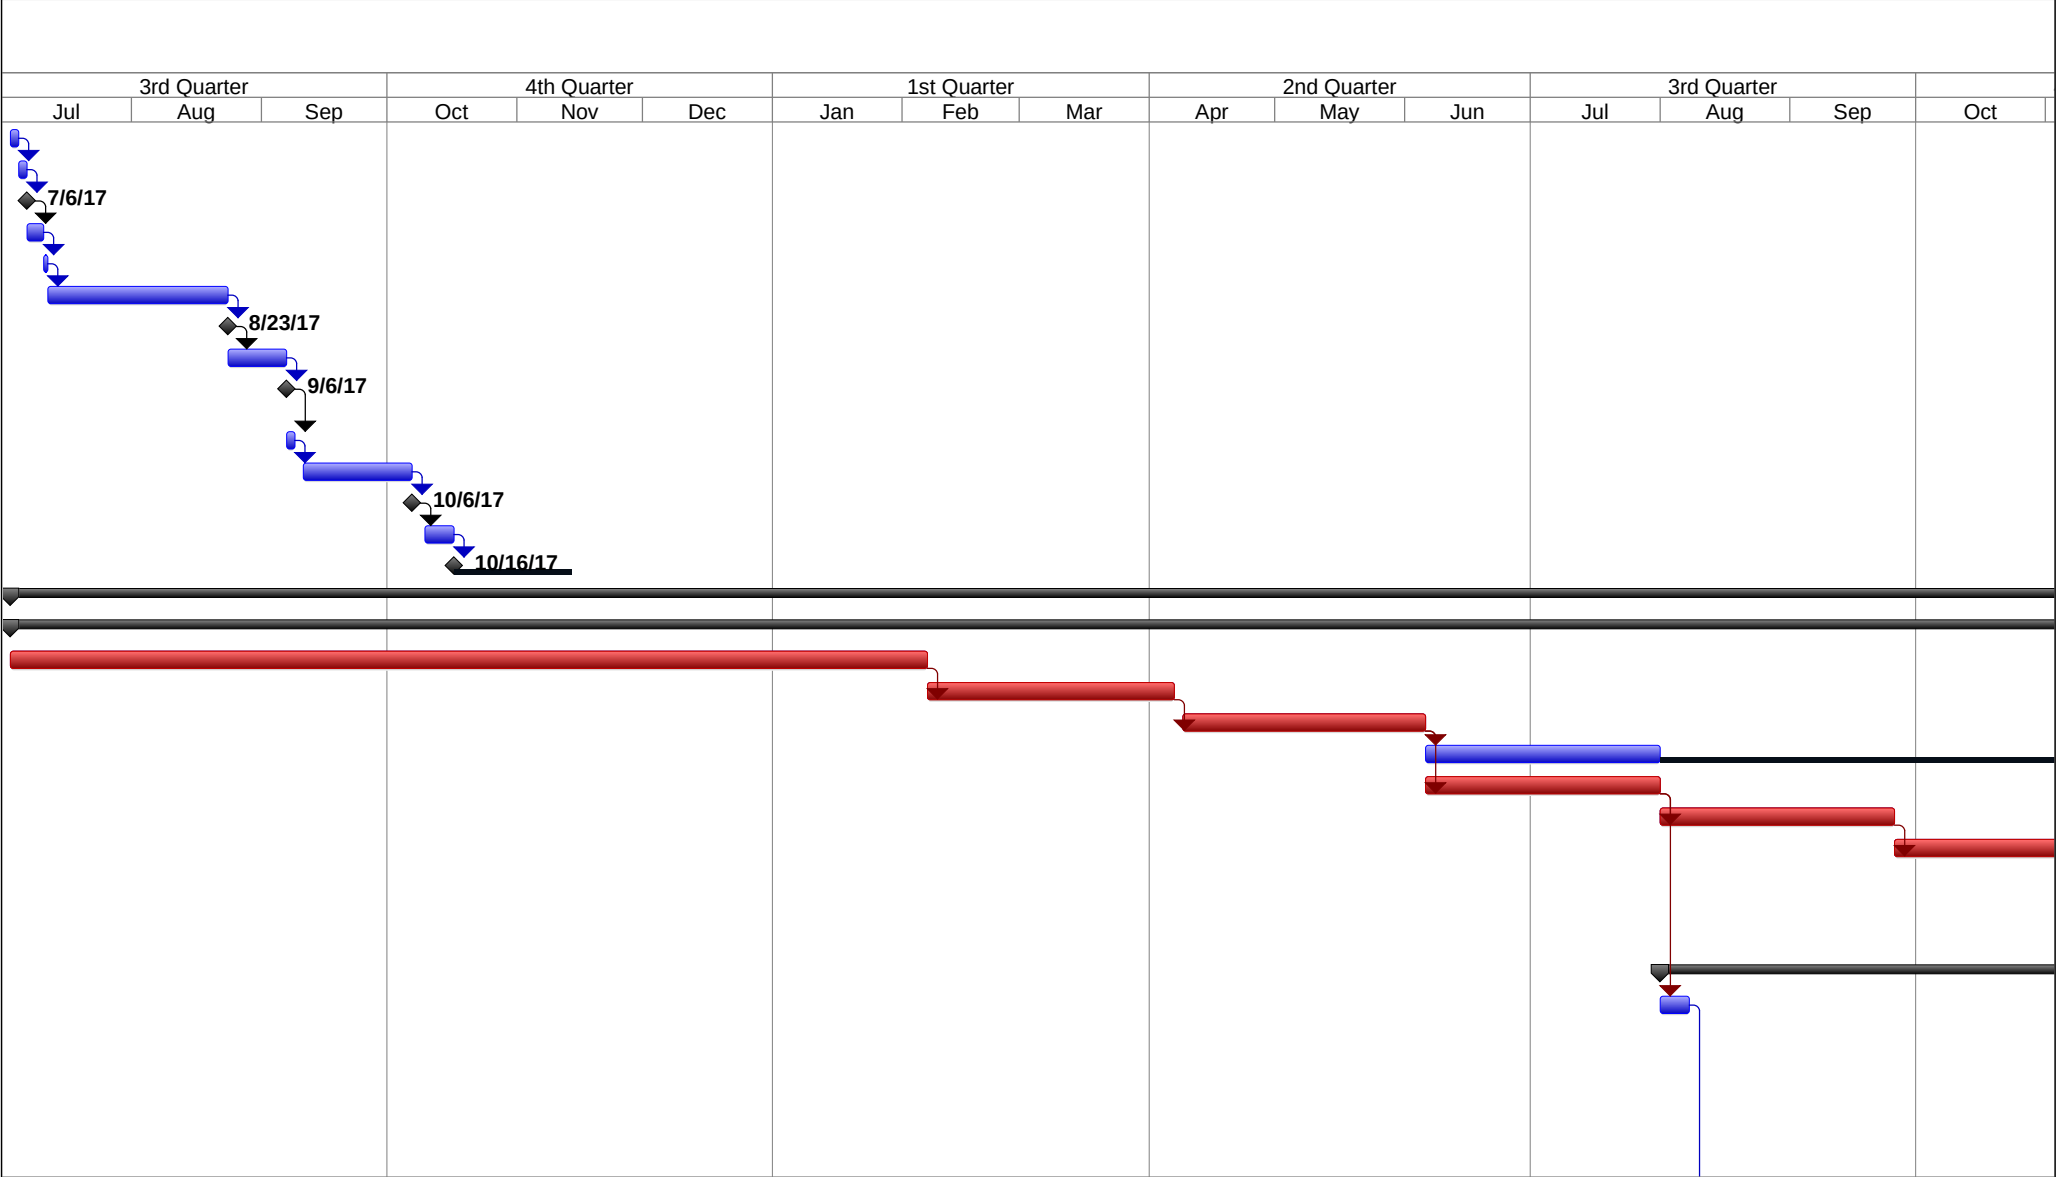


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

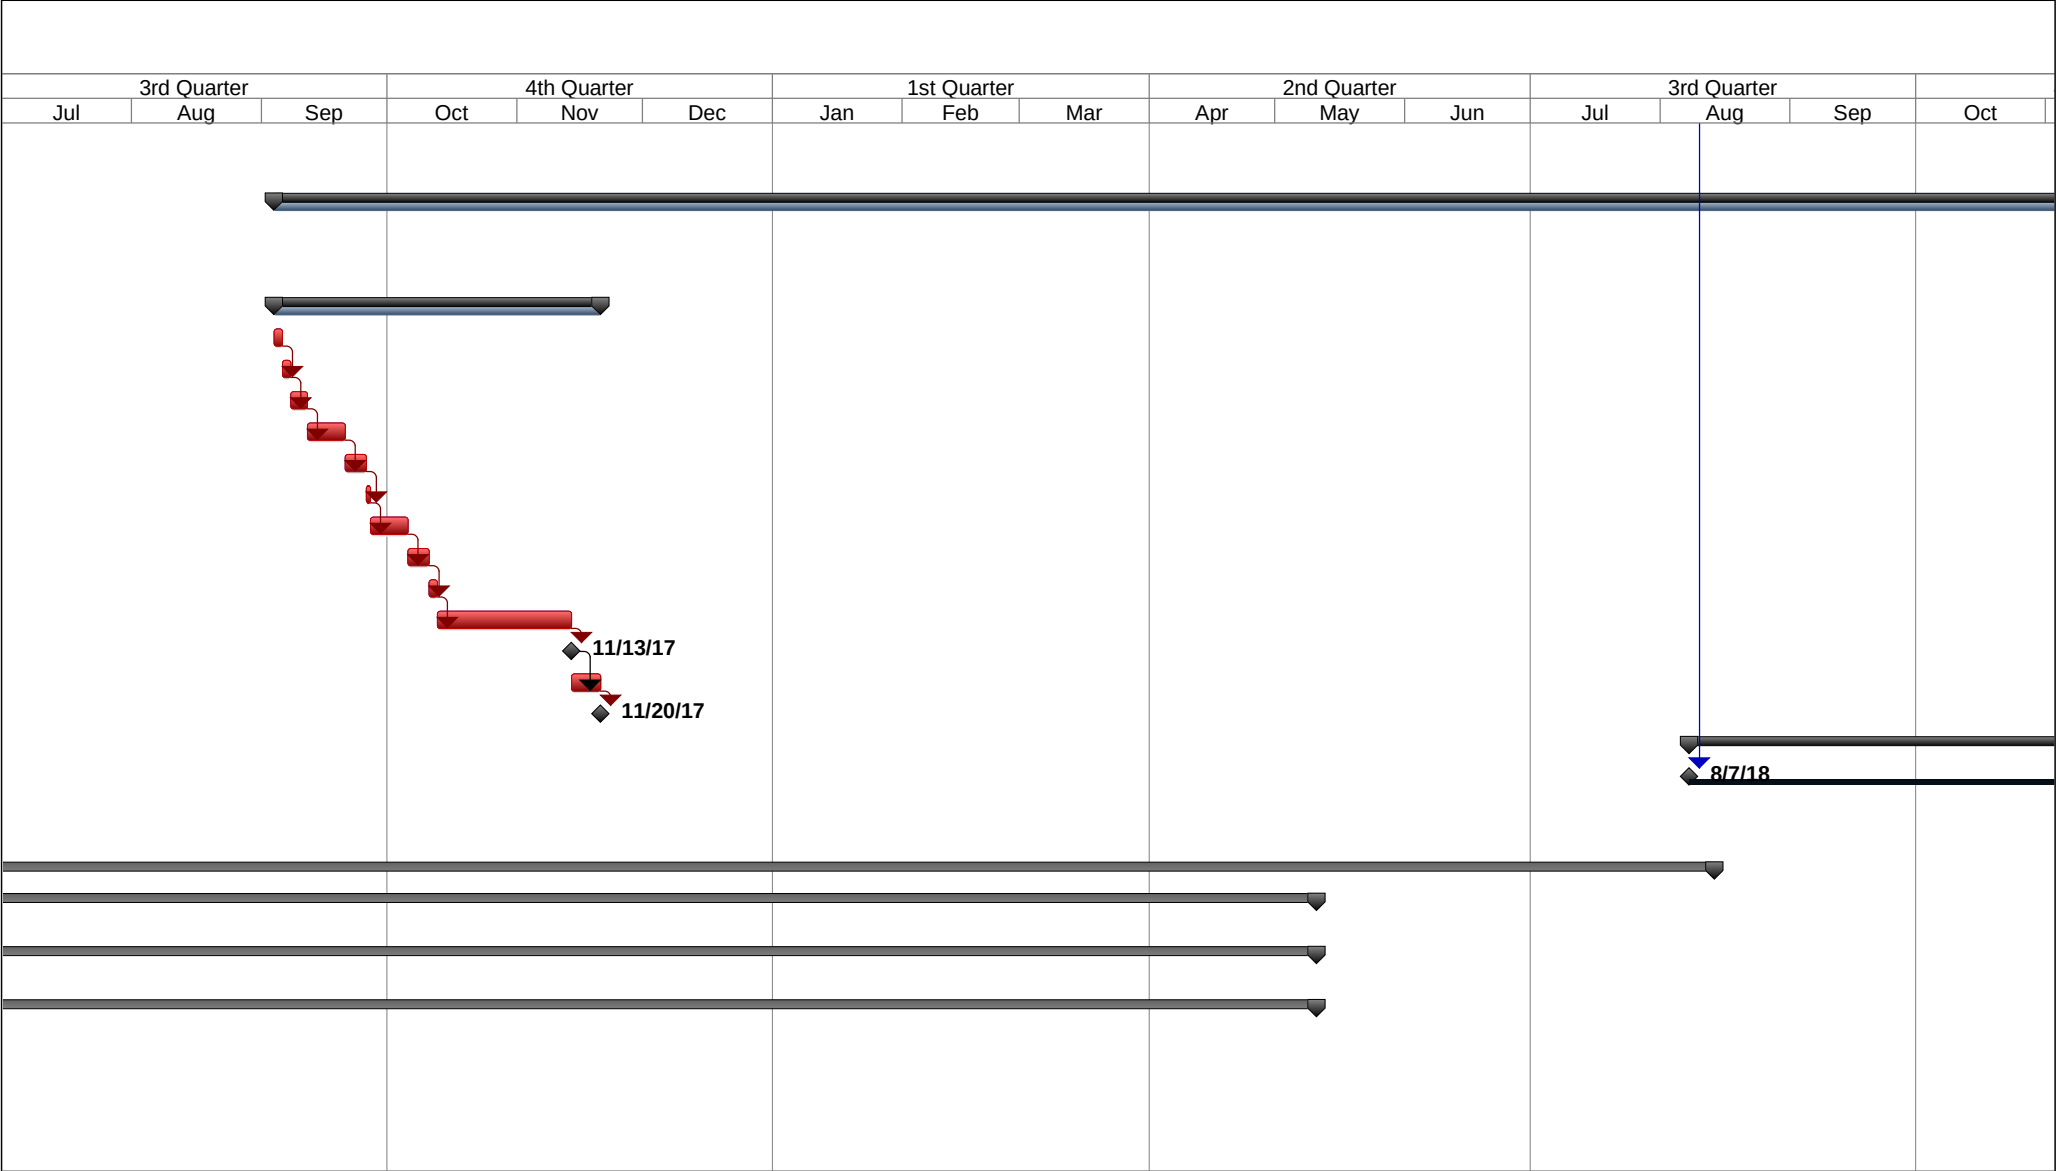


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

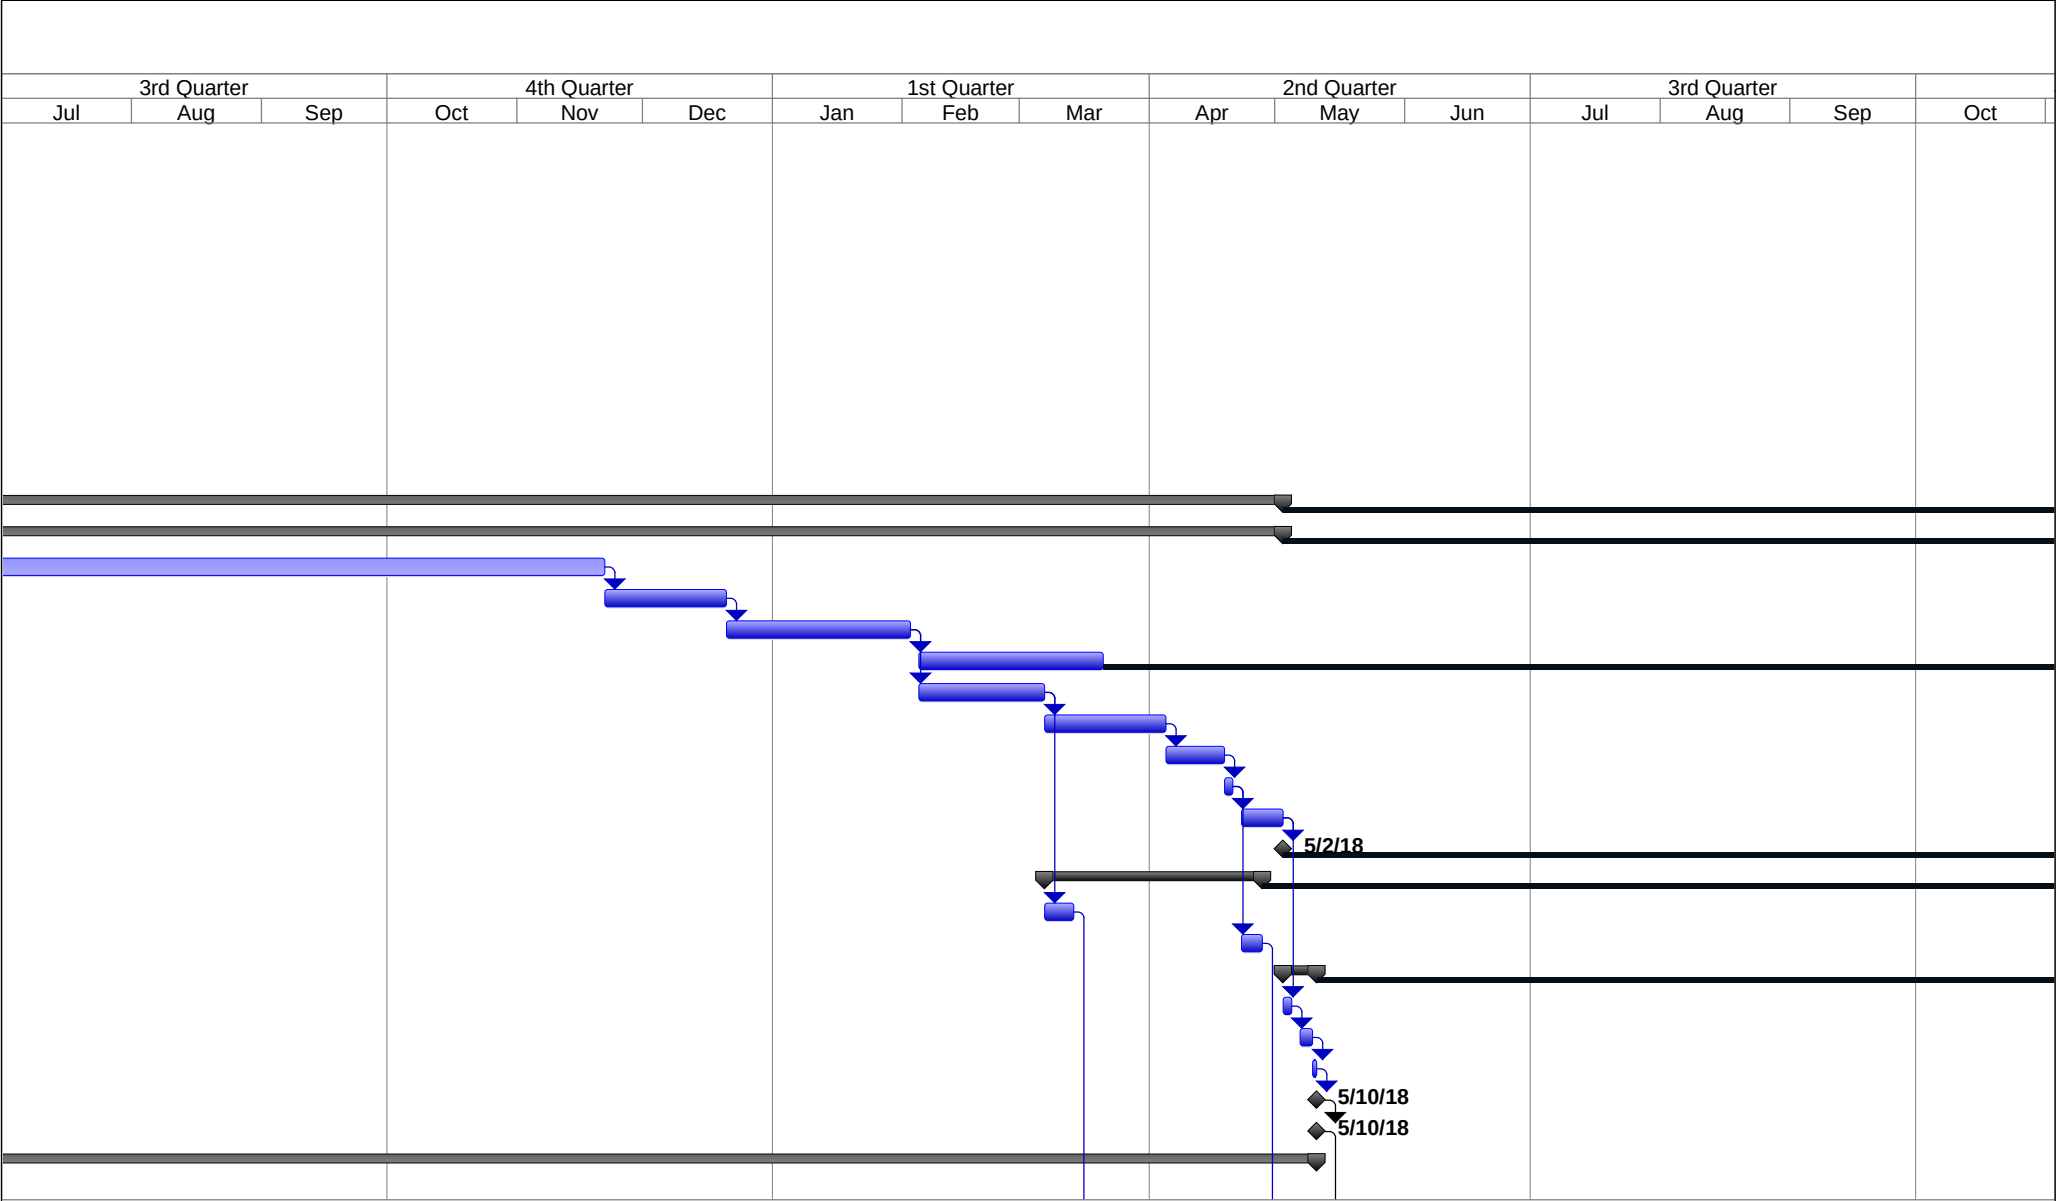

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

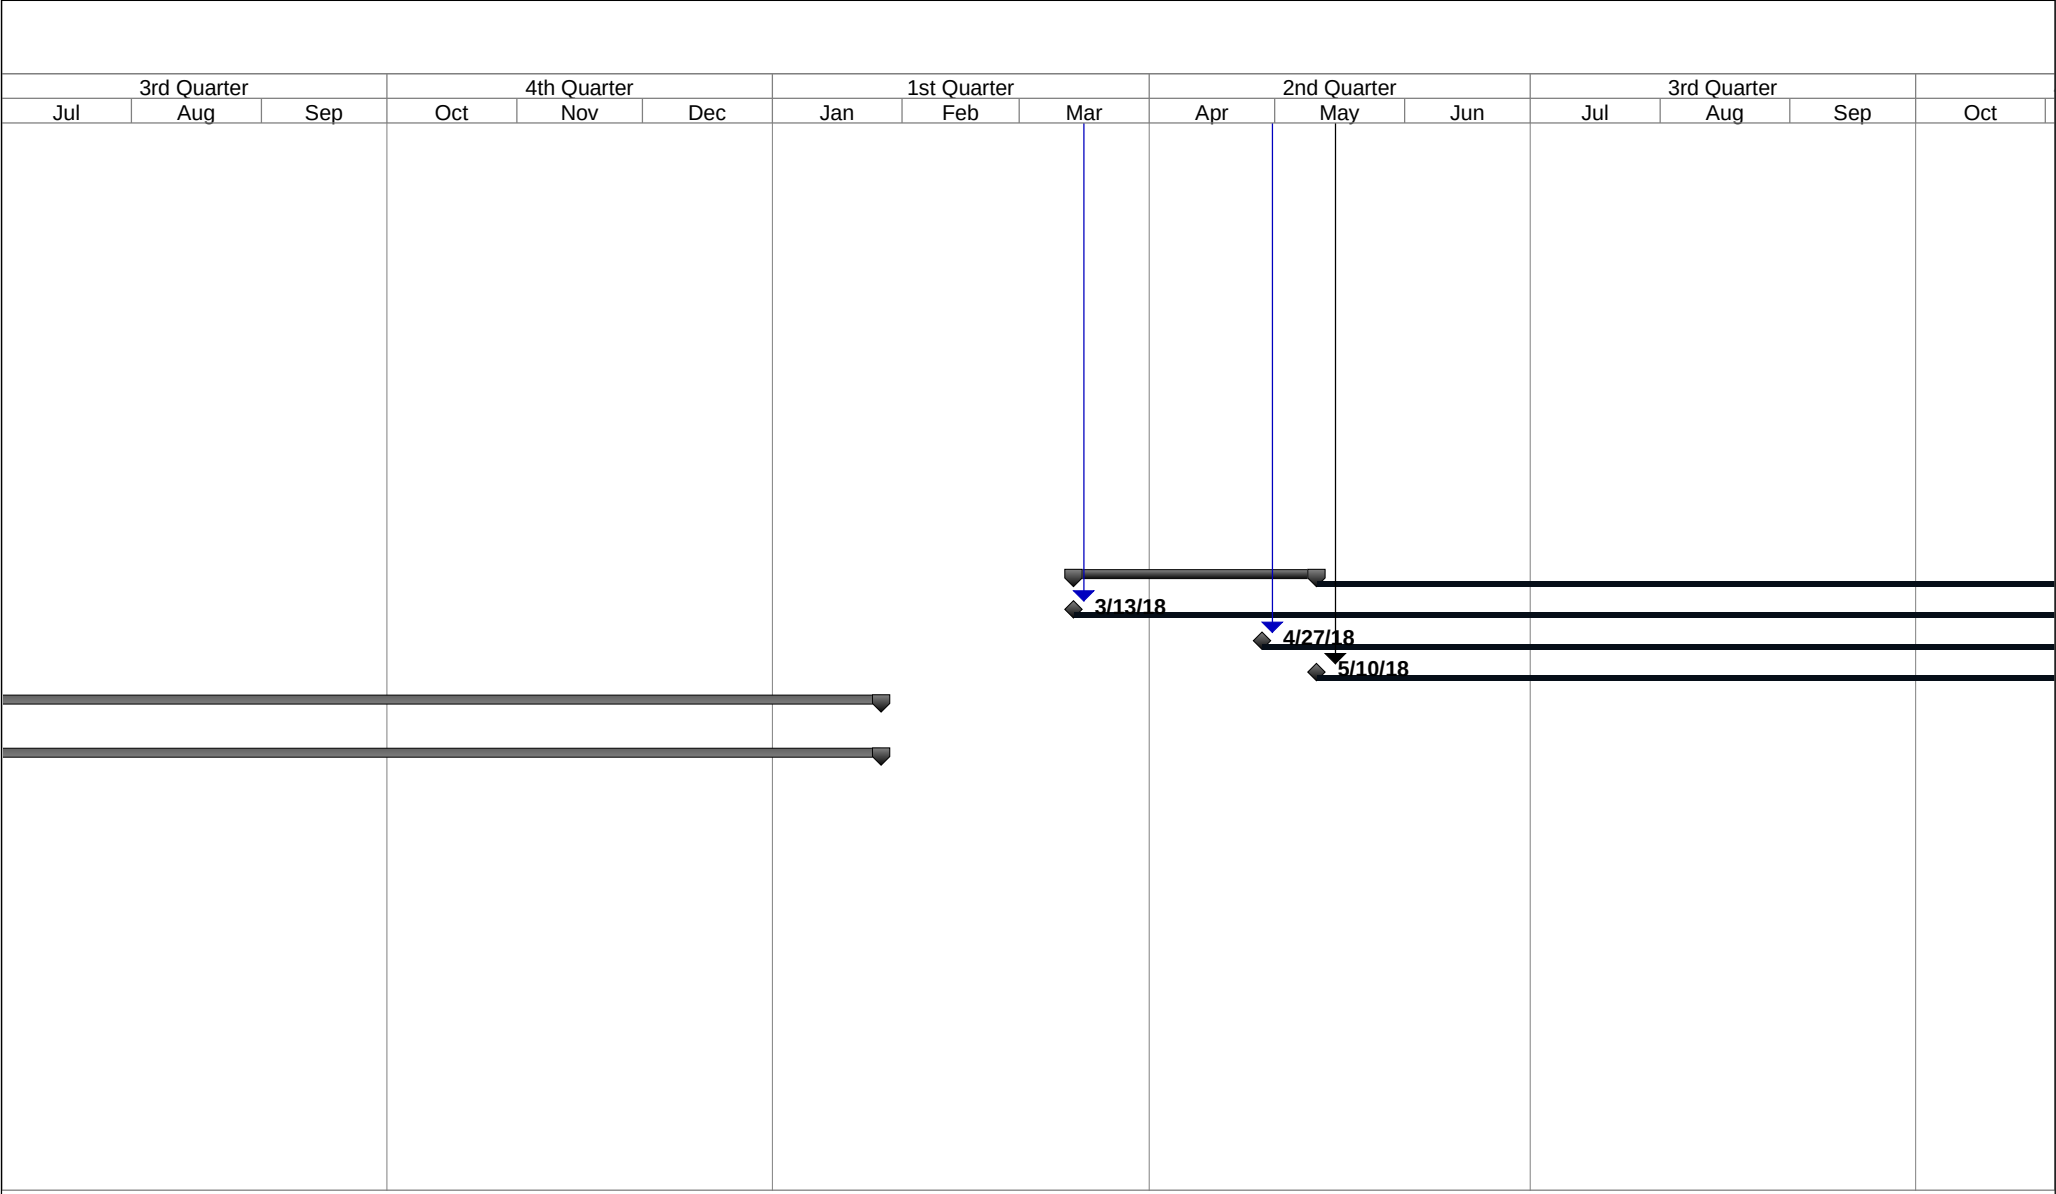


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

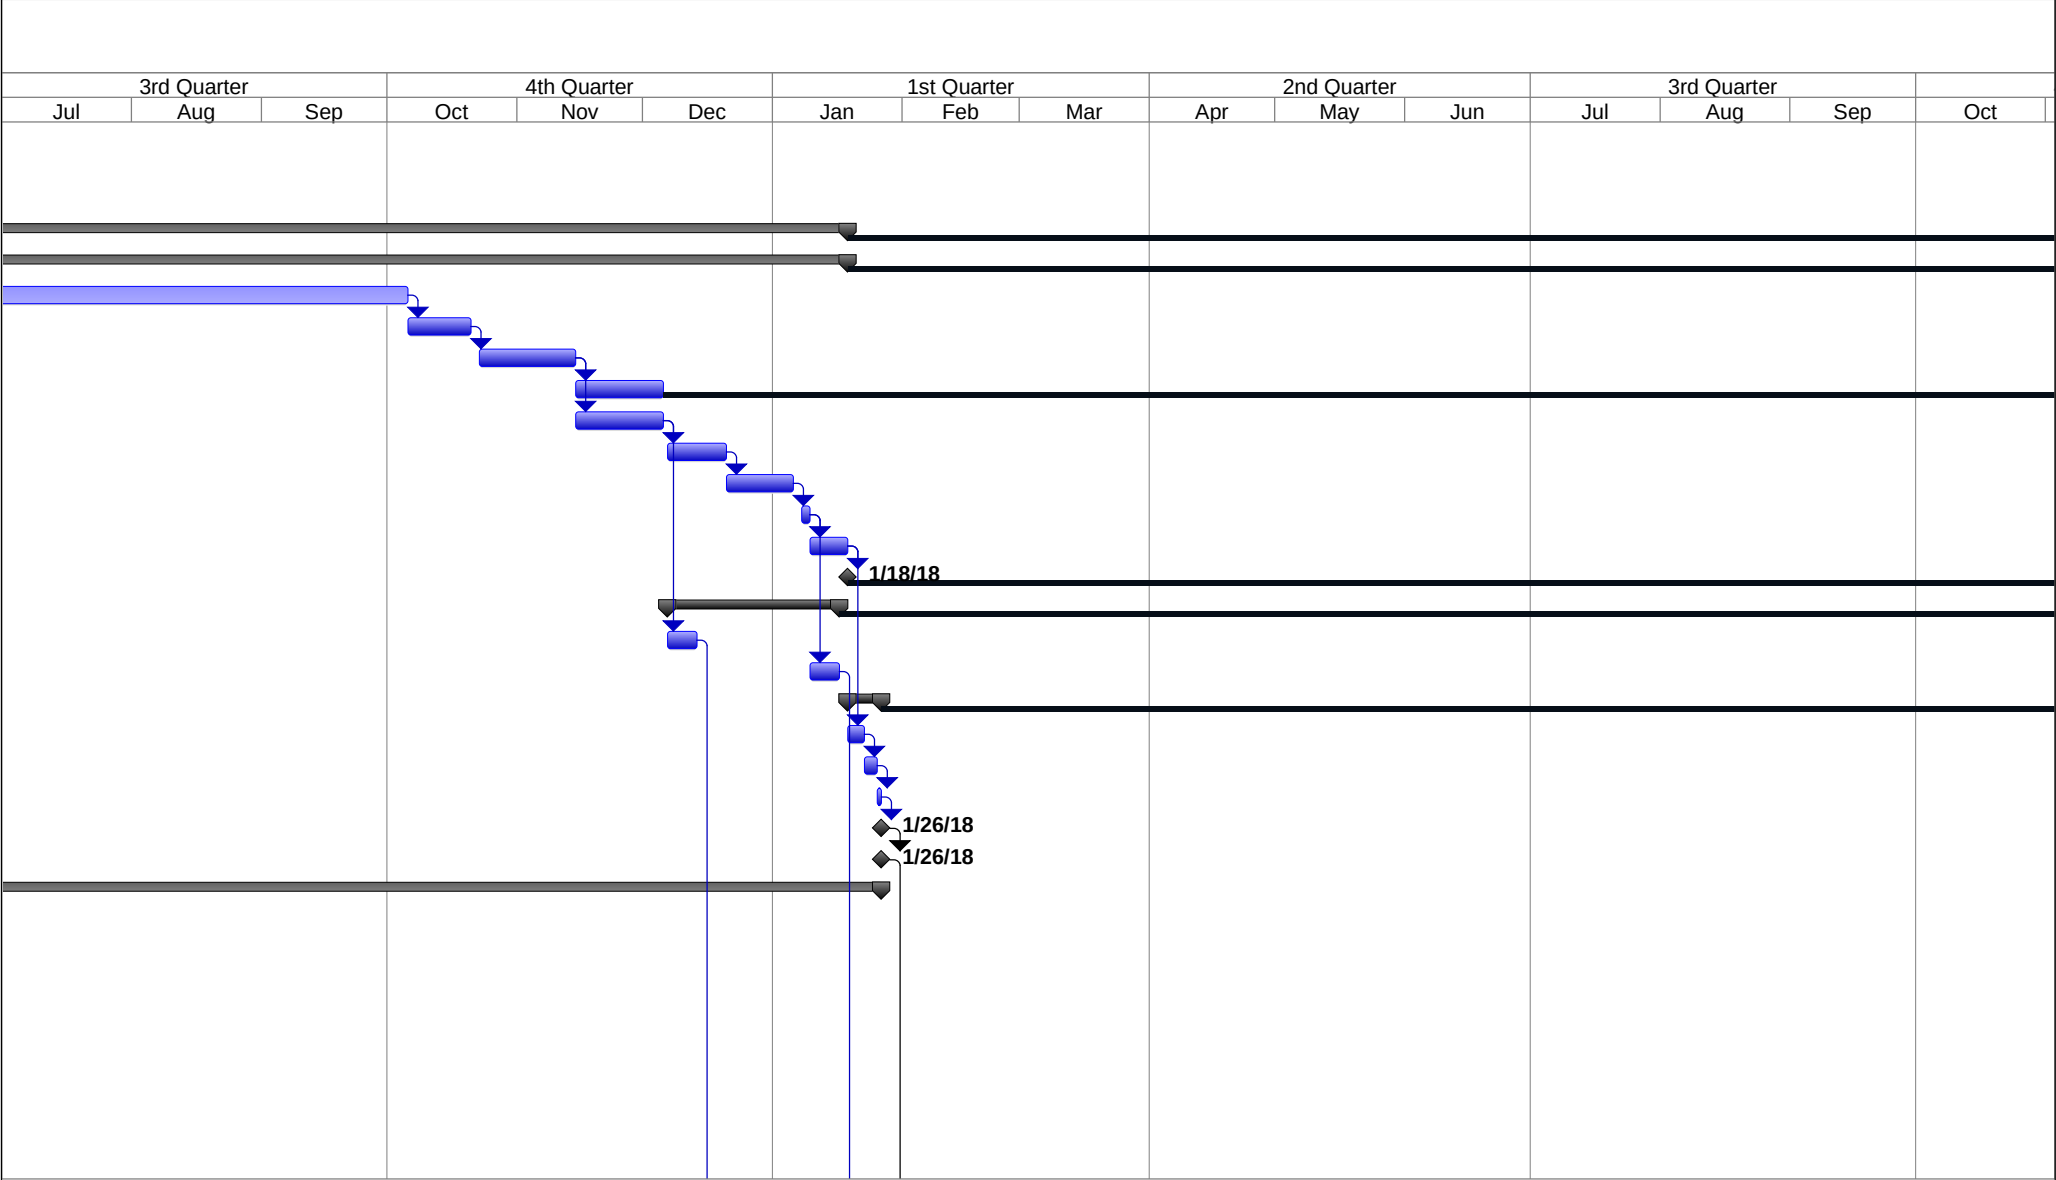





Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

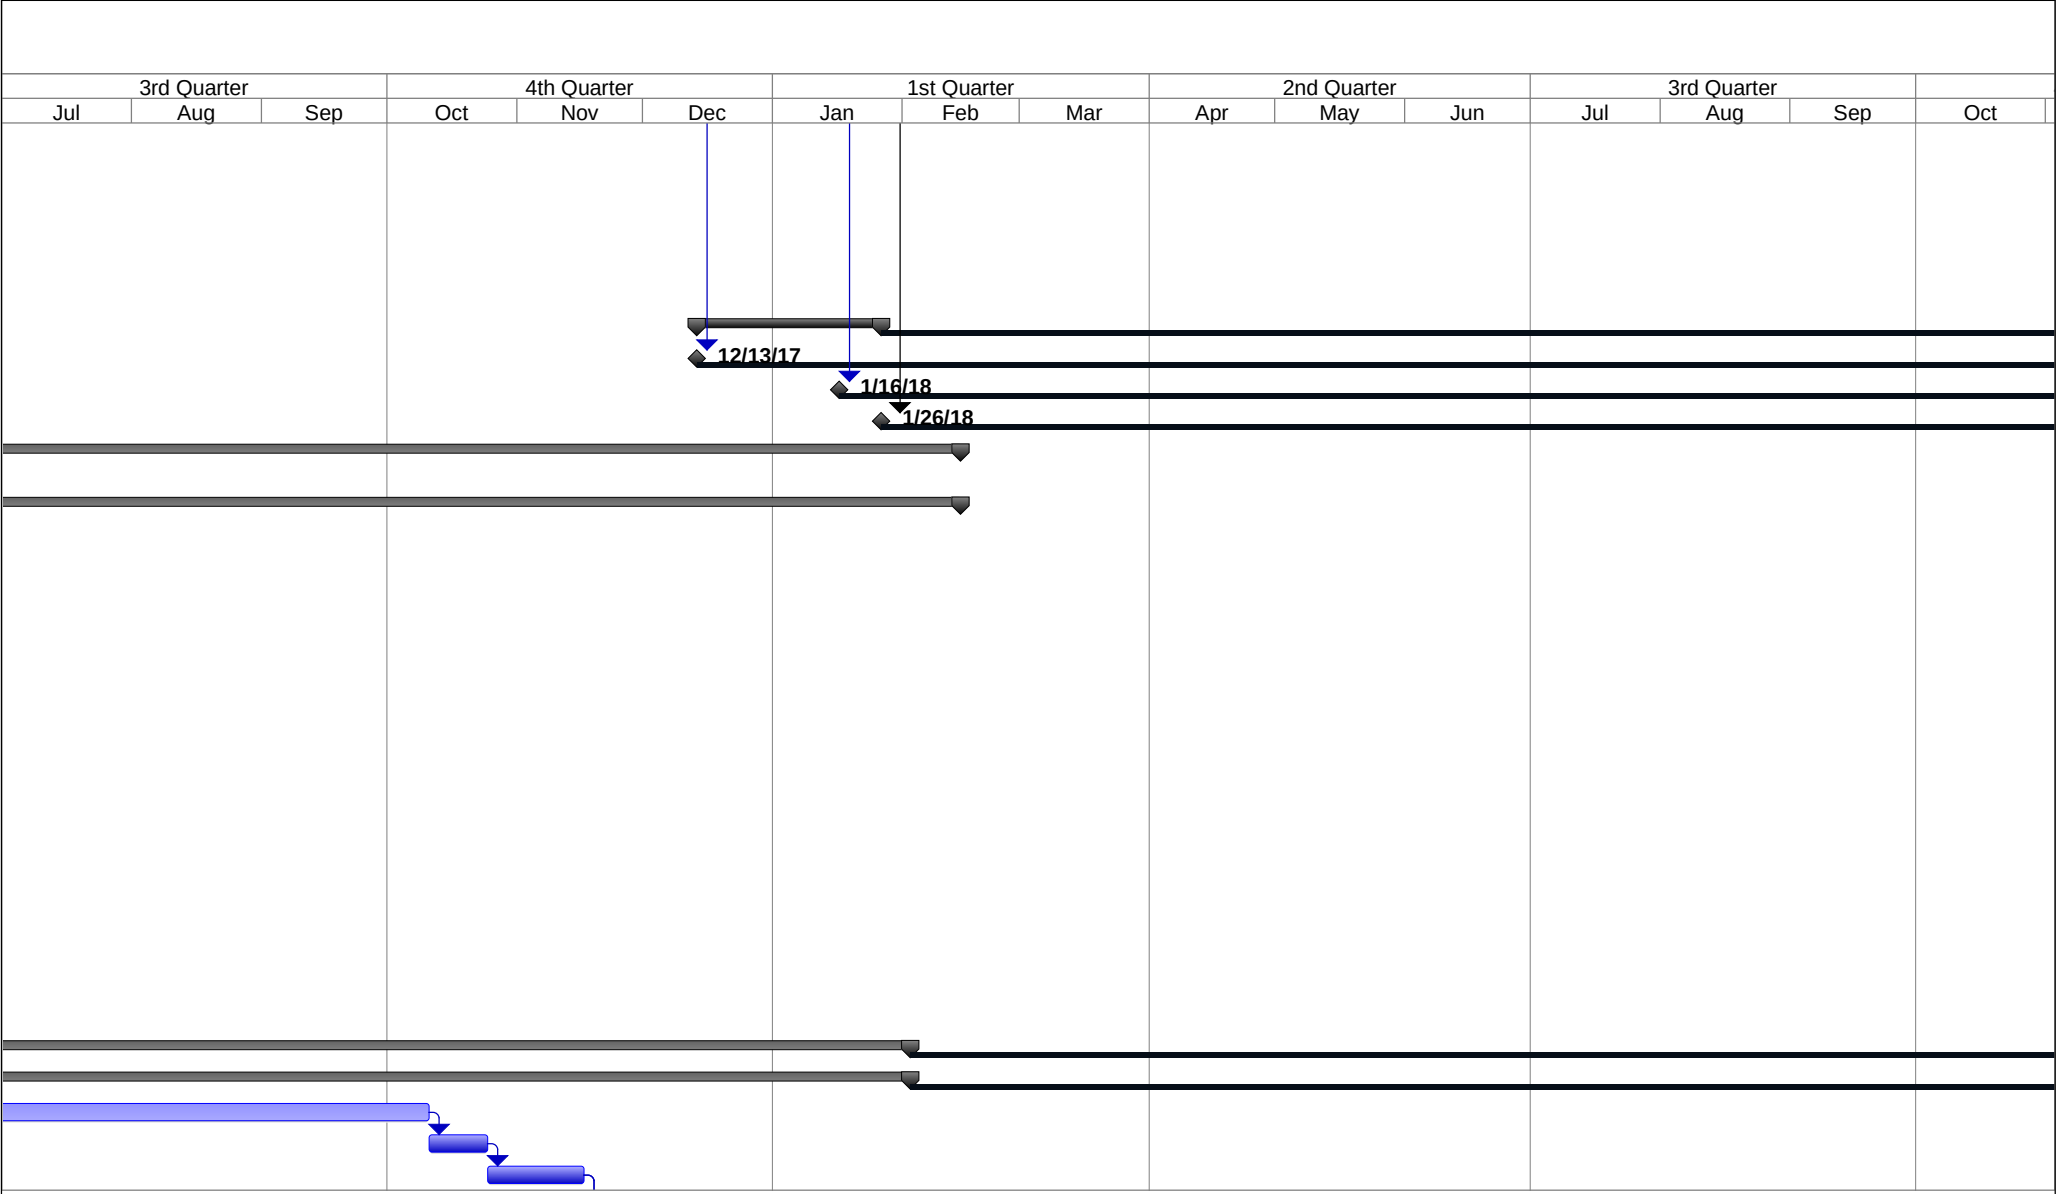

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

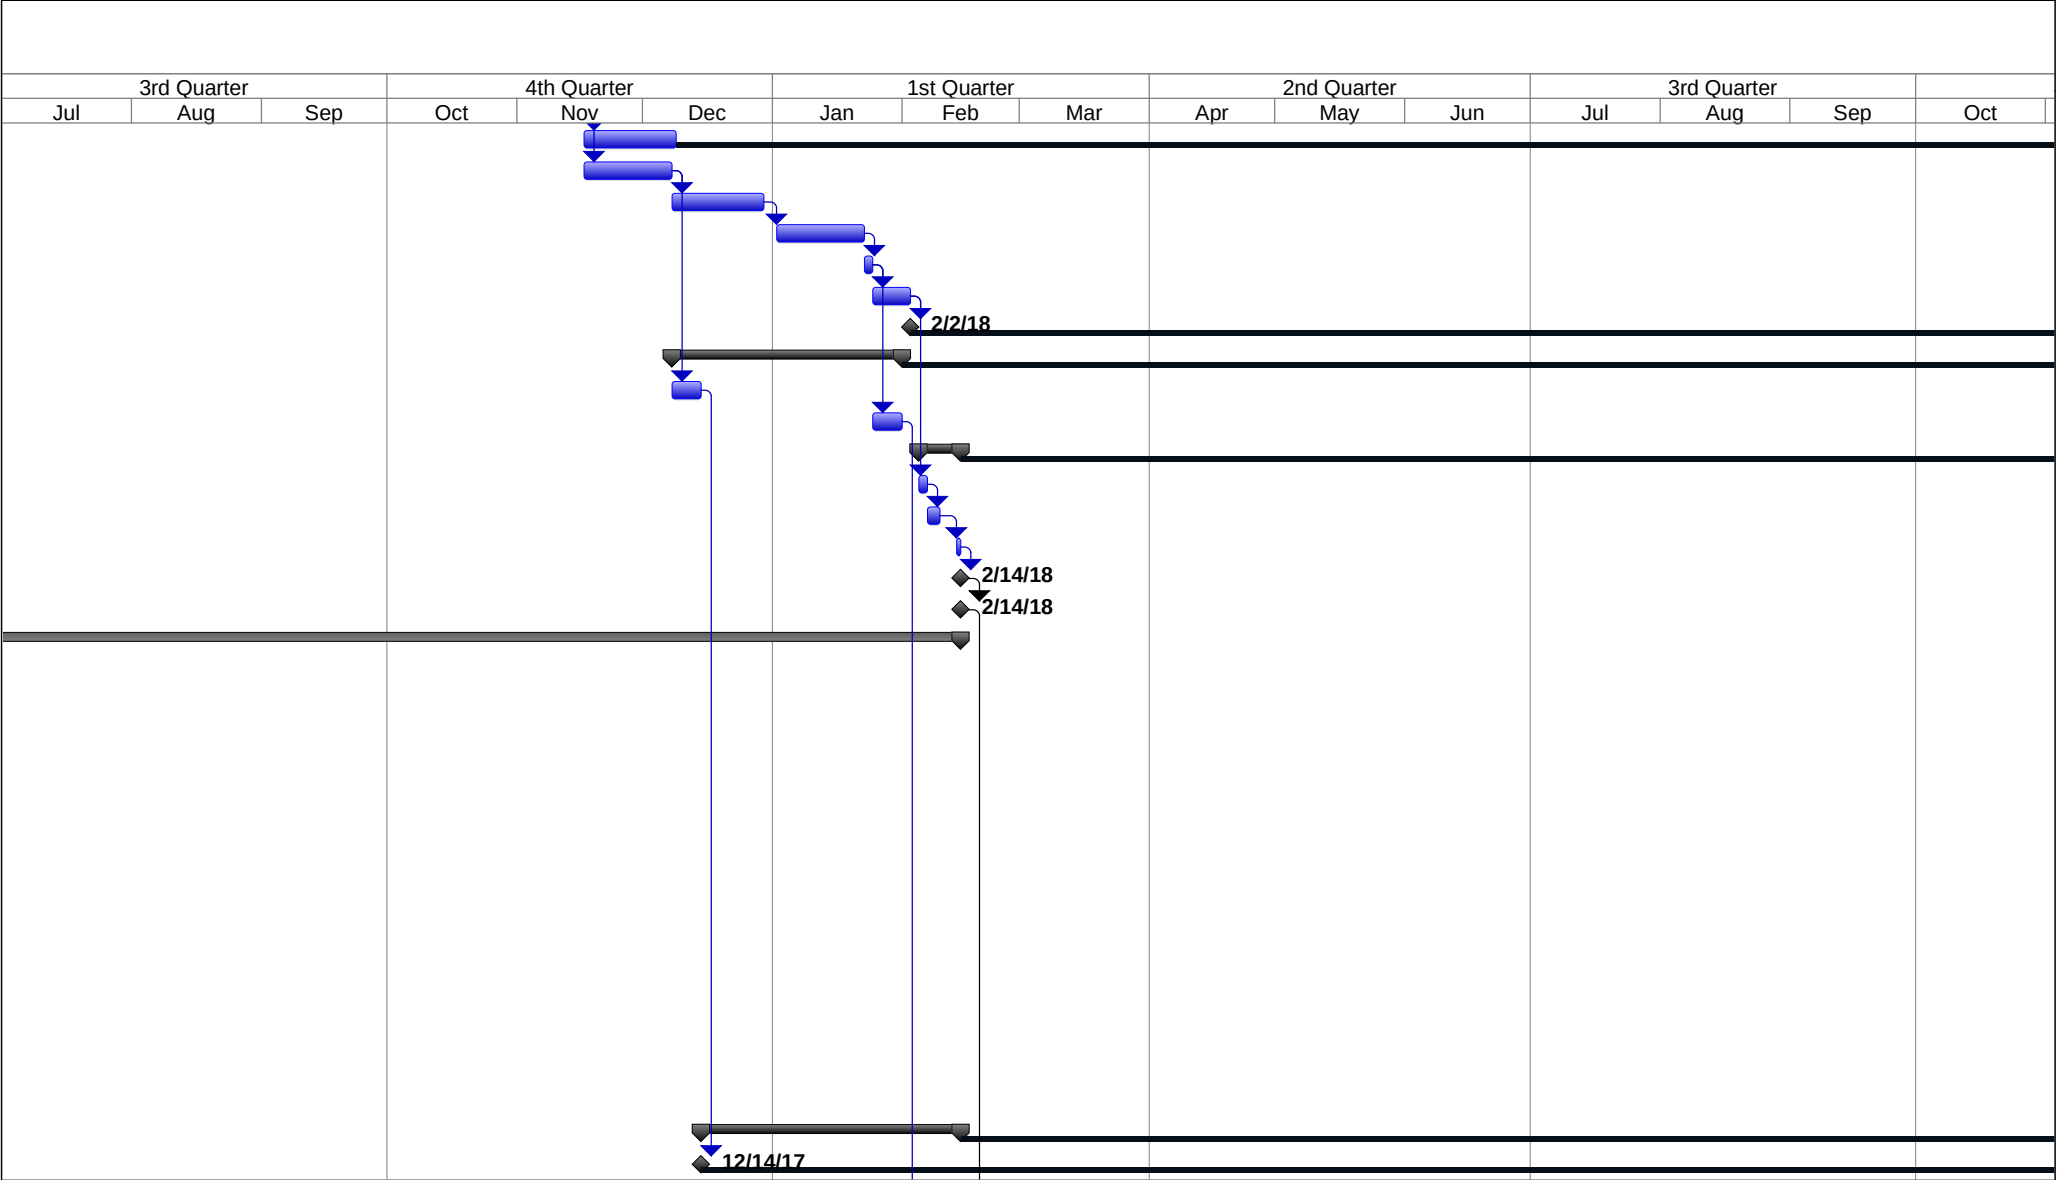


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

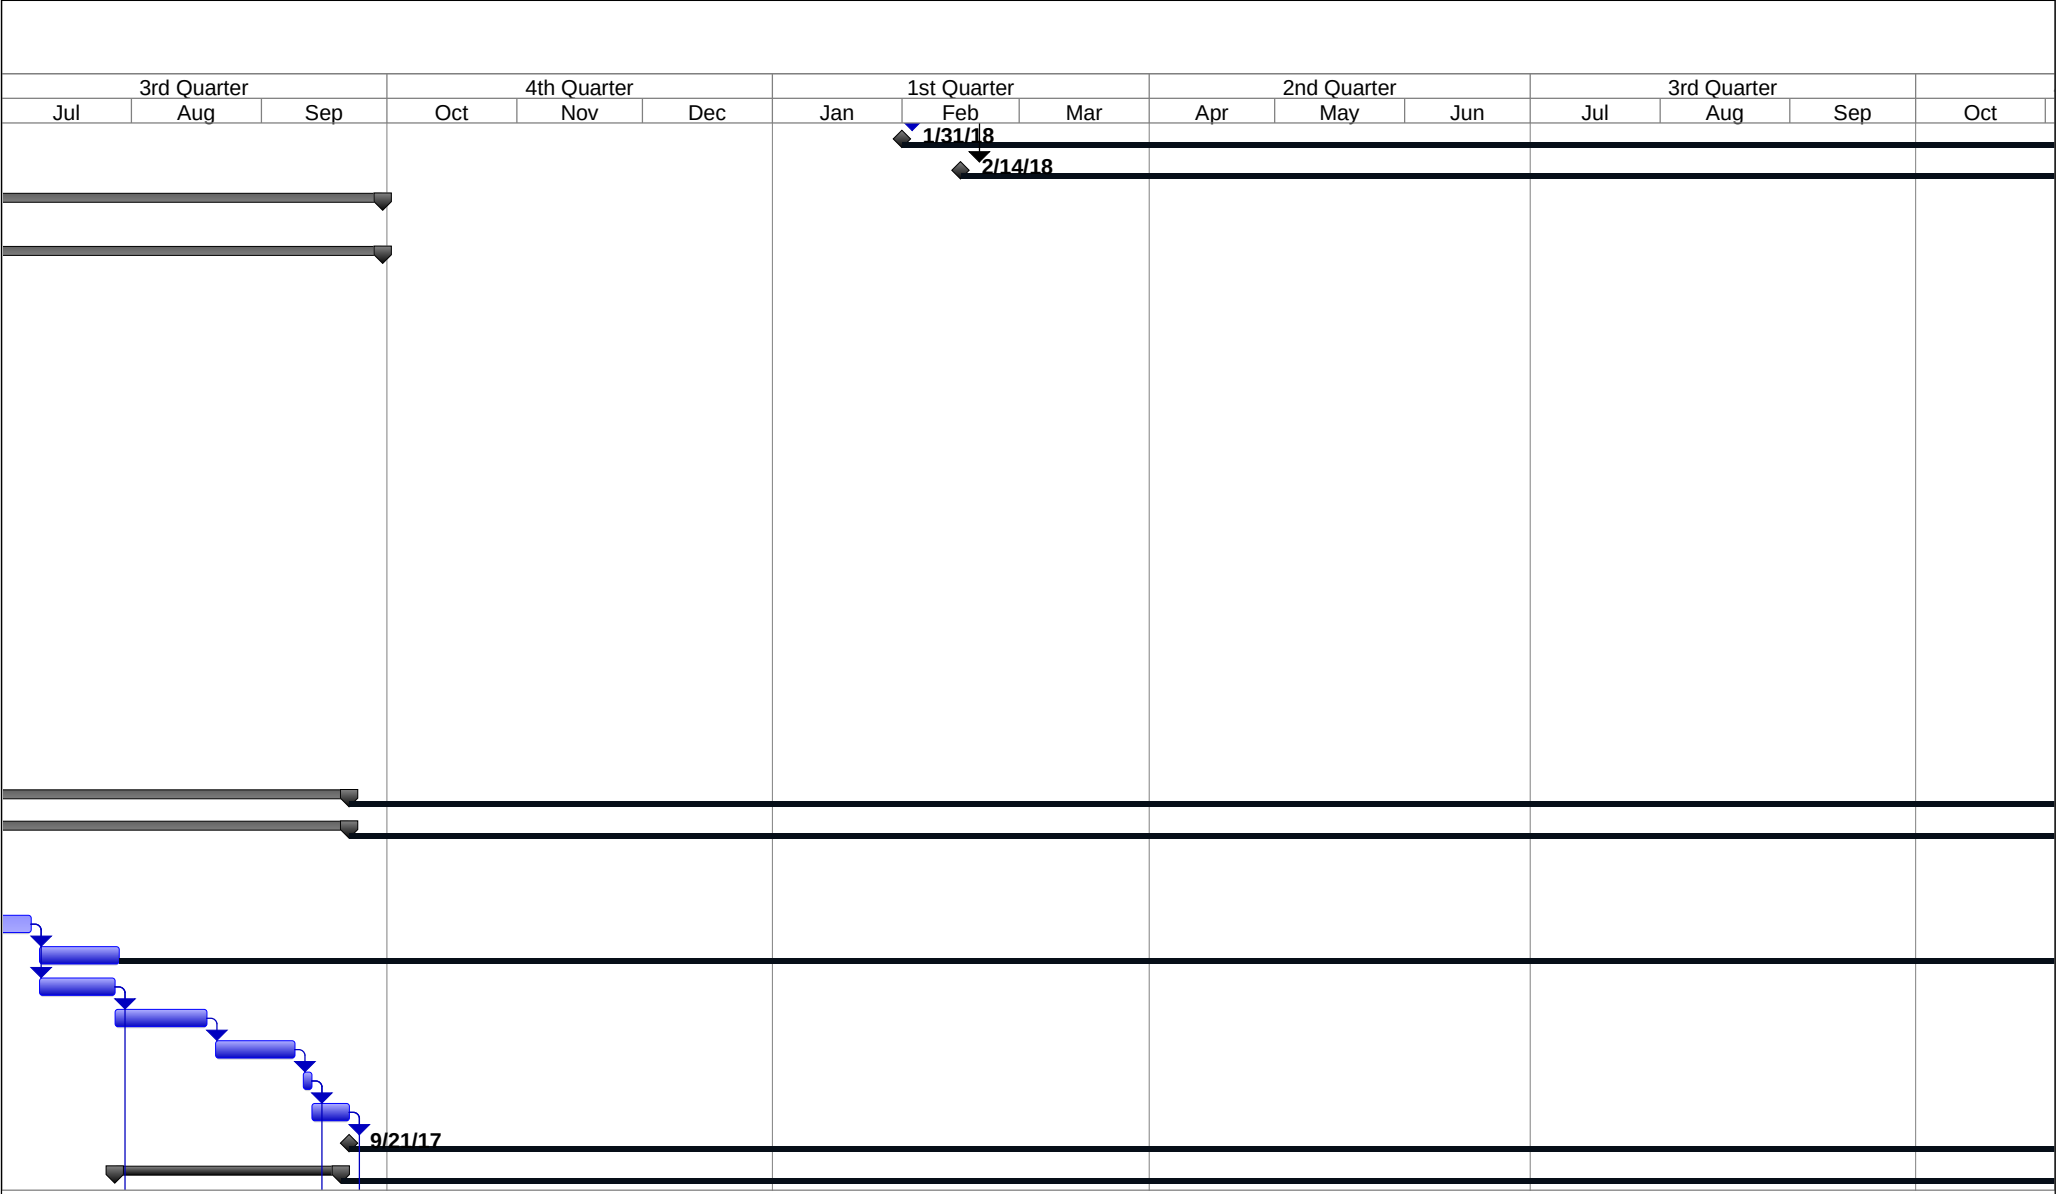





Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

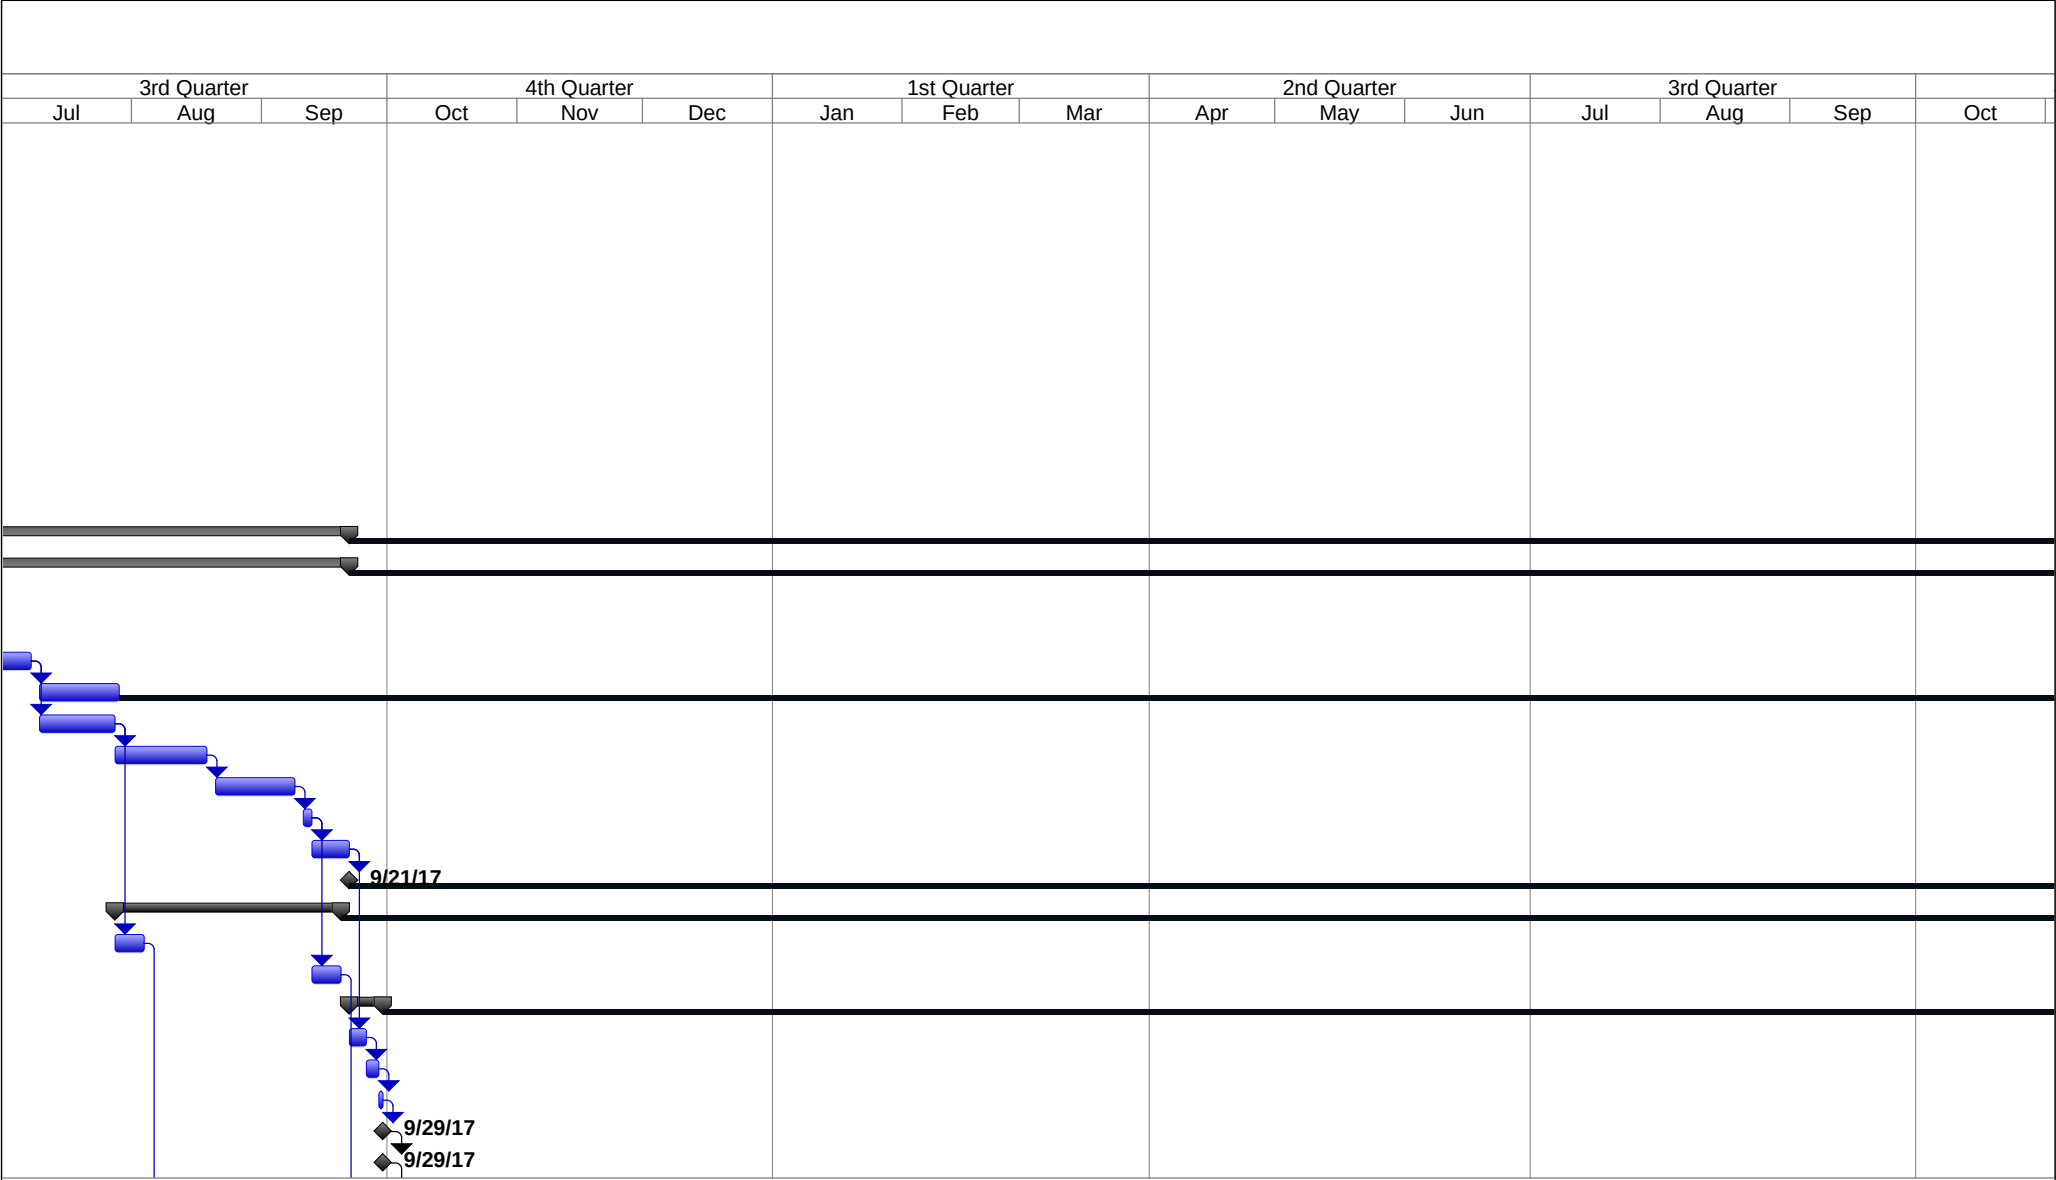


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

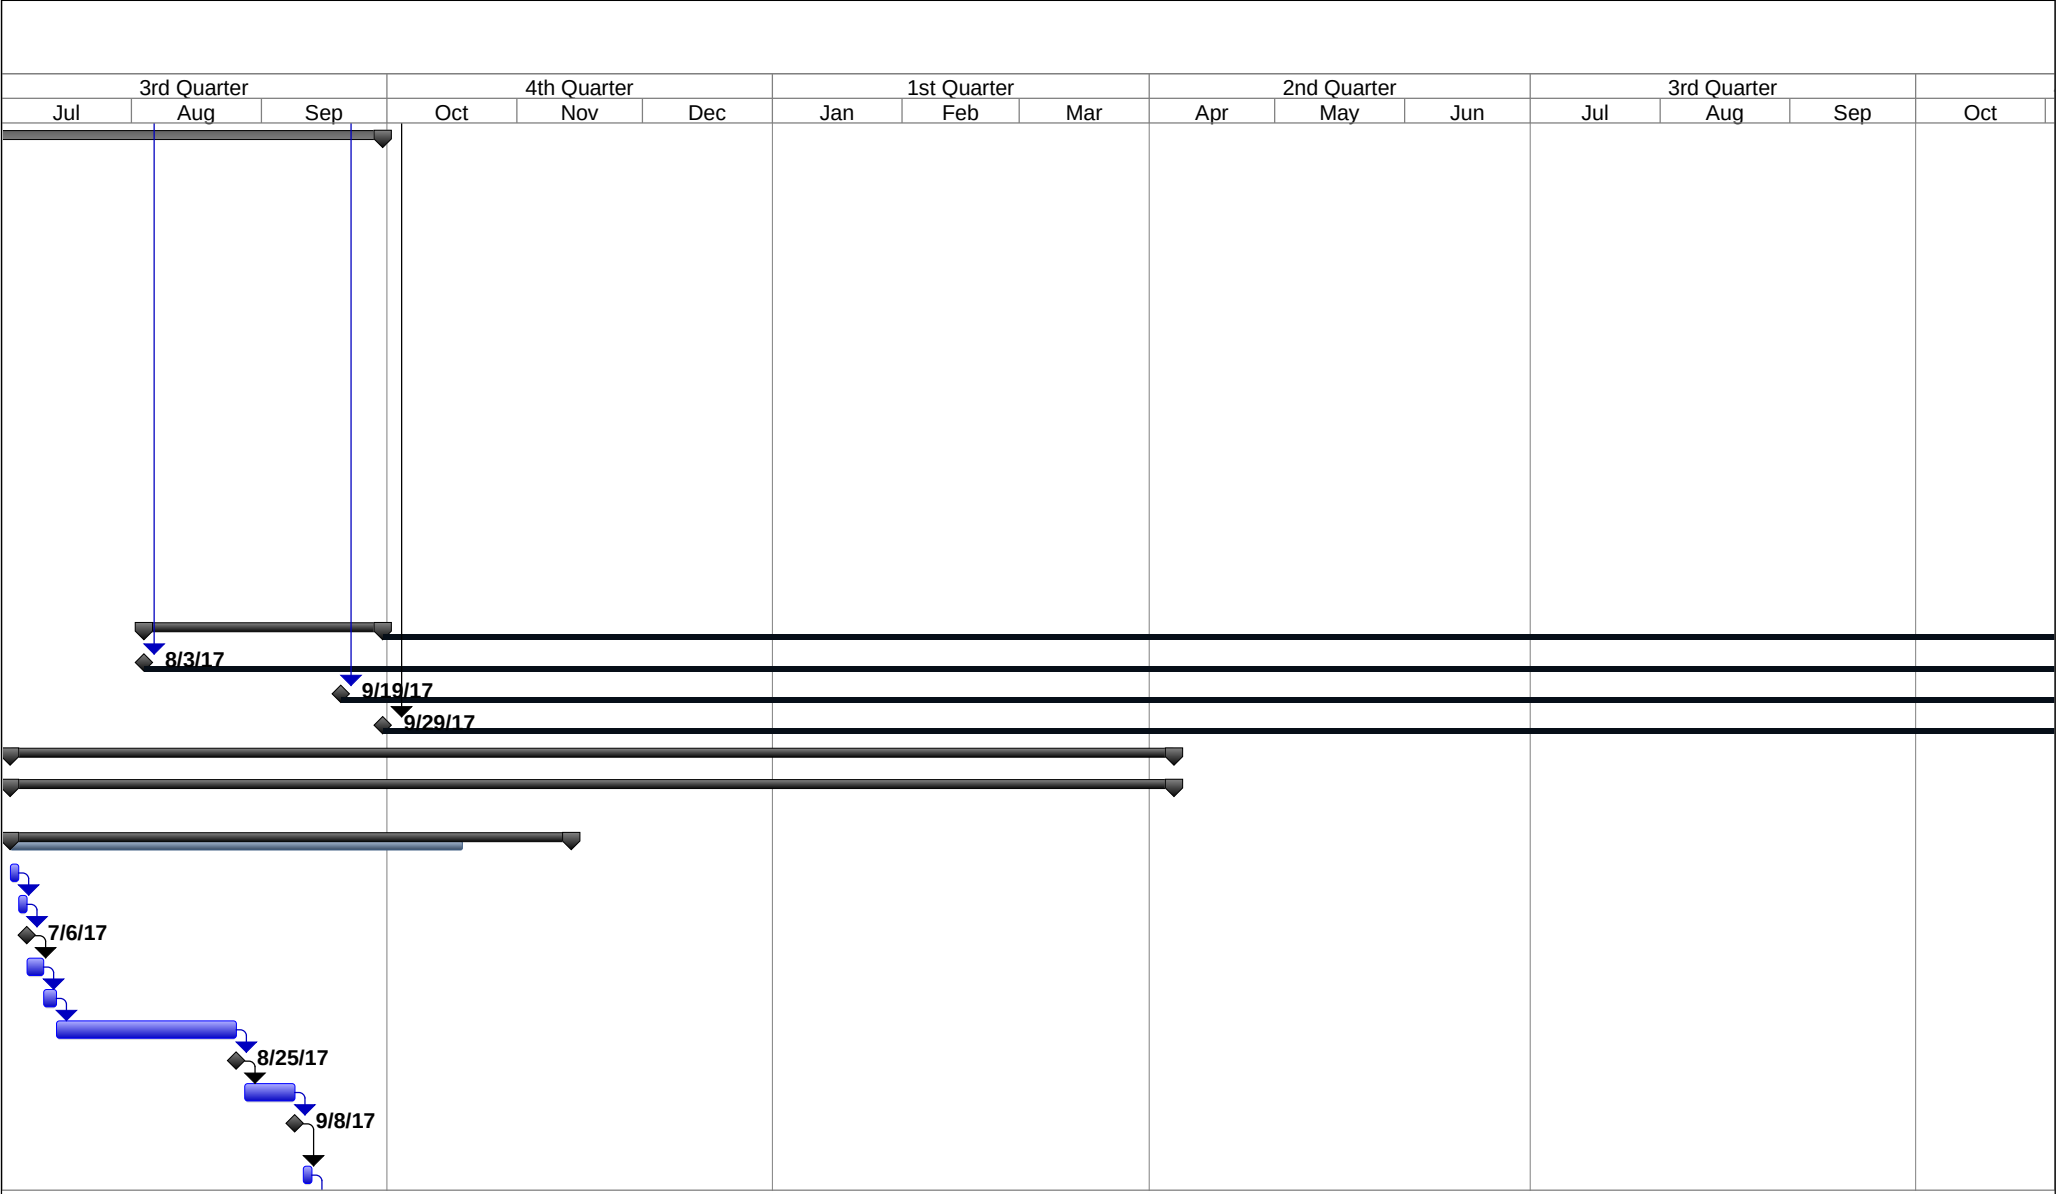

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

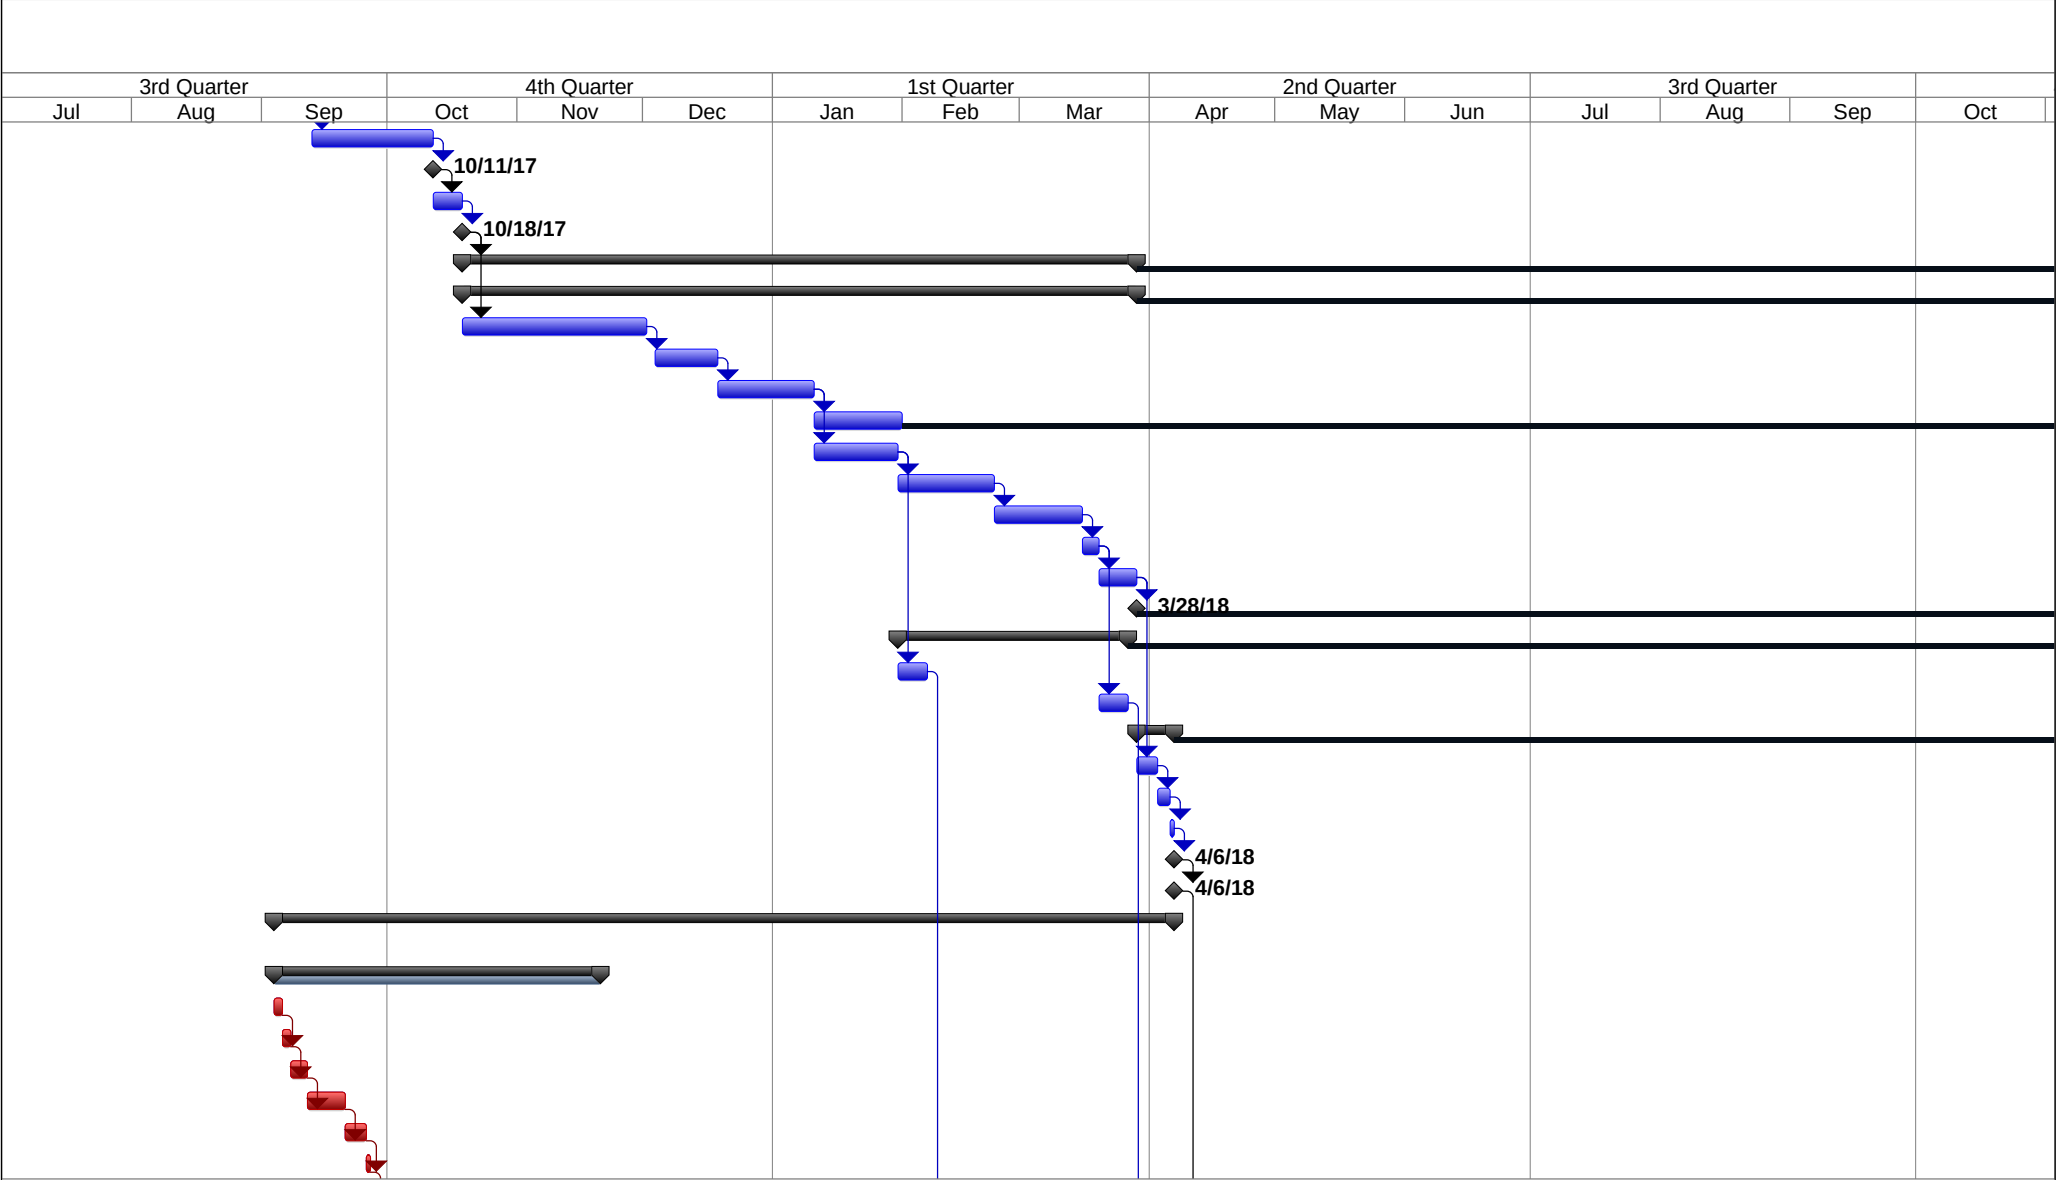


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

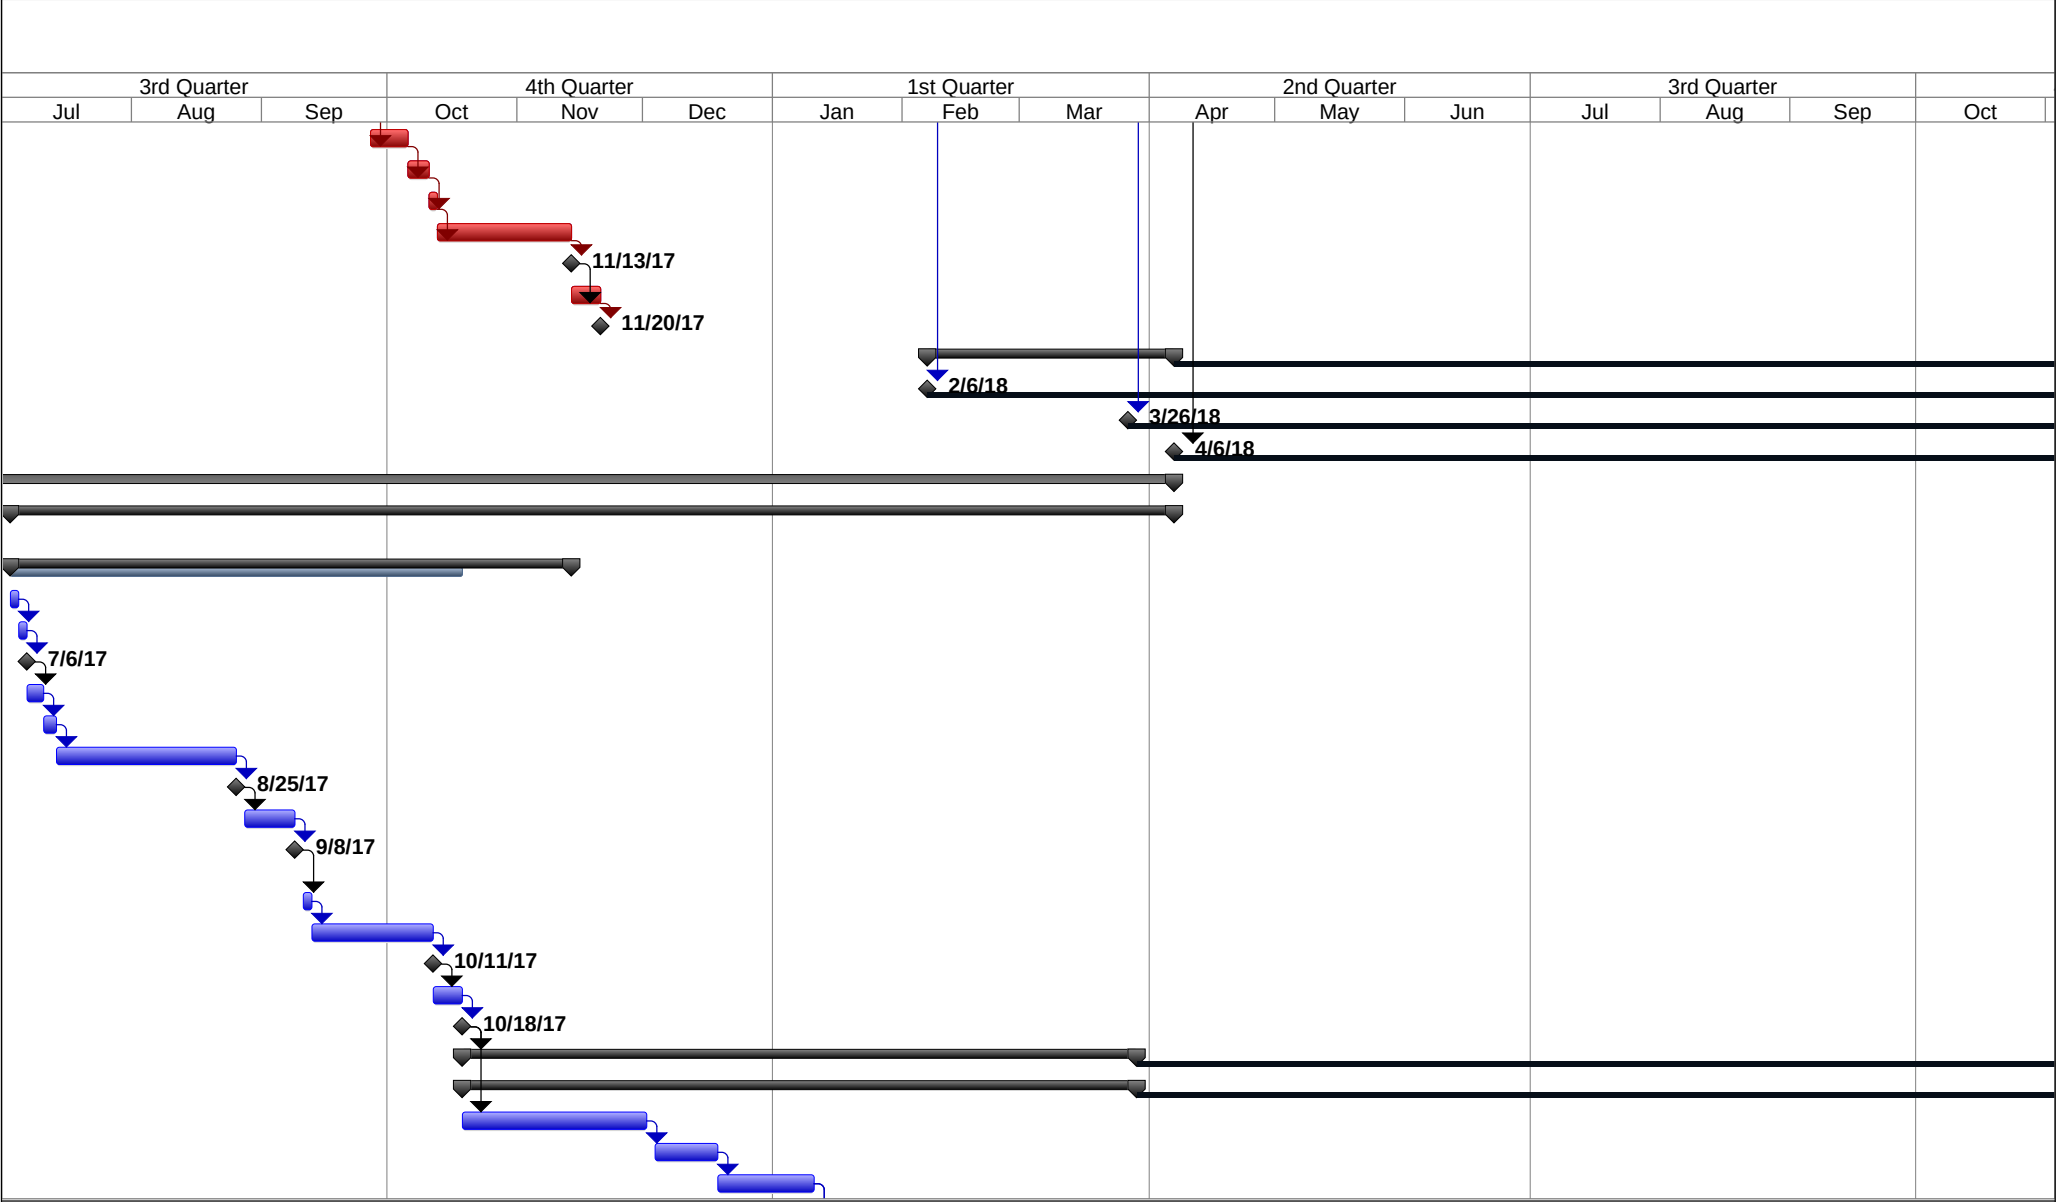





Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

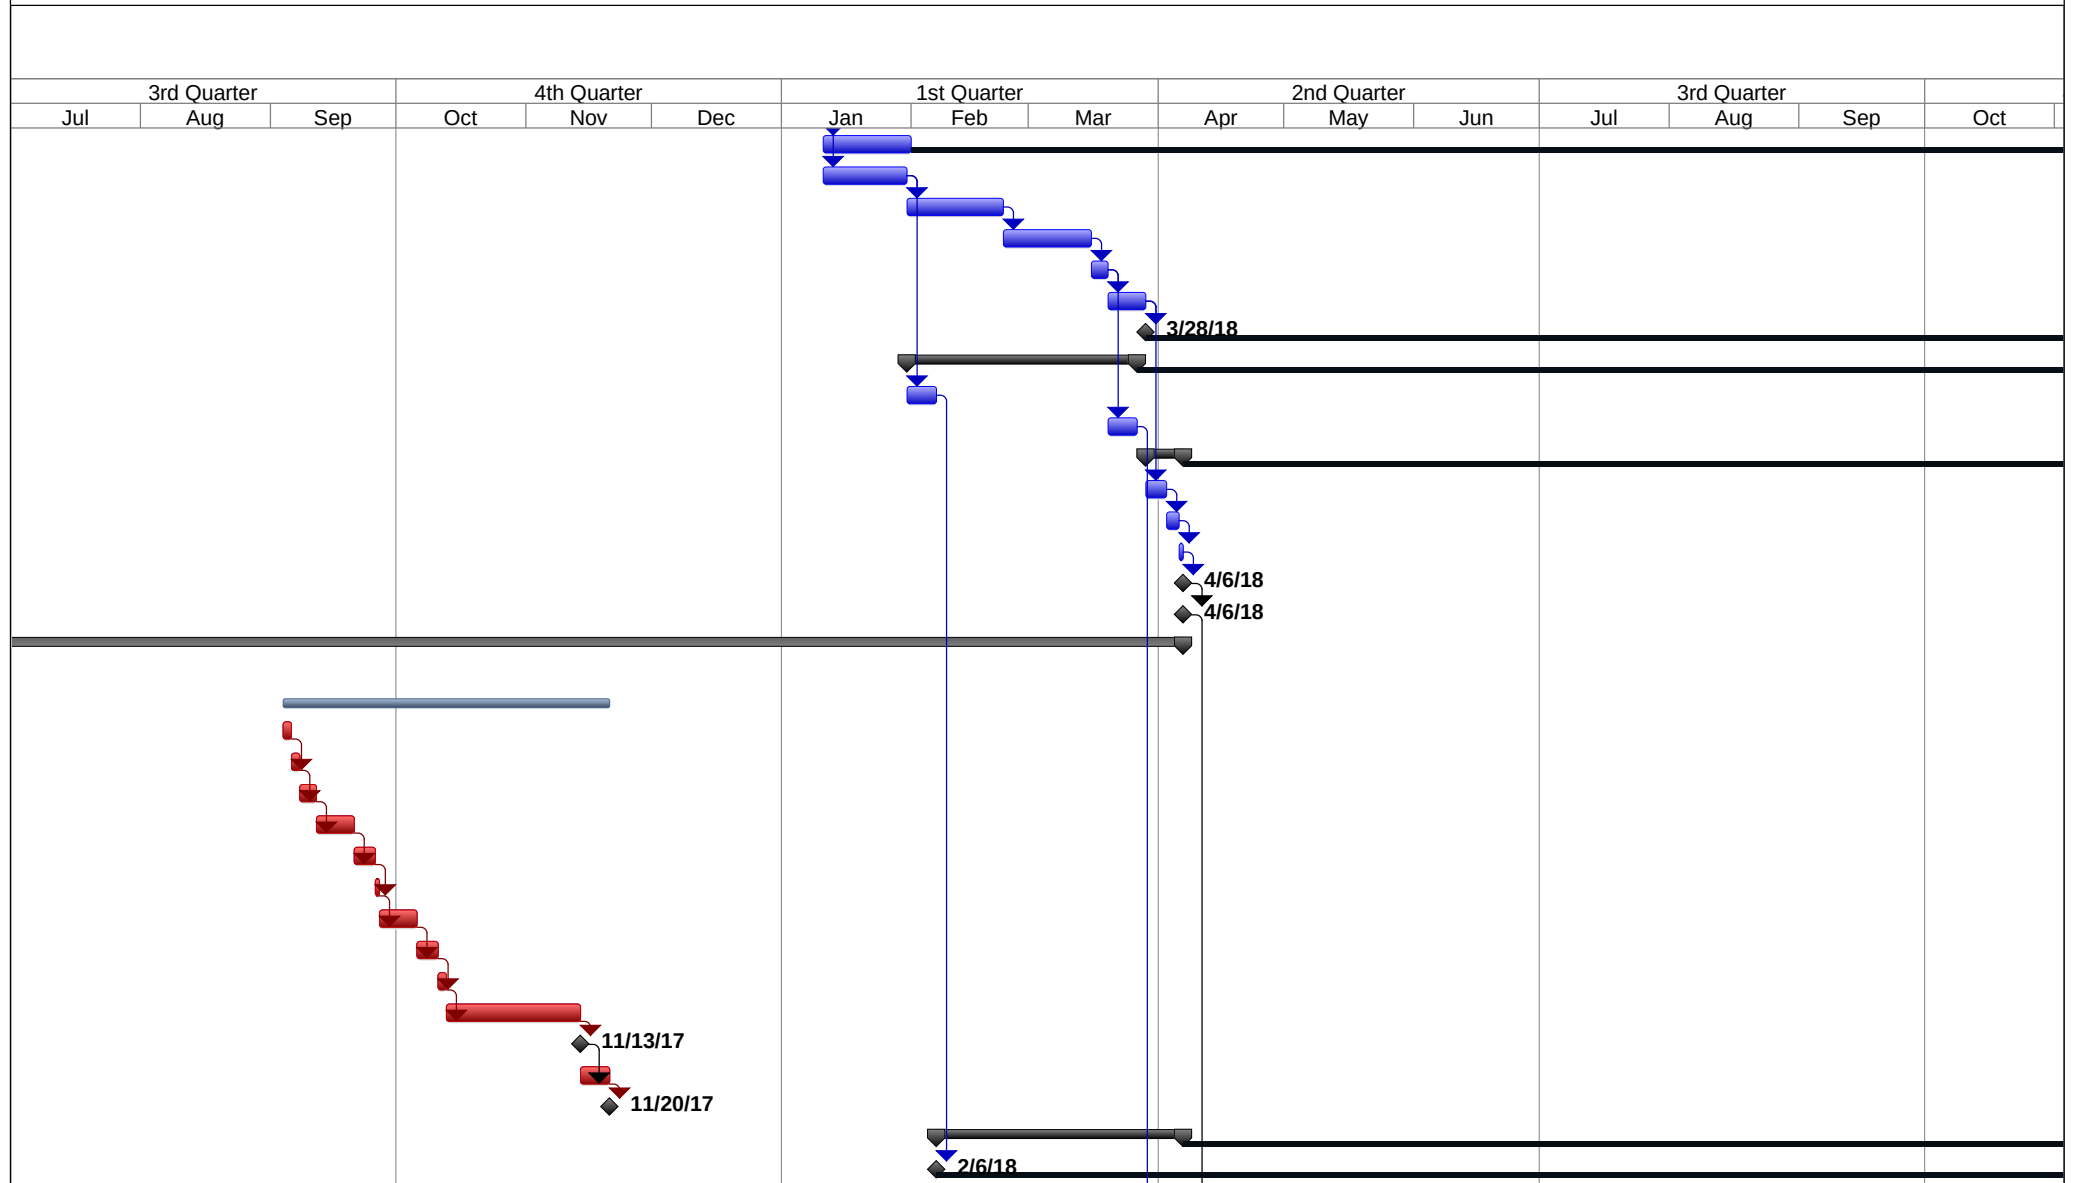


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

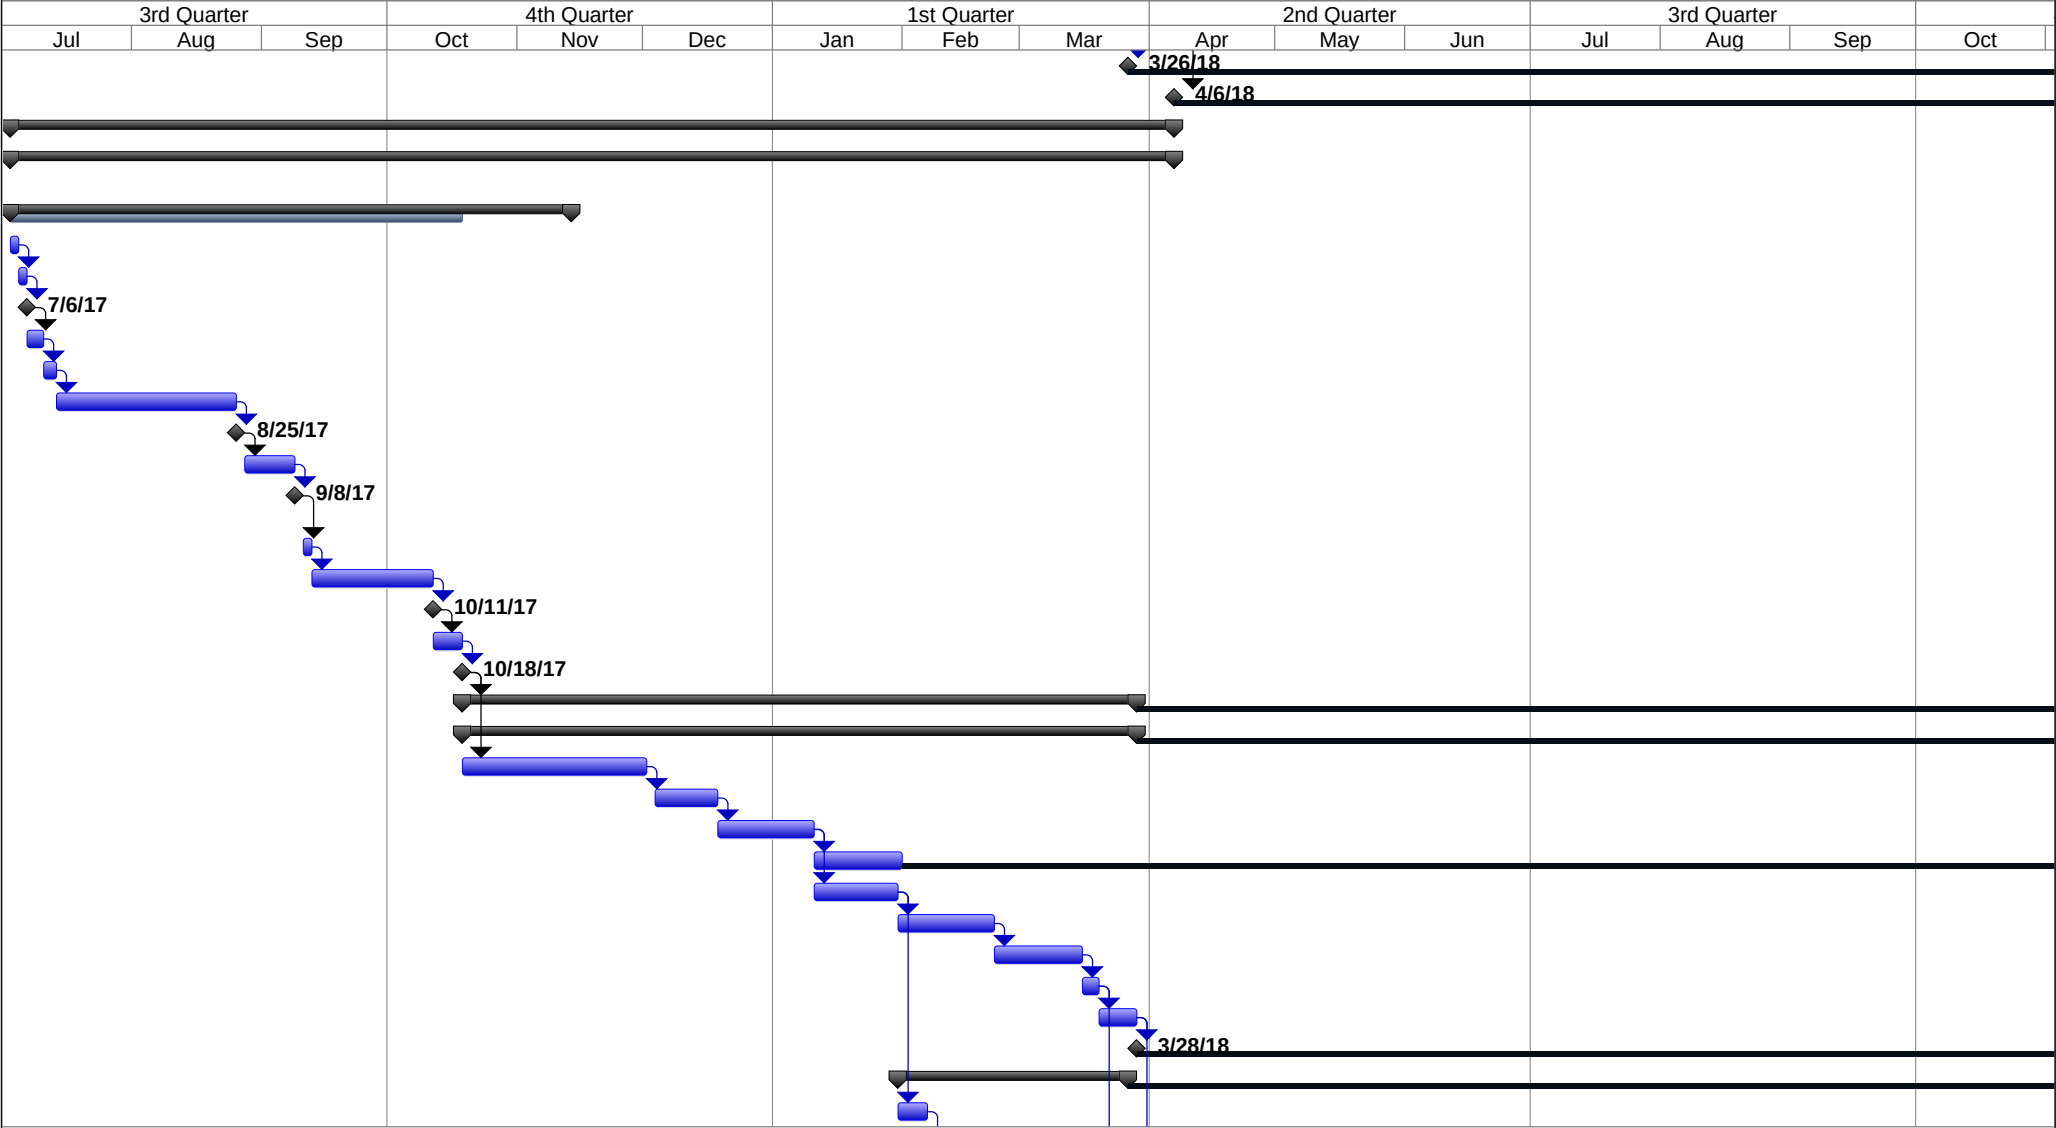


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

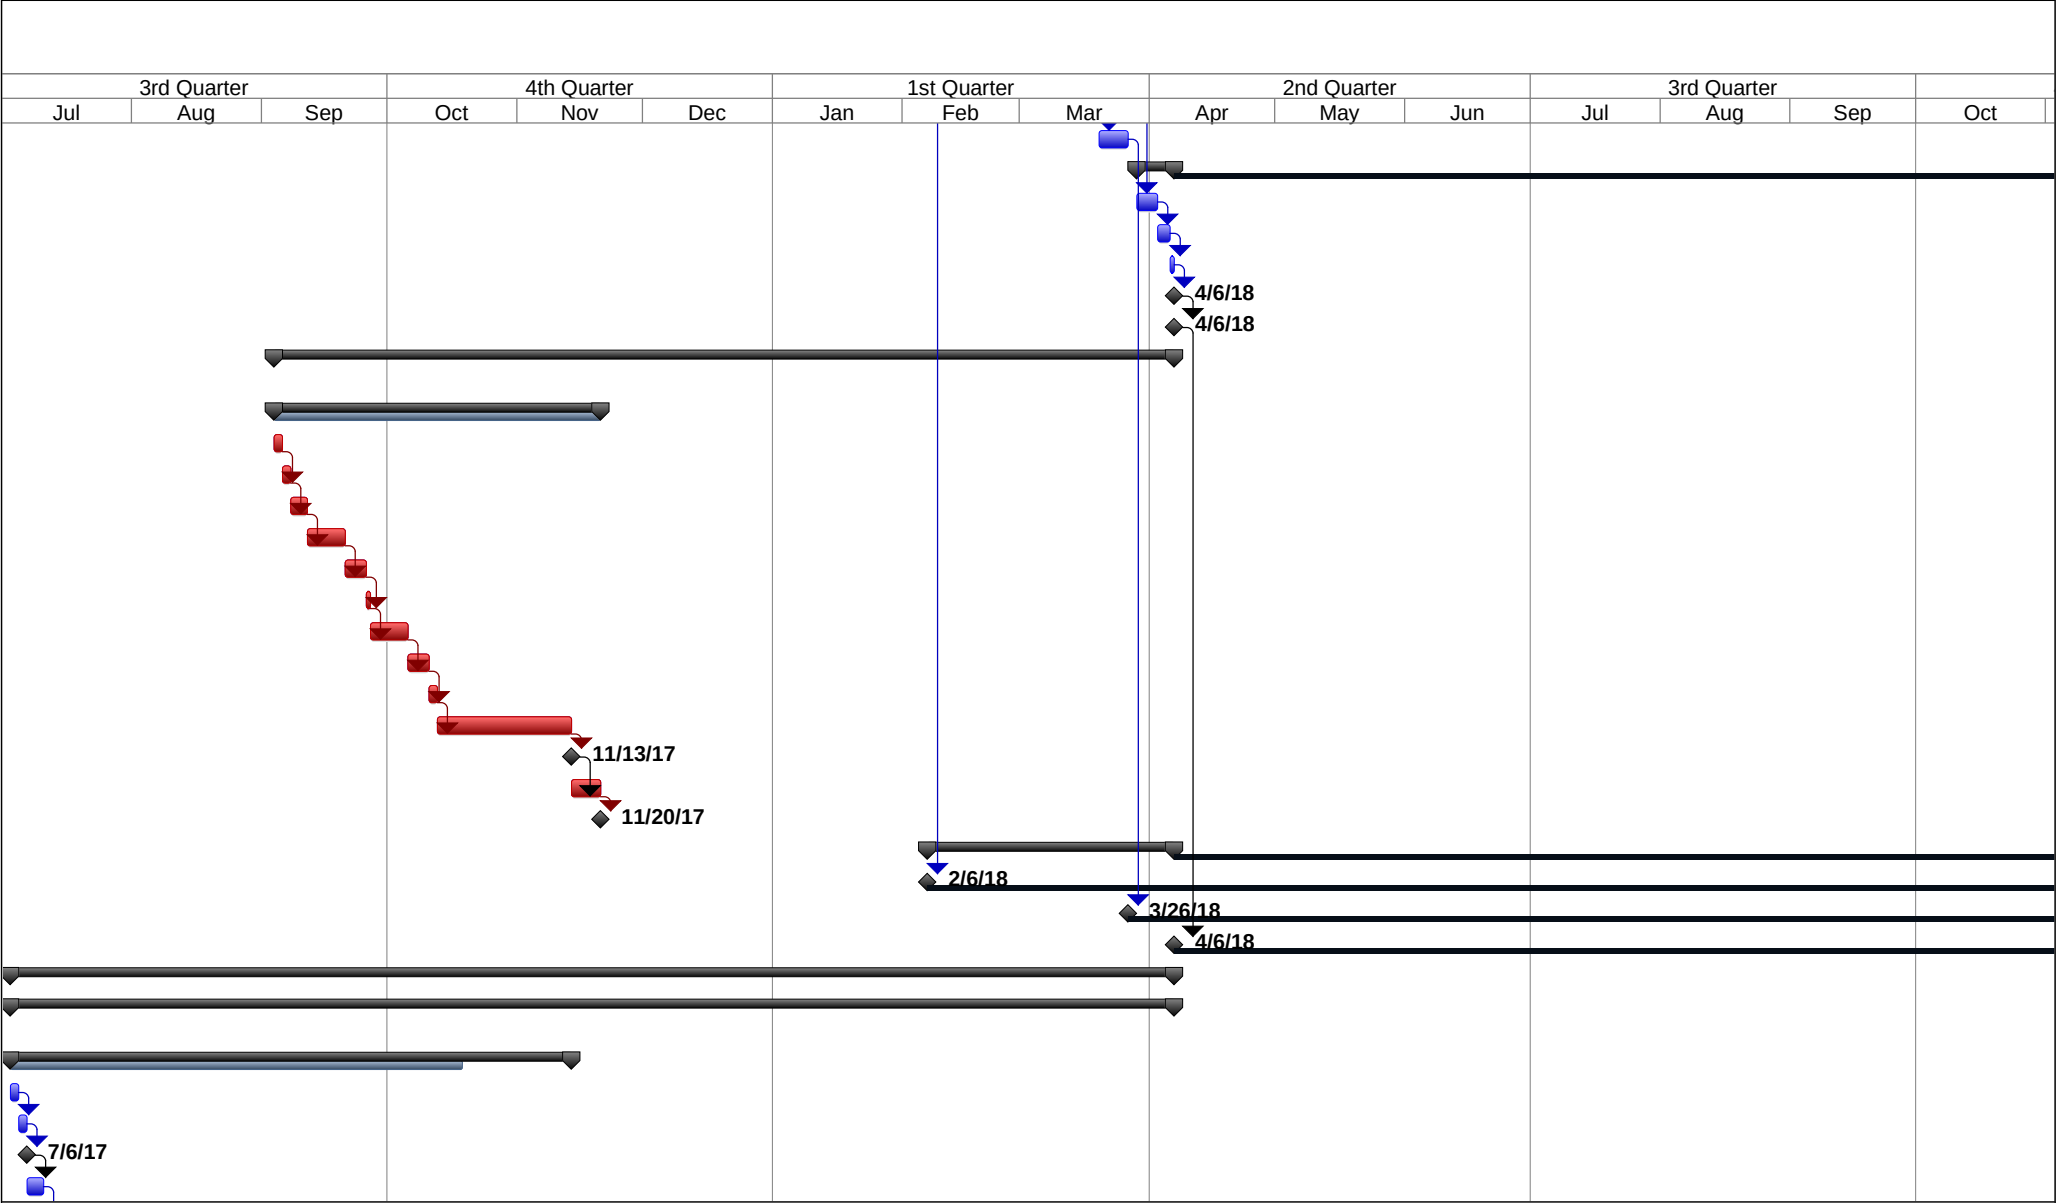


## Plan Operativo Anual, POA

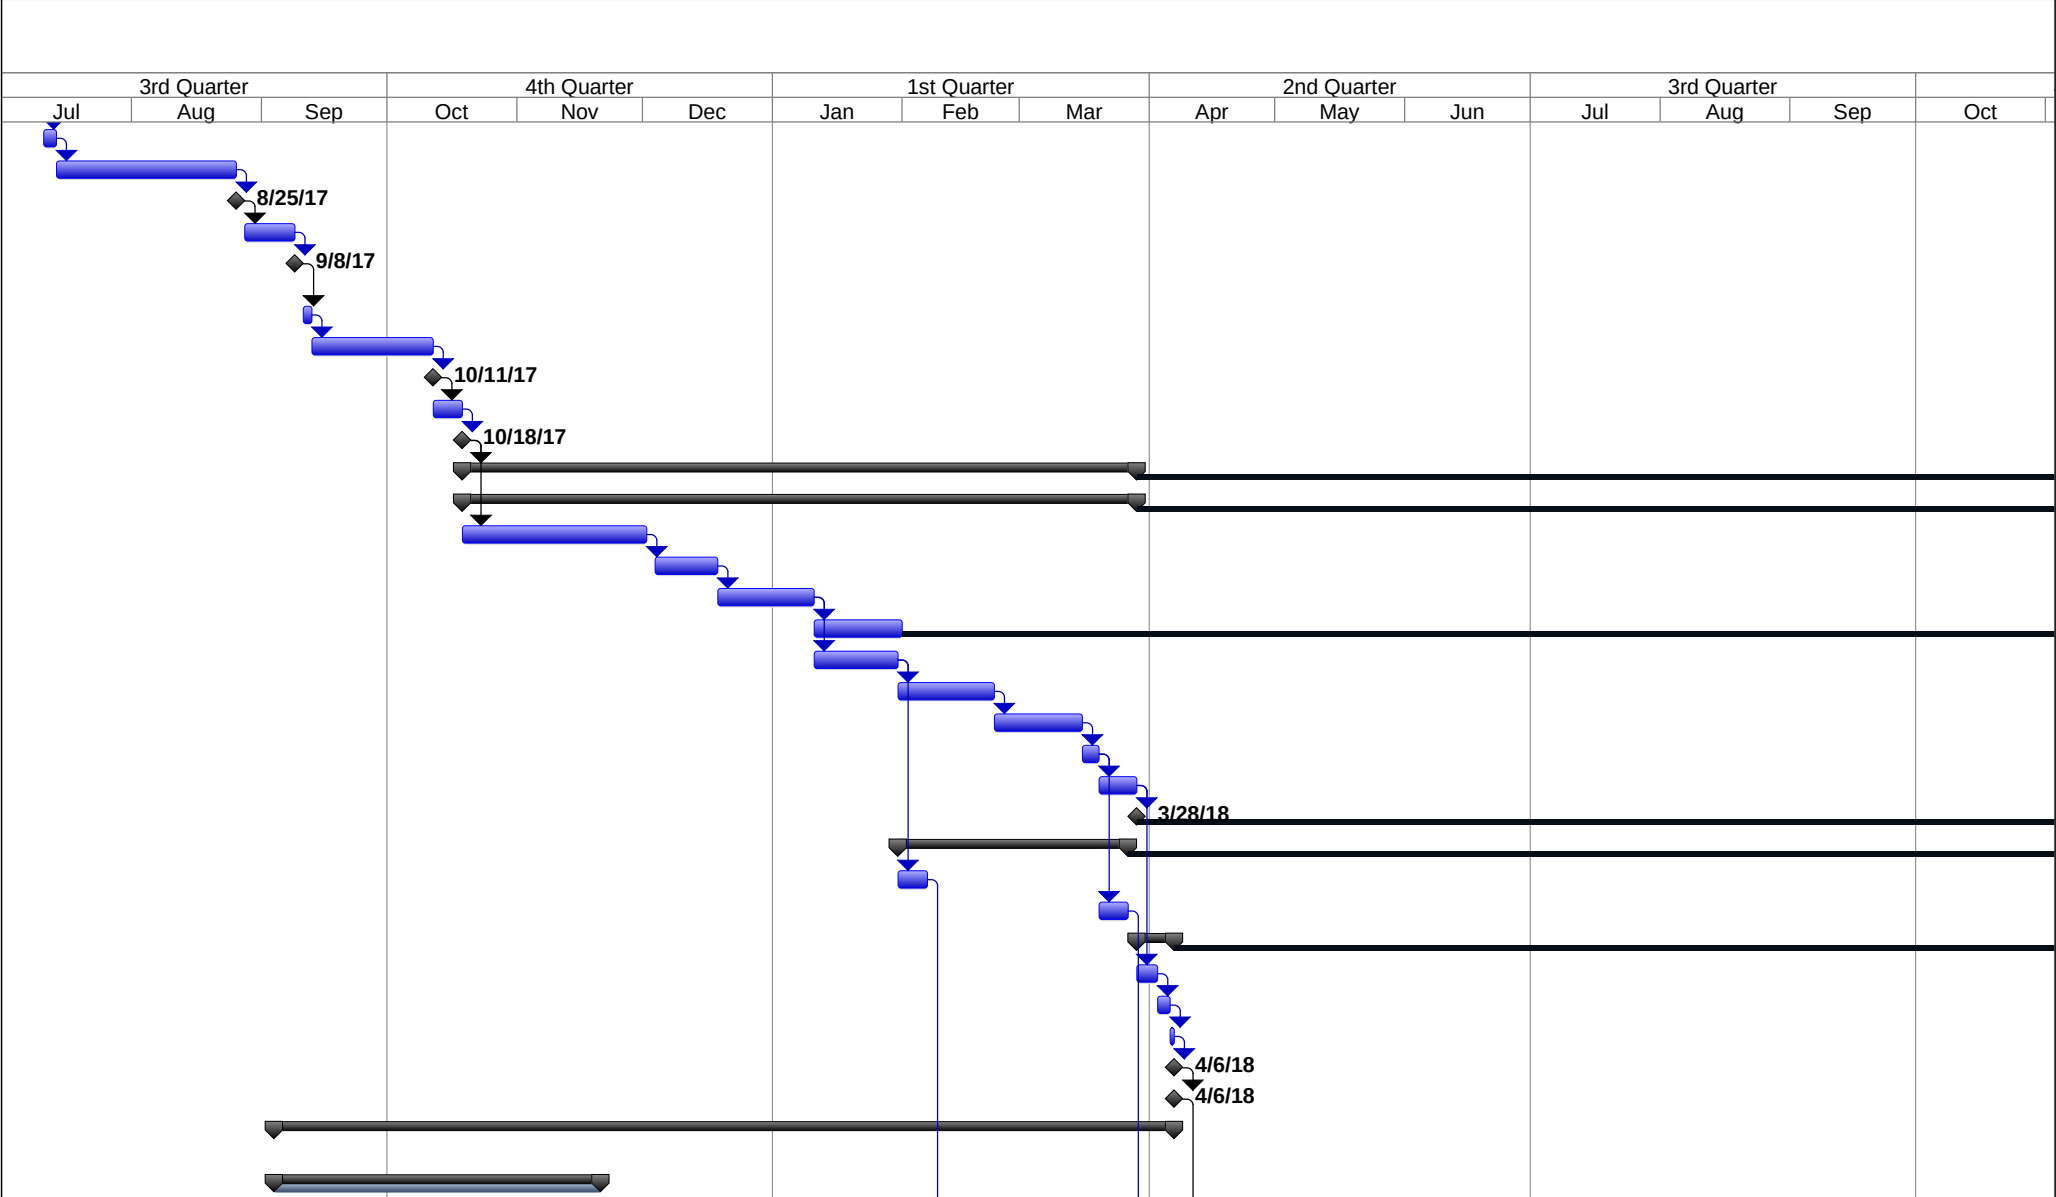

## Plan Operativo Anual, POA

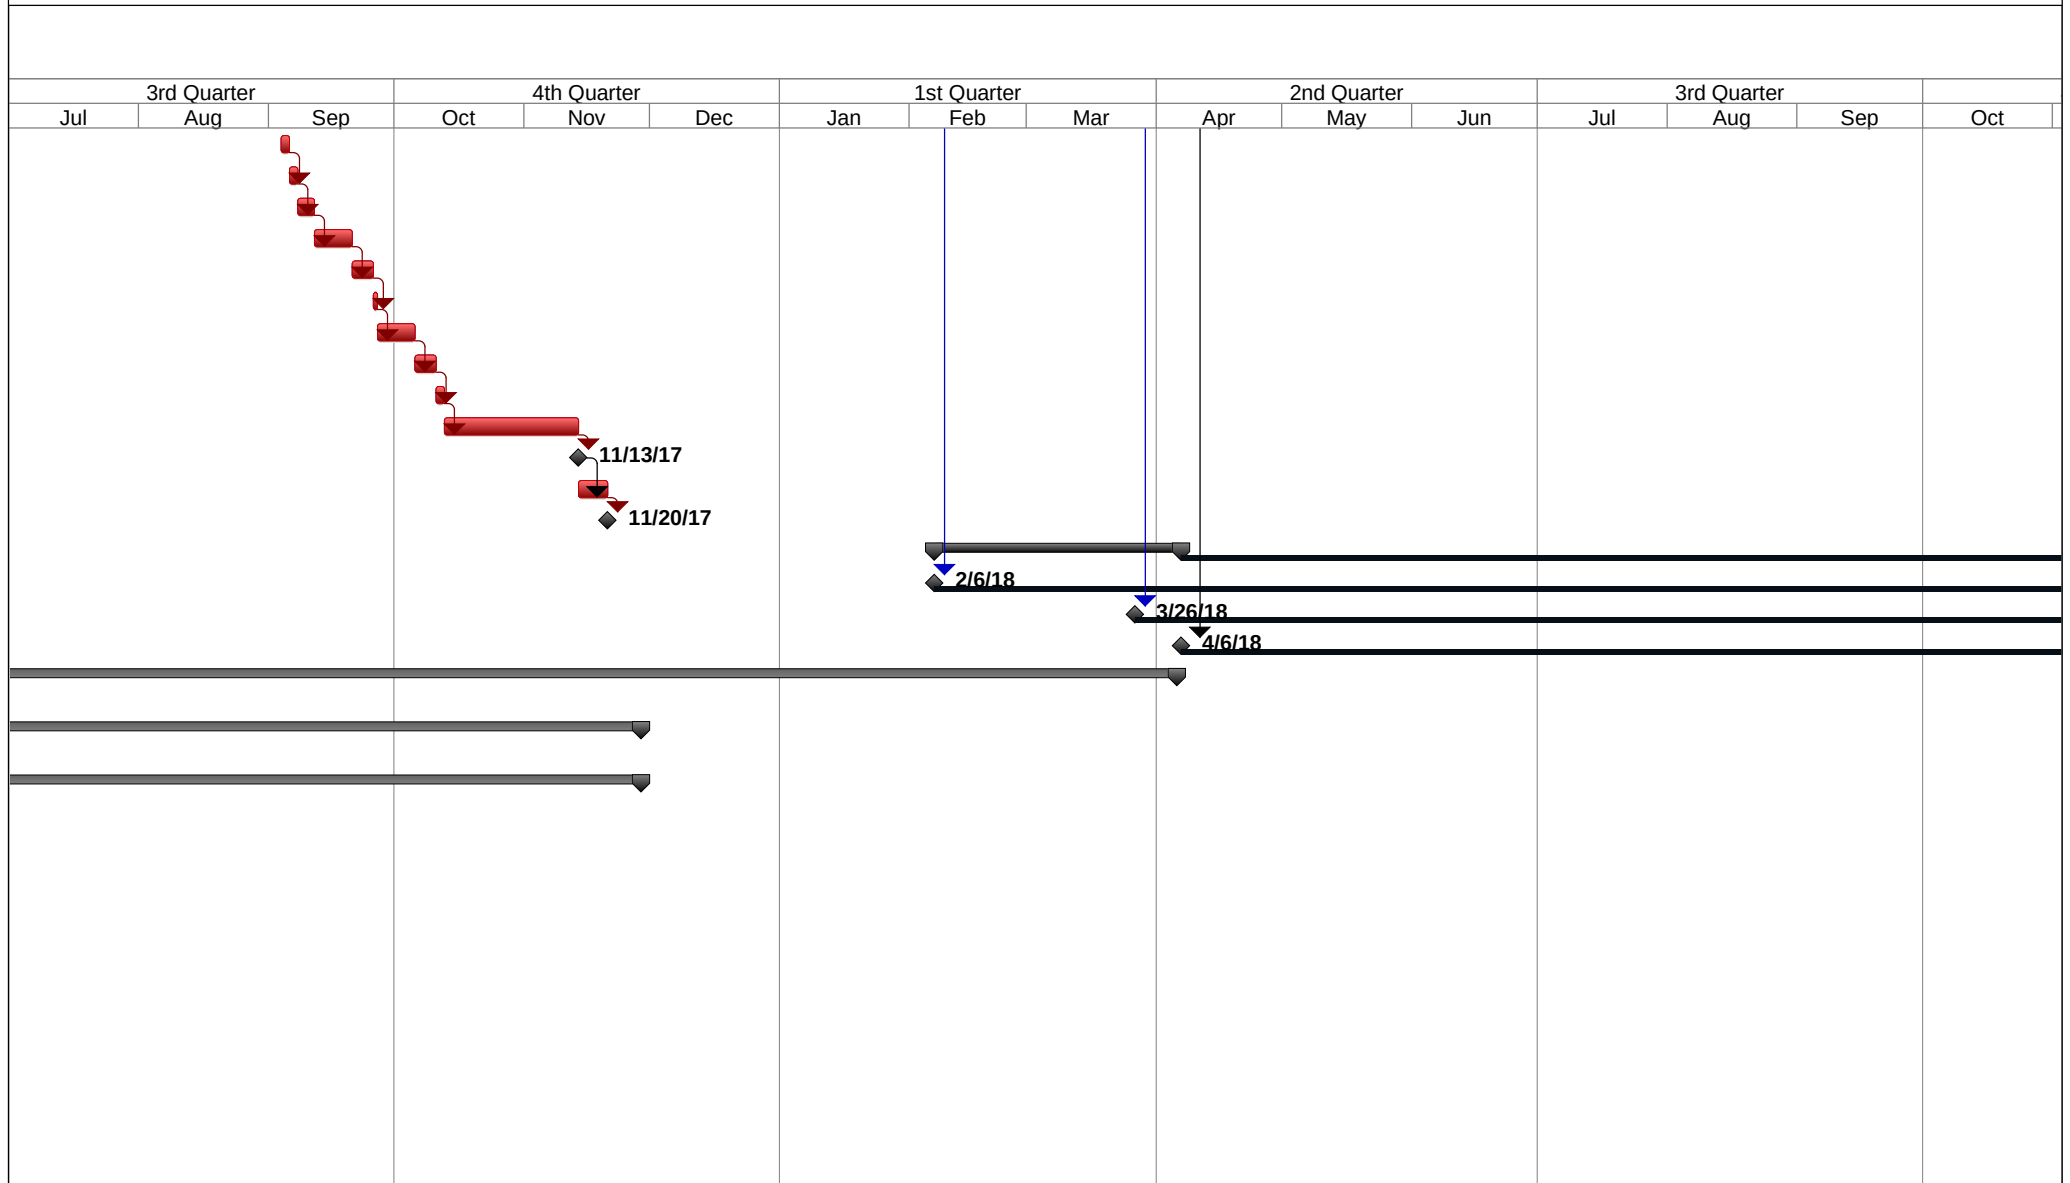


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

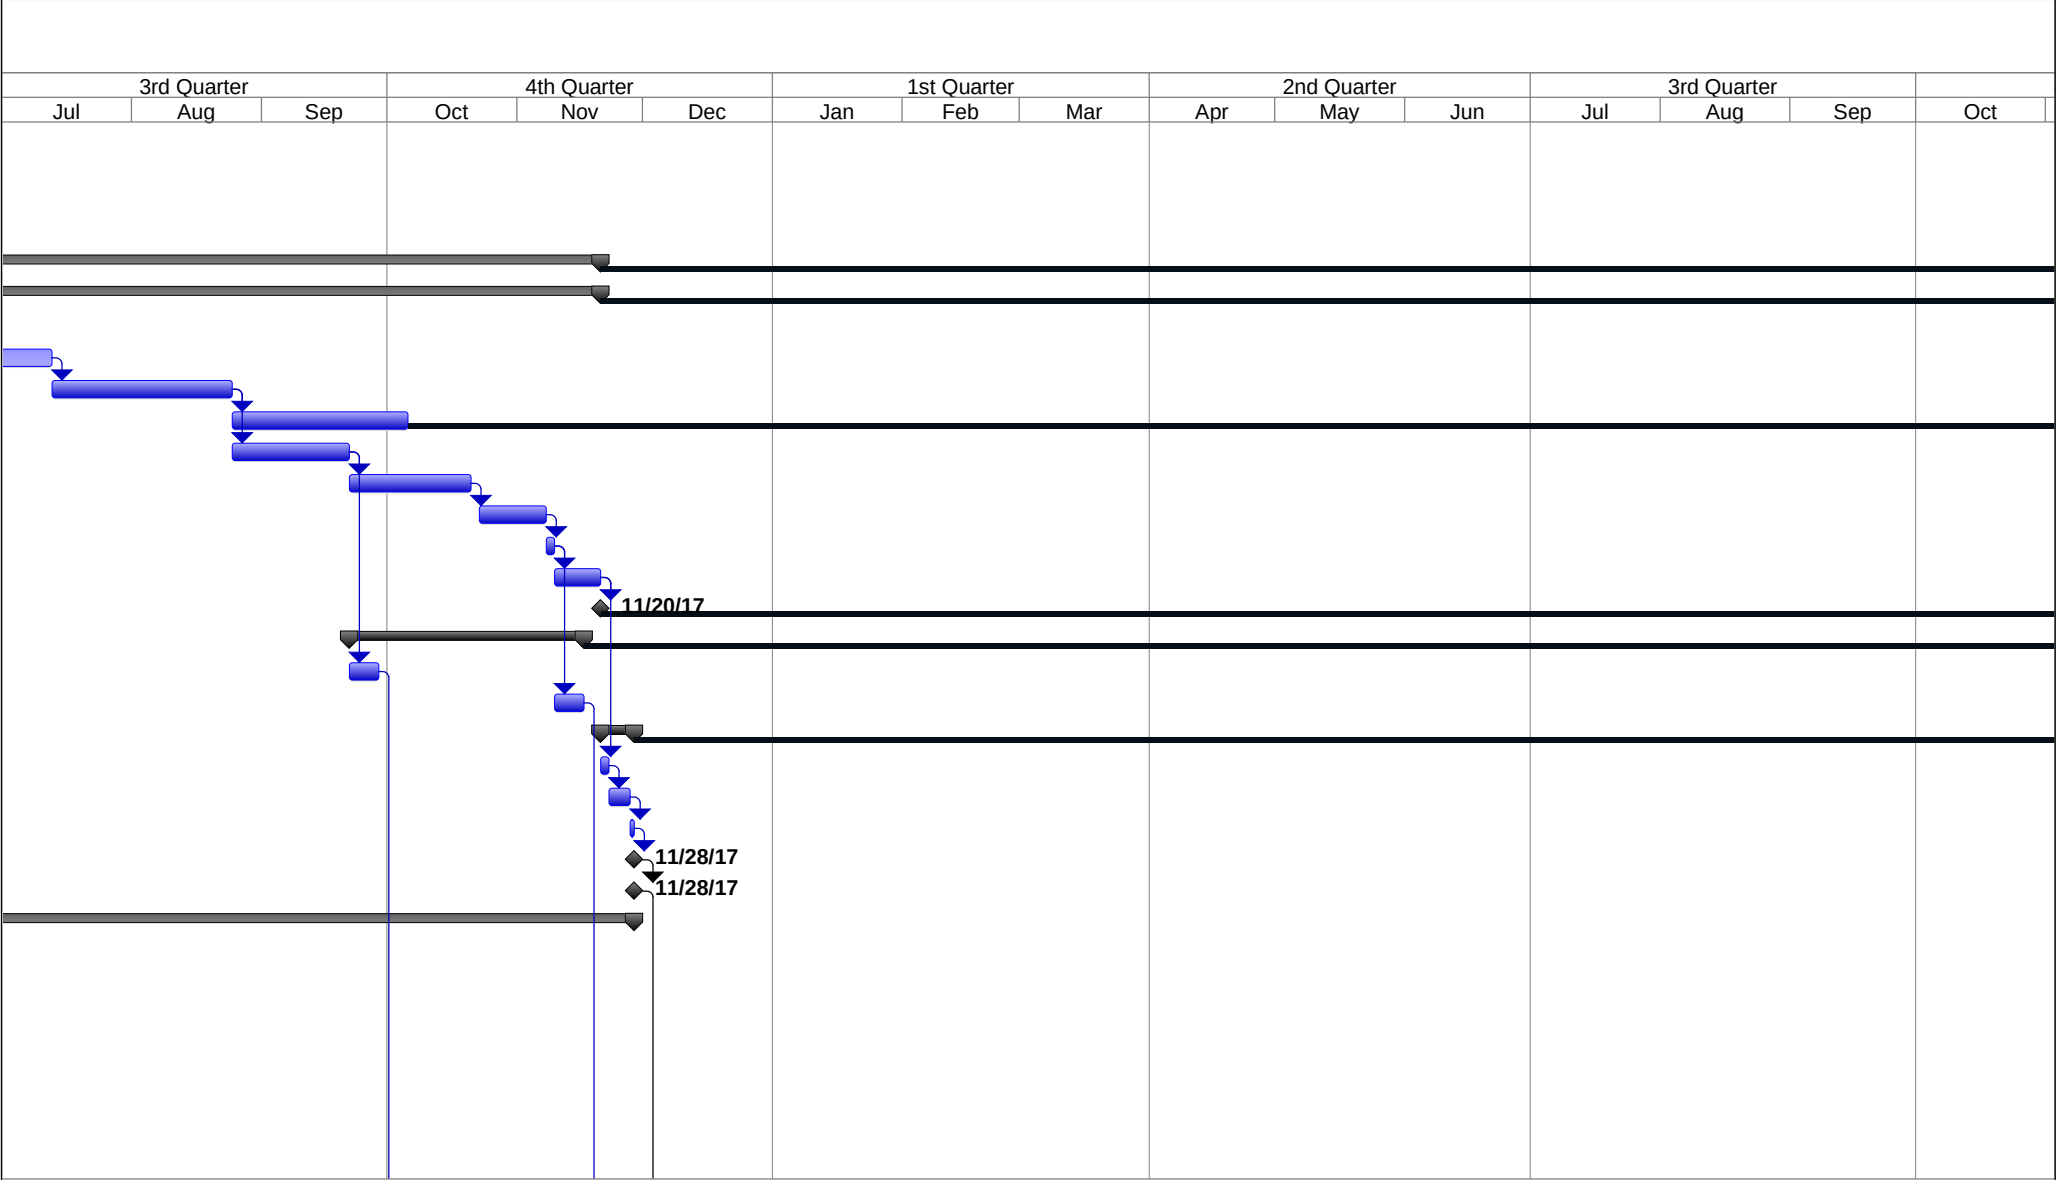



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

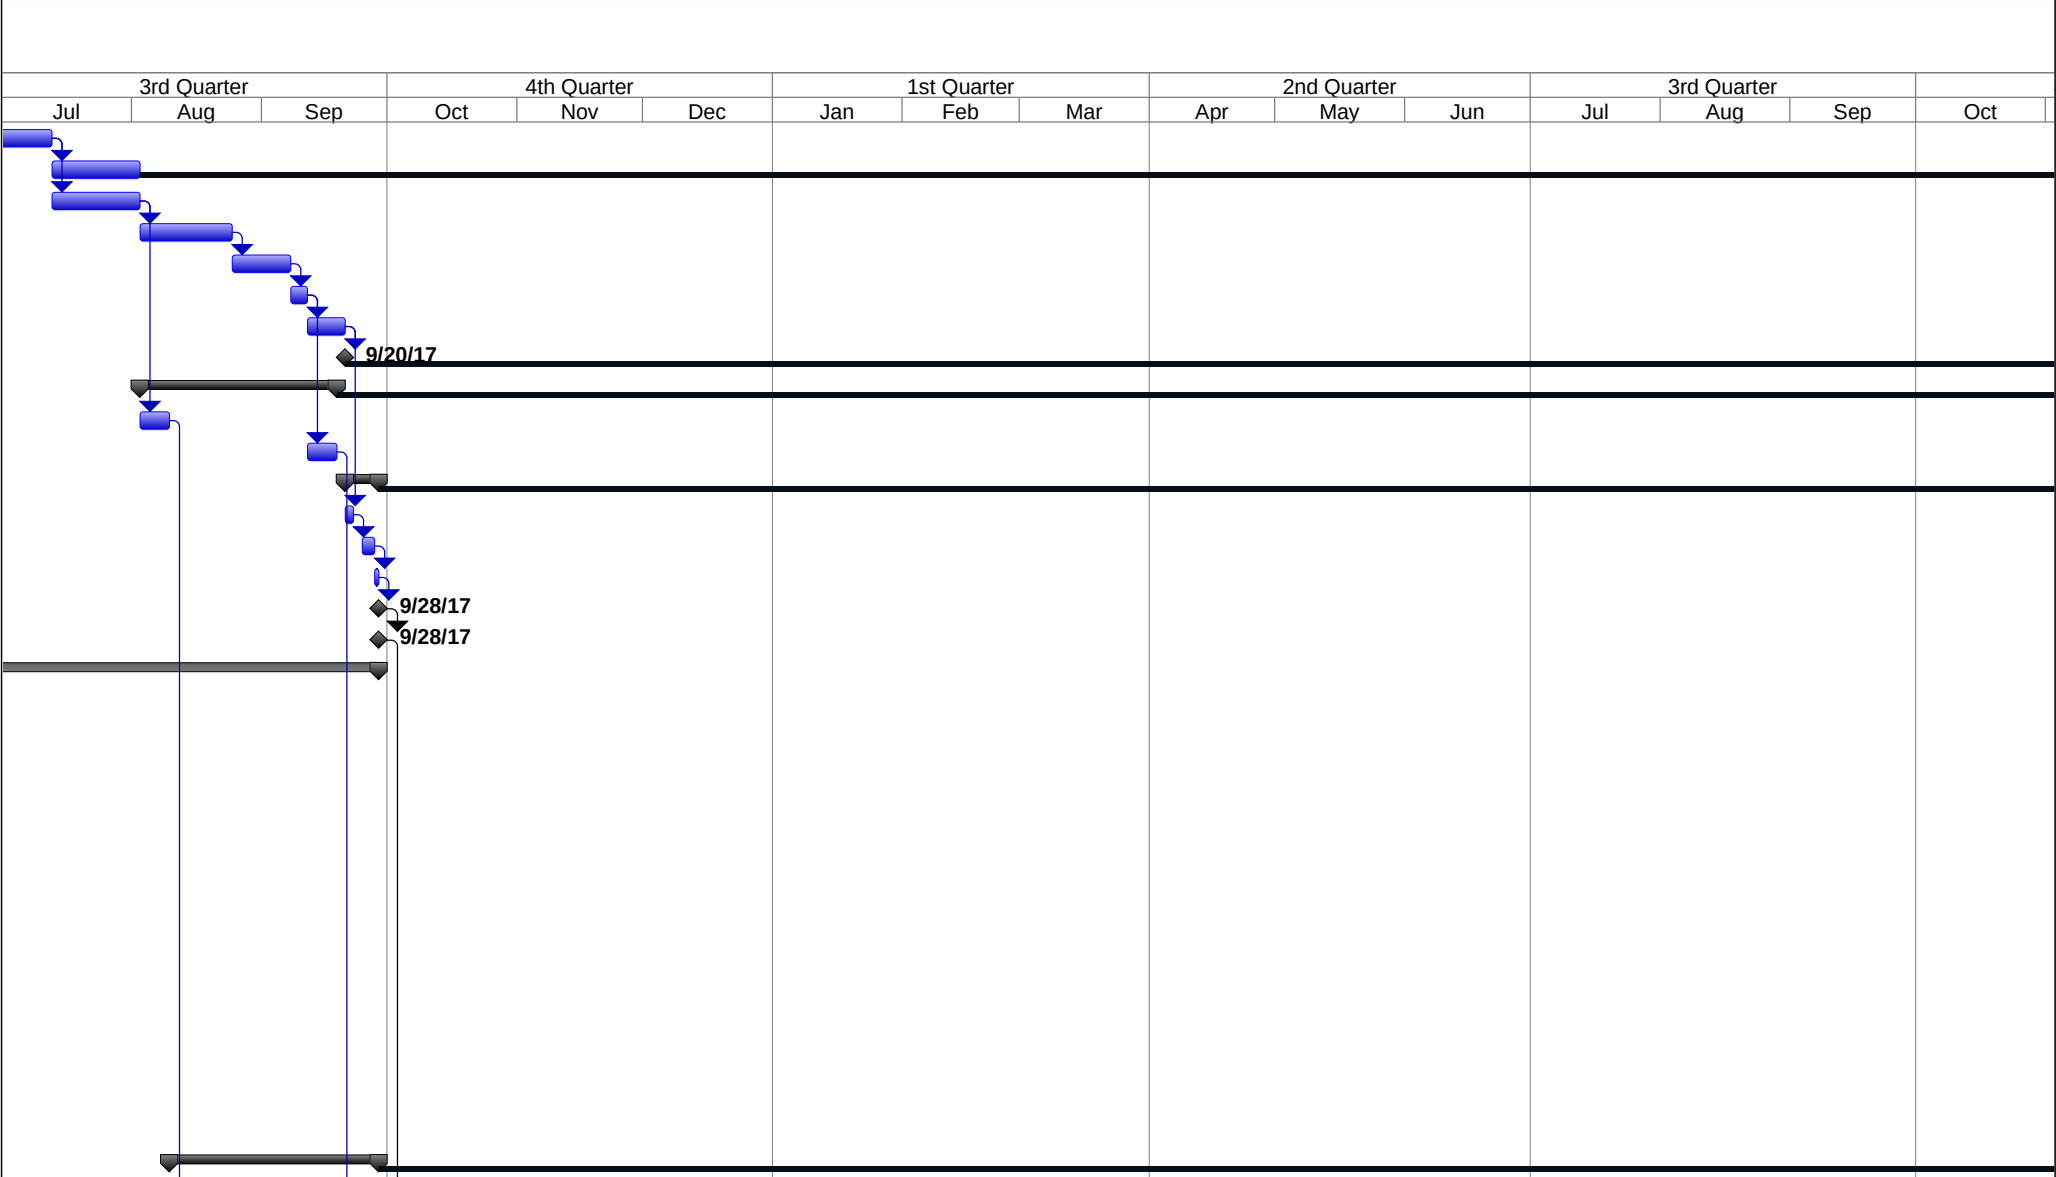





## Plan Operativo Anual, POA




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

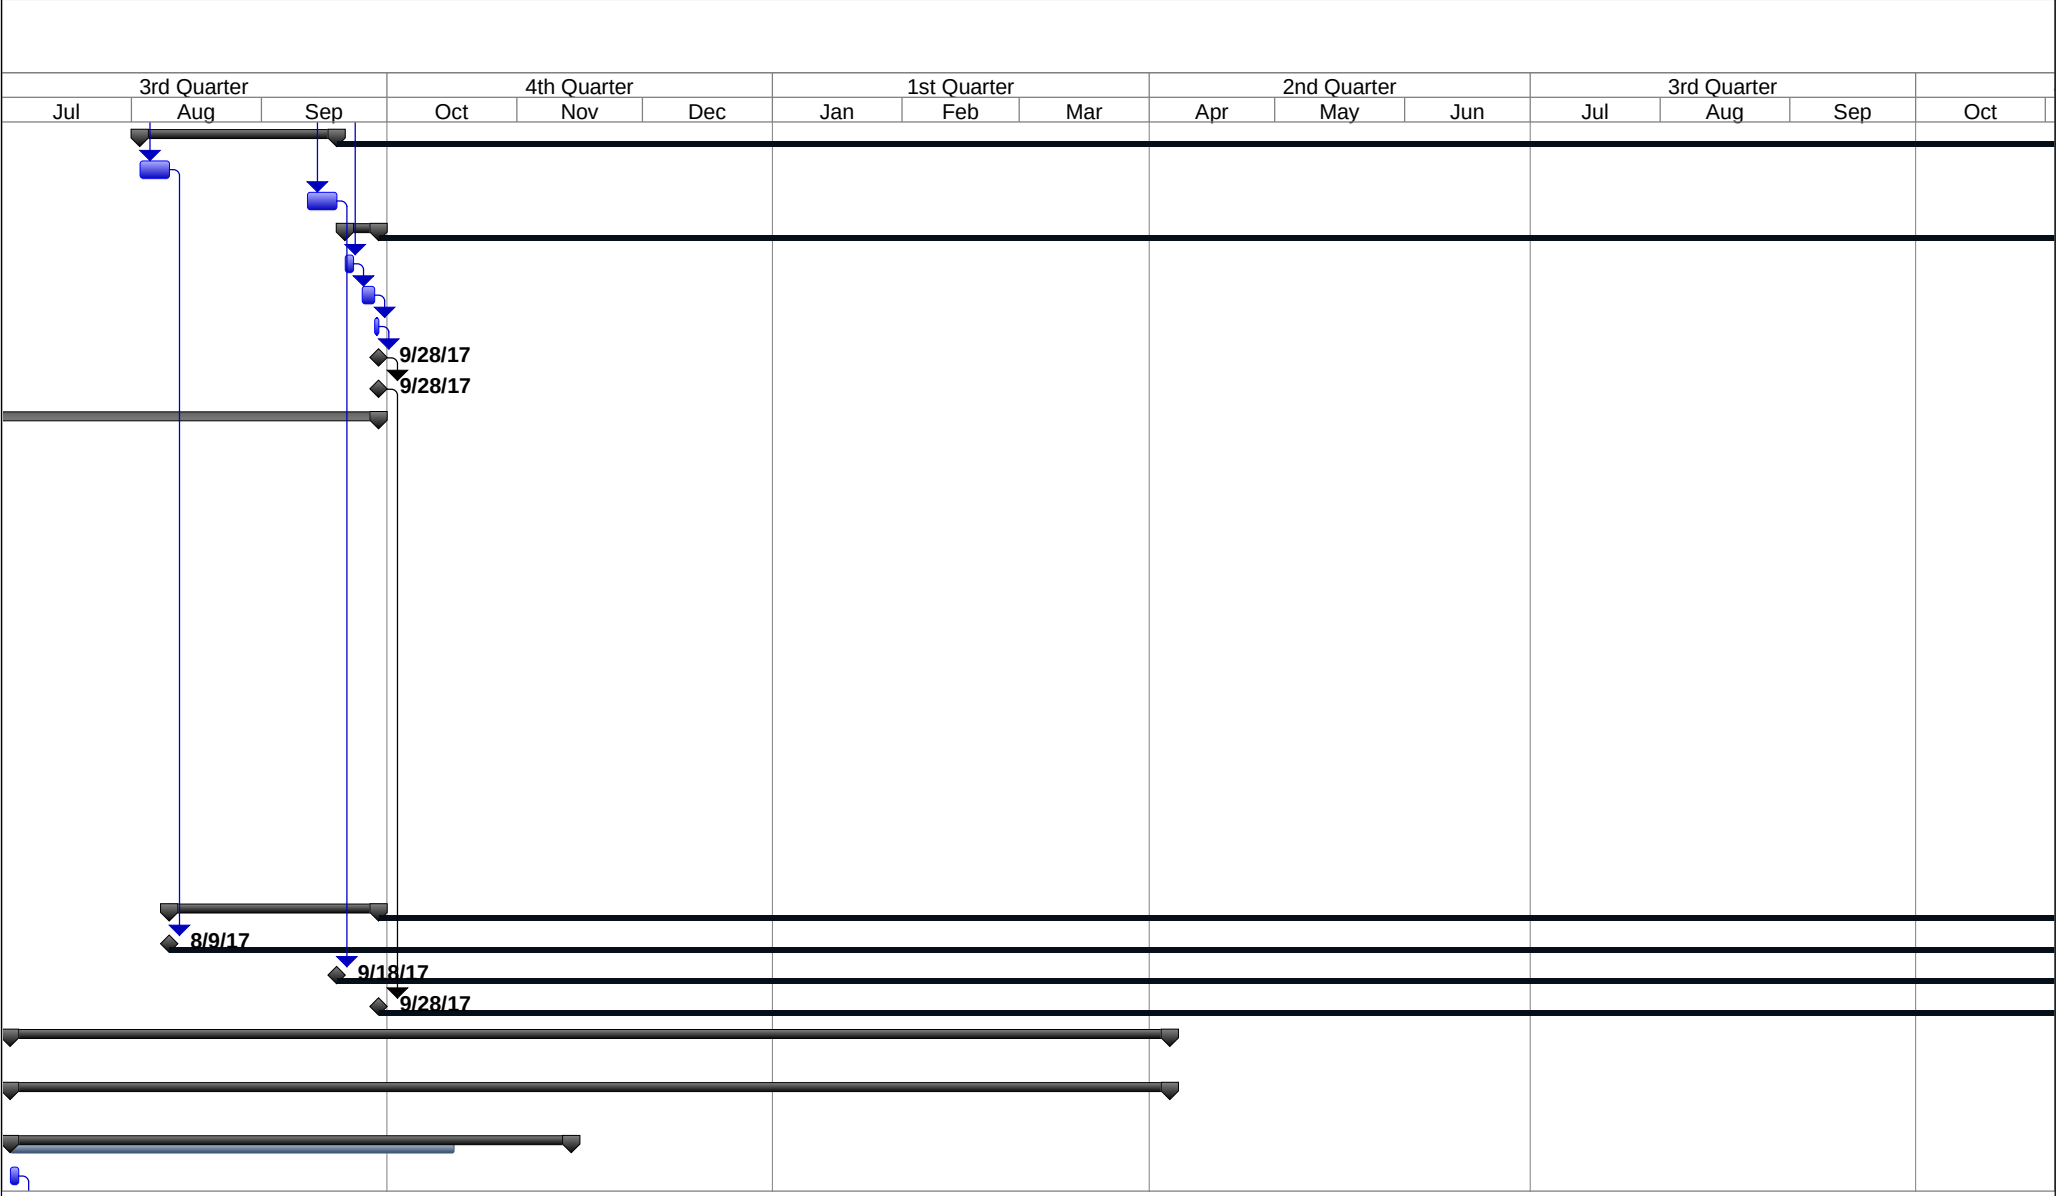


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

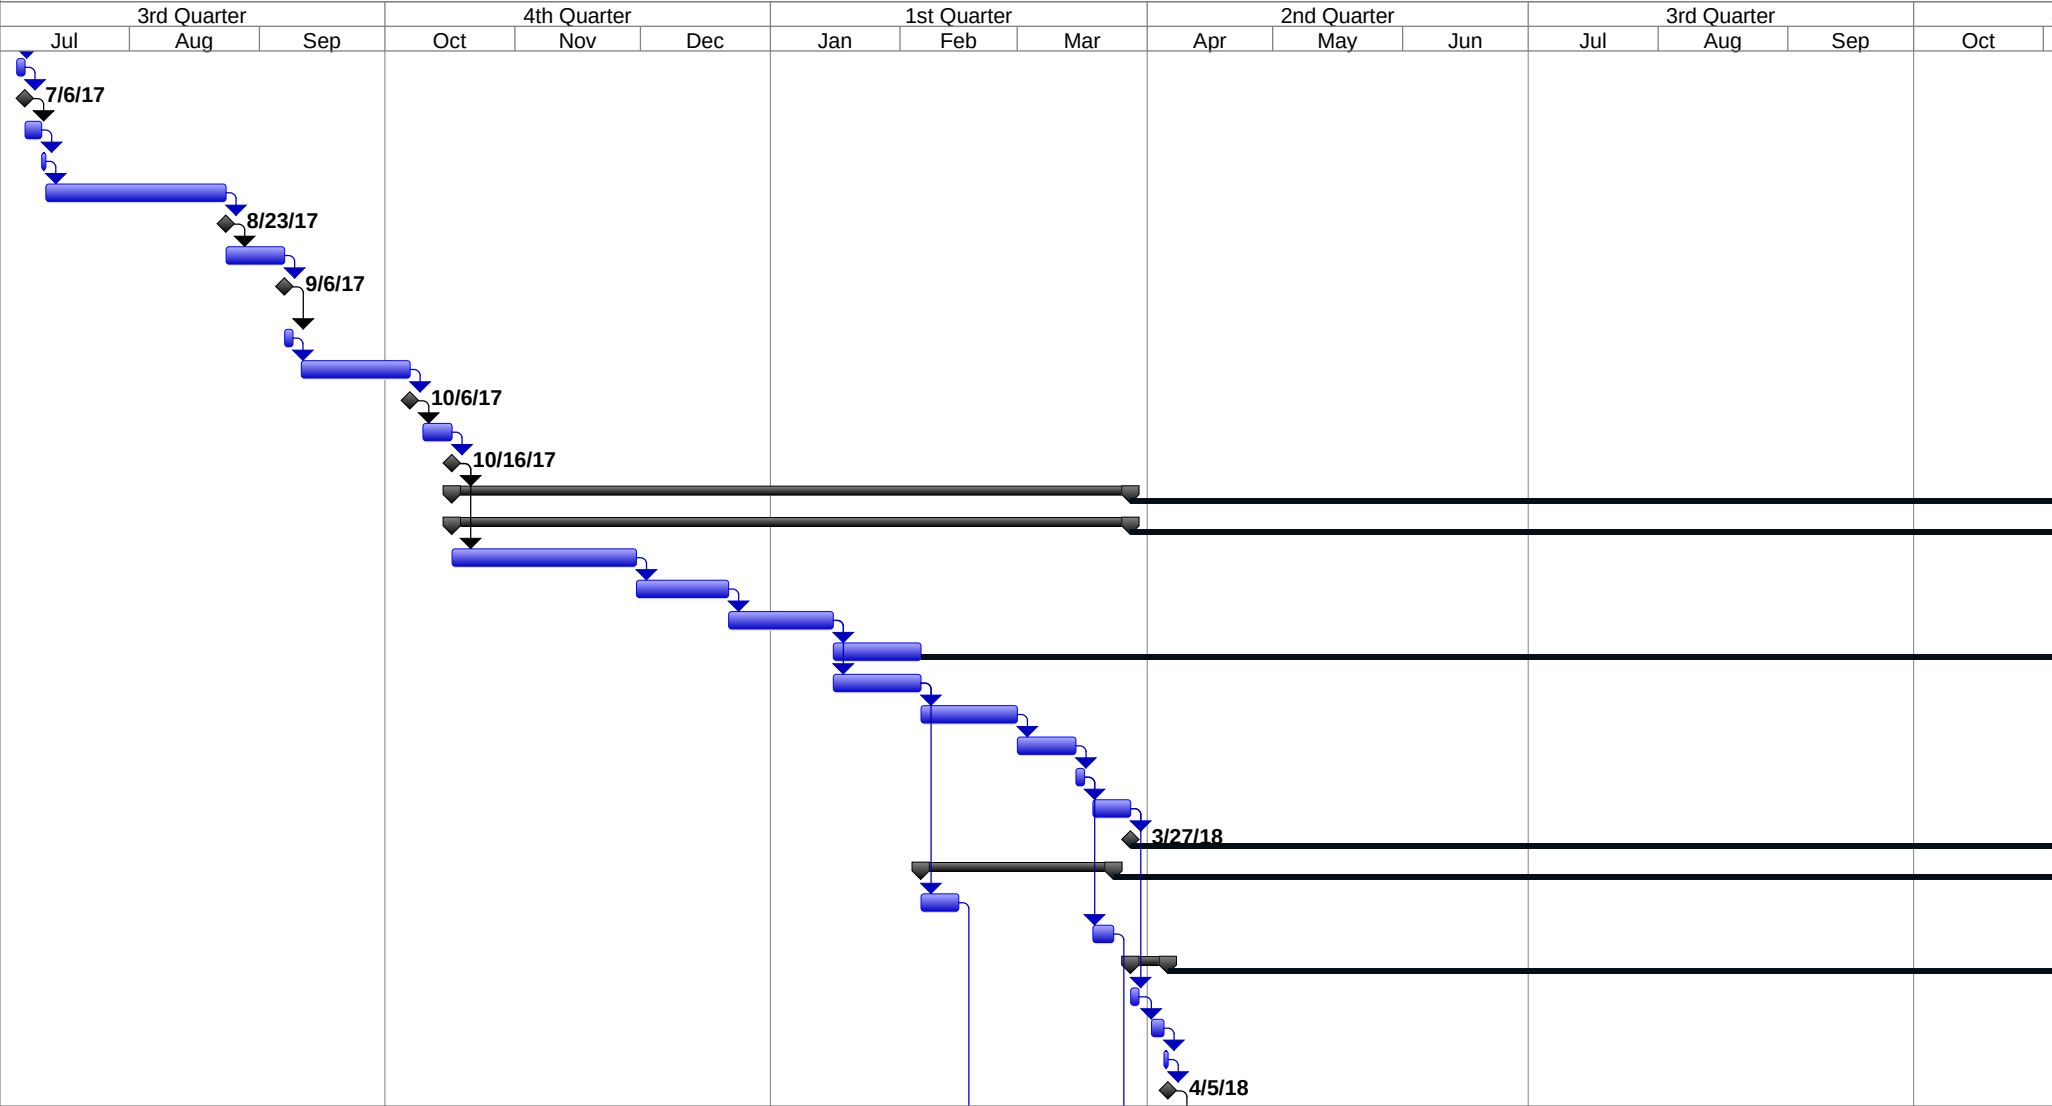


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

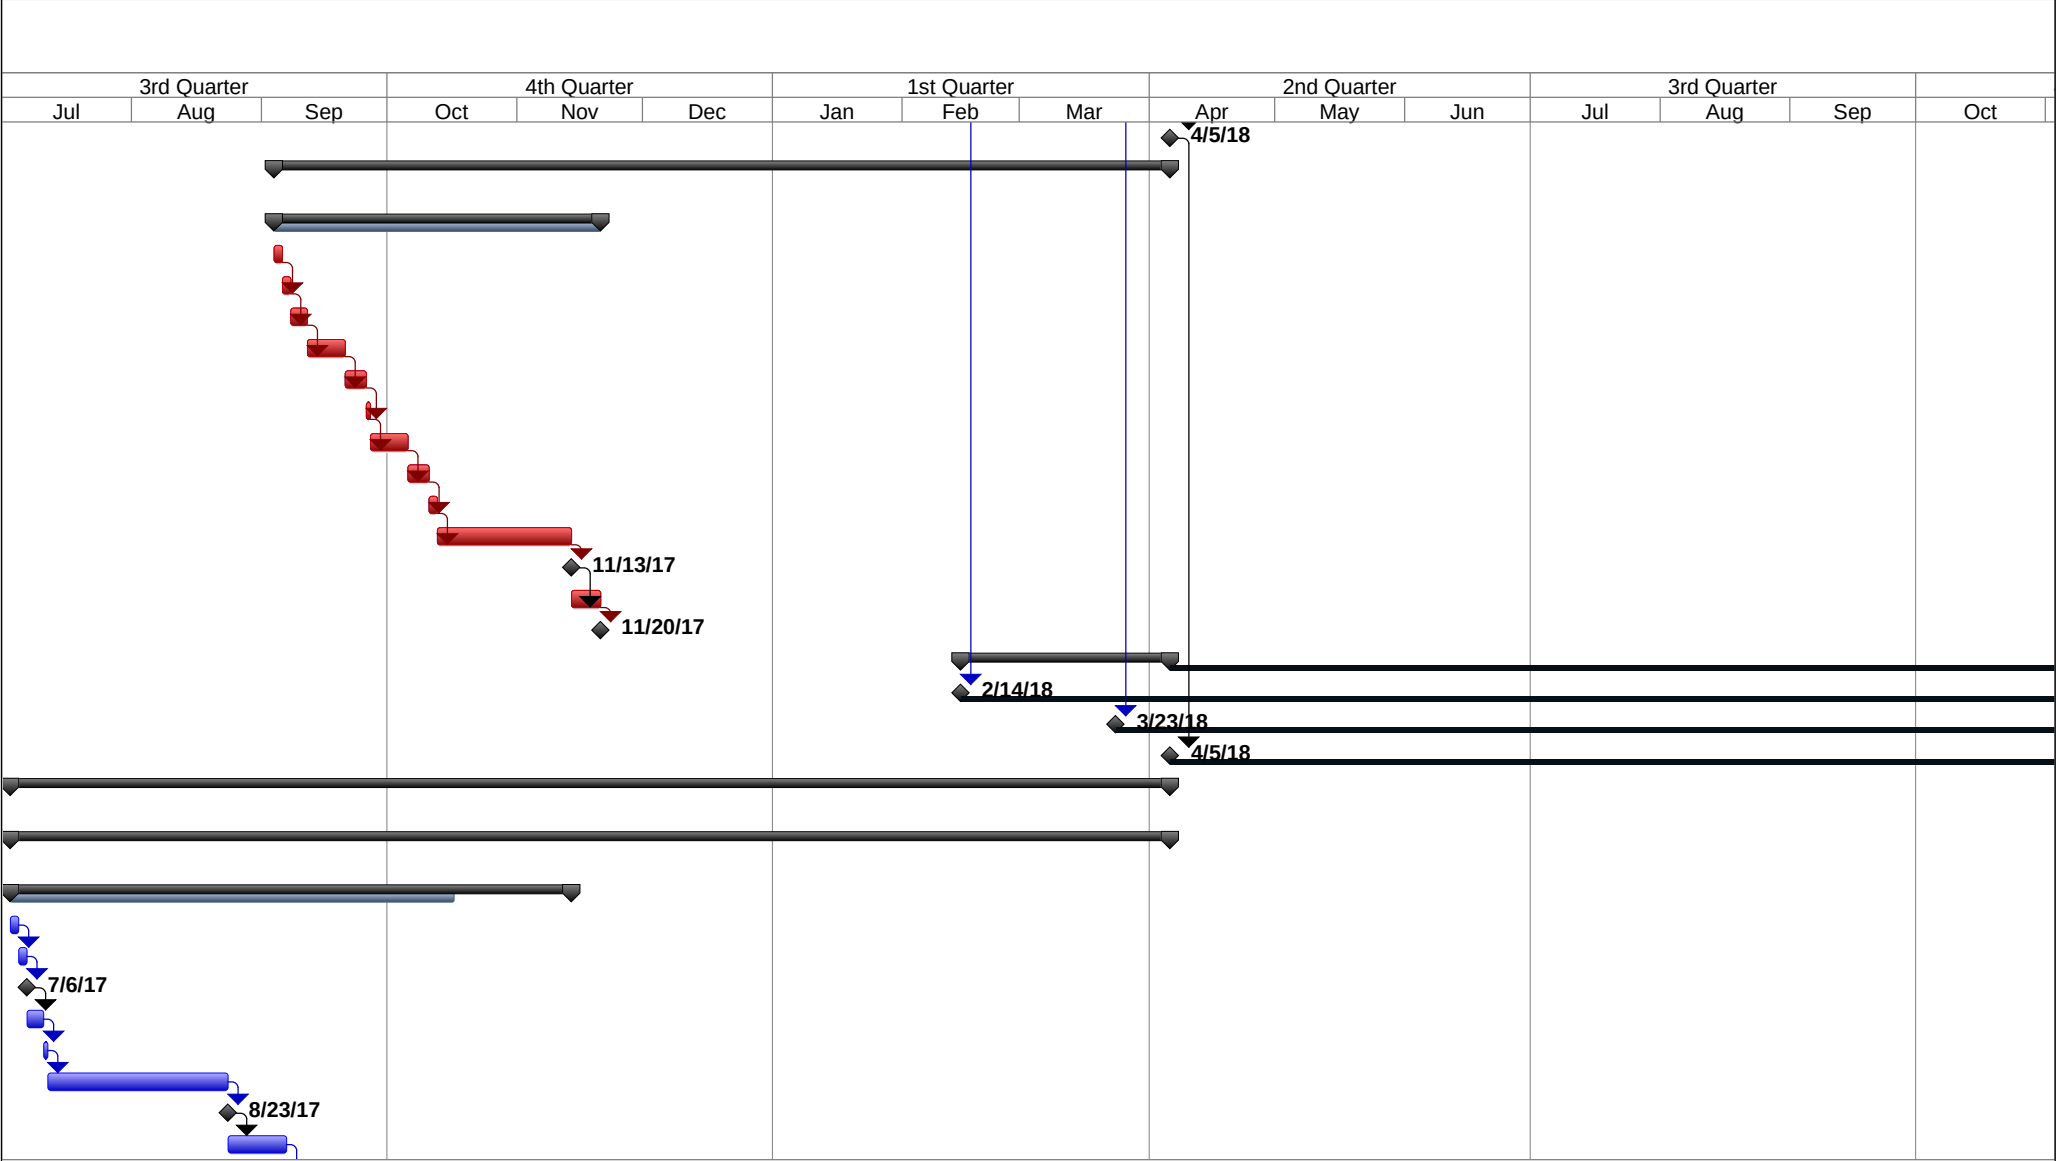


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

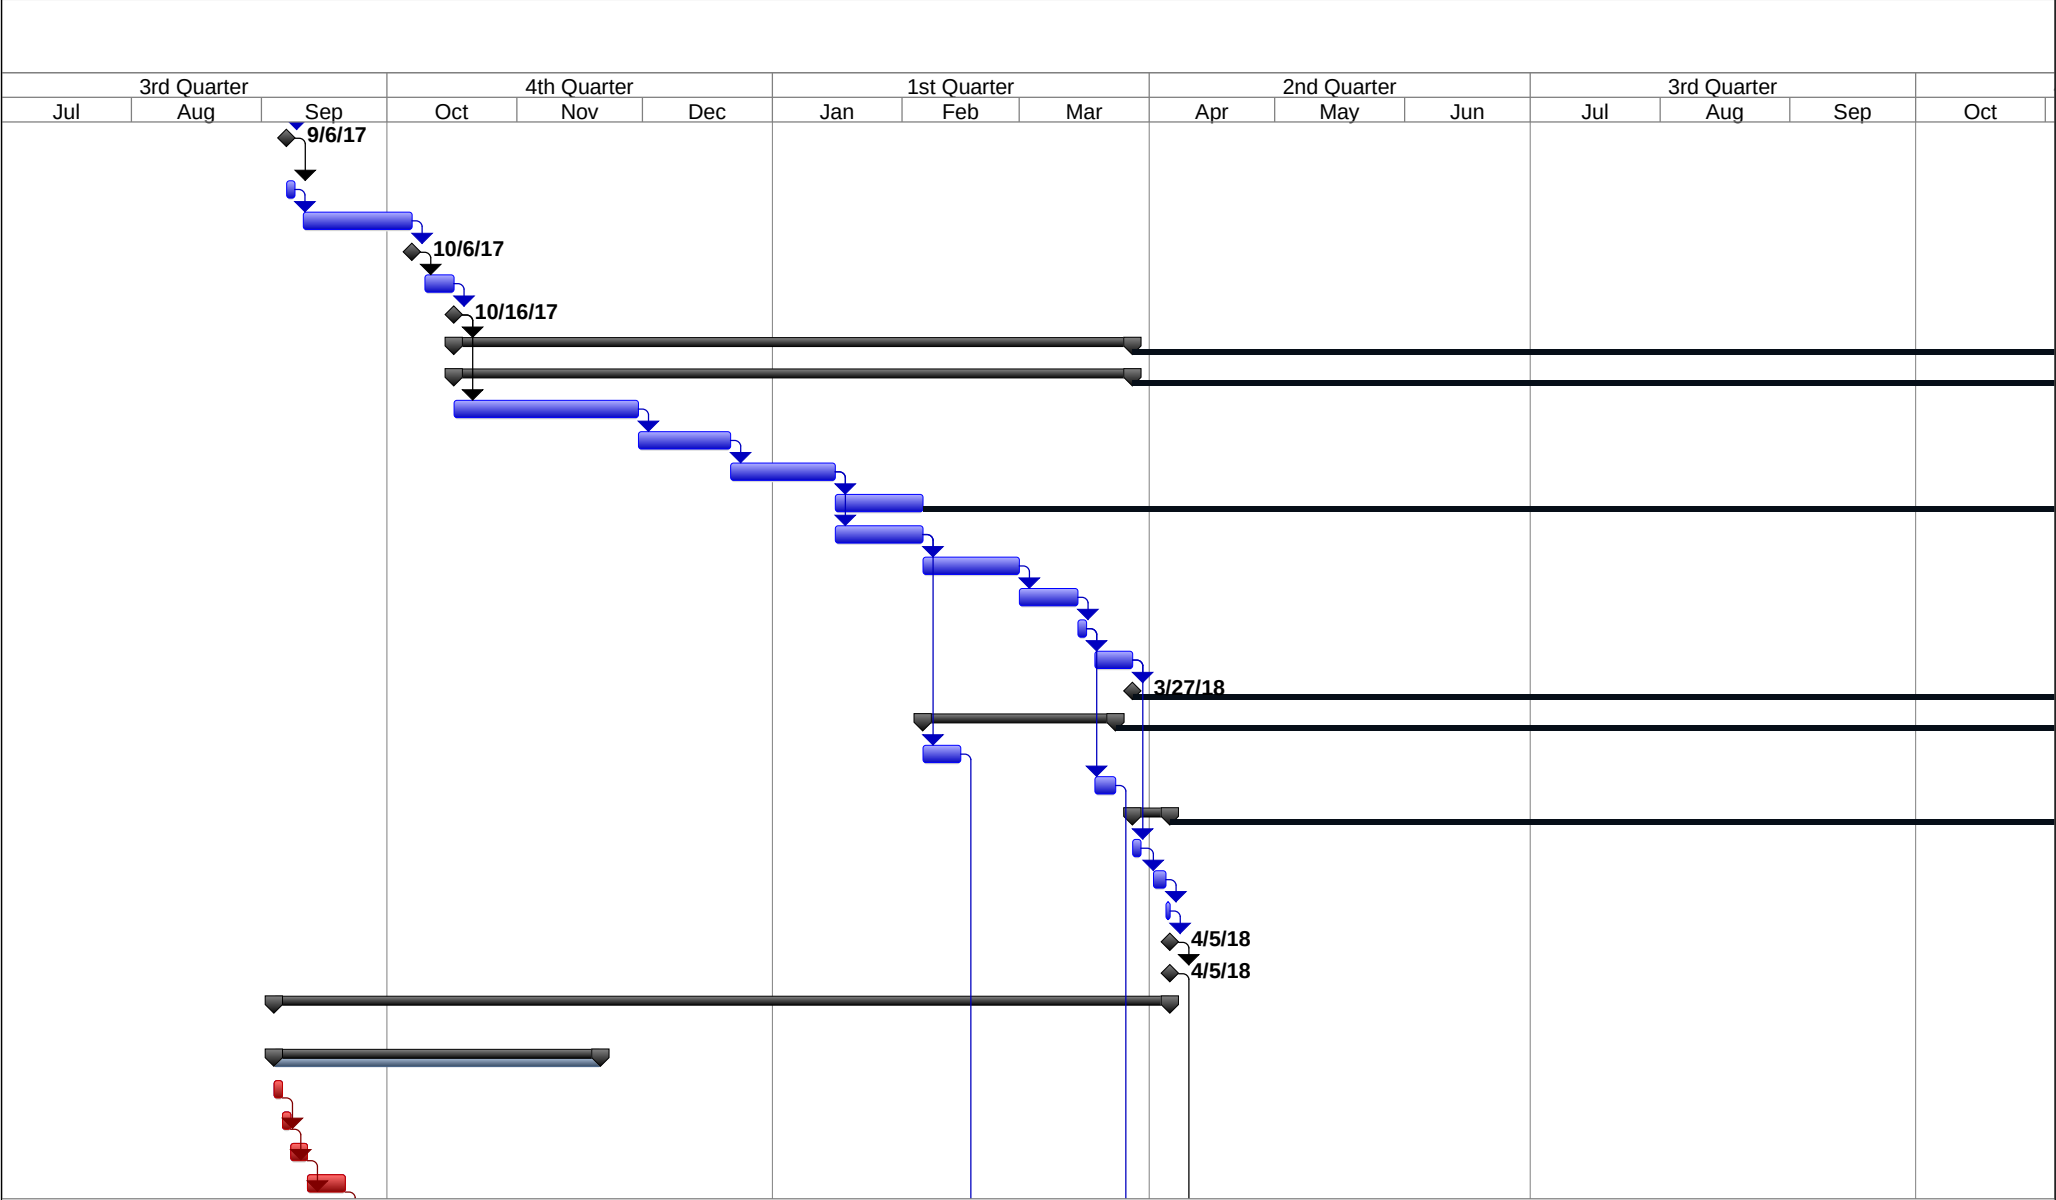


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

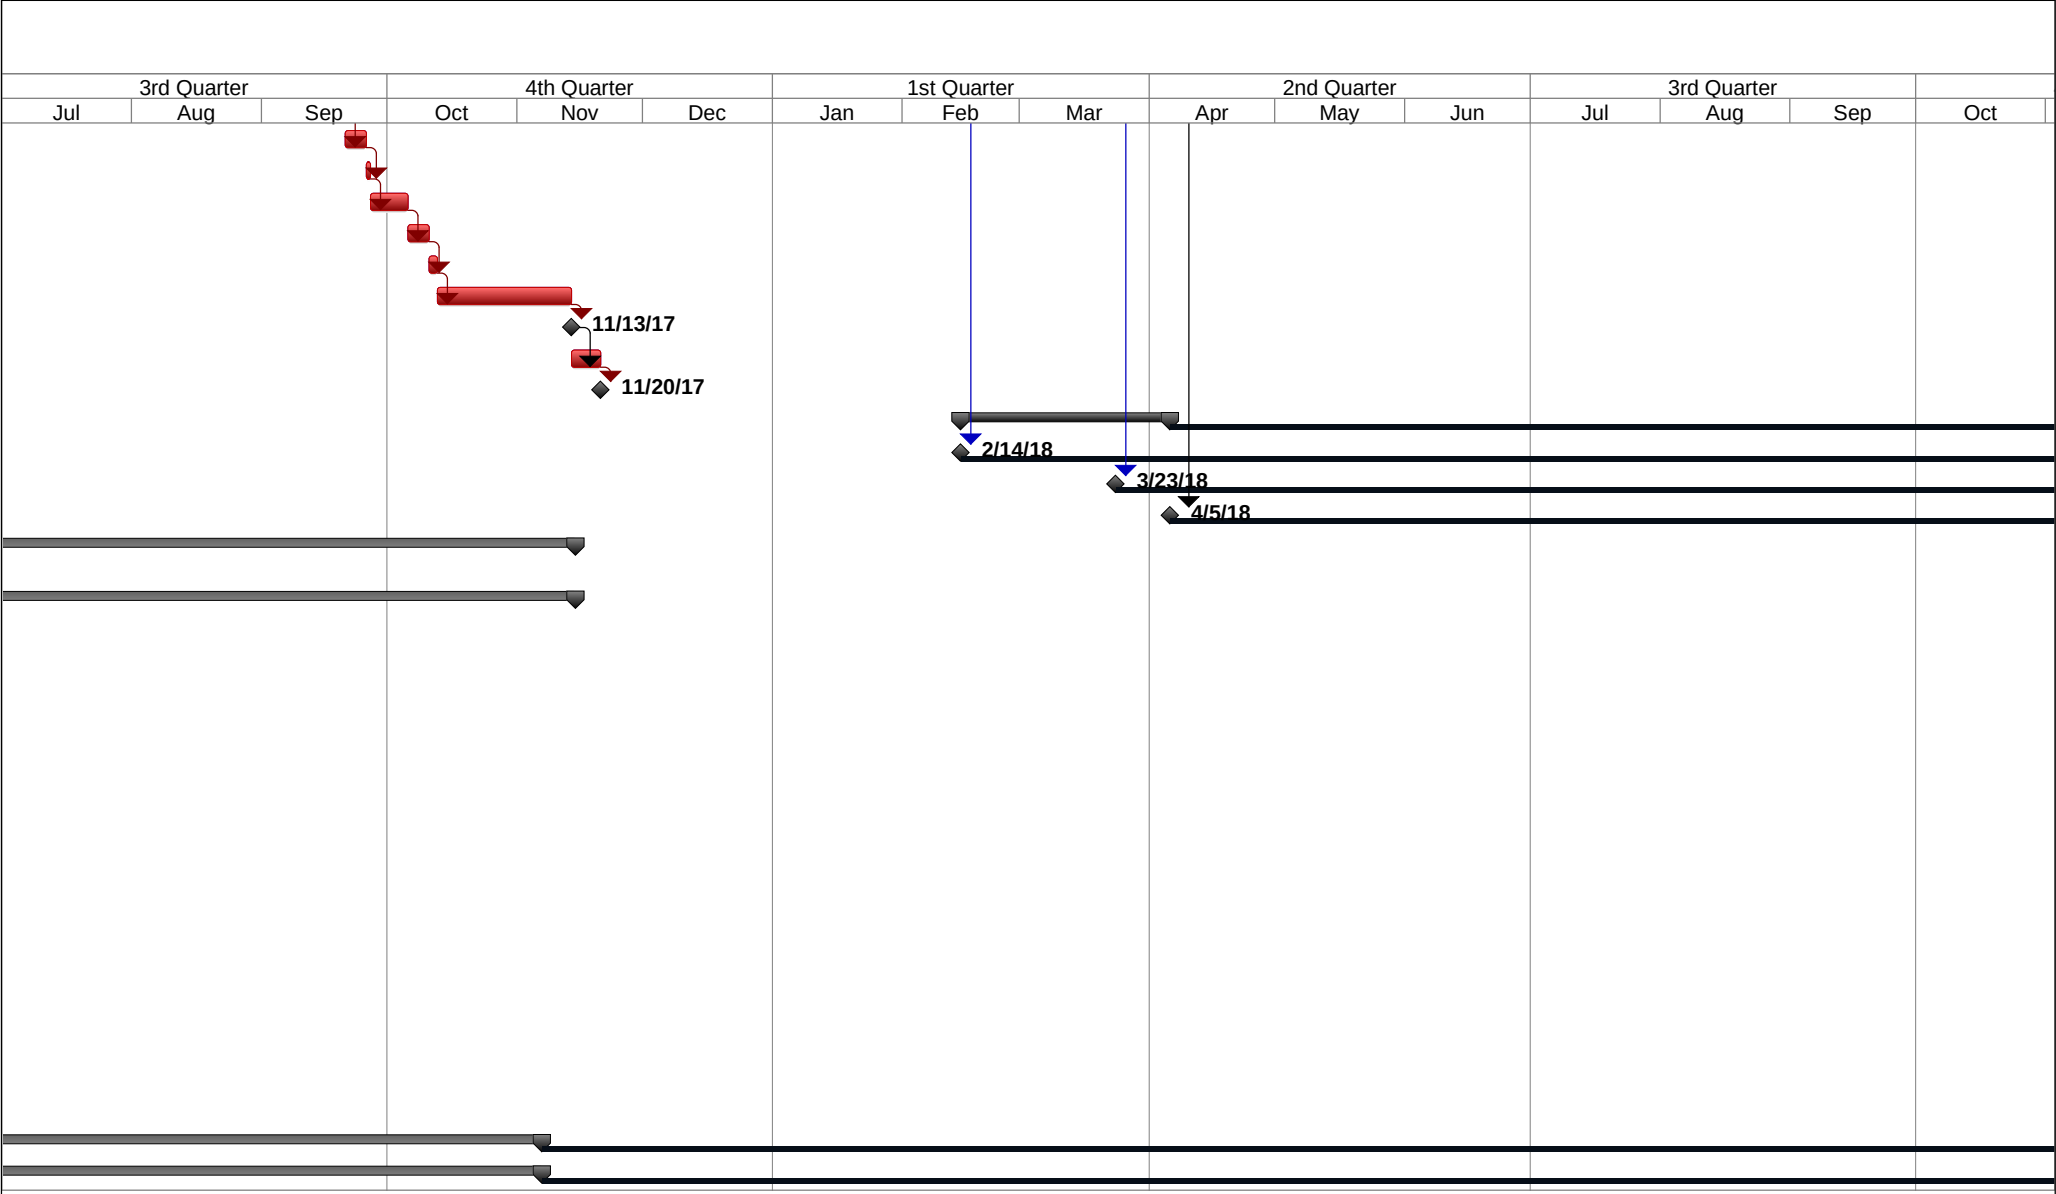

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

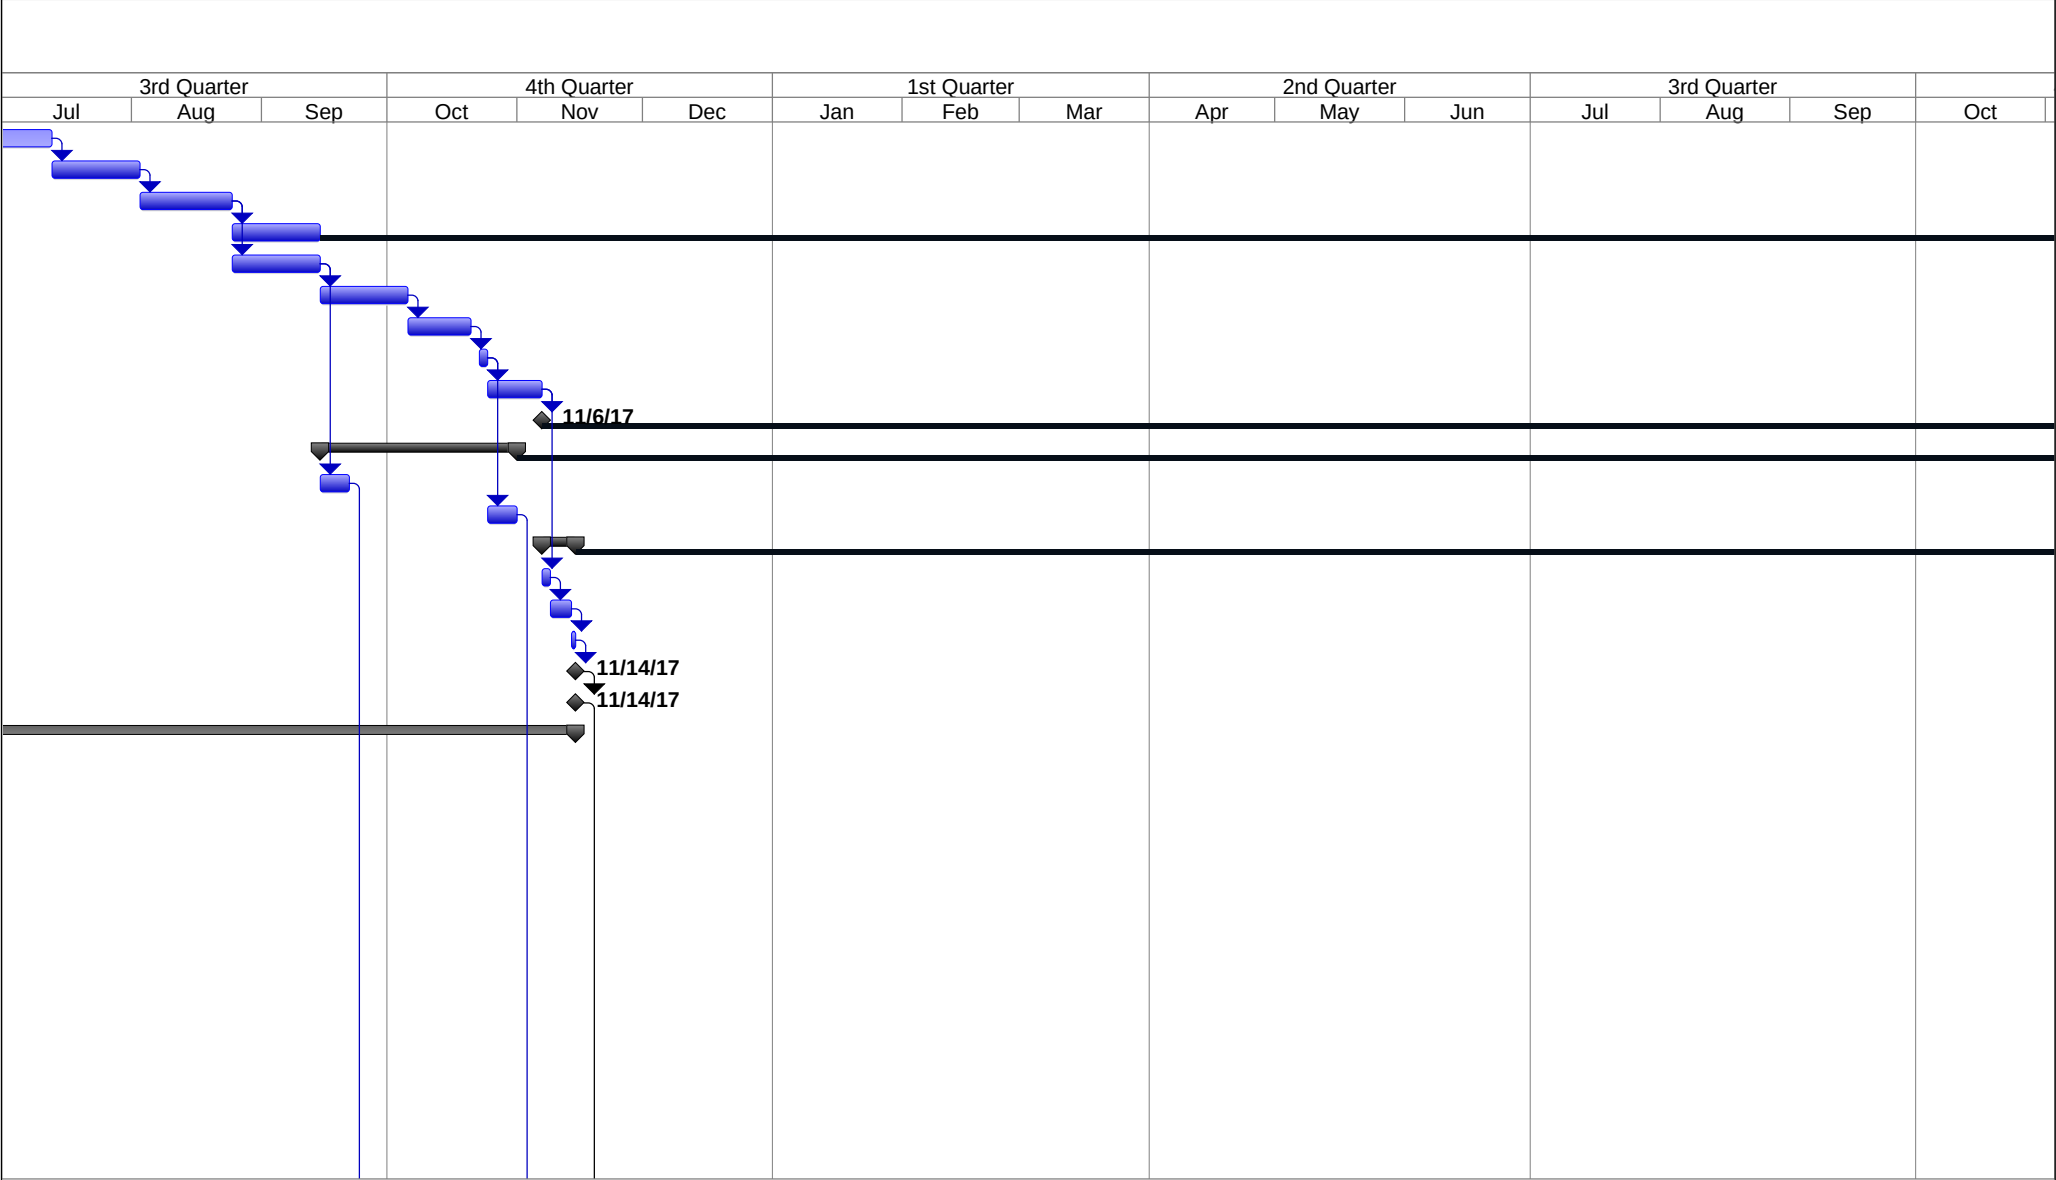


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

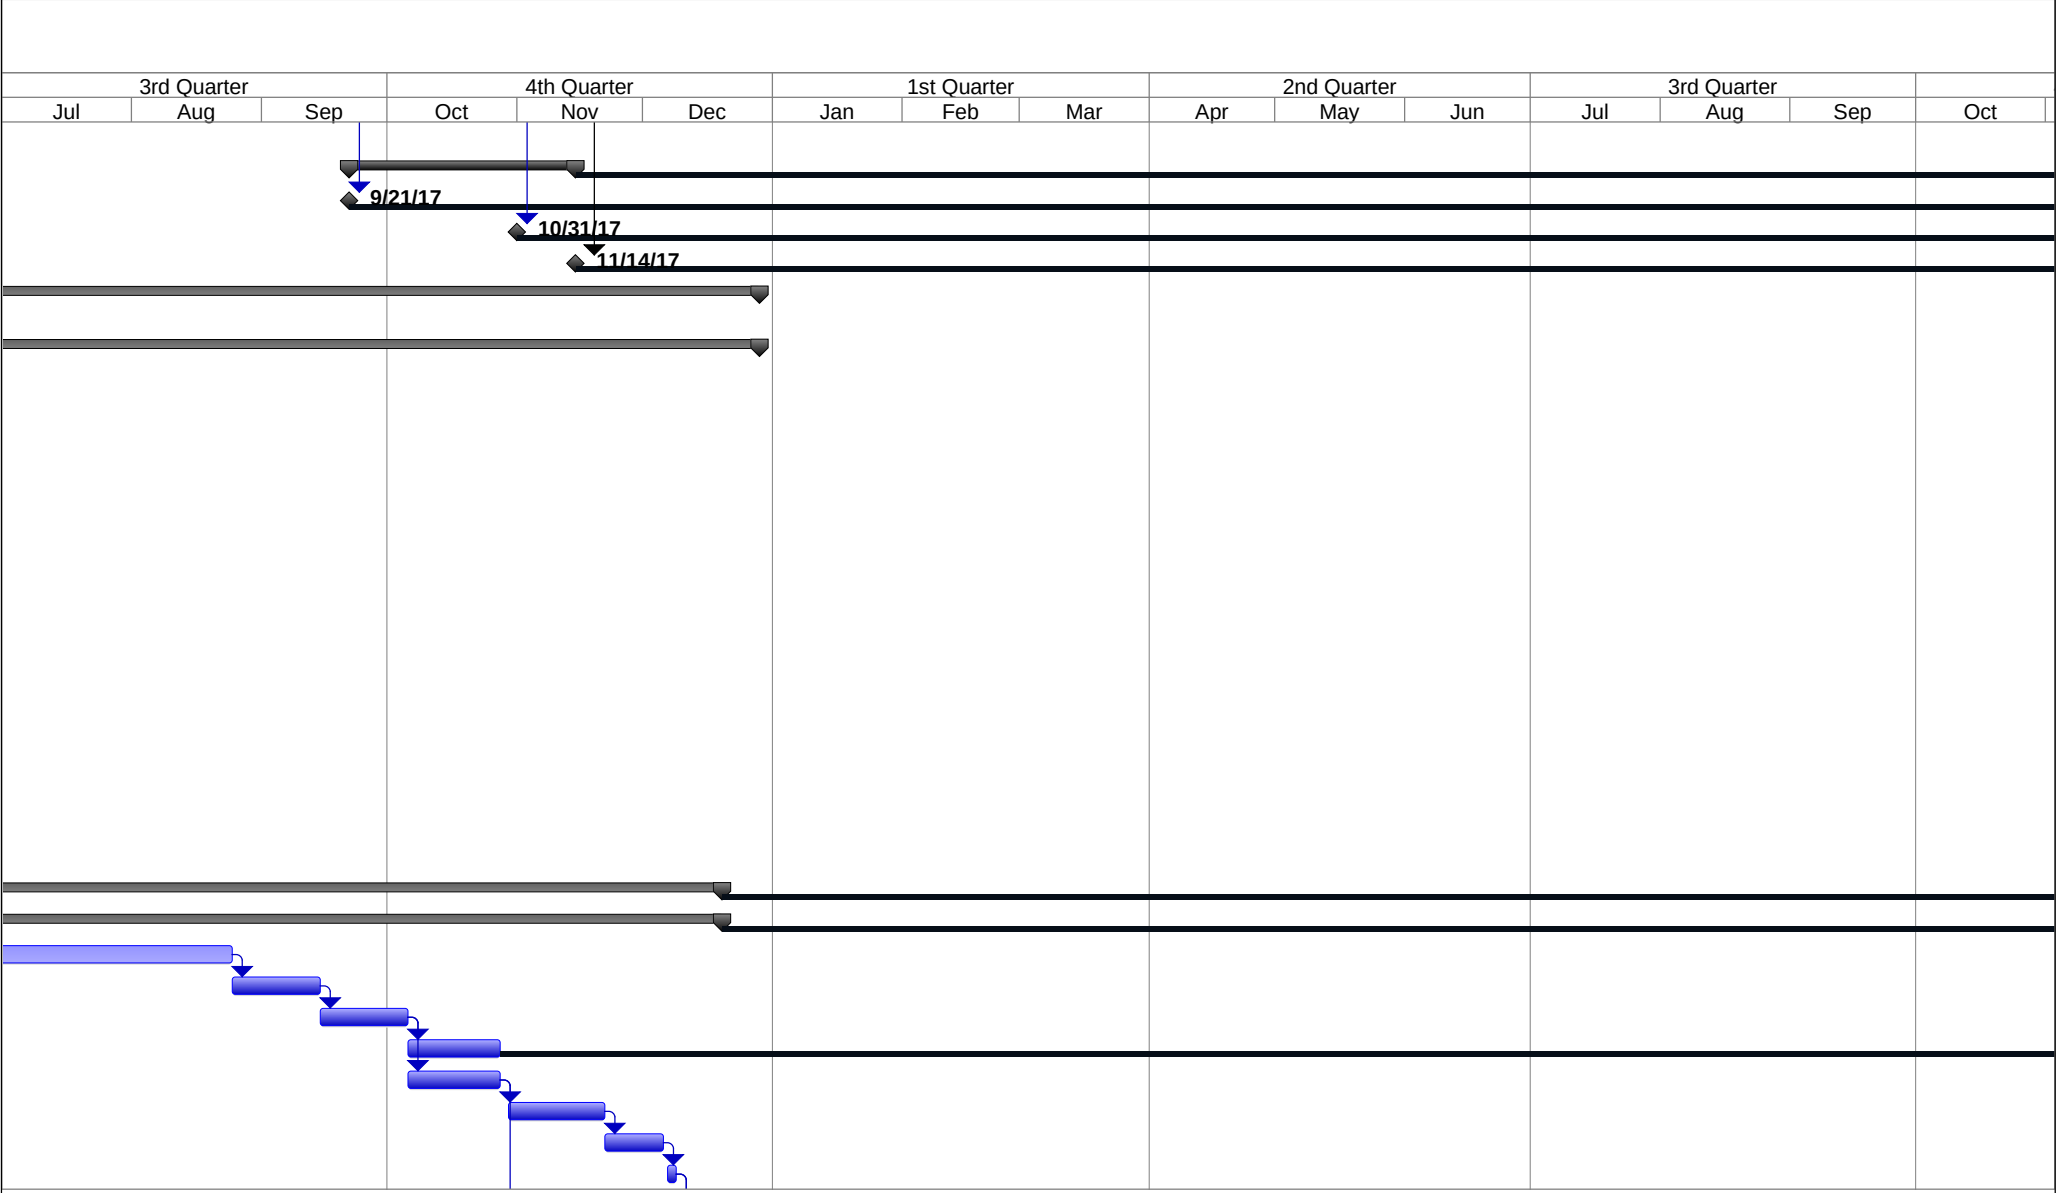






Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

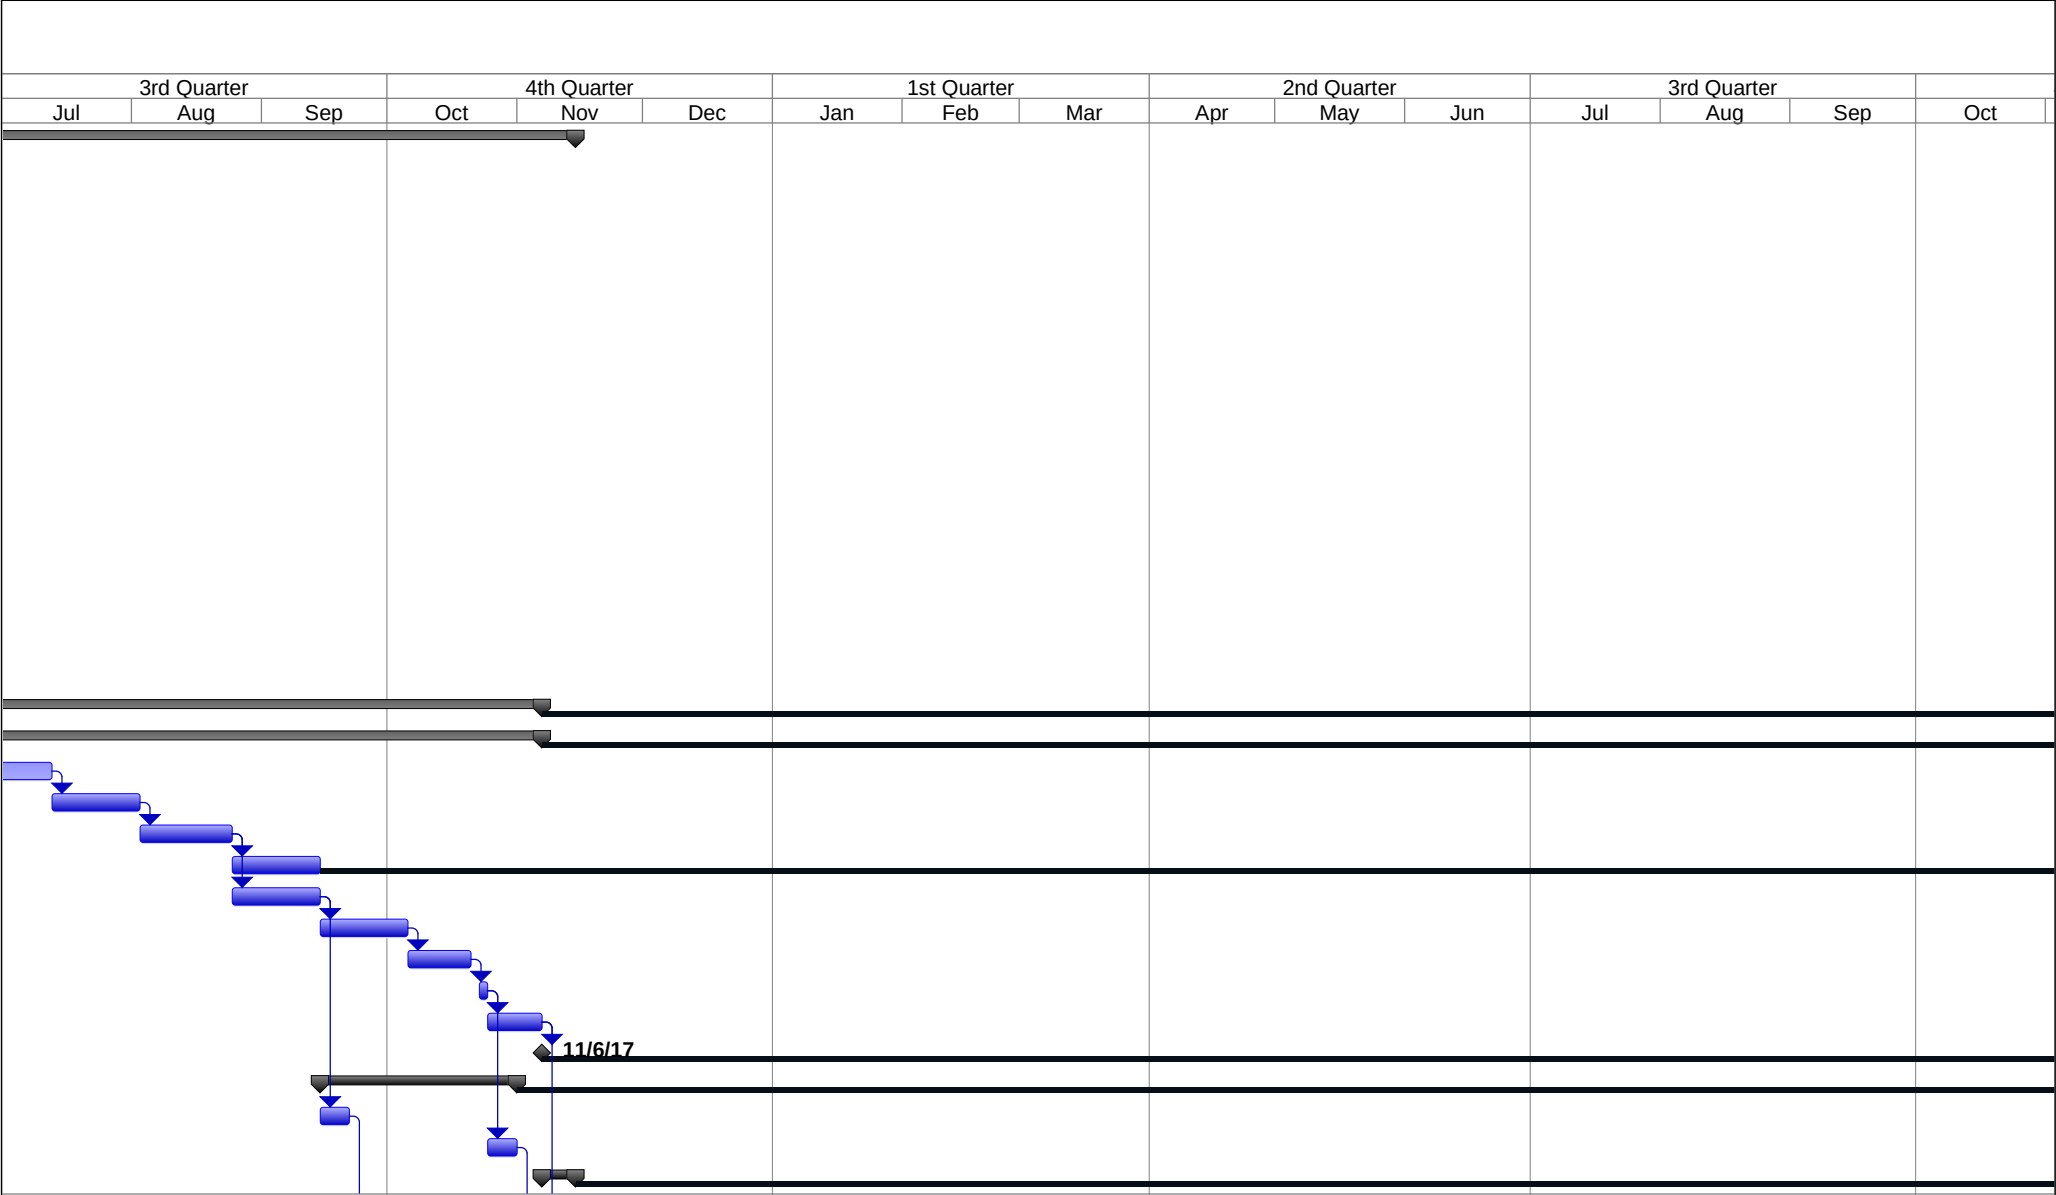

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

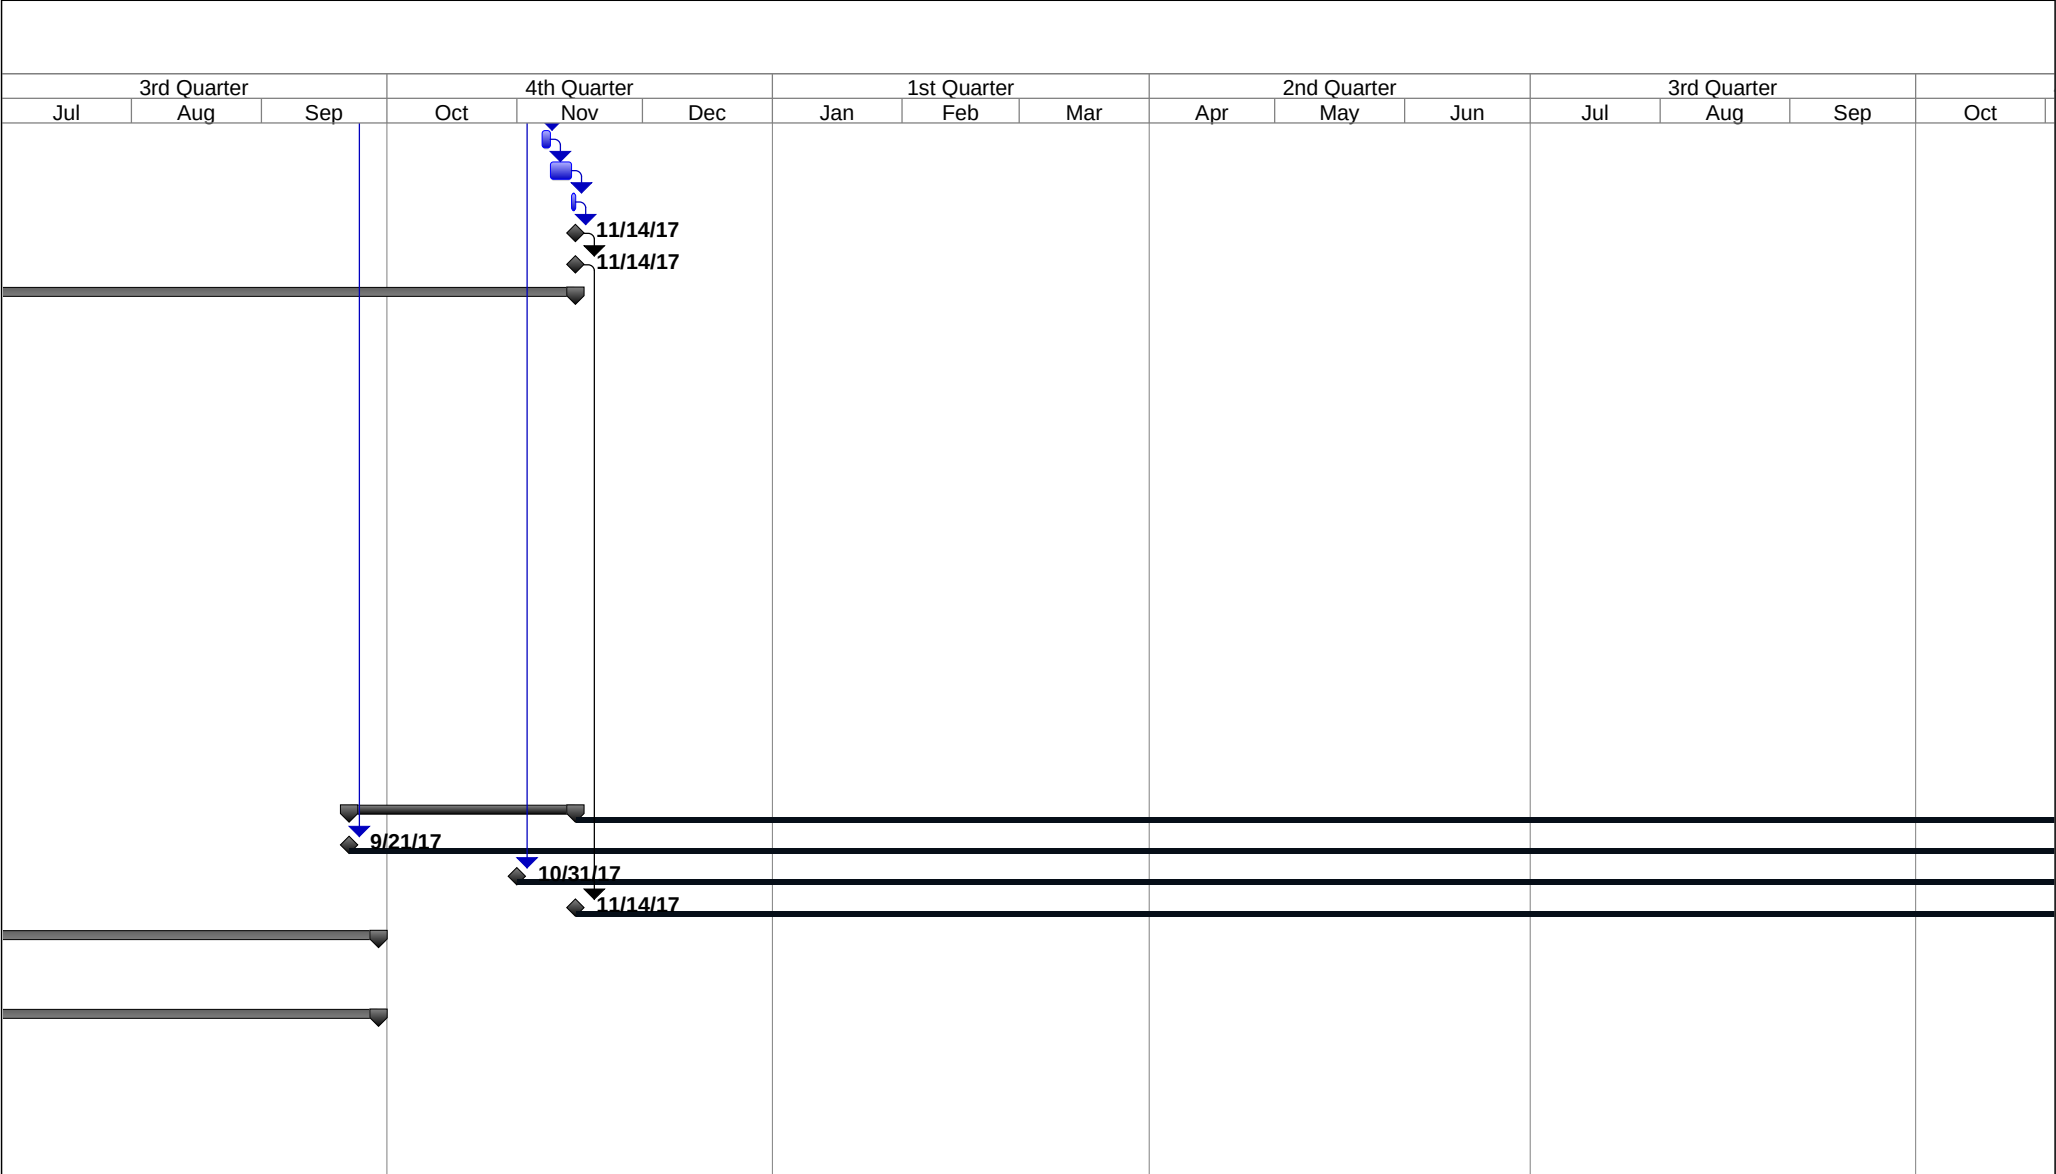


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA




## Plan Operativo Anual, POA

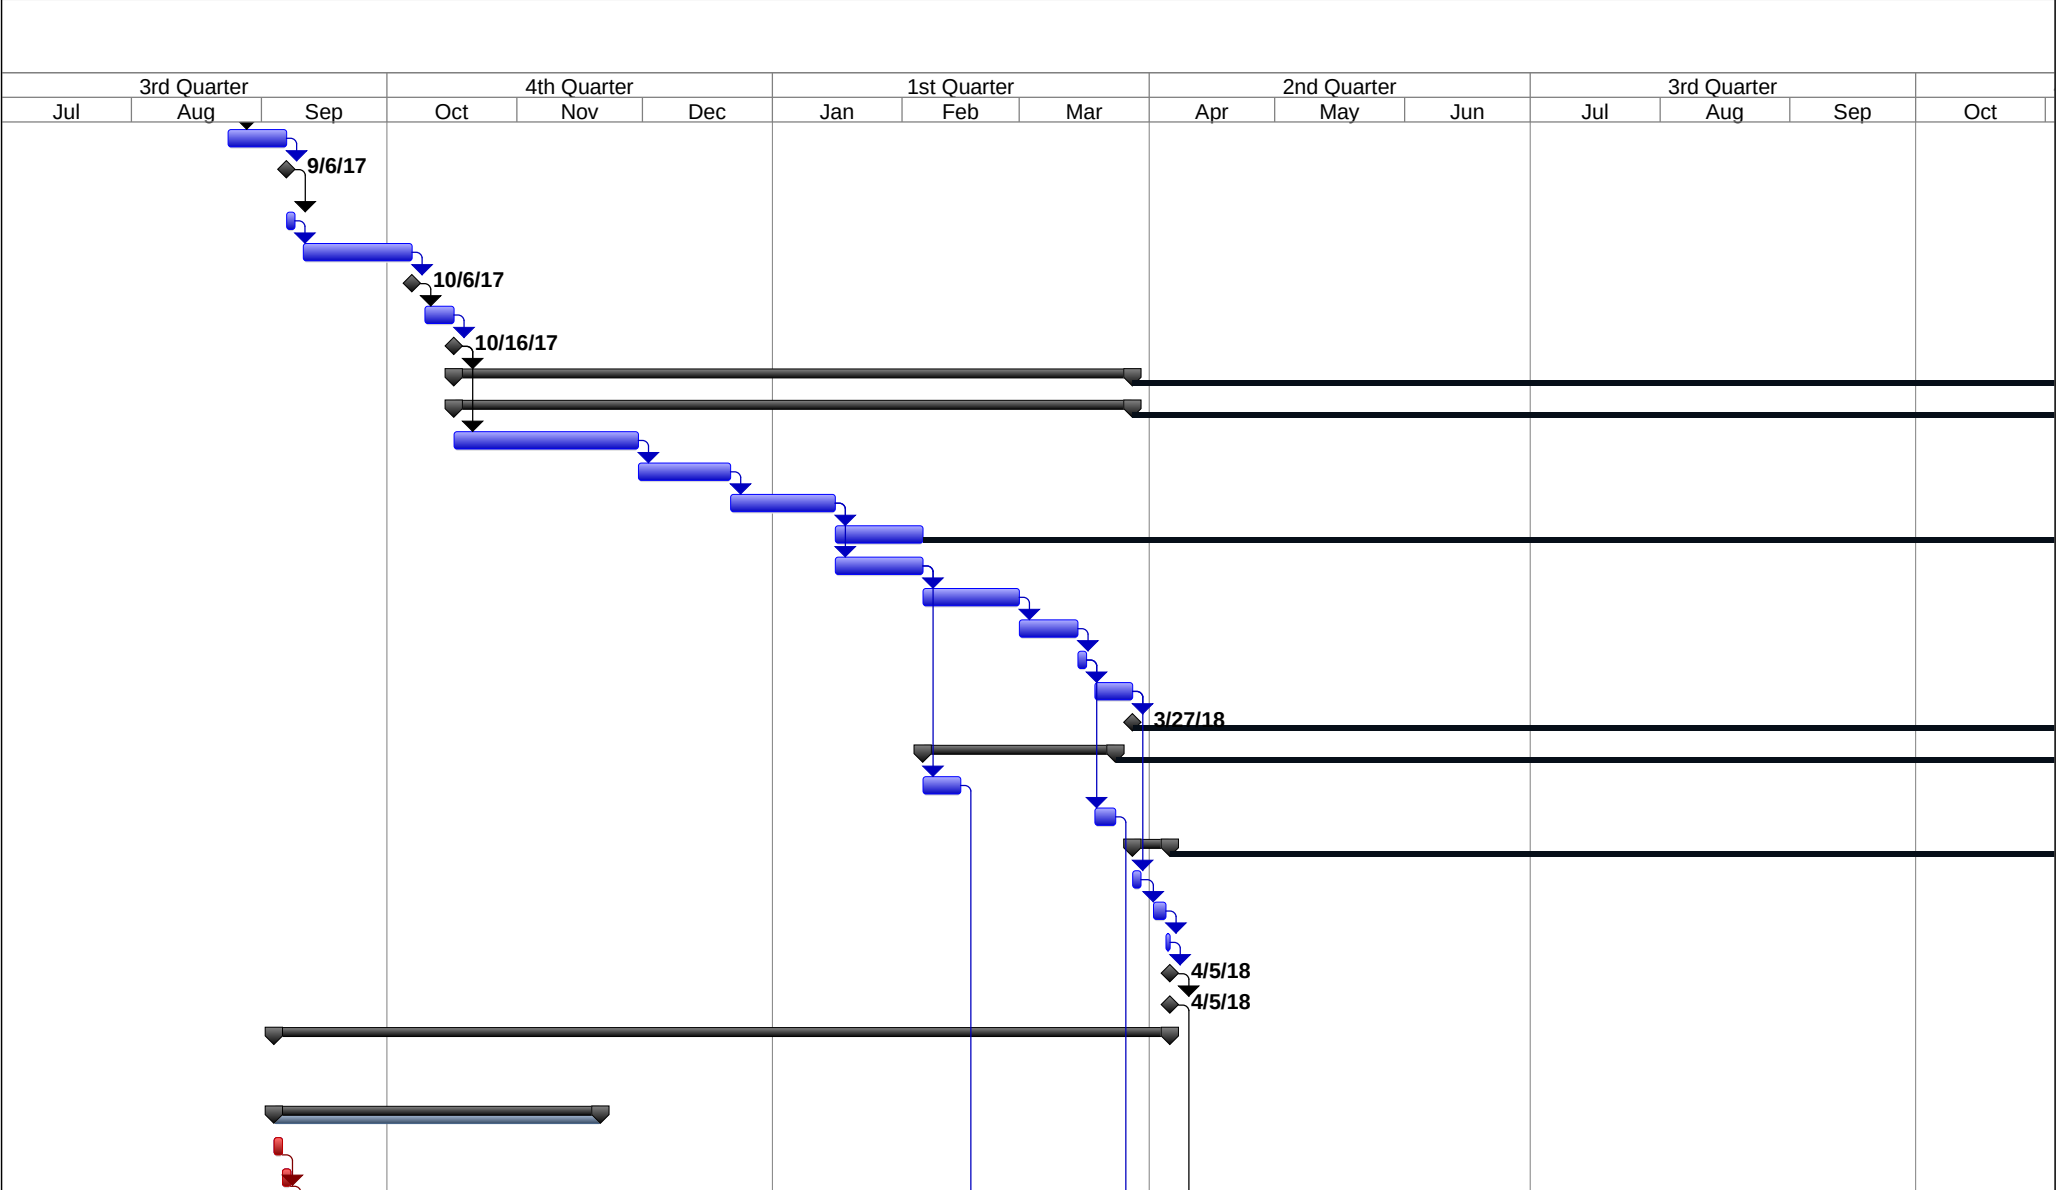

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

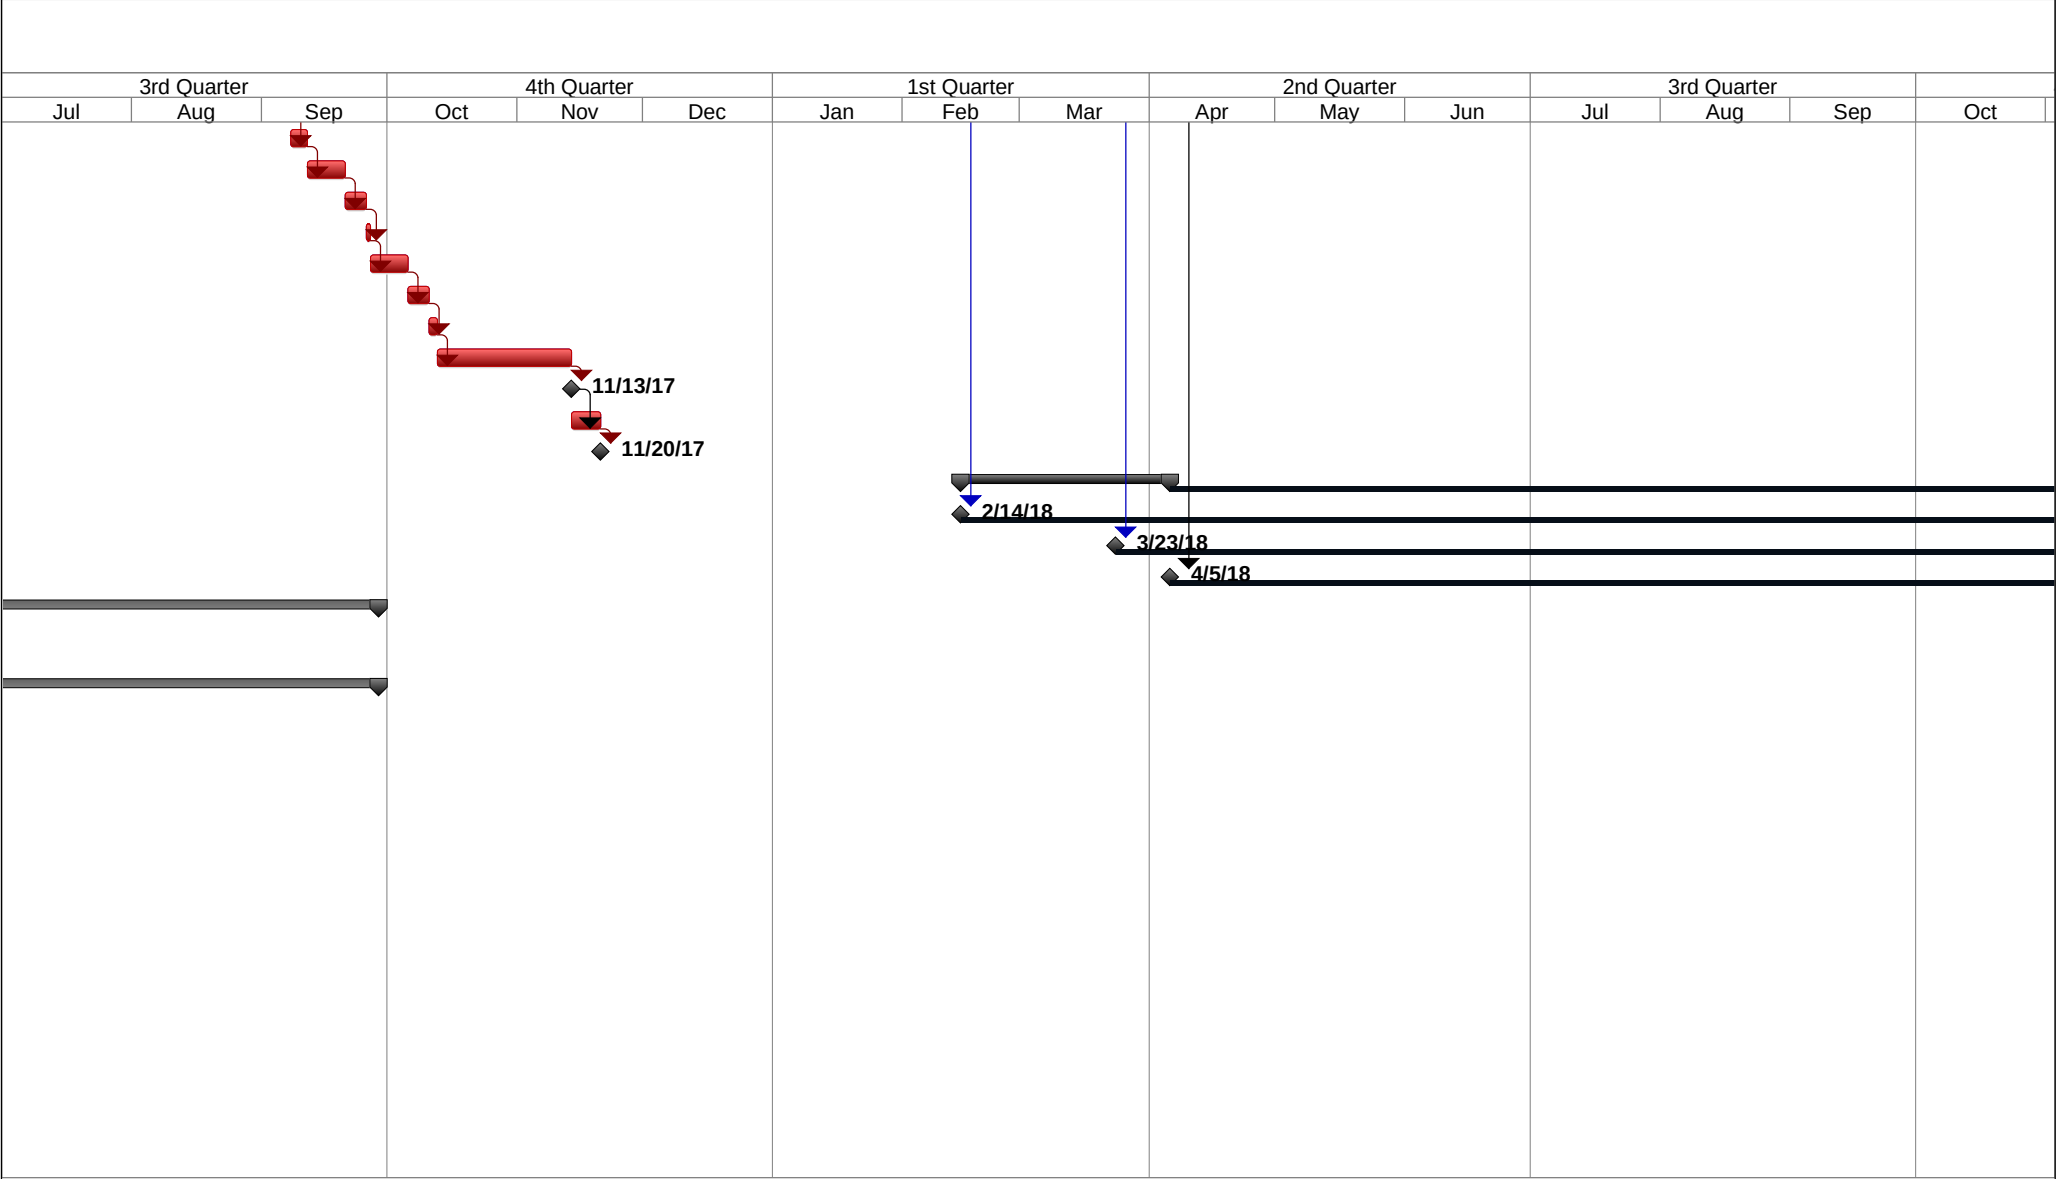


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

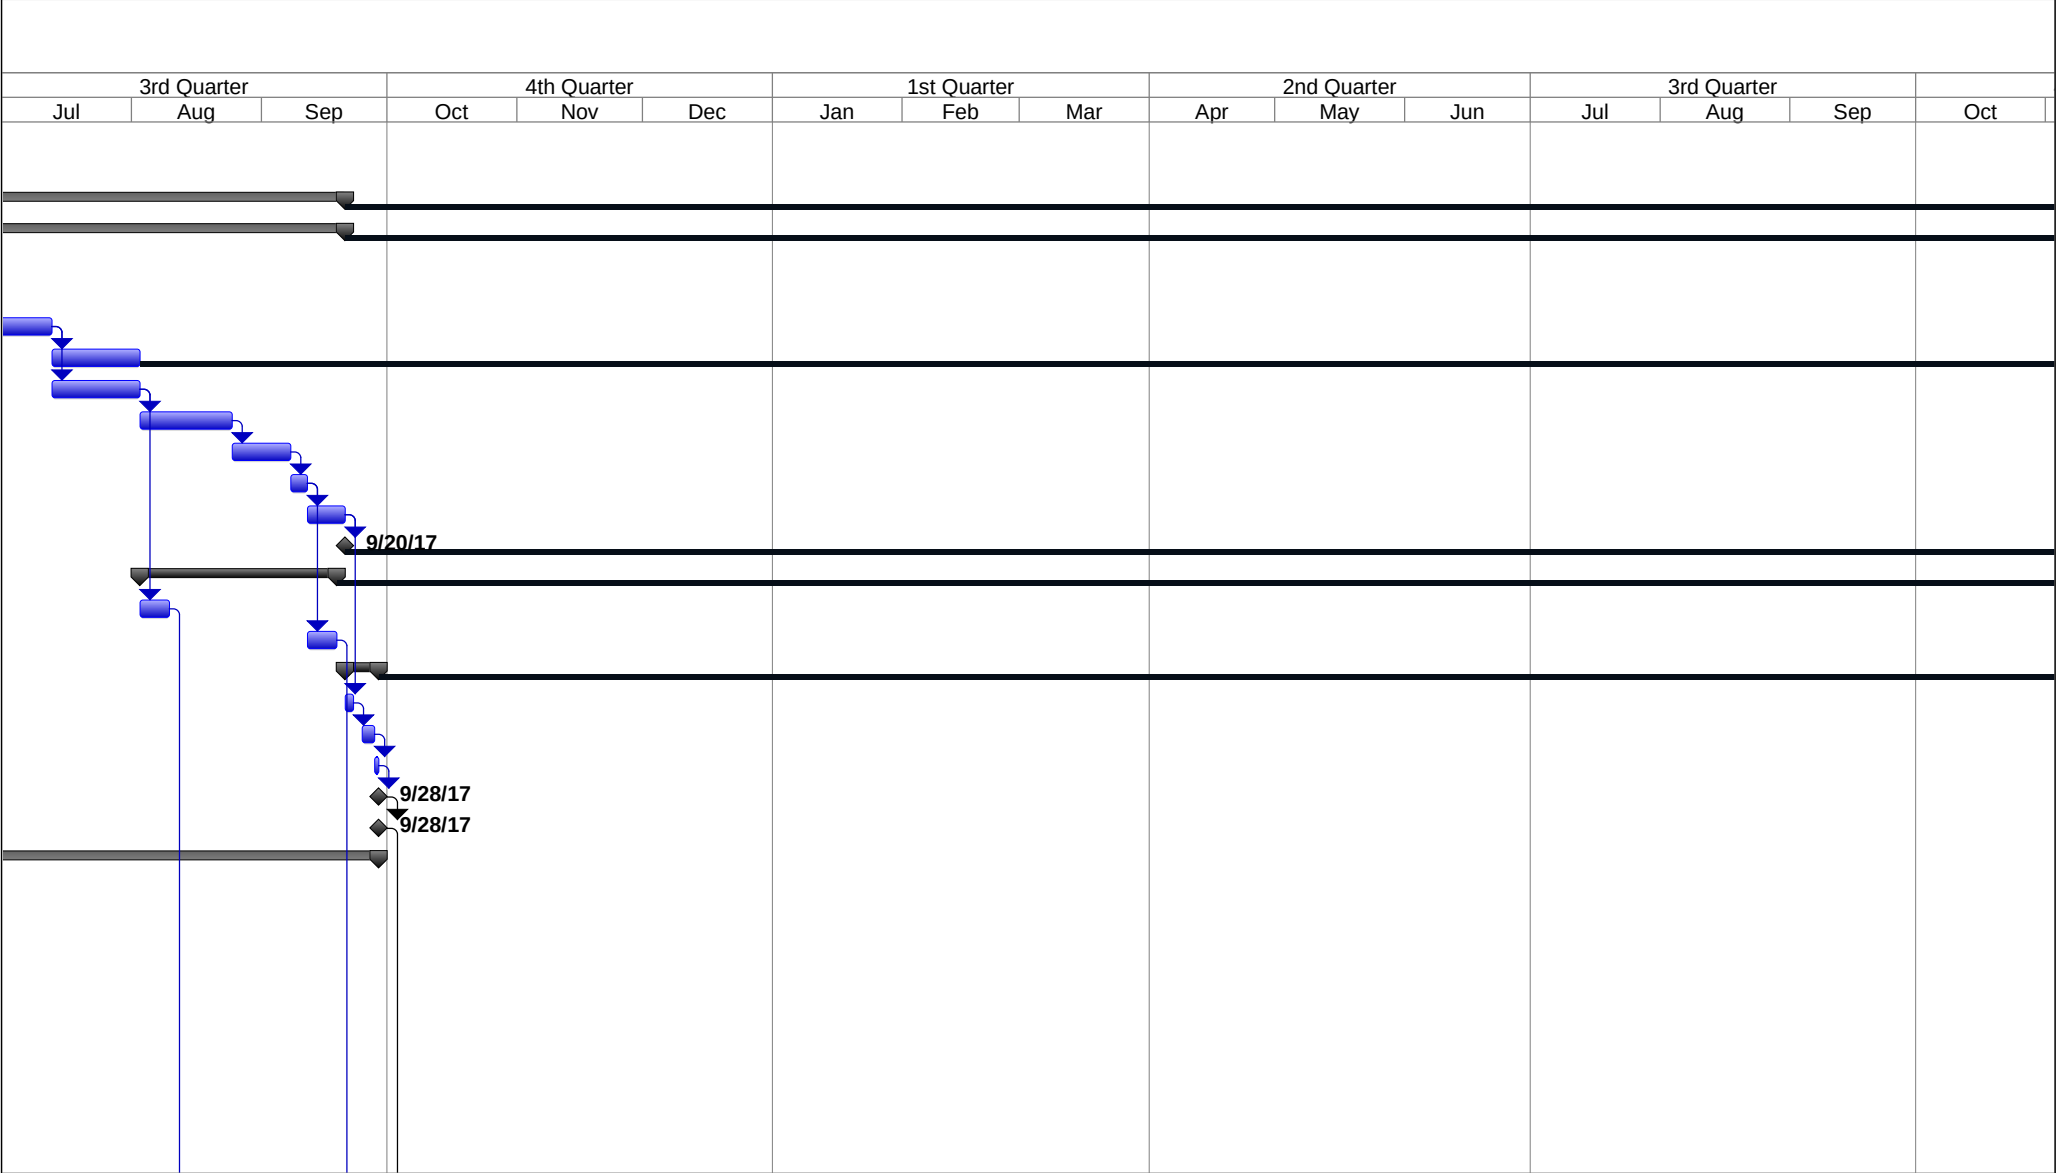





Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

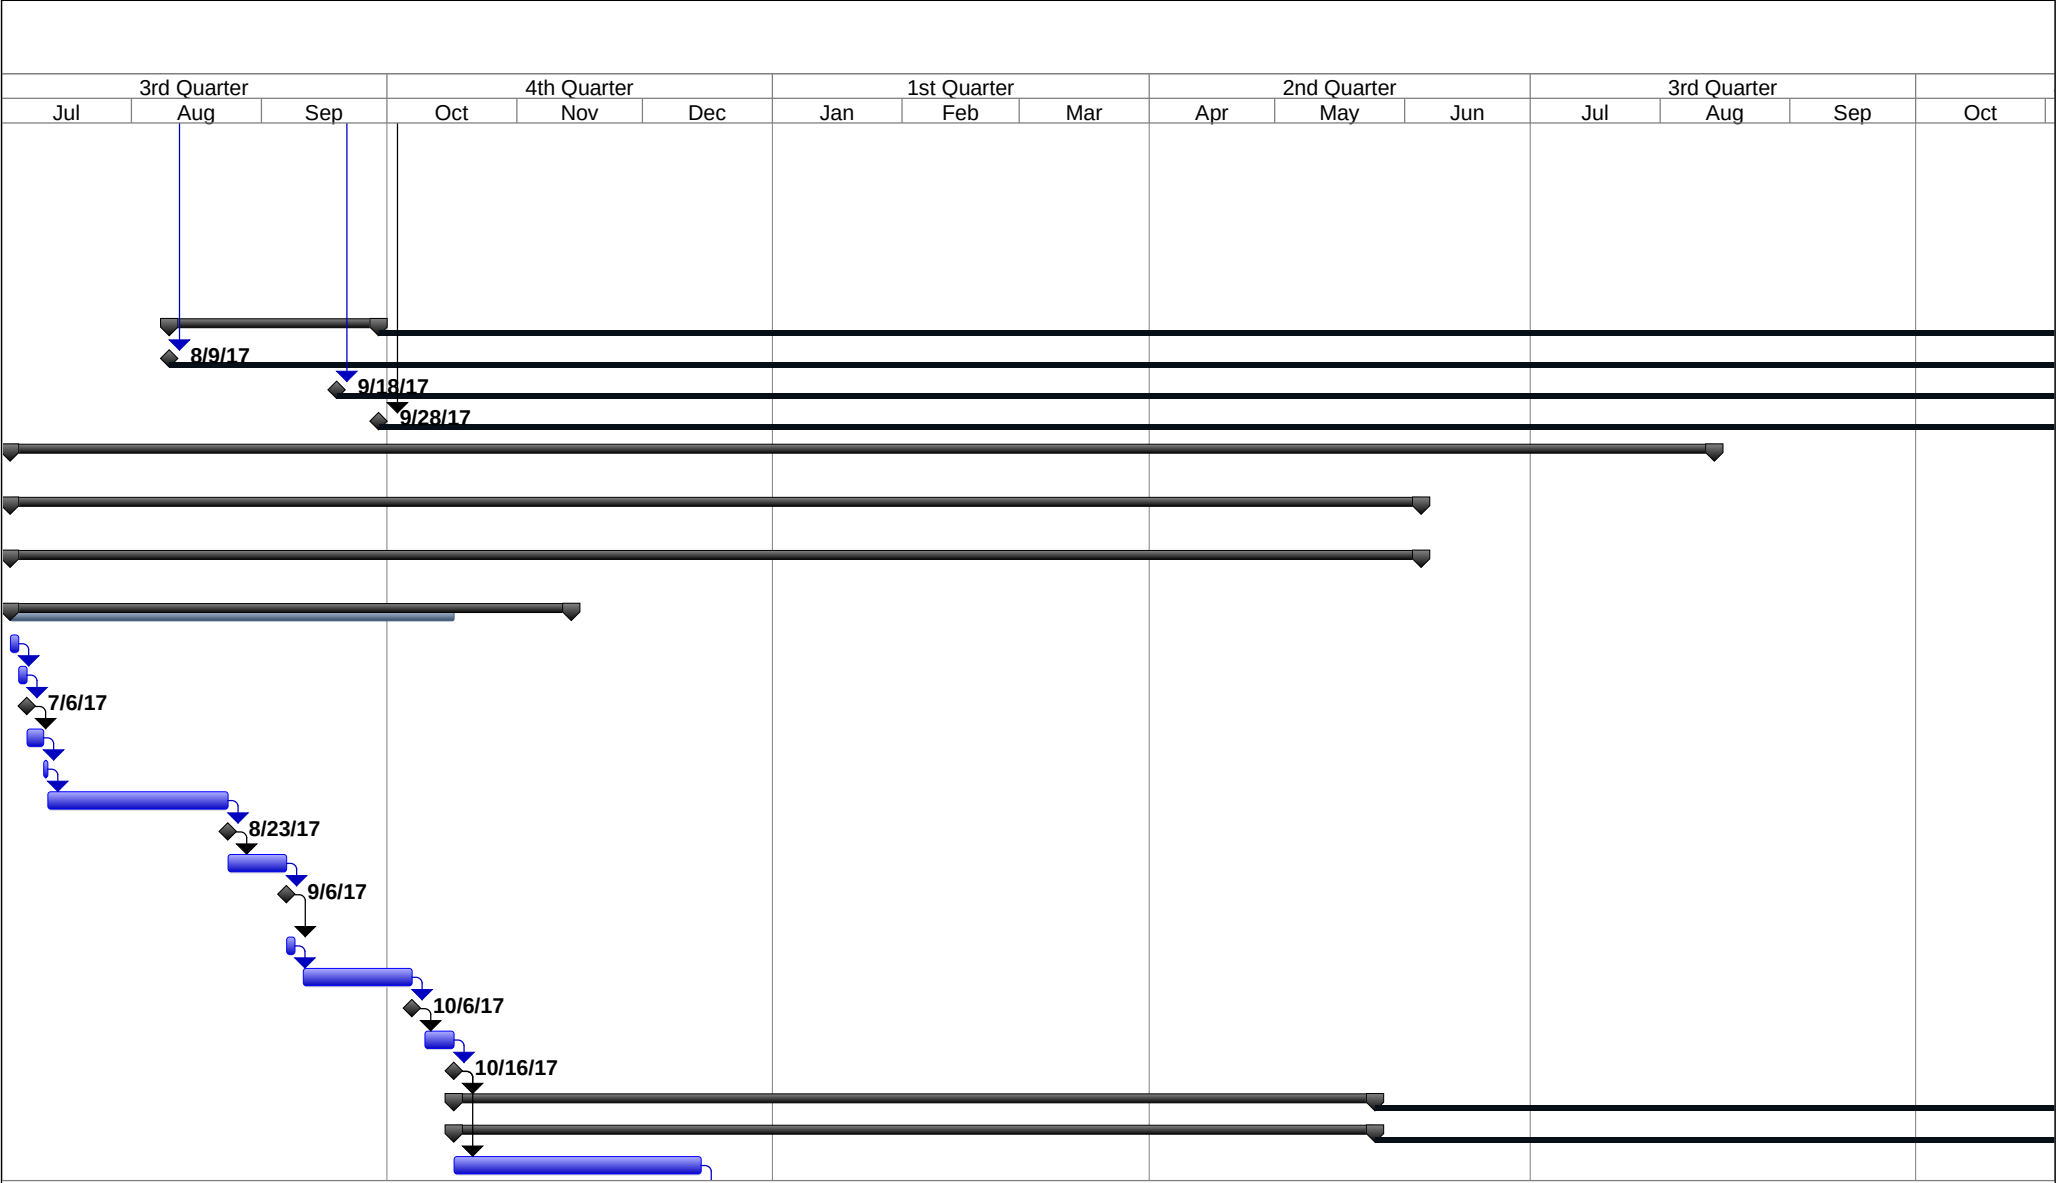


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

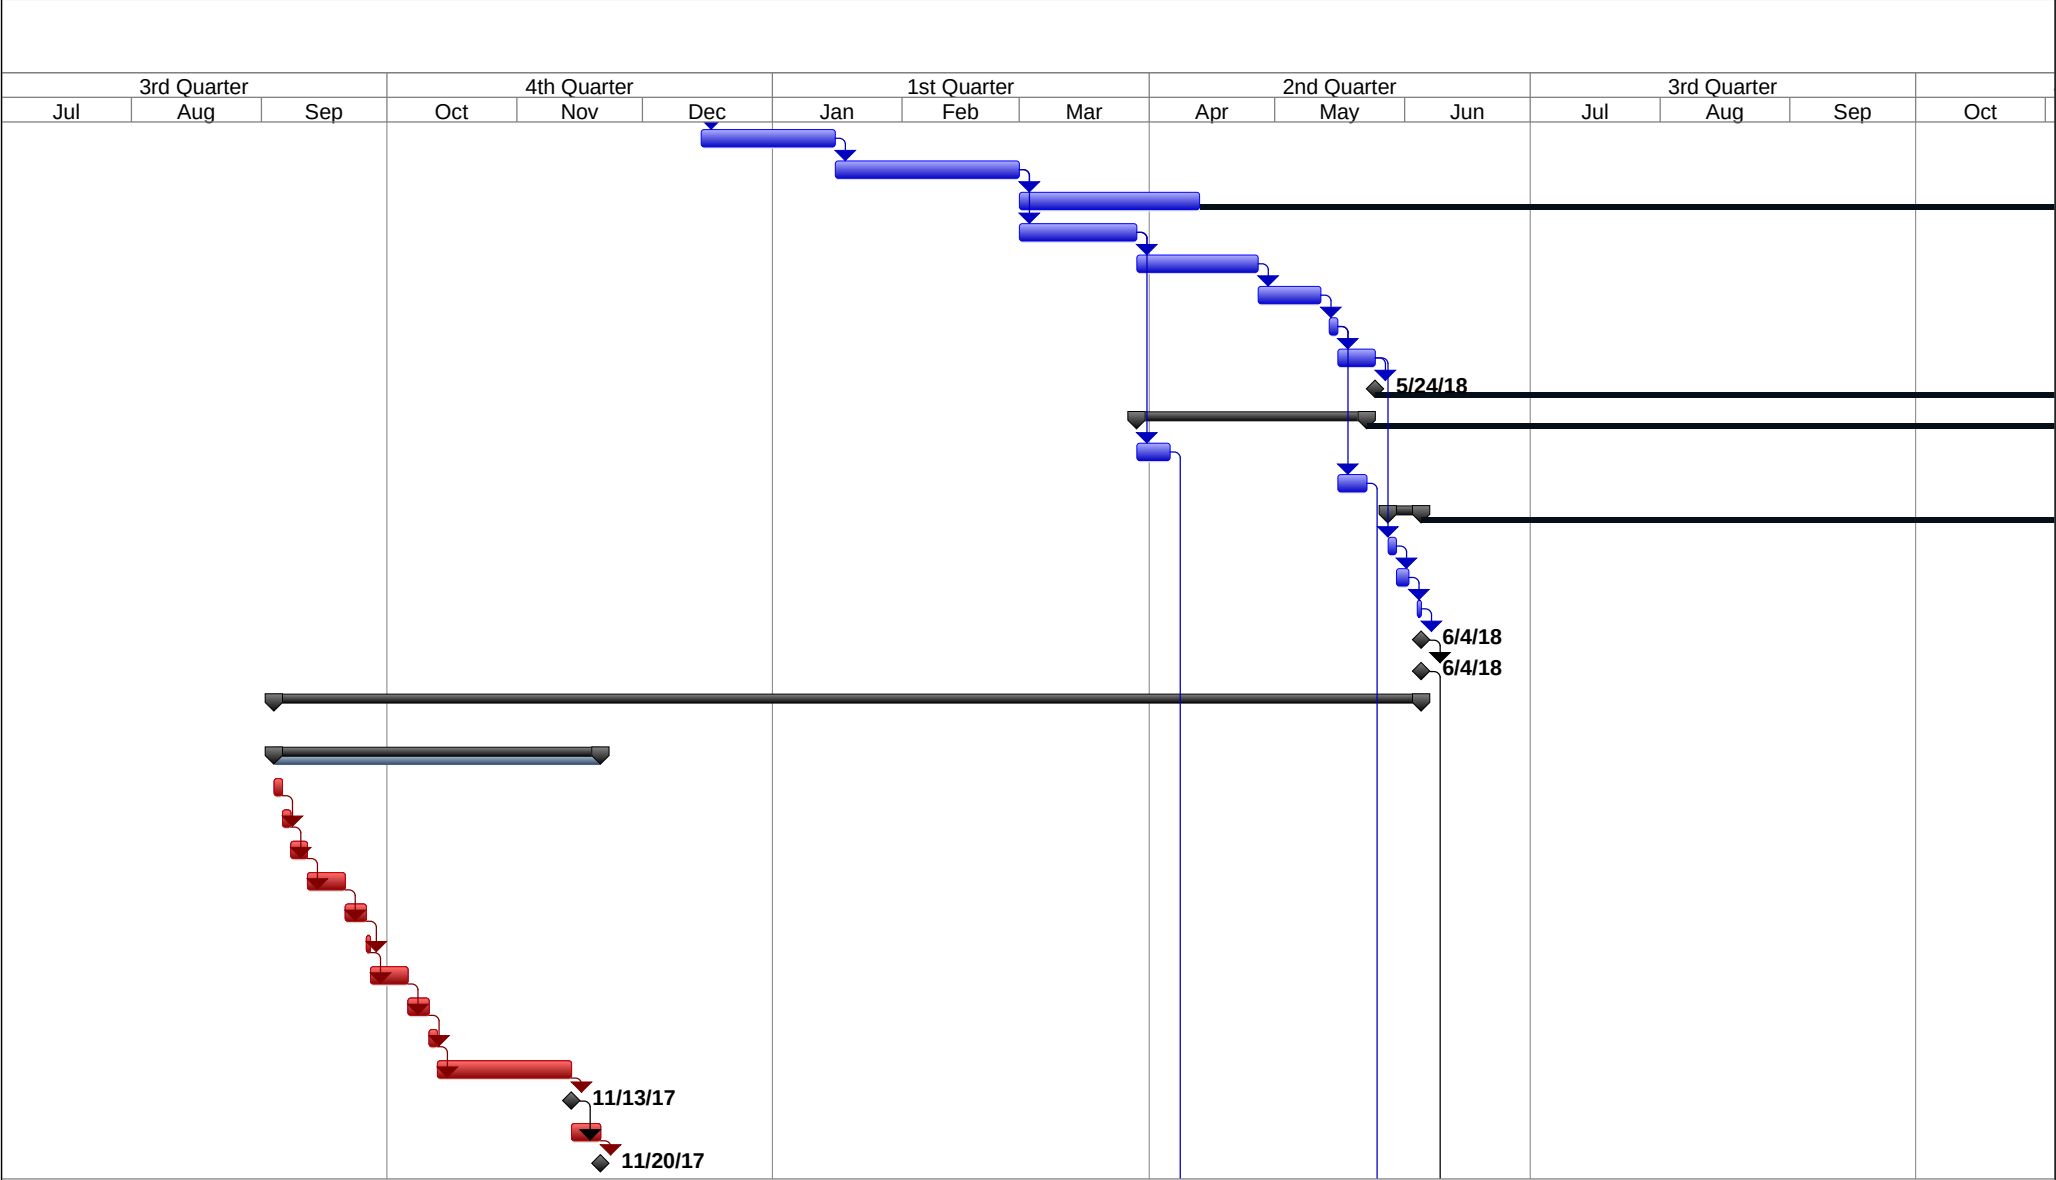


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
 EC - L1219  
 Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
 Plan Operativo Anual, POA

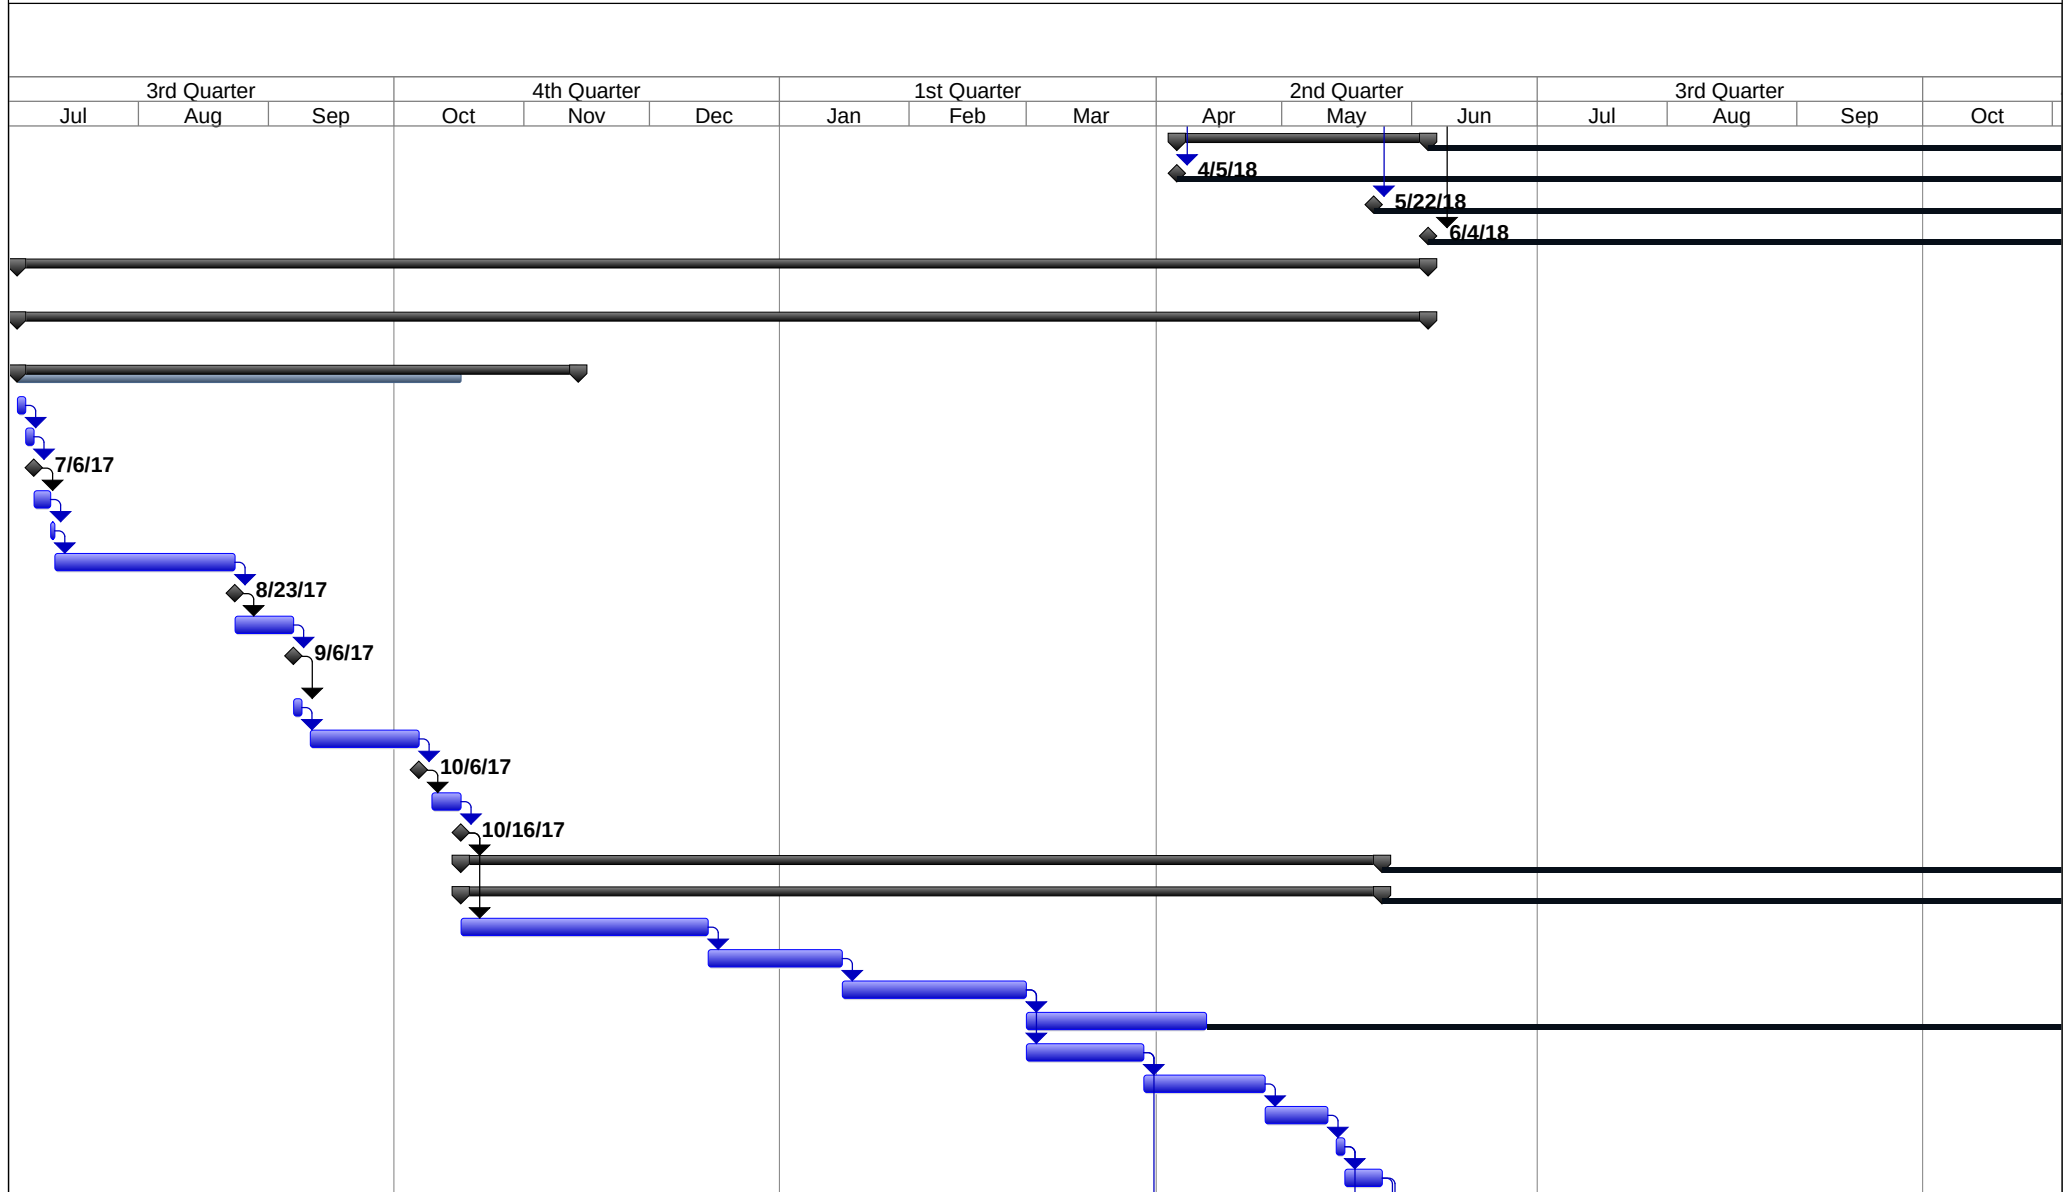


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

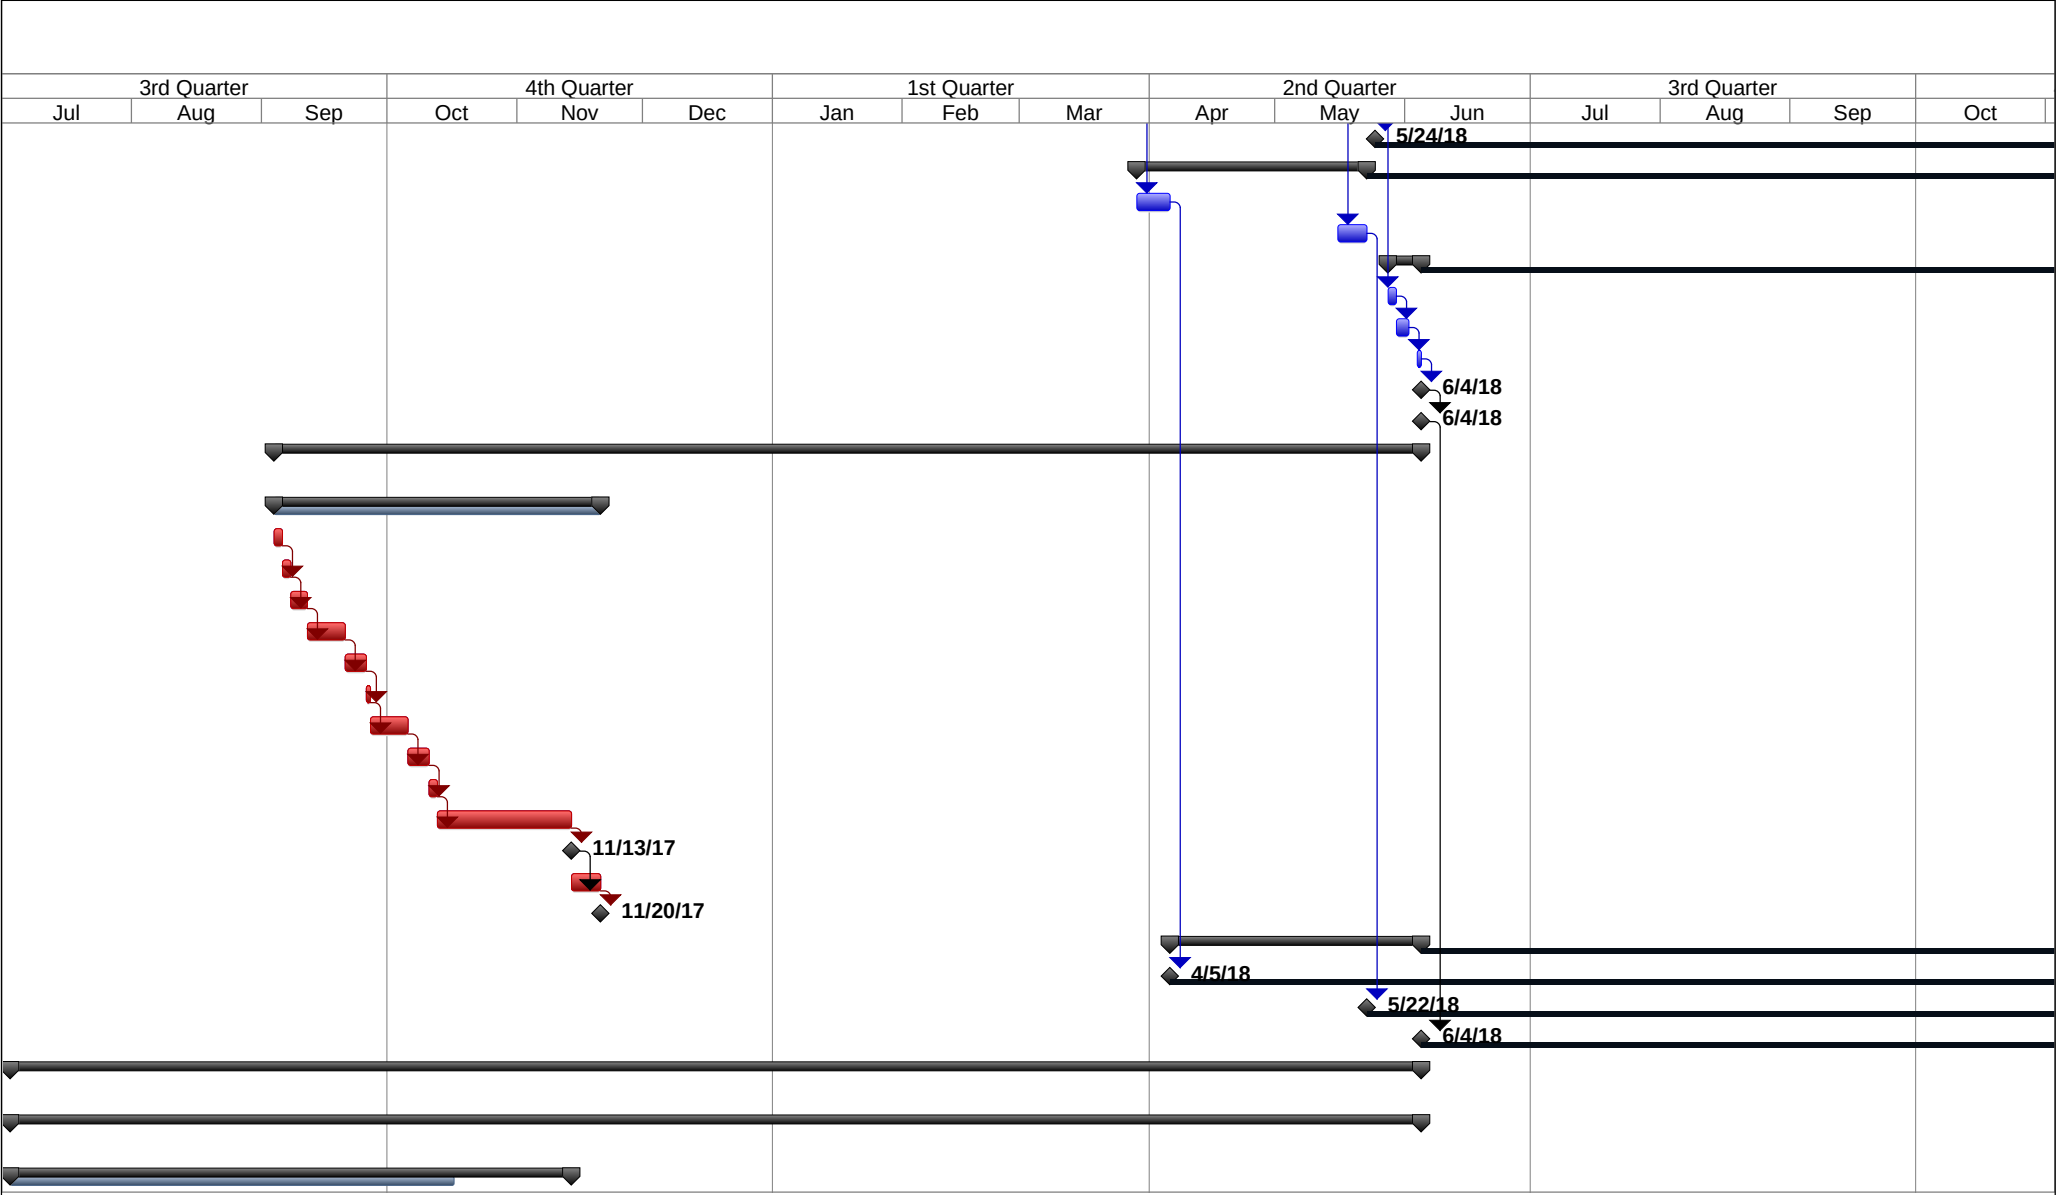


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

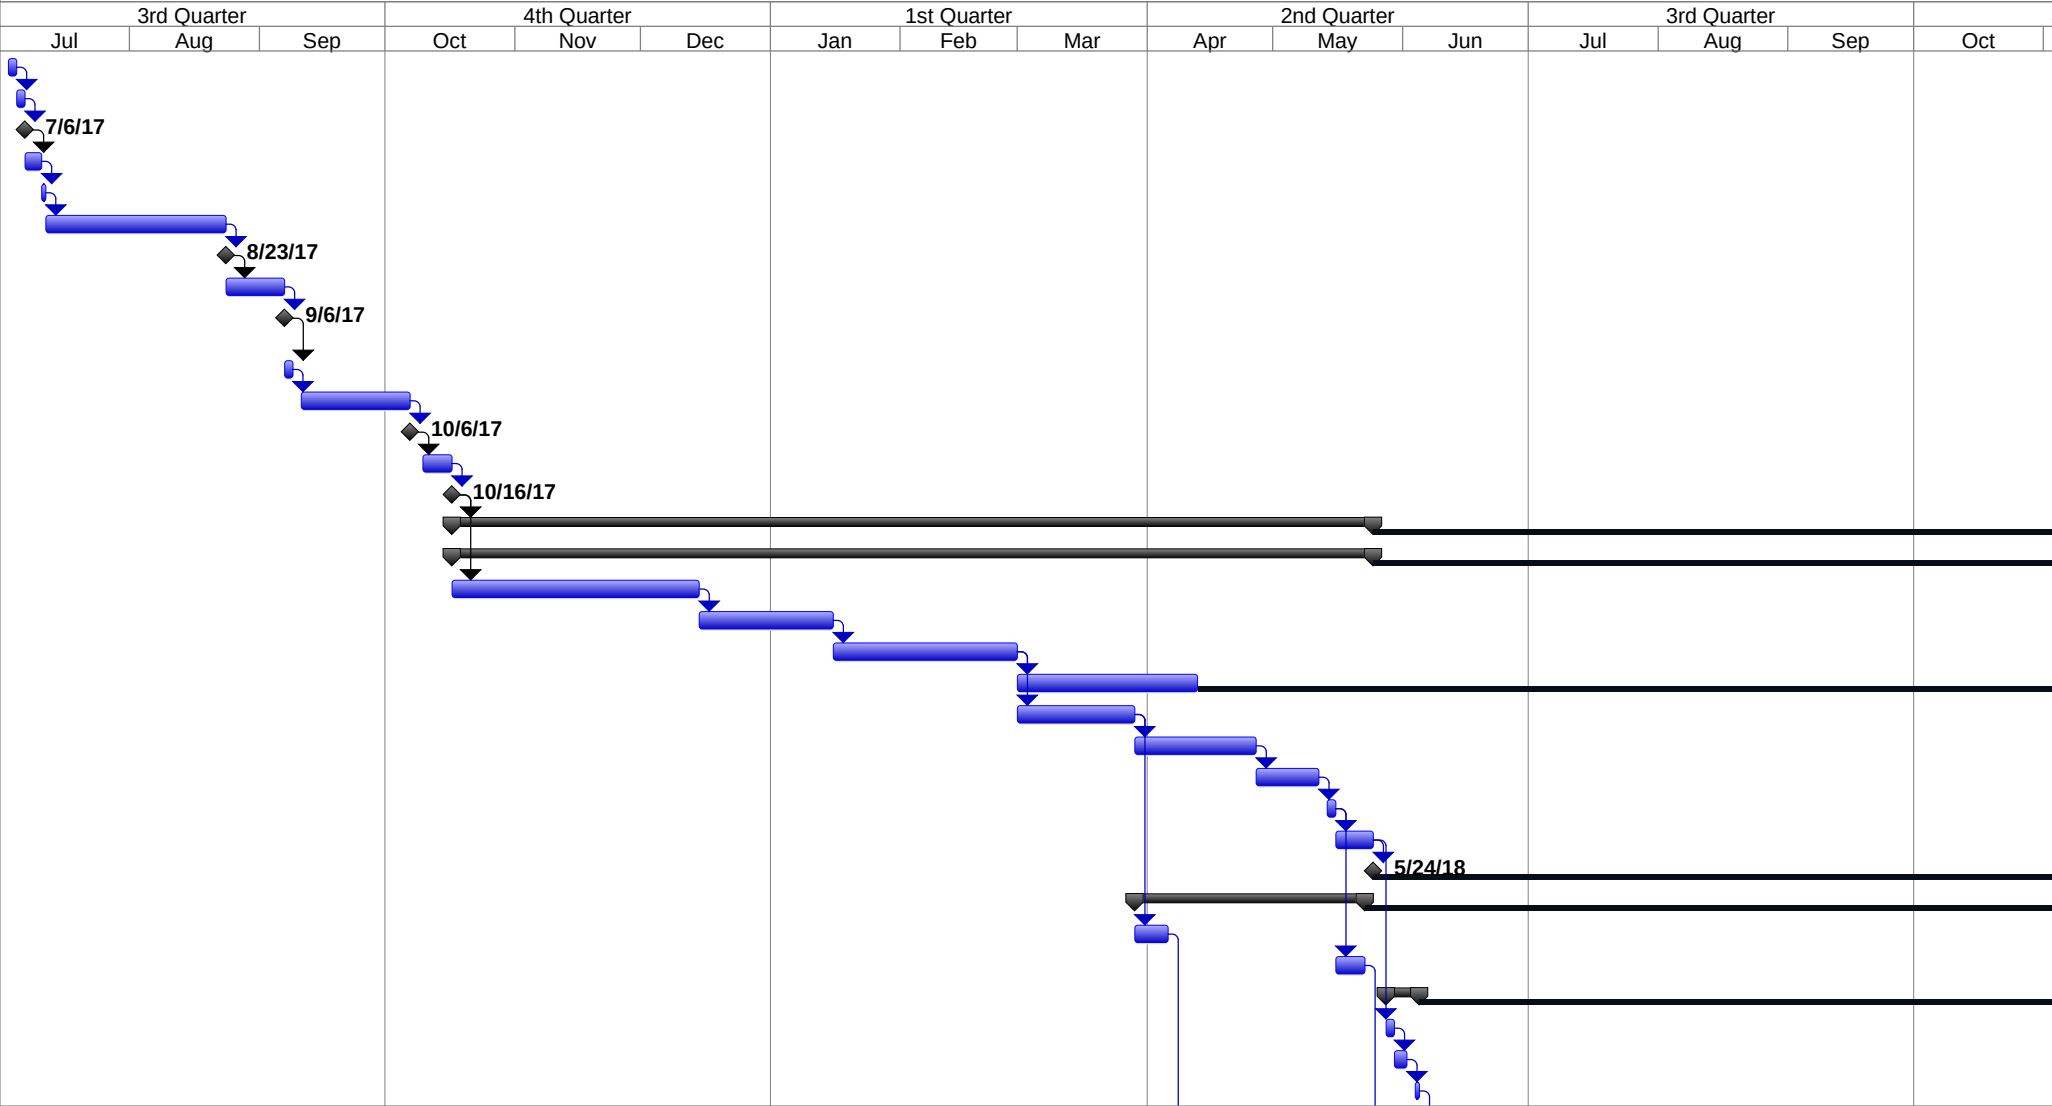


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

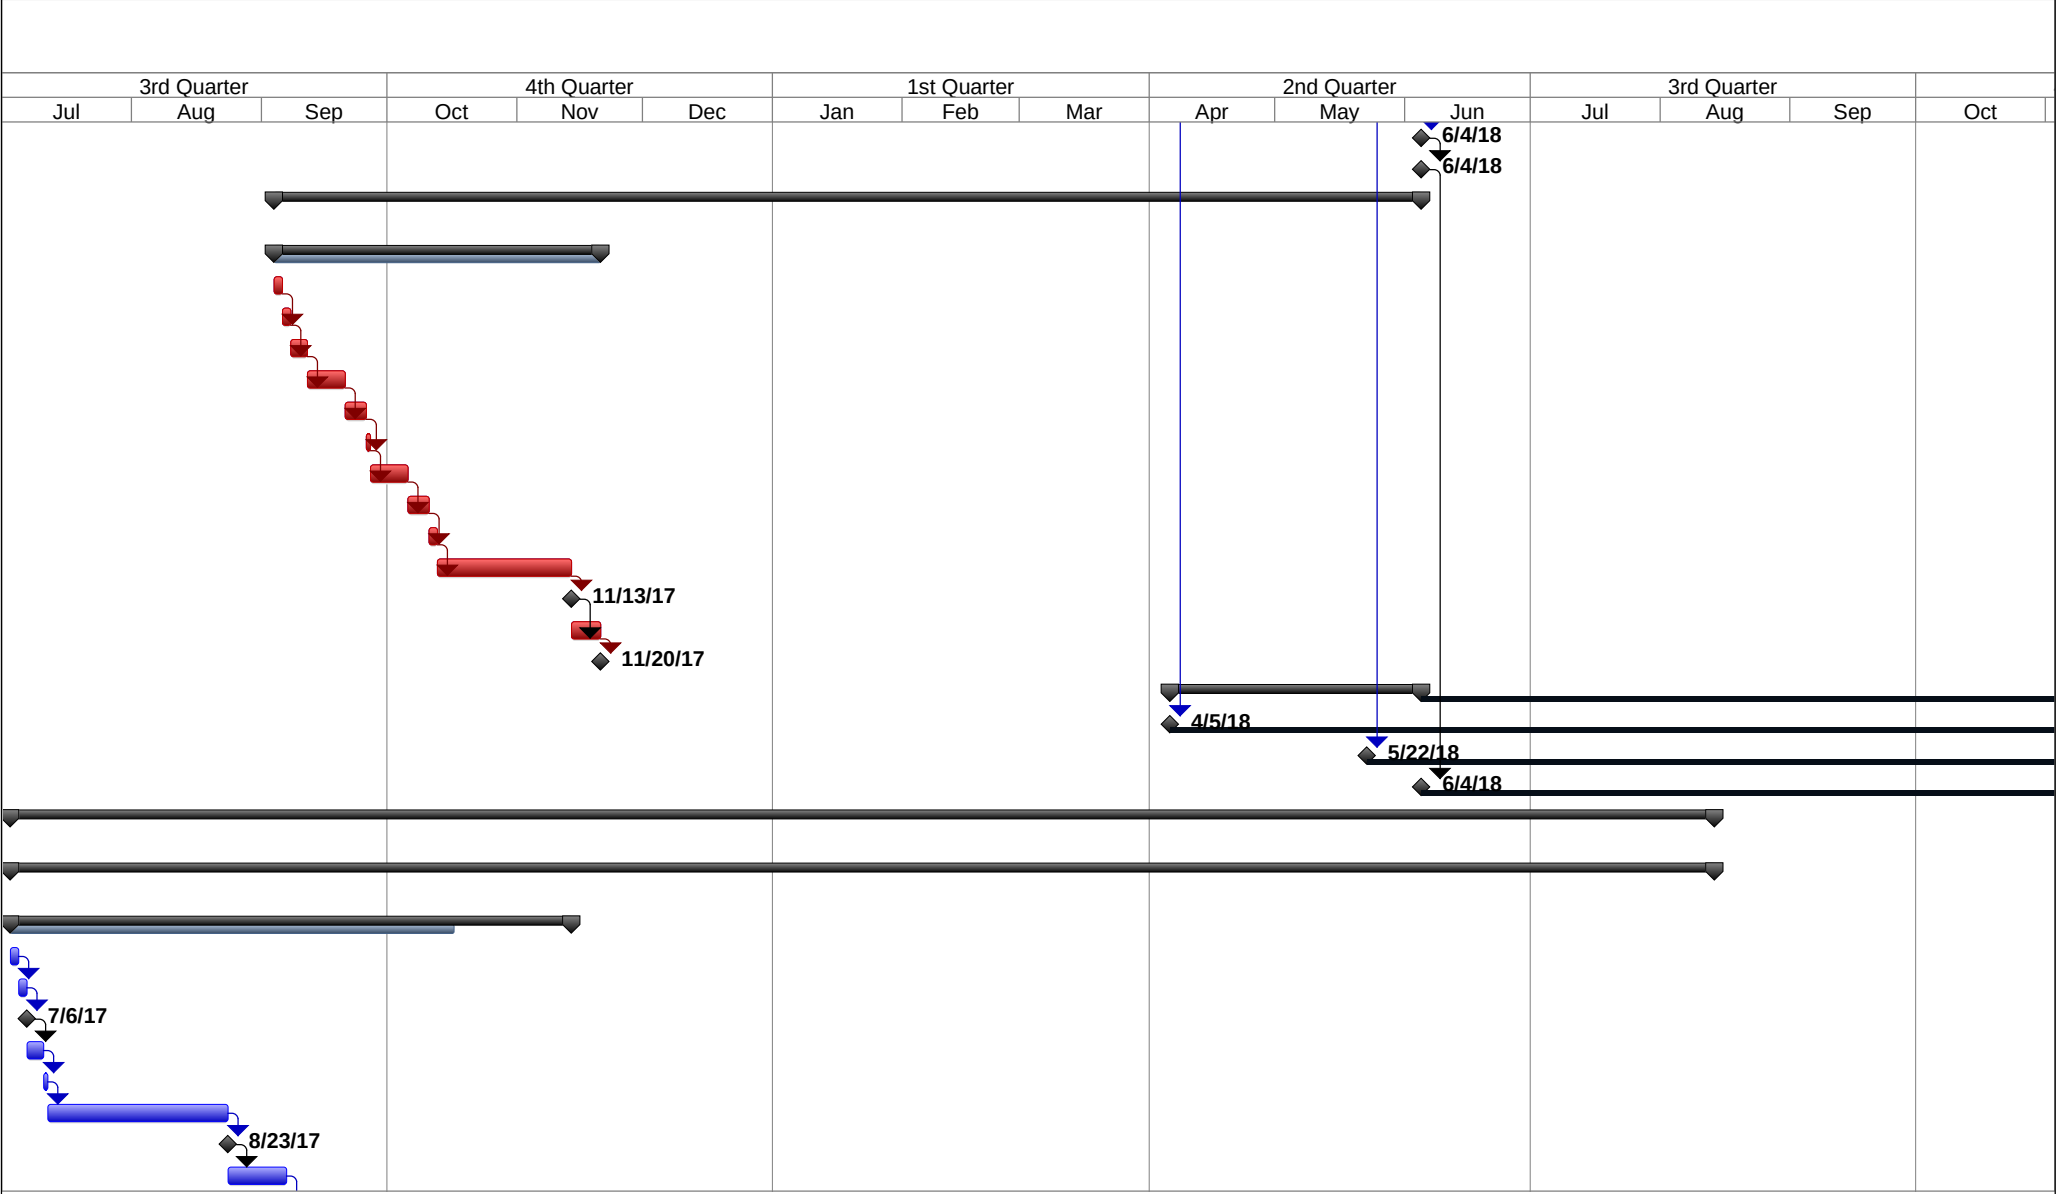

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

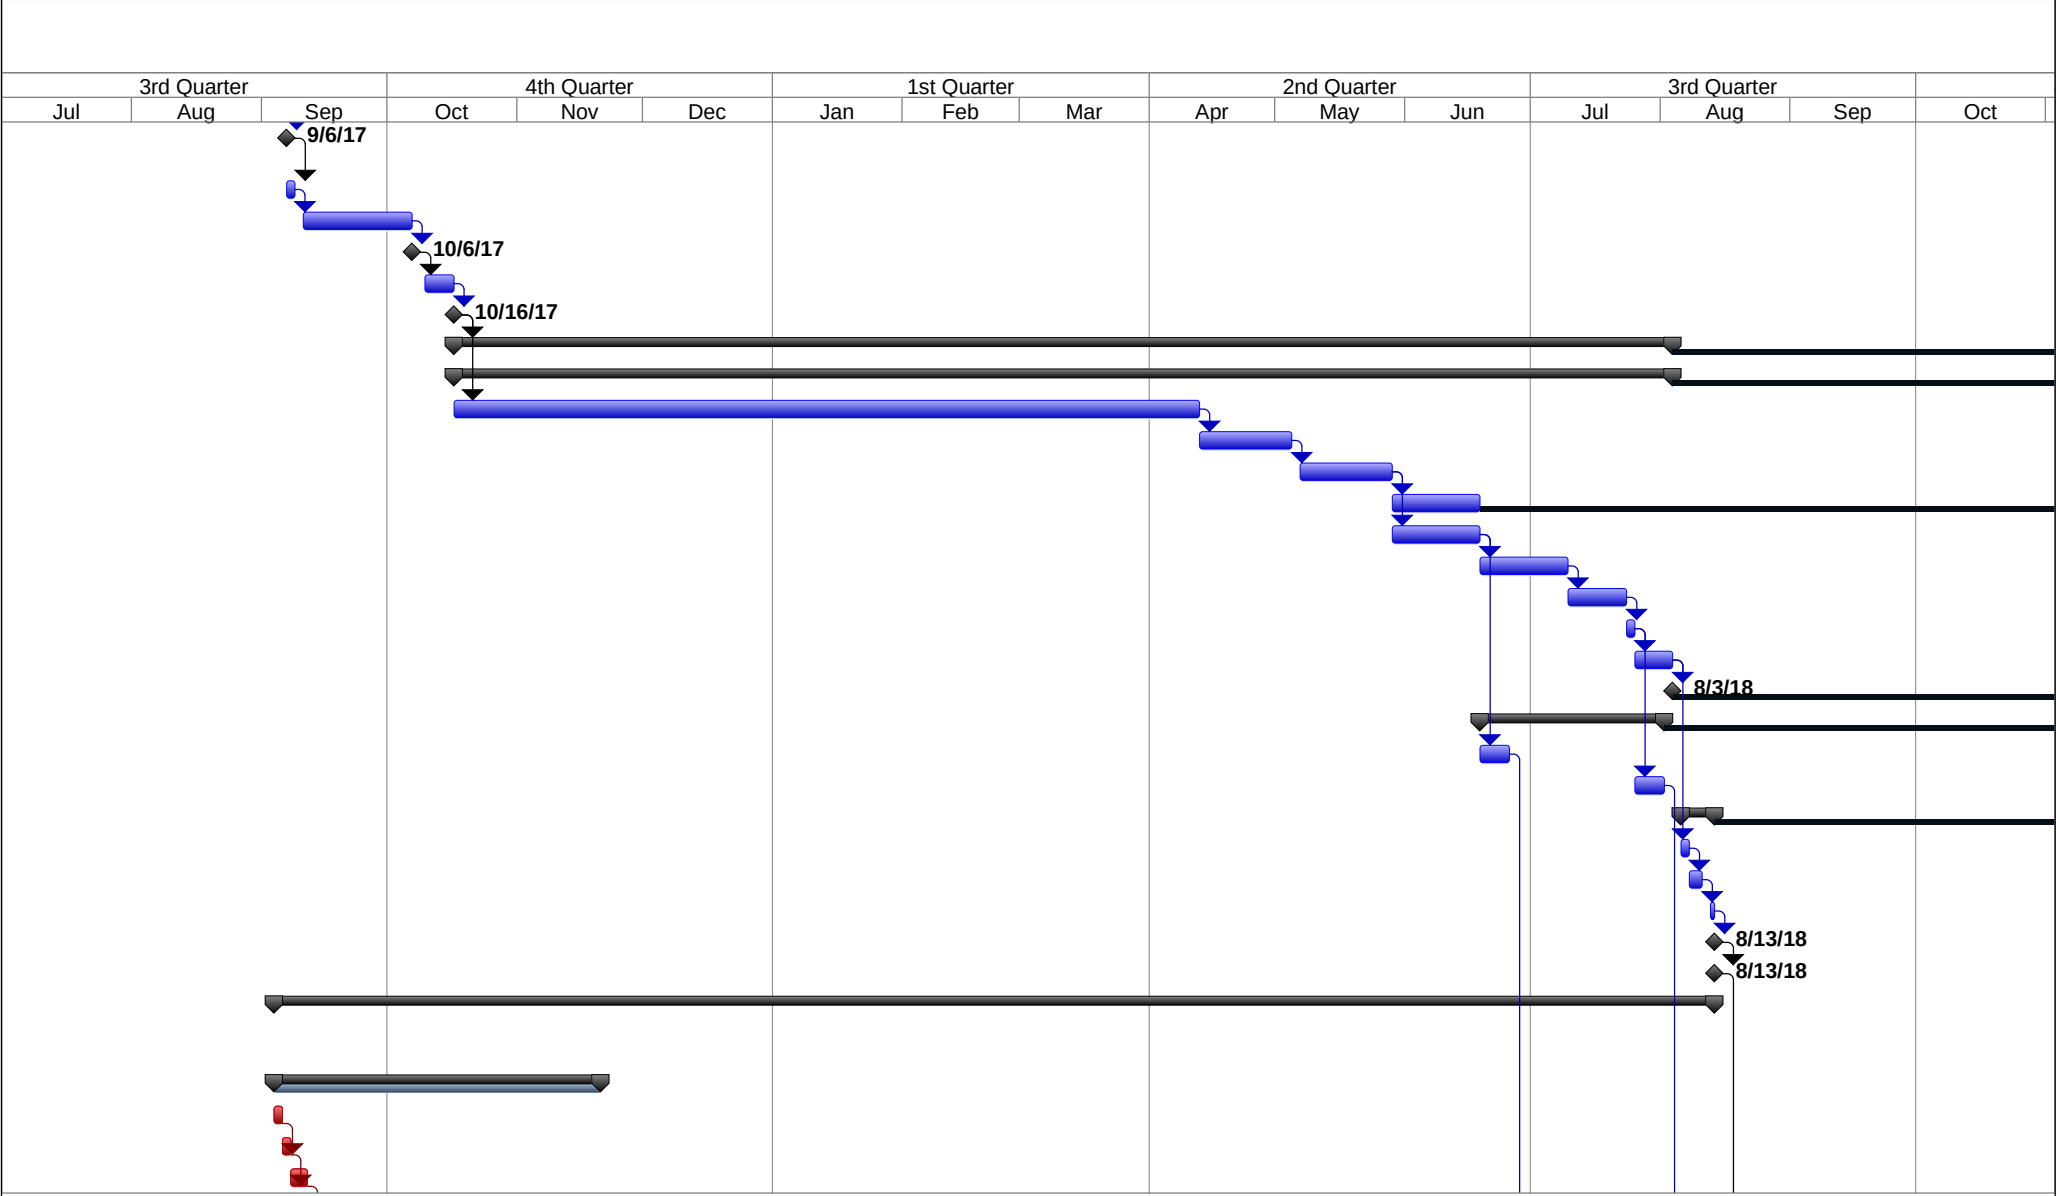


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

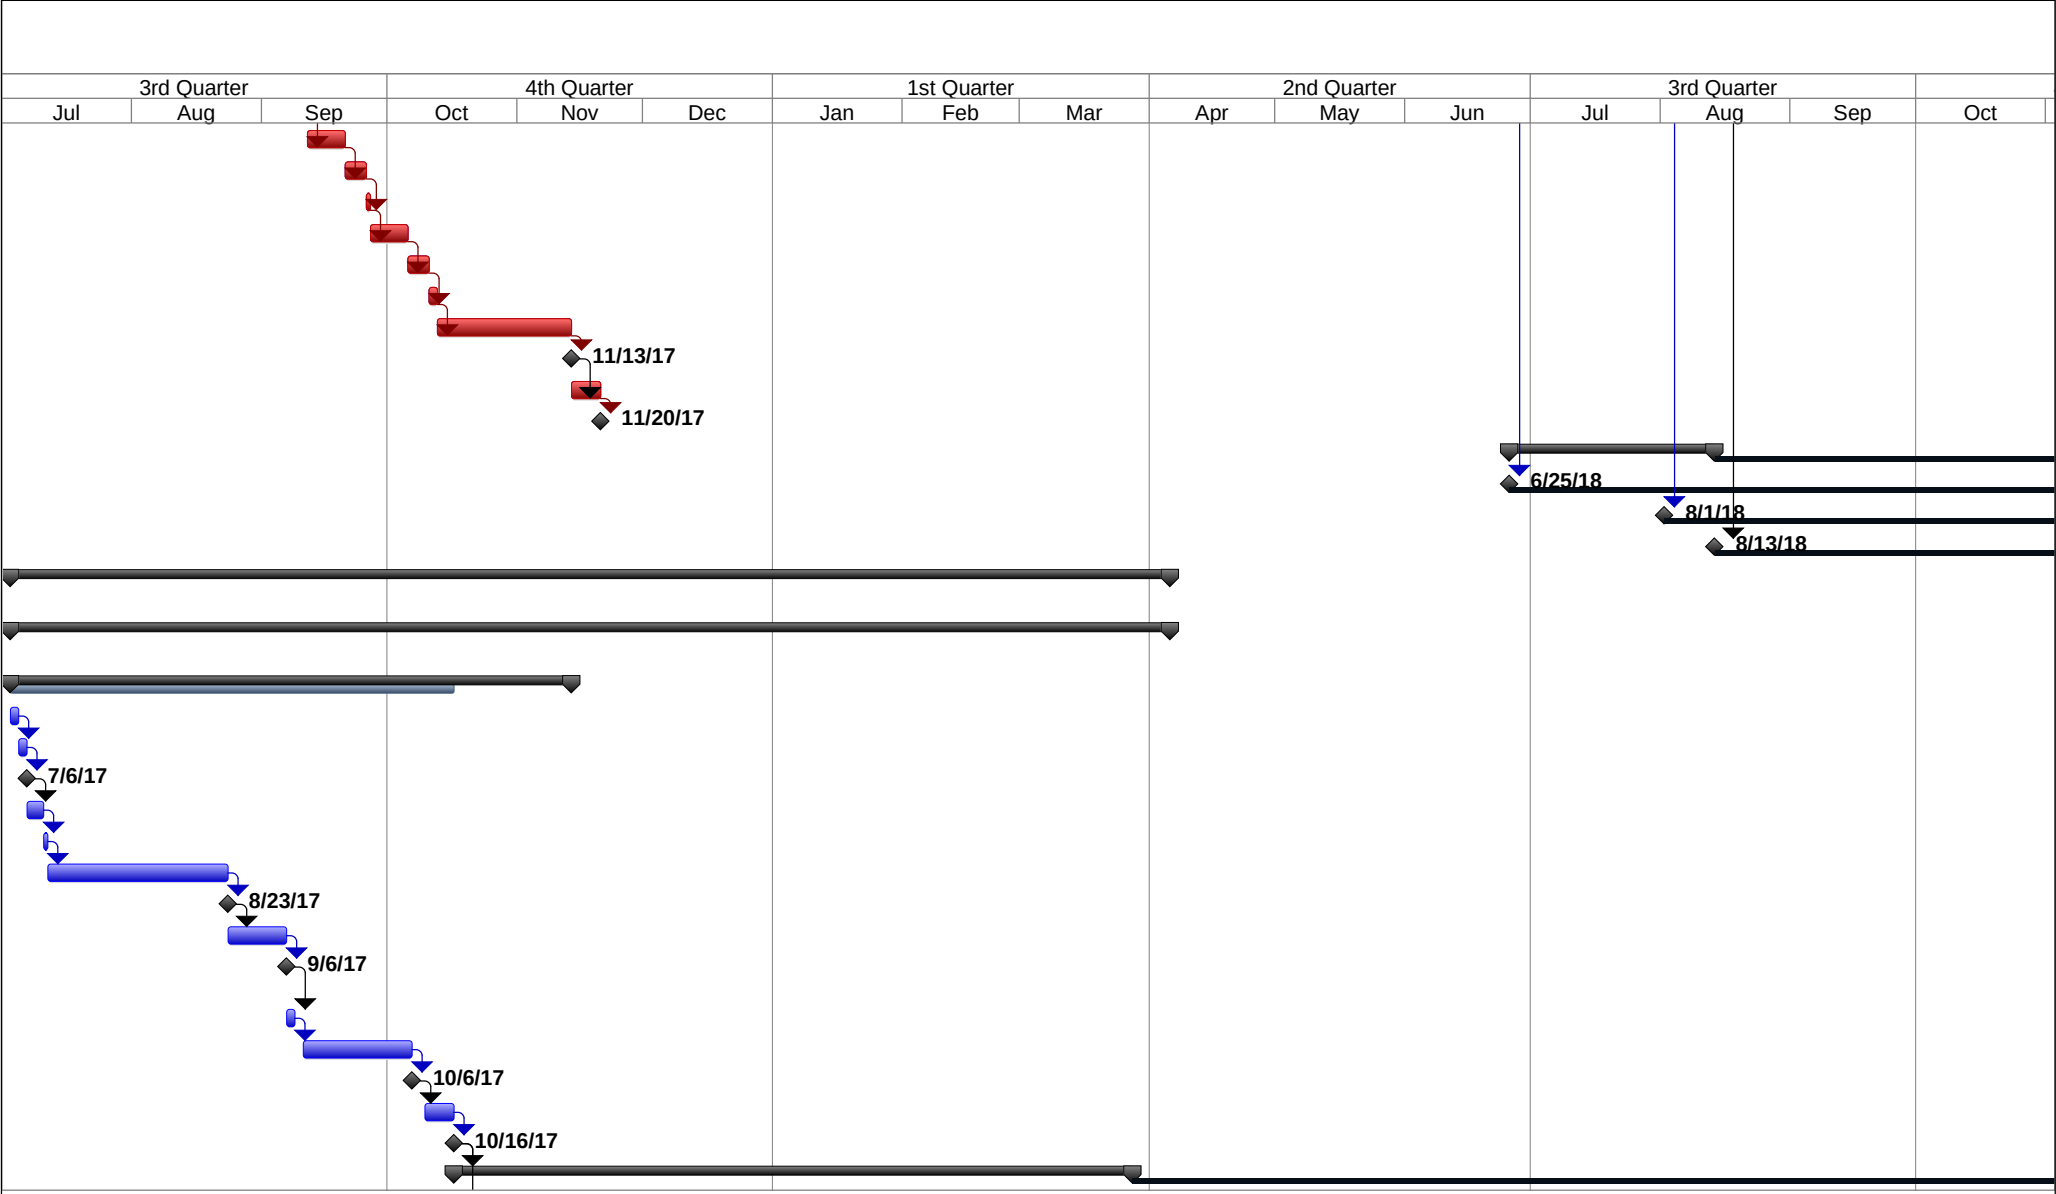




# Plan Operativo Anual, POA

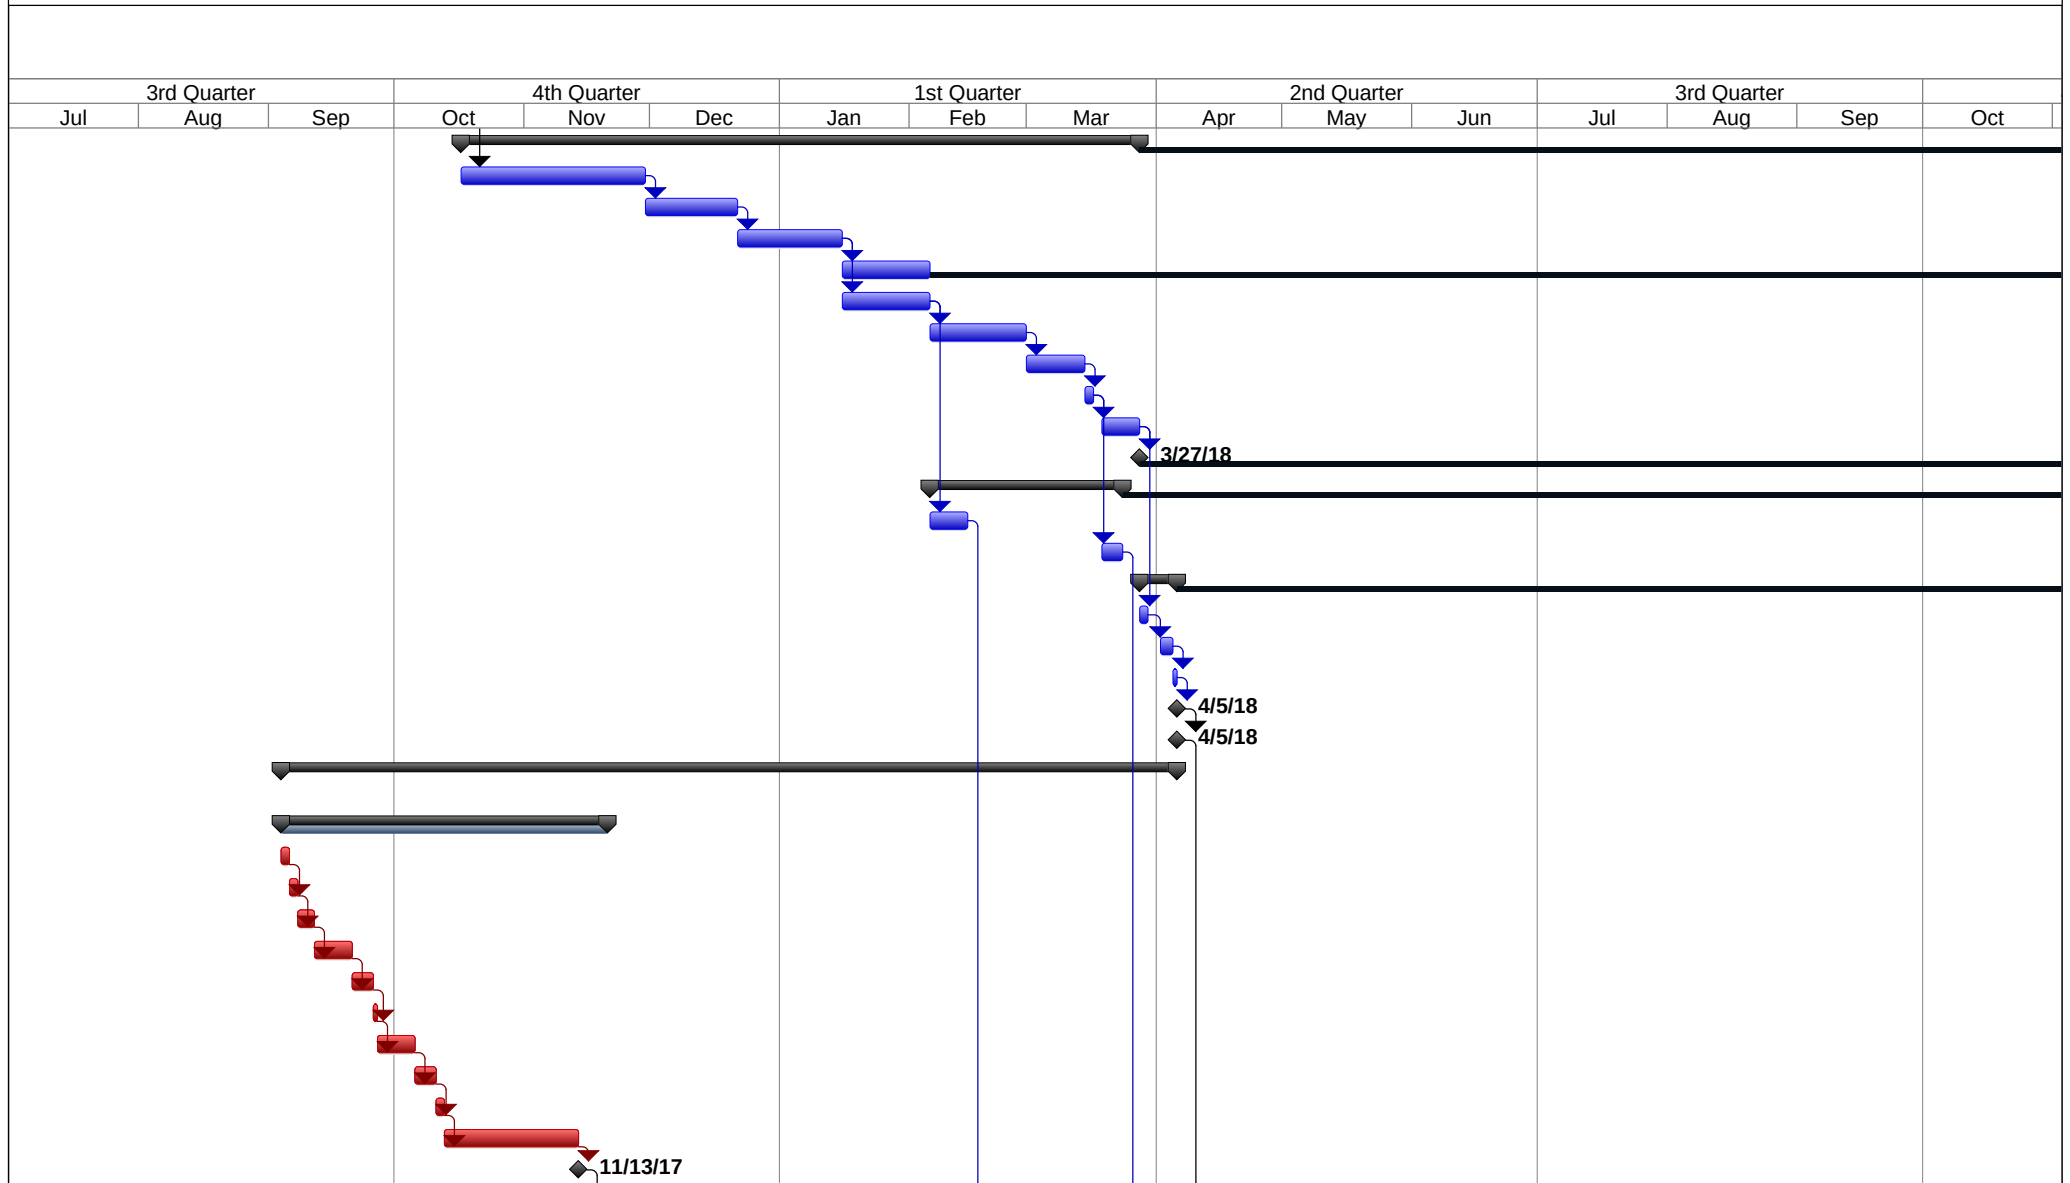

## Plan Operativo Anual, POA

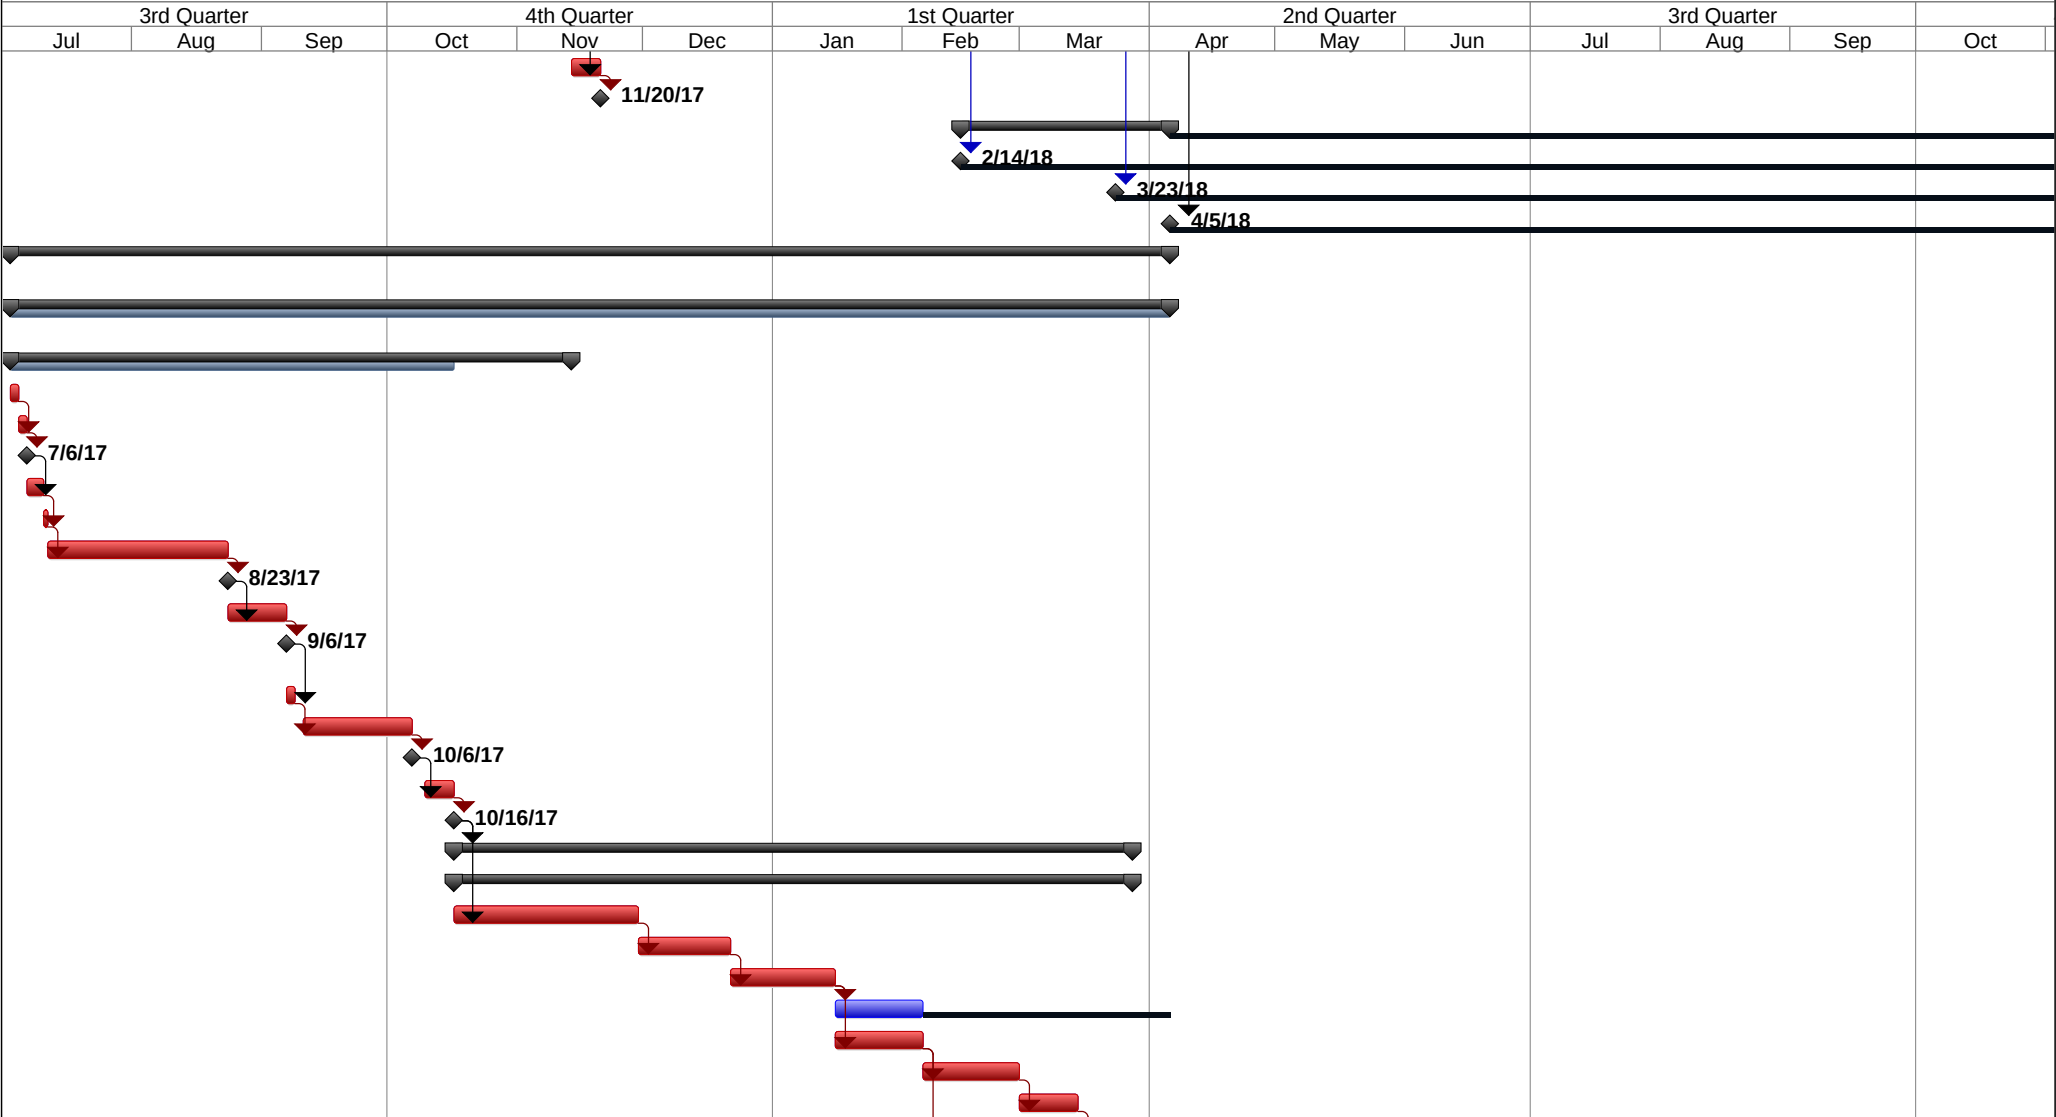



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter                                                                        |     |     | 2nd Quarter                                                                         |     |     | 3rd Quarter |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan                                                                                | Feb | Mar | Apr                                                                                 | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |     |     |             |     |     |                                                                                    |     |     |                                                                                     |     |     |             |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |     |     |             |     |     |  |     |     |  |     |     |             |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |     |     |             |     |     |                                                                                    |     |     |  |     |     |             |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |     |     |             |     |     |                                                                                    |     |     |                                                                                     |     |     |             |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |     |     |             |     |     |                                                                                    |     |     |                                                                                     |     |     |             |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |     |     |             |     |     |                                                                                    |     |     |                                                                                     |     |     |             |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |  |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|--|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]





Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

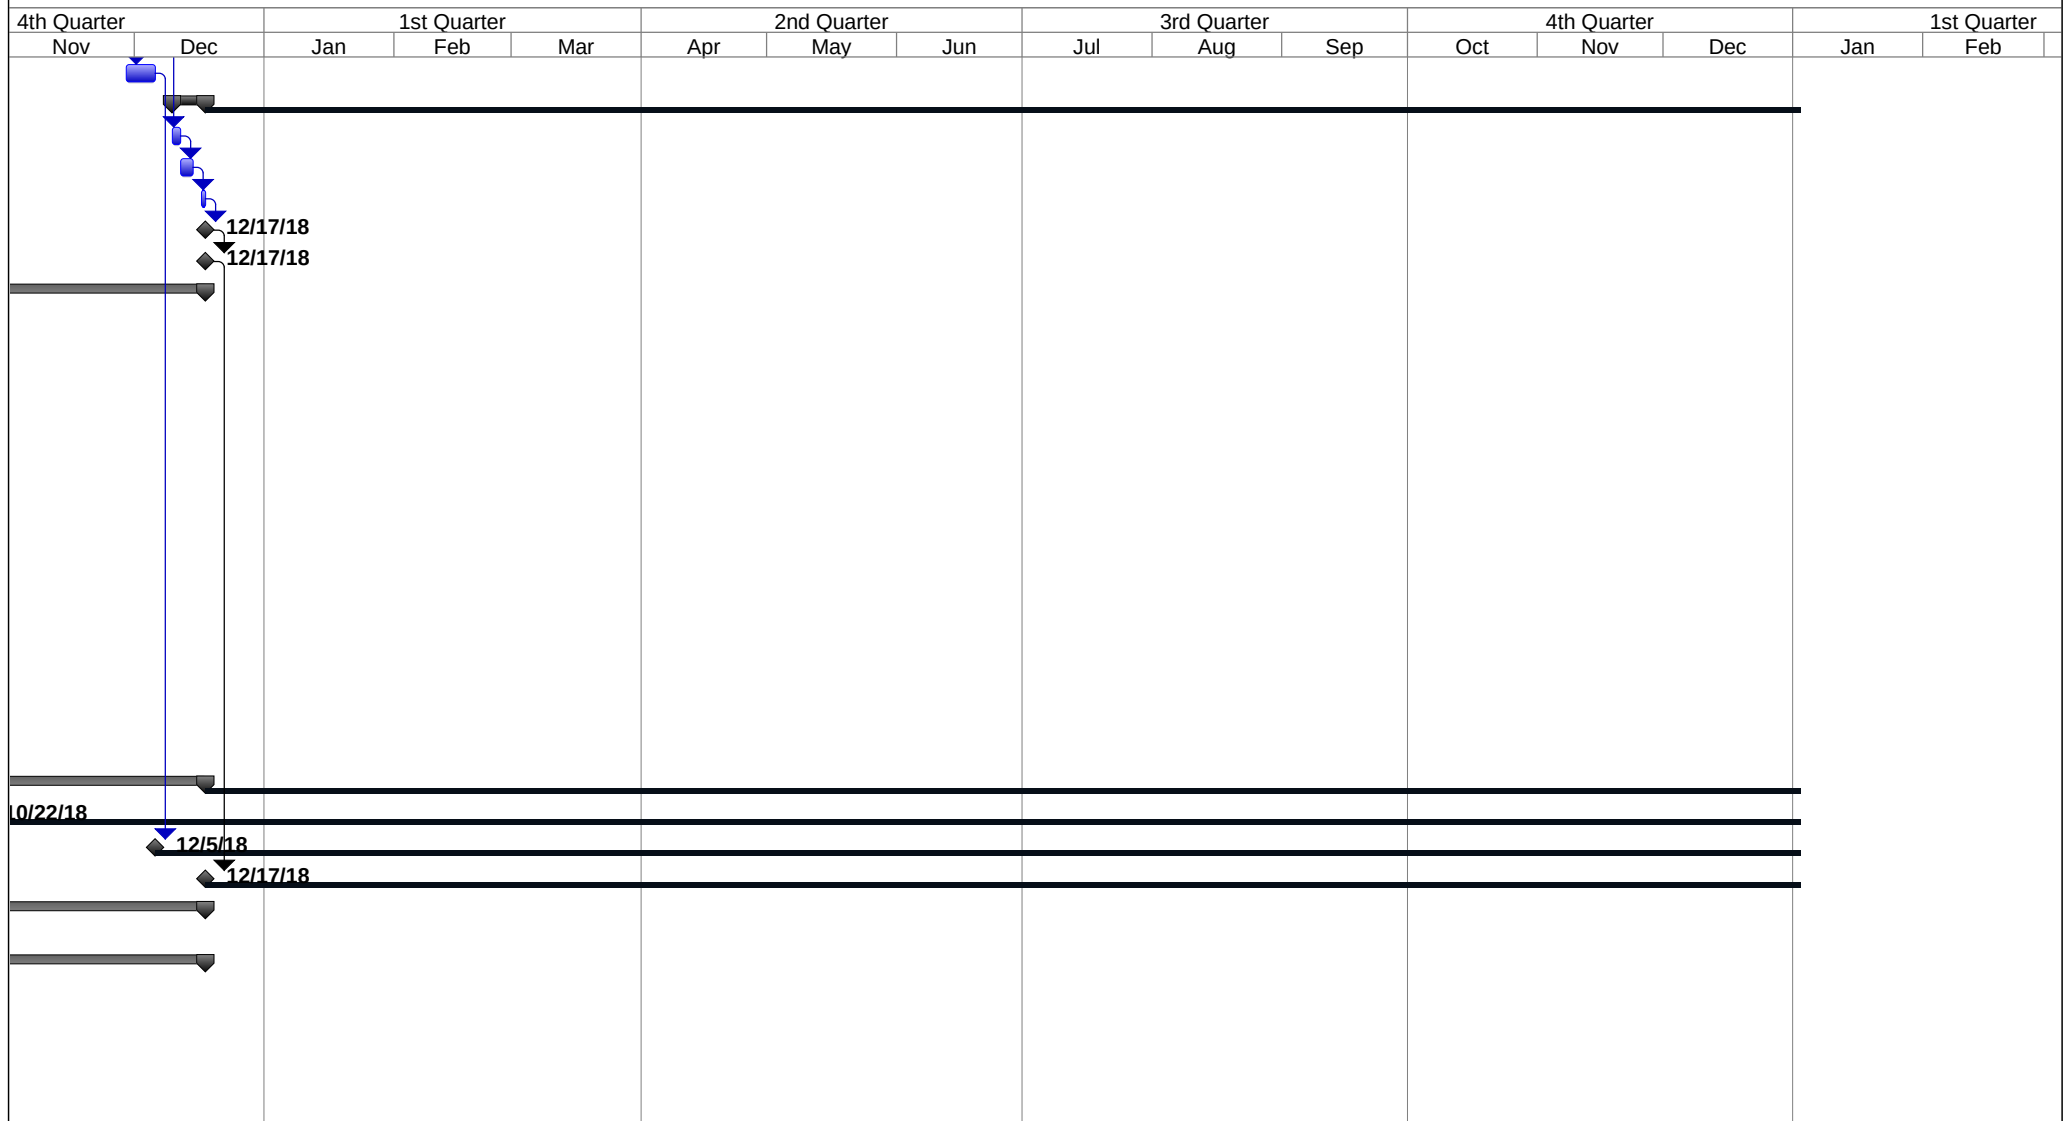


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

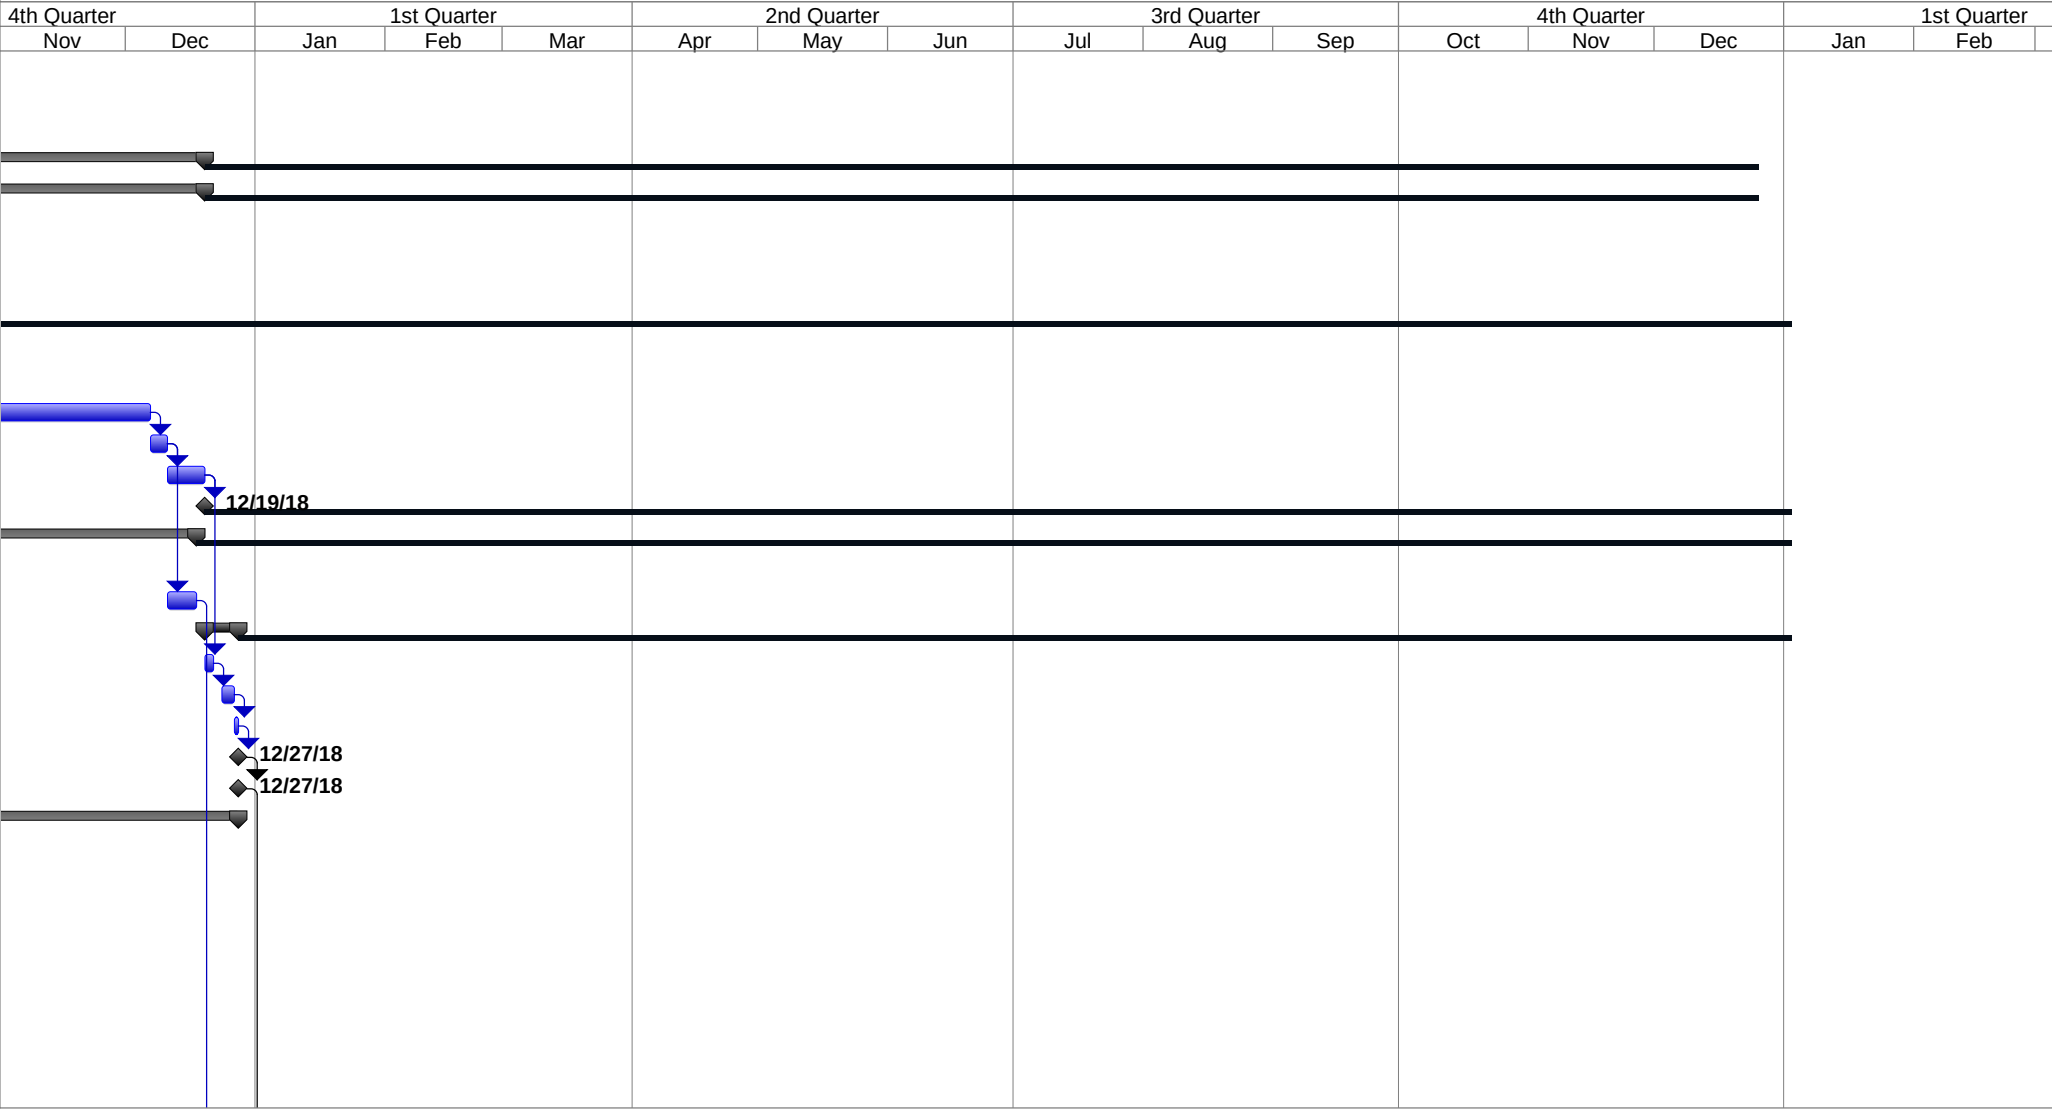

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

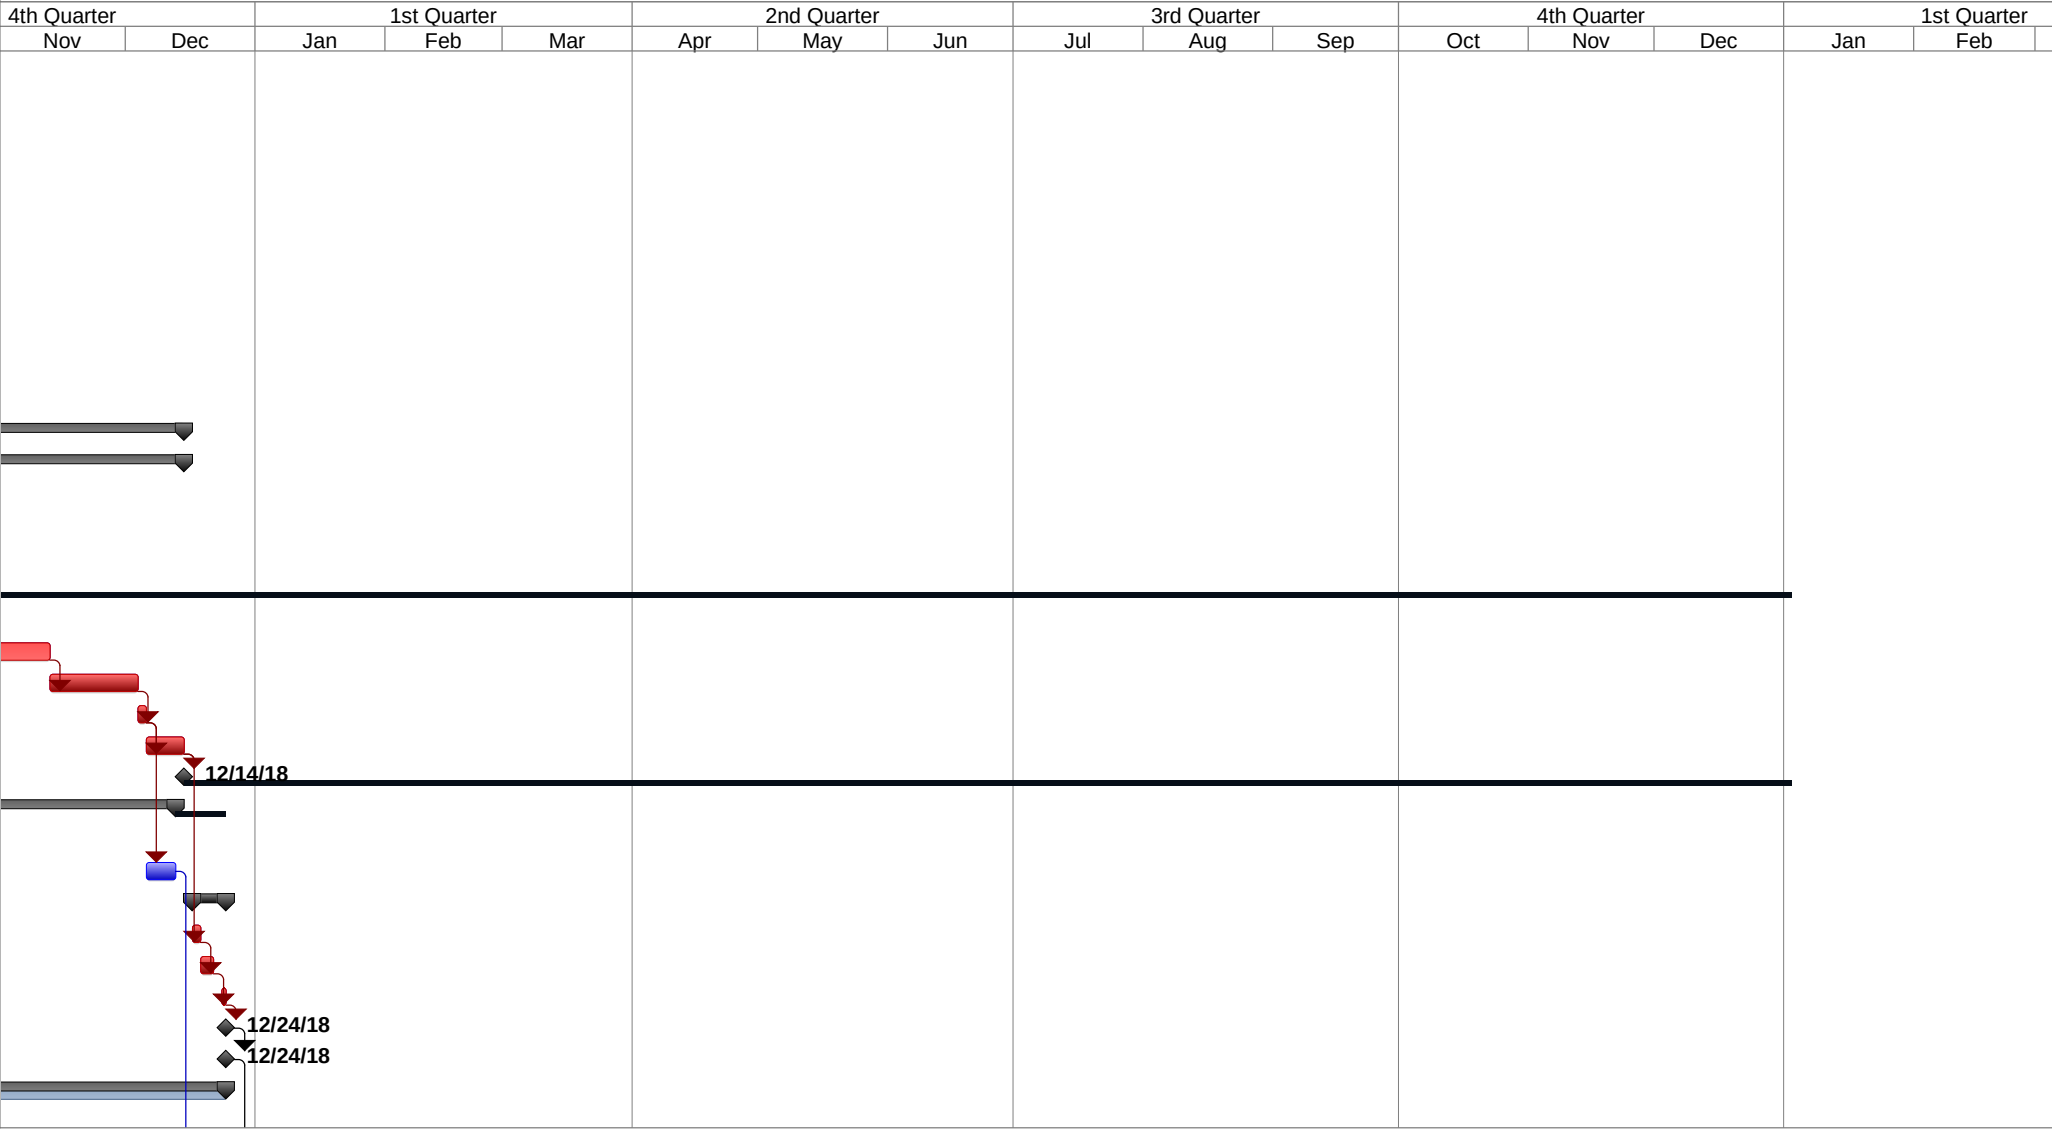

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
| <p>The chart displays a project timeline across five quarters. A task is shown in the 4th Quarter, starting in November and ending in December. The task bar is labeled with the dates 12/12/18 and 12/24/18. A blue arrow points from the 'Dec' header to the task bar.</p> |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |






Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

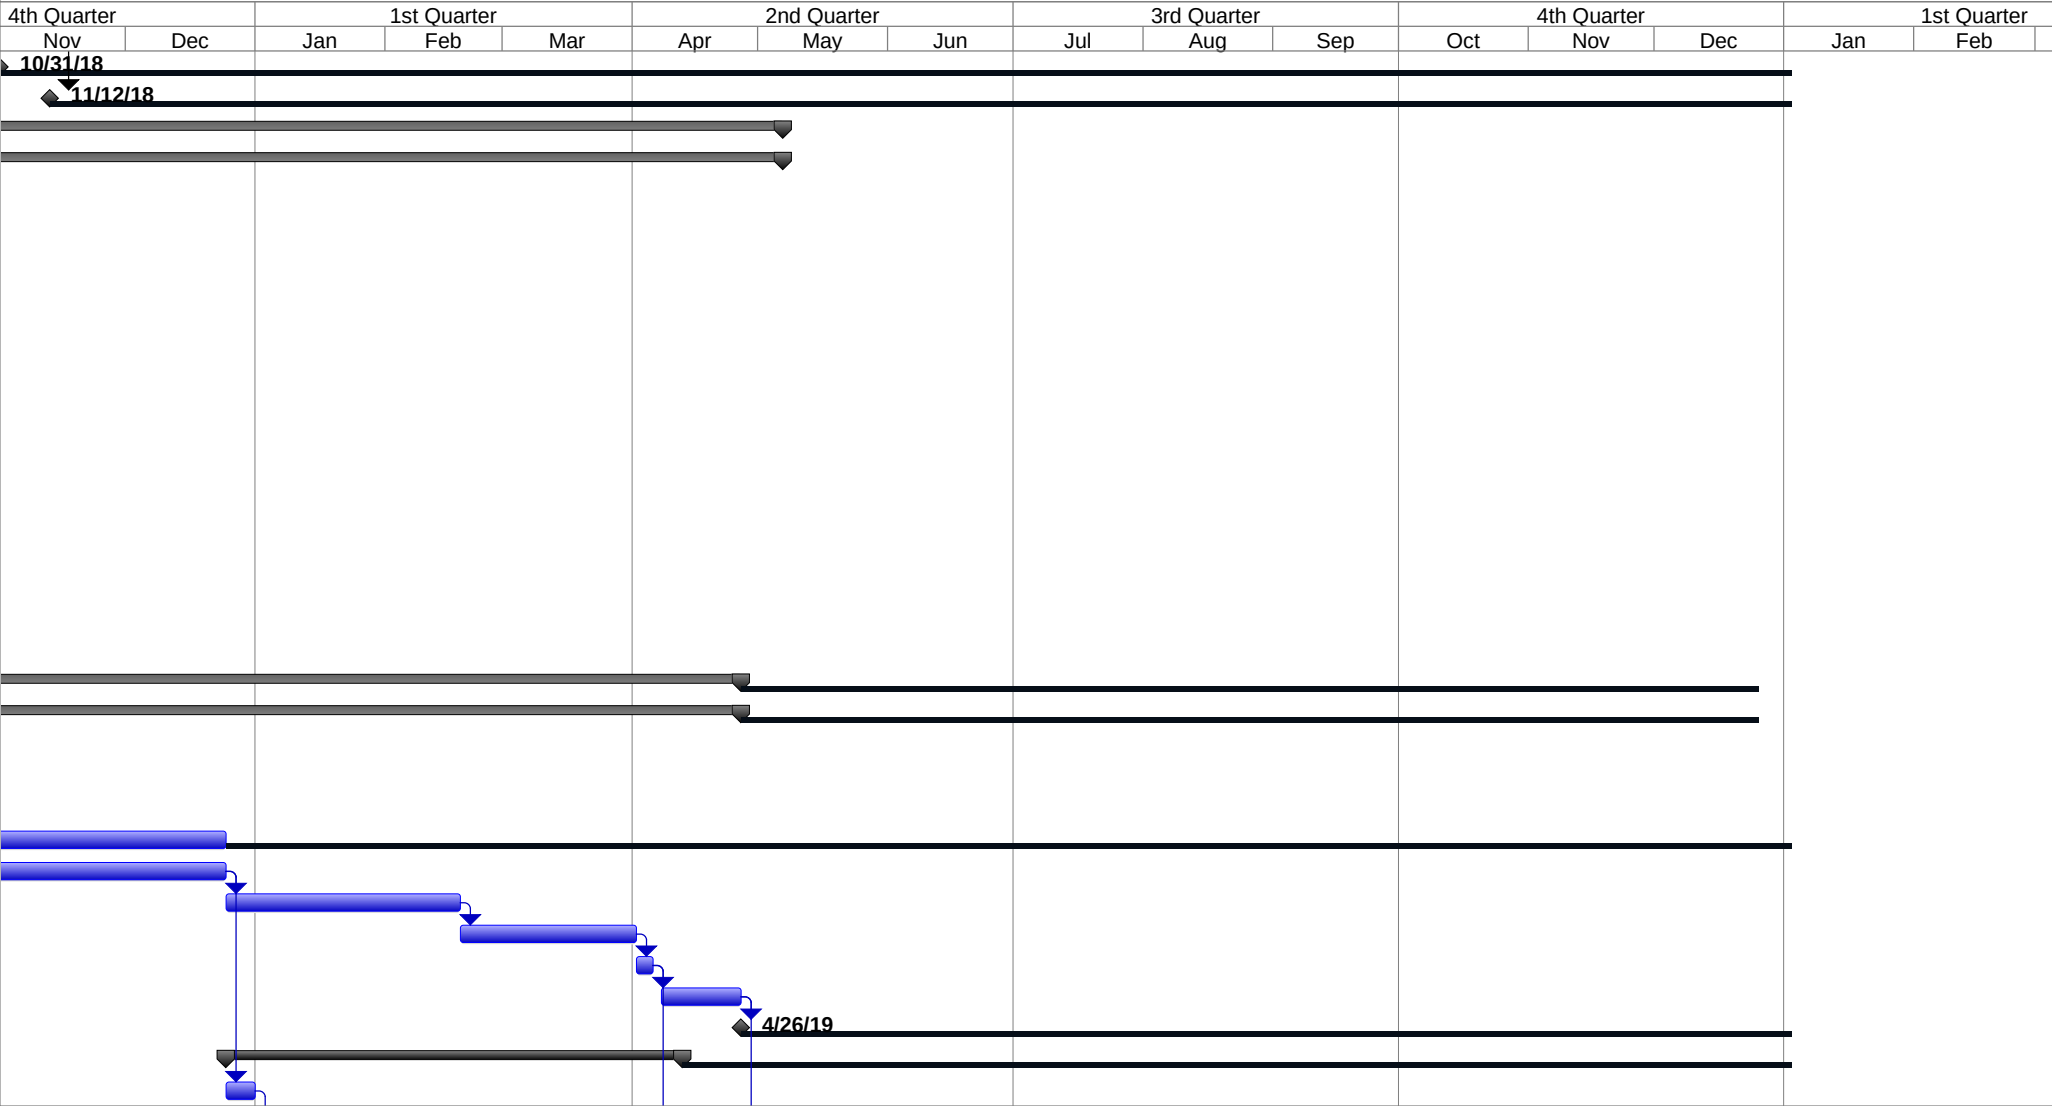



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |




Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |


Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter                                                                       |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov                                                                               | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|                                                                                   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|                                                                                   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|                                                                                   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|                                                                                   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|                                                                                   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|                                                                                   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|                                                                                   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|                                                                                   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|                                                                                   |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter                                                                       |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov                                                                               | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|  |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |  |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|--|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 2024        |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |  |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|--|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |  |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|--|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |  |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |



Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

| 4th Quarter |     | 1st Quarter |     |     | 2nd Quarter |     |     | 3rd Quarter |     |     | 4th Quarter |     |     | 1st Quarter |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| Nov         | Dec | Jan         | Feb | Mar | Apr         | May | Jun | Jul         | Aug | Sep | Oct         | Nov | Dec | Jan         | Feb |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |
|             |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]

Ecuador - Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador  
EC - L1219  
Plan de Ejecución Plurianual, PEP  
Plan Operativo Anual, POA

[illegible]
