




Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	Perfeitura Municipal de São José dos Campos				
Setor:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT				
Número da Operação:	2323/OC-BR	Atual:	85.672.400,00	Original BID:	85.672.400,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:		Corrente BID:	85.672.400,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:		Pari-passu:	
Operação Relacionada:	RG-P1374	Saldo:	85.672.400,00	Cofinanciamento/País:	92.353.800,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	178.026.200,00
				Período de Amortização (meses):	

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 18, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011

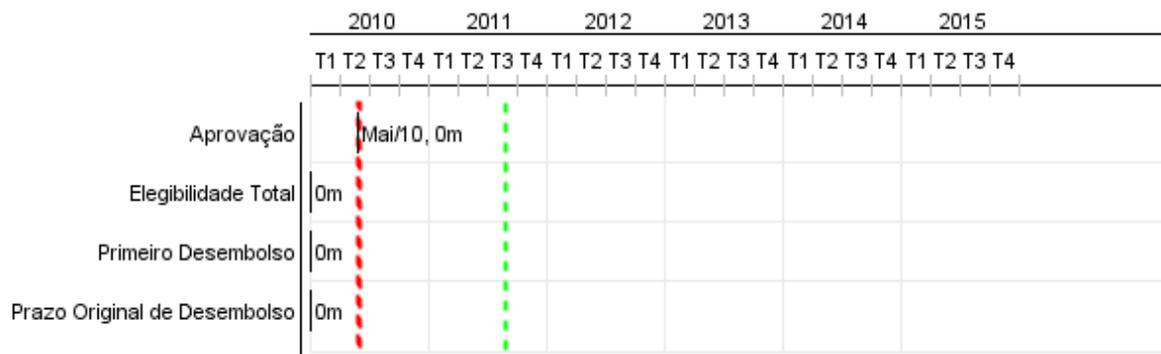

Progresso Acumulado até 2010

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: Desenvolvimento Urbano do Município de São José dos Campos estruturado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Nº de favelas existentes	Favela	1,00	2010	P A						0,00
Índice de passageiros por km percorrido.	IPK	1,60	2010	P A		2,10				2,10
Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) aumentada	US\$	39.000.000,00	2010	P A	105,00	116,00	127,00	140,00		58.000.000,00
							148,00			

Resultado: Melhorias urbano-ambientais implementadas

Suposições: área verde de 7,4 m2 por habitante

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
incremento no m2 de área verde por habitante	m2	7,40	2010	P A					7,80	7,80

Resultado: Aumento da quantidade de resíduos de construção civil não descartados clandestinamente

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Resíduos não descartados clandestinamente	toneladas		2010	P A	8.640,00	17.280,00	24.480,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00

Resultado: Assentamentos regularizados

Suposições: SH (Secretaría de Vivienda); predios con matrículas individualizadas (depende de la acción de la Notaría de Registro de Inmuebles)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Predios con matrículas individualizadas nos assentamentos	Predios		2010	P A		530,00	802,00	548,00	1.880,00	1.880,00

Resultado: Reubicación de las familias de la favela do banhado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
tasa de permanencia de las familias asentadas incrementada	%		2010	P A					80,00	80,00
zona liberada para la integración al area de preservación ambiental ampliada	m2		2010	P A	223.102,00					223.102,00

Resultado: Melhorias en cuanto a movilidad de la población implantadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Via do Banhado - aumento de la velocidad promedio para el acceso y transposición del Centro	km/h	29,00	2010	P A					45,00	45,00
Cambuí - aumento de la velocidad media comparada con la alternativa actual	Km/h	36,00	2010	P A					45,00	45,00
Centro de control de operaciones. reducción del tiempo de espera en el semáforo	minuto	2,50	2010	P A					1,00	1,00
Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de líneas en funcionamiento)	lineas	37,00	2010	P A					34,00	34,00

Resultado: Fortalecimiento institucional implementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento reducido	dias	35,00	2010	P A					25,00	28,00
Capacidad de getión de servicios electrónicos incrementada	servidores	36,00	2010	P A					18,00	18,00
Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos reducido	dias	172,00	2010	P A					148,00	148,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I: Melhorias urbano-ambientais									
Parques Urbanos criados	Parques				5,00				15.000.485,73
Gestão de Resíduos da Construção Civil	Postos de Entrega				21,00				2.836.601,34
Assentamentos Urbanizados	Assentamentos				5,00				6.426.641,54
Famílias reassentadas	Famílias				399,00				14.300.000,00
Canal de Drenagem	Canal				1,00				2.930.371,39
Componente II: Melhorias en cuanto a movilidad urbana									
Obras do sistema Viário concluídas	Km construído				14,50				104.296.082,99
Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	Sistema				1,00				3.320.000,00
Estações de Conexão de Ônibus construídas	Estação				13,00				2.706.895,72
Plano Diretor de Transporte Urbano elaborado	Plano				1,00				1.987.000,00
Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto				1,00				1.692.659,29
Componente III: Fortalecimiento institucional									
Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação implantada	Modelo				1,00				150.000,00
Gestão Cadastral e Serviços eletrônicos	Registros de Contribuintes Imobiliários				180.000,00				16.687.200,00
Administracion del Programa									
Imprevistos									
TOTAL									172.333.938,00
