
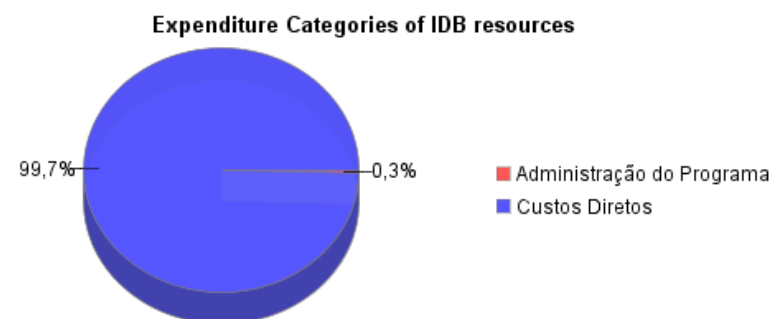



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Perfeitura Municipal de São José dos Campos				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	2323/OC-BR	Current Approved Amount:	85.672.400,00	Original IDB:	85.672.400,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	85.672.400,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	48,00
Related Operation(s):	RG-P1374	Balance:	85.672.400,00	Co-Financing/Country:	92.353.800,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	178.026.200,00
				Amortization Period (months):	168

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	Nov 18, 2011
		Validated by Country Representative:	Nov 18, 2011

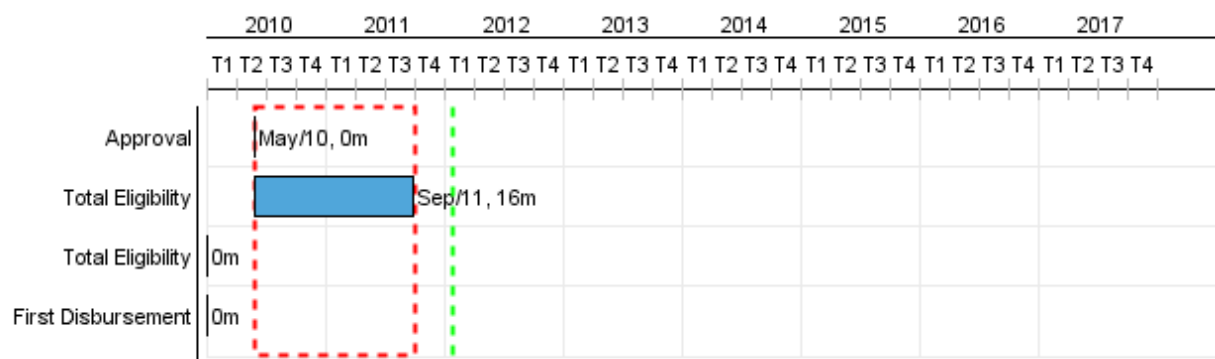

Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Desenvolvimento Urbano do Municipio de São José dos Campos estruturado
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Nº de favelas existentes	Favela	1,00	2010	P A						0,00
Indice de passageiros por km (IPK) percorrido.	IPK (%)	1,60	2010	P A		2,10				2,10
Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	US\$	39.000.000,00	2010	P A	105,00	116,00	127,00 148,00	140,00		58.000.000,00

Outcome:	Melhorias urbano-ambientais implementadas
Suppositions:	área verde de 7,4 m2 por habitante

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
incremento no m2 de área verde por habitante	m2	7,40	2010	P A					7,80	7,80

Outcome:	Resíduos de construção civil não descartados clandestinamente incrementados
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Resíduos não descartadas clandestinamente	toneladas		2010	P A	8.640,00	17.280,00	24.480,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00

Outcome:	Assentamentos regularizados
Suppositions:	SH (Secretaría de Vivienda); predios con matrículas individualizadas (depiende de la acción de la Notaría de Registro de Inmuebles)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Predios con matrículas individualizadas nos assentamentos	Predios		2010	P A		530,00	802,00	548,00	1.880,00	1.880,00

Outcome:	Familias de la favela do banhado reubicadas
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
tasa de permanencia de las familias asentadas	%		2010	P A					80,00	80,00
zona liberada para la integración al area de preservación ambiental	m2		2010	P A	223.102,00					223.102,00

Outcome:	Mejorías en cuanto a movilidad de la población implantadas
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Via do Banhado - velocidad promedio para el acceso y transposición del Centro	km/h	29,00	2010	P					45,00	45,00
				A						
Cambuí - velocidad media comparada con la alternativa actual	Km/h	36,00	2010	P					45,00	45,00
				A						
Centro de control de operaciones - tiempo de espera en el semáforo	minuto	2,50	2010	P					1,00	1,00
				A						
Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de líneas en funcionamiento)	lineas	37,00	2010	P					34,00	34,00
				A						

Outcome:	Fortalecimiento institucional implementado
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento	dias	35,00	2010	P					25,00	28,00
				A						
Capacidad de getión de servicios electrónicos	servidores	36,00	2010	P					18,00	18,00
				A						
Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos	dias	172,00	2010	P					148,00	148,00
				A						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I: Melhorias urbano-ambientais									
Parques Urbanos criados	Parques	1,00			5,00	3.000.097,14			15.000.485,73
Gestão de Resíduos da Construção Civil implementada	Postos	6,00			21,00	709.150,33			2.836.601,34
Assentamentos Urbanizados	Assentamentos	2,00			5,00	2.142.213,84			6.426.641,54
Famílias reassentadas	Famílias				399,00				14.300.000,00
Canal de Drenagem construído	Canal				1,00				2.930.371,39
Componente II: Melhorias en cuanto a movilidad urbana									
Obras do sistema Viário concluídas	Km				14,50				104.296.082,99
Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	Sistema				1,00				3.320.000,00
Estações de Conexão de Ônibus construídas	Estação				13,00				2.706.895,72
Plano Diretor de Transporte Urbano elaborado	Plano				1,00				1.987.000,00
Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto				1,00				1.692.659,29
Componente III: Fortalecimiento institucional									
Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação implantada	Modelo				1,00				150.000,00
Gestão Cadastral e Serviços eletrônicos de registro de contribuintes imobiliários implantados	Registros				180.000,00				16.687.200,00
Administracion del Programa									
Imprevistos									
TOTAL						5.851.461,31			172.333.938,00
