

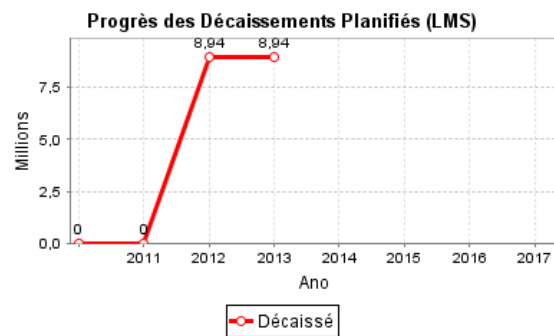



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Perfeitura Municipal de São José dos Campos				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Numéro(s) de Prêt(s):	2323/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	85.672.400,00	Initial BID:	85.672.400,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	8.940.586,42	Courant BID:	85.672.400,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	10,44	Pari Passu:	48,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1374, BR-T1225	Solde:	76.731.813,58	Cofinancement/Pays:	92.353.800,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	178.026.200,00
				Période d'Amortissement (mois):	168

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 12-abr-2013 Validé par le Représentant: 15-abr-2013

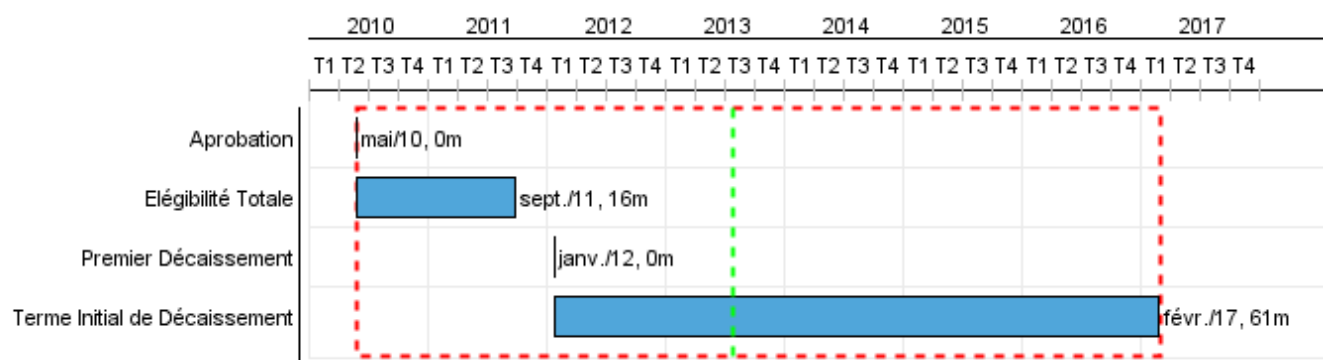

Progrès Cumulé à 2012

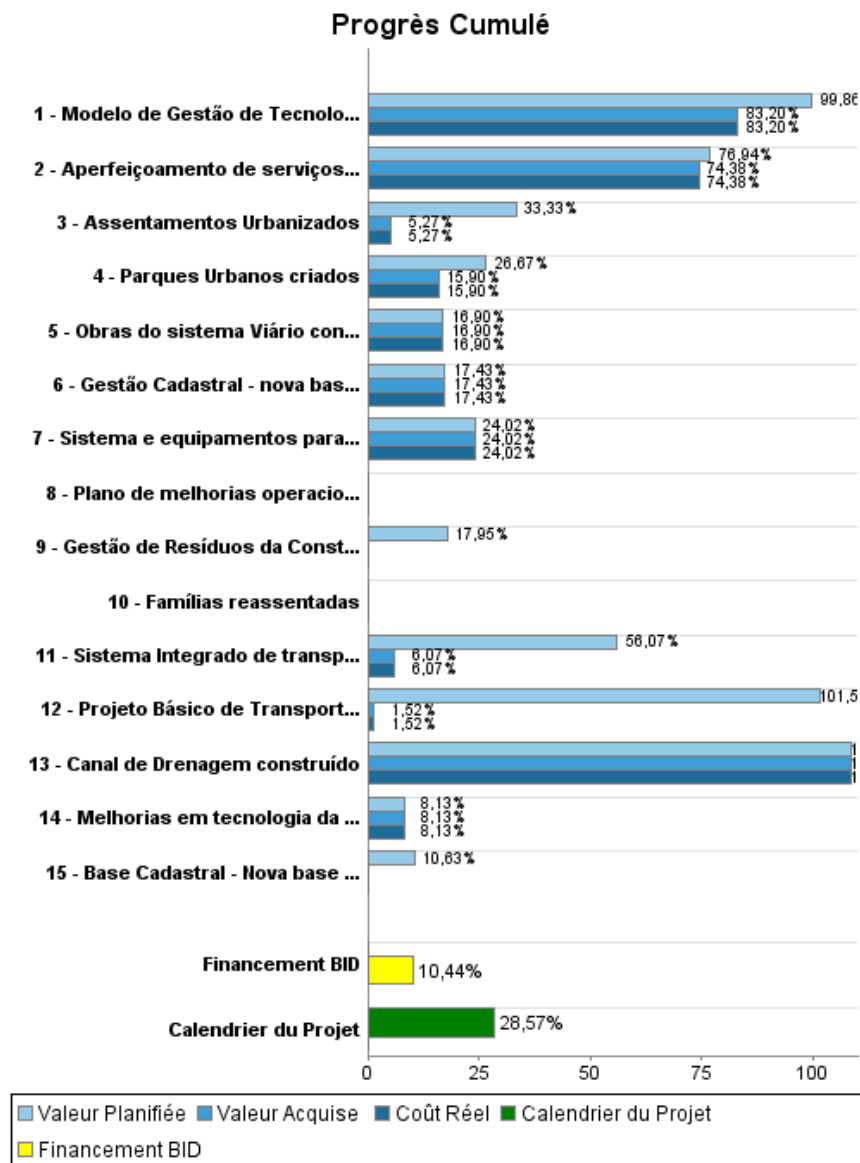

Résultats

Résultat:	Desenvolvimento Urbano do Municipio de São José dos Campos estruturado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Nº de favelas existentes	Favela	1,00	2010	P A						
Indice de passageiros por km (IPK) percorrido.	IPK (%)	1,60	2010	P A		2,10				2,10
Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	US\$	39.000.000,00	2010	P A	105,00	116,00	127,00	140,00		58.000.000,00

Résultat:	Melhorias urbano-ambientais implementadas
Suposições:	área verde de 7,4 m2 por habitante

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
incremento no m2 de área verde por habitante	m2	7,40	2010	P A					7,80	7,80

Résultat:	Resíduos de construção civil não descartados clandestinamente incrementados
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Resíduos não descartadas clandestinamente	toneladas		2010	P A	8.640,00	17.280,00	24.480,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00

Résultat:	Assentamentos regularizados
Suposições:	SH (Secretaría de Vivienda); predios con matrículas individualizadas (depiende de la acción de la Notaría de Registro de Inmuebles)

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Predios con matrículas individualizadas nos assentamentos	Predios		2010	P A		530,00	802,00	548,00	1.880,00	1.880,00

Résultat:	Familias de la favela do banhado reubicadas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
------------	-----------------	---------------	---------------------	--	------	------	------	------	------	---------------

tasa de permanencia de las familias asentadas	%		2010	P					80,00	80,00
				A						
zona liberada para la integración al area de preservación ambiental	m2		2010	P	223.102,00					223.102,00
				A						

Résultat:	Mejoras en cuanto a movilidad de la población implantadas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Via do Banhado - velocidad promedio para el acceso y transposición del Centro	km/h	29,00	2010	P					45,00	45,00
				A						
Cambuí - velocidad media comparada con la alternativa actual	Km/h	36,00	2010	P					45,00	45,00
				A						
Centro de control de operaciones - tiempo de espera en el semáforo	minuto	2,50	2010	P					1,00	1,00
				A						
Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de lineas en funcionamiento)	lineas	37,00	2010	P					34,00	34,00
				A						

Résultat:	Fortalecimiento institucional implementado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento	dias	35,00	2010	P					25,00	28,00
				A						
Capacidad de getión de servicios electrónicos	servidores	36,00	2010	P					18,00	18,00
				A						
Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos	dias	172,00	2010	P					148,00	148,00
				A						

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I: Melhorias urbano-ambientales									
Parques Urbanos criados	Parques				5,00		2.385.316,96		15.000.485,73
Gestão de Resíduos da Construção Civil implementada	Postos		11,00		21,00				2.836.601,34
Assentamentos Urbanizados	Assentamentos		2,00		7,00		338.732,32		6.426.641,54
Famílias reassentadas	Famílias				399,00				14.300.000,00
Canal de Drenagem construído	Canal		1,00		1,00		3.178.621,89		2.930.371,39
Componente II: Melhorias en cuanto a movilidad urbana									
Obras do sistema Viário concluídas	Km		3,00		5,00		17.628.344,03		104.296.082,99
Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	%		30,00		100,00		797.319,23		3.320.000,00
Sistema Integrado de transporte público em operação	%				100,00		164.234,71		2.706.895,72
Plano de melhorias operacionais na Secretaria de Transporte implementado	Plano				1,00				1.987.000,00
Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto				1,00		25.701,44		1.692.659,29
Componente III: Fortalecimiento institucional									
Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação - ferramentas para planejamento de TI implantada.	ferramentas		2,00		2,00		124.797,09		150.000,00
Melhorias em tecnologia da informação (solução de armazenamento e processamento de dados) implementadas	%				100,00		280.201,87		3.444.464,35
Aperfeiçoamento de serviços de governo eletrônico - softwares de governo eletrônicos implementados	softwares		2,00		4,00		3.489.532,77		4.691.480,95
Base Cadastral - Nova base de dados geoterritoriais integrada	%				100,00				5.646.600,00
Gestão Cadastral - nova base de dados cadastrais e multifinalitários implantada	%				100,00		2.908.401,34		16.687.200,00
Administracion del Programa									
Auditoria, monitoramento, avaliação, UGP, fiscalização de obras	N/A						17.272,59		3.912.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								1.780.262,00
TOTAL							31.338.476,24		191.808.745,30
