
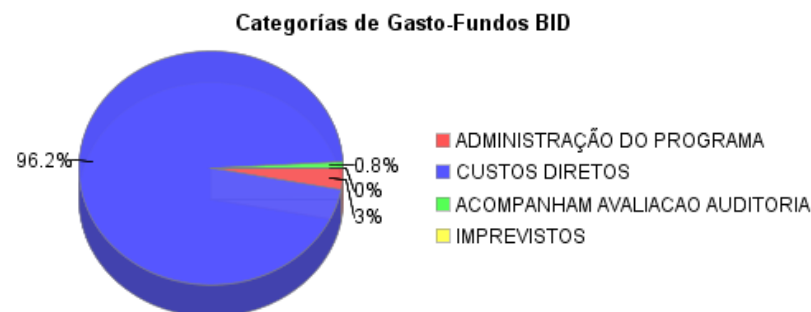
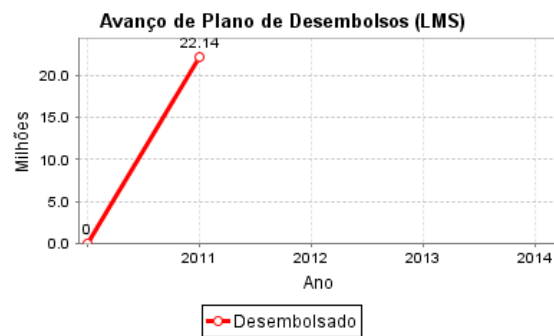


## Relatório Resumido

| Dados Gerais          |                                                                           | Fundos Disponíveis (US\$) |                | Custo Total e Fonte             |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Executor:             | Secretaria de Medio Ambiente São Paulo                                    |                           |                |                                 |                |
| Setor:                | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE |                           |                |                                 |                |
| Número da Operação:   | 2376/OC-BR                                                                | Atual:                    | 162.454.000,00 | Original BID:                   | 162.454.000,00 |
| Estágio:              | Approved                                                                  | Desembolsado:             | 22.137.733,70  | Corrente BID:                   | 162.454.000,00 |
| Tipo Operação:        | INV - Investimento                                                        | % Desembolsado:           | 13,63          | Pari-passu:                     | 35,00          |
| Operação Relacionada: | RG-P1400                                                                  | Saldo:                    | 140.316.266,30 | Cofinanciamento/País:           | 2.000.000,00   |
| Subtipo de Operação:  | ESP - Specific Investment Operation                                       |                           |                | Original Estimado:              | 164.454.000,00 |
|                       |                                                                           |                           |                | Período de Amortização (meses): | 246            |

| Categoria do impacto social  | Reformulação                                      | Validação                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria do impacto social: | A ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 30-abr-2012<br>Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012 |

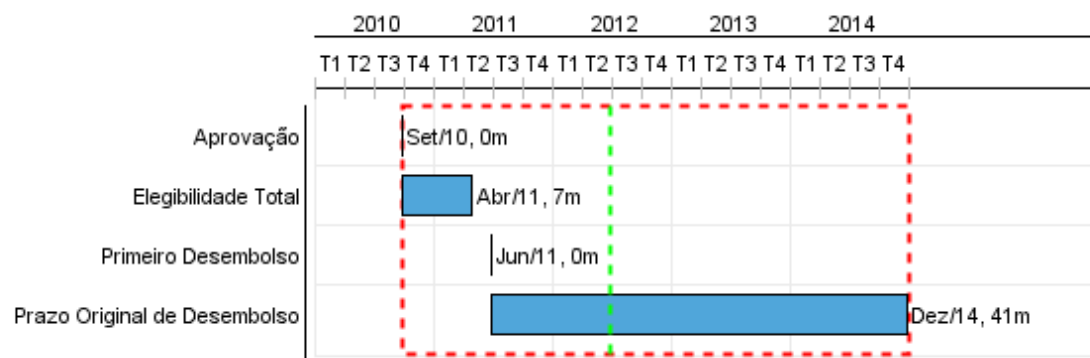

## Progresso Acumulado até 2011



## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO


BR-L1241 - Serra do Mar and Atlantic Forest Mosaics System Socioenvironmental Recovery  
2011 2º período com fechamento em (31-Mar-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB  
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 30/04/2012

### Progresso Acumulado



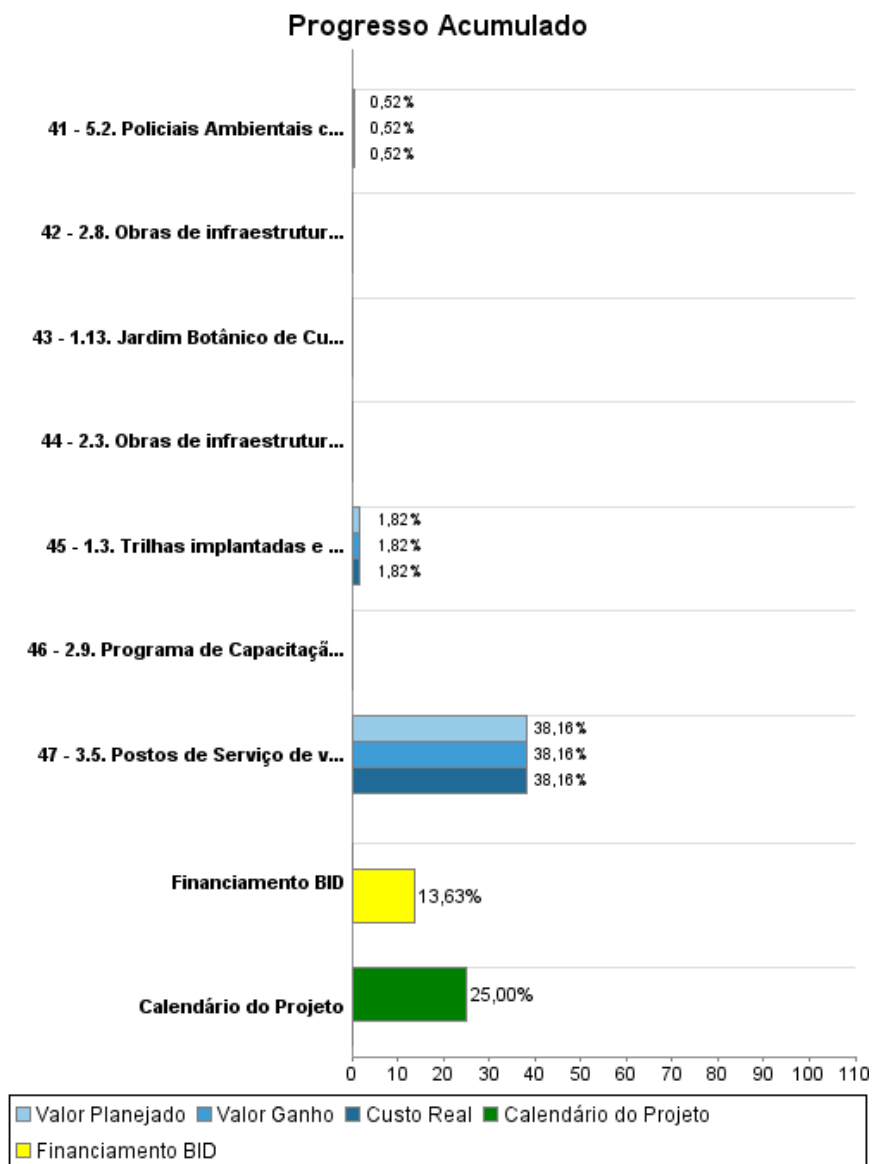

## Resultados

**Resultado:** Resultado 1: GESTÃO DAS UCs MELHORADAS

| Indicador                                                                        | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base |        | 2014   | Final do Projeto |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|--------|------------------|
| Número de habitações reocupando áreas que tem sido desocupadas pelo programa     | Habitações     |            | 2010           | P<br>A |        | 0,00             |
| Índice de ilegalidade, medindo o nível de ocupação ilegal                        | %              | 10.44      | 2010           | P<br>A | 9.40   | 9,40             |
| Índice de cobertura de fiscalização, indicando % de setores das UCs fiscalizadas | %              |            | 2010           | P<br>A | 100.00 | 100,00           |
| Índice de Qualidade da Eficácia e Gestão das Unidades de Conservação do Programa | Pontos         | 66.70      | 2010           | P<br>A | 71.00  | 71,00            |

**Resultado:** Resultado 2: IMPACTO ANTRÓPICO REDUZIDO

| Indicador                                                                                              | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base |        | 2014  | Final do Projeto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|-------|------------------|
| % del área antropizada no Parque Estadual Serra do Mar (PESM) del total del área del PESH (315.000 ha) | %              | 5.00       | 2010           | P<br>A | 3.00  | 3,00             |
| Área liberada en el PESH para recuperación ambiental                                                   | Há             |            | 2010           | P<br>A | 90.00 | 90,00            |

**Resultado:** Resultado 3: QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO PROJETO MELHORADA

| Indicador                                             | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base |        | 2014 | Final do Projeto |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Índice de Qualidade de Vida das famílias reassentadas | %              |            | 2010           | P<br>A |      | 0,00             |
| Índice de Qualidade de Vida das famílias permanentes  | %              |            | 2010           | P<br>A |      | 0,00             |

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011**

| Descrição                                                                                                  | Unidade de medida | Físico    |       |                     |              | Financeiro   |              |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                            |                   | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado    | Atual        | Custos Acumulados | Custos FDP    |
| COMPONENTE 1:PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO                                                          |                   |           |       |                     |              |              |              |                   |               |
| 1.1. Projeto de lei contendo os novos limites do Parque Estadual Serra do Mar (PESM) desenvolvido          | Proyectos         |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 234.193,00    |
| 1.2. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública do PESH completadas                  | Obras             |           |       |                     | 20,00        | 680.665,00   | 680.665,00   |                   | 4.696.999,00  |
| 1.3. Trilhas implantadas e sinalizadas                                                                     | Trilhas           |           |       |                     | 6,00         | 37.595,00    | 37.595,00    |                   | 2.061.403,00  |
| 1.4. Núcleos atendidos com equipamento e custeio operacional                                               | Núcleos           |           |       |                     | 9,00         | 355.923,00   | 355.923,00   |                   | 3.277.884,00  |
| 1.5. Postos de vigilância e monitores ambientais contratados                                               | Posto             | 18,00     | 18,00 |                     | 120,00       | 2.105.096,00 | 2.105.096,00 |                   | 7.383.601,00  |
| 1.6. Programa de comunicação e divulgação do PESH desenvolvido e implantado                                | Programa          |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 1.331.359,00  |
| 1.7. Programa de Capacitação de gestores e equipe operacional                                              | Progama           |           |       |                     | 2,00         |              |              |                   | 624.999,00    |
| 1.8. Sistema de monitoramento ambiental e micro zoneamento das áreas críticas desenvolvida                 | Sistema           |           |       |                     | 1,00         | 63.500,00    | 63.500,00    |                   | 1.229.623,00  |
| 1.9. Áreas com eliminação de exóticas                                                                      | Hectares          |           |       |                     | 200,00       |              |              |                   | 1.762.282,00  |
| 1.10. Áreas de enriquecimento florestal                                                                    | Hectares          |           |       |                     | 850,00       |              |              |                   | 1.371.649,00  |
| 1.11. Áreas com recuperação ambiental - Cubatão                                                            | Hectares          |           |       |                     | 90,00        |              |              |                   | 1.208.175,00  |
| 1.12. Jardim Botânico de Cubatão (JBC) construído                                                          | Jardim Botânico   |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 17.145.631,00 |
| 1.13. Jardim Botânico de Cubatão (JBC) operando                                                            | Jardim Botânico   |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 1.898.938,00  |
| 1.14. Projetos pilotos em metodologia e procedimentos para a regularização fundiária implementados no PESH | Projetos Pilotos  |           |       |                     | 2,00         |              |              |                   | 2.595.921,00  |
| 2.1. Projeto de Lei da Estação Ecológica (E.Ec. ) Jureia-Itatins encaminhado pela Assembléia Legislativa   | Proyectos         |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 25.629,00     |
| 2.2. Estudo sobre procedimentos para regularização fundiária e reassentamento na E. Ec. finalizados        | Estudo            |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 1.852.441,00  |
| 2.3. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública                                      | Obras             |           |       |                     | 6,00         |              |              |                   | 4.766.267,00  |

| Descrição                                                                                                 | Unidade de medida | Físico    |       |                     |              | Financeiro   |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                           |                   | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado    | Atual        | Custos Acumulados | Custos FDP   |
| 2.4. Programa de Capacitação nas Unidades de Proteção Integral                                            | Programa          |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 505.240,00   |
| 2.5. Trilhas implantadas com Plano de Riscos e Contingências                                              | km2               |           |       |                     | 25,00        |              |              |                   | 285.087,00   |
| 2.6 Unidade dotada com equipamentos e manutenção operacional                                              | UC                |           |       |                     | 1,00         | 49.415,00    | 49.415,00    |                   | 1.245.237,00 |
| 2.7.Postos de vigilância e monitoramento ambiental implementado                                           | Postos            | 13,00     | 13,00 |                     | 46,00        | 1.093.976,00 | 1.093.976,00 |                   | 4.412.661,00 |
| 2.8. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública nas UC's do Mosaico                 | Obras             |           |       |                     | 7,00         |              |              |                   | 1.843.799,00 |
| 2.9. Programa de Capacitação nas Unidades de Uso Sustentável                                              | Programa          |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 357.479,00   |
| 2.10 Unidades dotadas com equipamentos e manutenção operacional                                           | UC                |           |       |                     | 6,00         |              |              |                   | 391.063,00   |
| 2.11. Sistema de gestão do Mosaico Jureia-Itatins desenvolvido e em execução                              | Sistema           |           |       |                     | 3,00         |              |              |                   | 1.574.562,00 |
| 2.12. Planos de Uso Sustentável elaborados                                                                | Planos            |           |       |                     | 2,00         |              |              |                   | 1.190.791,00 |
| 3.1. Planos de Manejo elaborados                                                                          | Plano             |           |       |                     | 4,00         |              |              |                   | 1.701.757,00 |
| 3.2. Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Marinhas com manutenção operacional instalados                    | APA               |           |       |                     | 3,00         | 13.309,00    | 13.309,00    |                   | 789.472,00   |
| 3.3. Obras nas UCs de Proteção Integral do Mosaico de UCs Marinhas completadas                            | Obra              |           |       |                     | 5,00         | 36.286,00    | 36.286,00    |                   | 2.192.183,00 |
| 3.4. UCs com sinalização parcial dos limites e atrativos completados                                      | UC                |           |       |                     | 2,00         |              |              |                   | 213.597,00   |
| 3.5. Postos de Serviço de vigilância patrimonial contratados                                              | Posto             | 6,00      | 6,00  |                     | 26,00        | 530.672,00   | 530.672,00   |                   | 2.638.991,00 |
| 3.6. Postos de Serviços de Monitores Ambientais contratados                                               | Monitor Ambiental | 9,00      | 9,00  |                     | 19,00        | 216.635,00   | 216.635,00   |                   | 1.021.929,00 |
| 3.7. APAs Marinhas e UCs Marinhas de Proteção Integral equipados e operacionalizado                       | UC                |           |       |                     | 8,00         | 40.790,00    | 40.790,00    |                   | 1.654.777,00 |
| 3.8. Trilha implantada e sinalizada                                                                       | Trilha            |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 122.808,00   |
| 3.9. Programa de comunicação e divulgação implantado                                                      | Programa          |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 629.202,00   |
| 3.10. Organizações capacitados através do Programa de Capacitação para Sustentabilidade das APAs Marinhas | Organizações      |           |       |                     | 48,00        |              |              |                   | 324.561,00   |
| 3.11. Sistema de gestão, monitoramento e informação das APAs Marinhas implantado                          | Sistema           |           |       |                     | 1,00         |              |              |                   | 497.806,00   |
| <b>COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS SOCIAIS</b>                                                                |                   |           |       |                     |              |              |              |                   |              |

## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1241 - Serra do Mar and Atlantic Forest Mosaics System Socioenvironmental  
Recovery  
2011 2º período com fechamento em (31-Mar-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 30/04/2012

| Descrição                                                                                                     | Unidade de medida | Físico    |          |                     |              | Financeiro            |                       |                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                               |                   | Planejado | Atual    | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado             | Atual                 | Custos Acumulados | Custos FDP            |
| 4.1. Famílias reassentadas de acordo com o Plano de Reassentamento                                            | Famílias          | 1.500,00  | 1.263,00 |                     | 6.550,00     | 169.616.002,00        | 169.616.002,00        |                   | 375.643.970,00        |
| 4.2. Famílias com ocupação consolidada por meio da urbanização e regularização fundiária                      | Famílias          |           |          |                     | 2.410,00     | 29.263.941,00         | 29.263.941,00         |                   | 73.883.645,00         |
| 4.3. Projeto básico de urbanização e reassentamento para famílias nos sectores sul e norte do PESM elaborado  | Projeto           |           |          |                     | 1,00         |                       |                       |                   | 9.895.000,00          |
| <b>COMPONENTE 3: FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</b>                                                 |                   |           |          |                     |              |                       |                       |                   |                       |
| 5.1. Estudantes capacitados através do Programa de Educação Socioambiental                                    | Estudantes        |           |          |                     | 30.000,00    |                       |                       |                   | 573.384,00            |
| 5.2. Policiais Ambientais capacitados através do Programa de Capacitação Técnica                              | Policiais         | 75,00     | 75,00    |                     | 565,00       | 6.991,00              | 6.991,00              |                   | 1.357.175,89          |
| 5.3. Veículos (carros, aeronave e embarcações) comprados                                                      | Veículos          | 50,00     | 50,00    |                     | 108,00       | 1.164.299,00          | 1.164.299,00          |                   | 18.349.251,00         |
| 5.4. Contratos de Operação e Manutenção essencial dos equipamentos a serem utilizados na fiscalização das UCs | Contrato          | 1,00      | 1,00     |                     | 7,00         | 112.443,00            | 112.443,00            |                   | 6.892.262,00          |
| 5.5. Sistema de Comunicação Digital implantado                                                                | Sistema           |           |          |                     | 1,00         |                       |                       |                   | 150.000,00            |
| 5.6. Contrato de obras e reformas das bases para execução da fiscalização executados                          | Obras             |           |          |                     | 7,00         |                       |                       |                   | 13.059.980,00         |
| 5.7. Sistema GIS implantado                                                                                   | Sistema           |           |          |                     | 1,00         |                       |                       |                   | 614.028,00            |
| <b>Outros</b>                                                                                                 |                   |           |          |                     |              |                       |                       |                   |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                  |                   |           |          |                     |              | <b>205.387.538,00</b> | <b>205.387.538,00</b> |                   | <b>577.478.691,89</b> |
