

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	Secretaría de Medio Ambiente São Paulo
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Número(s) de Préstamo:	2376/OC-BR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1400
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	162.454.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	35.137.733,70
% Desembolsado:	21,63
Saldo:	127.316.266,30

Costo total y Fuente

BID Original:	162.454.000,00
Actual BID:	162.454.000,00
Pari-passu:	35,00
Co-financiamiento/País:	307.709.000,00
Estimado Original:	470.163.000,00
Período de Amortización (meses):	246




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: A () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 22-sep-2012
Validado por Representante de País: 28-sep-2012

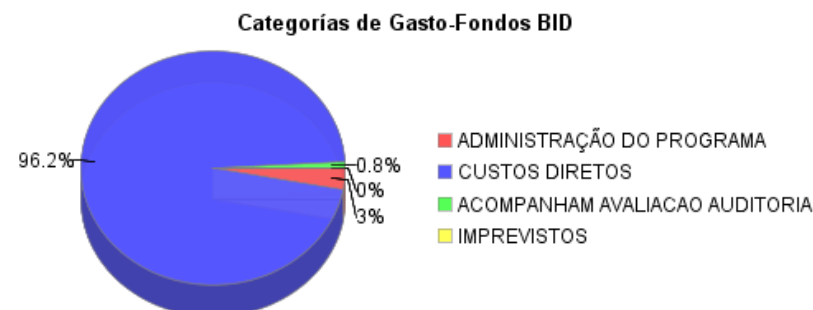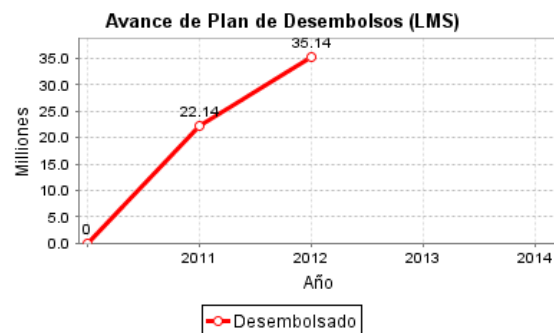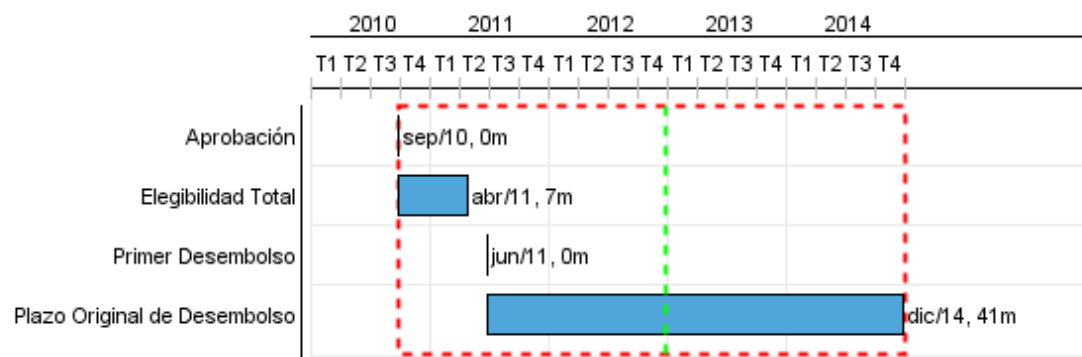


Progreso Acumulado al 2012

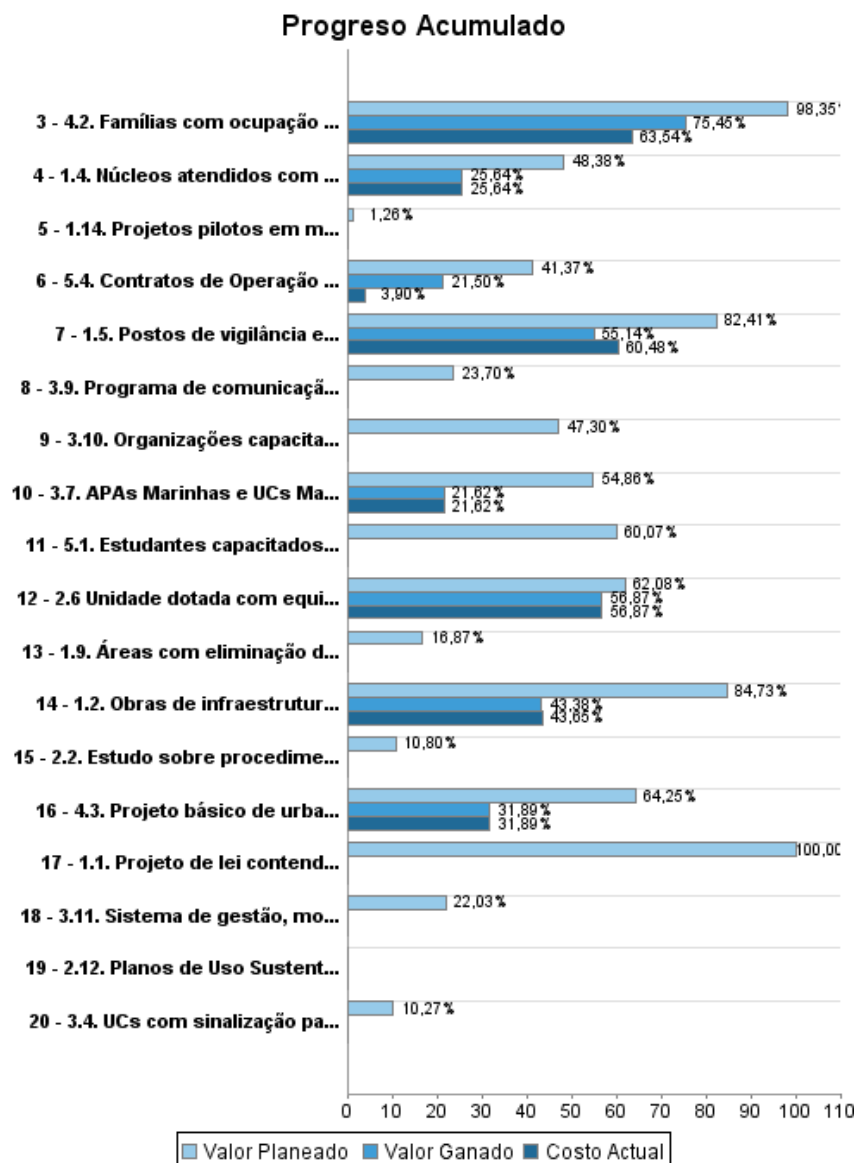

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1241 - Recuperación Socio-Ambiental de Serra do Mar y Sistema Mosaicos de Mata Atlántica
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)


Progreso Acumulado

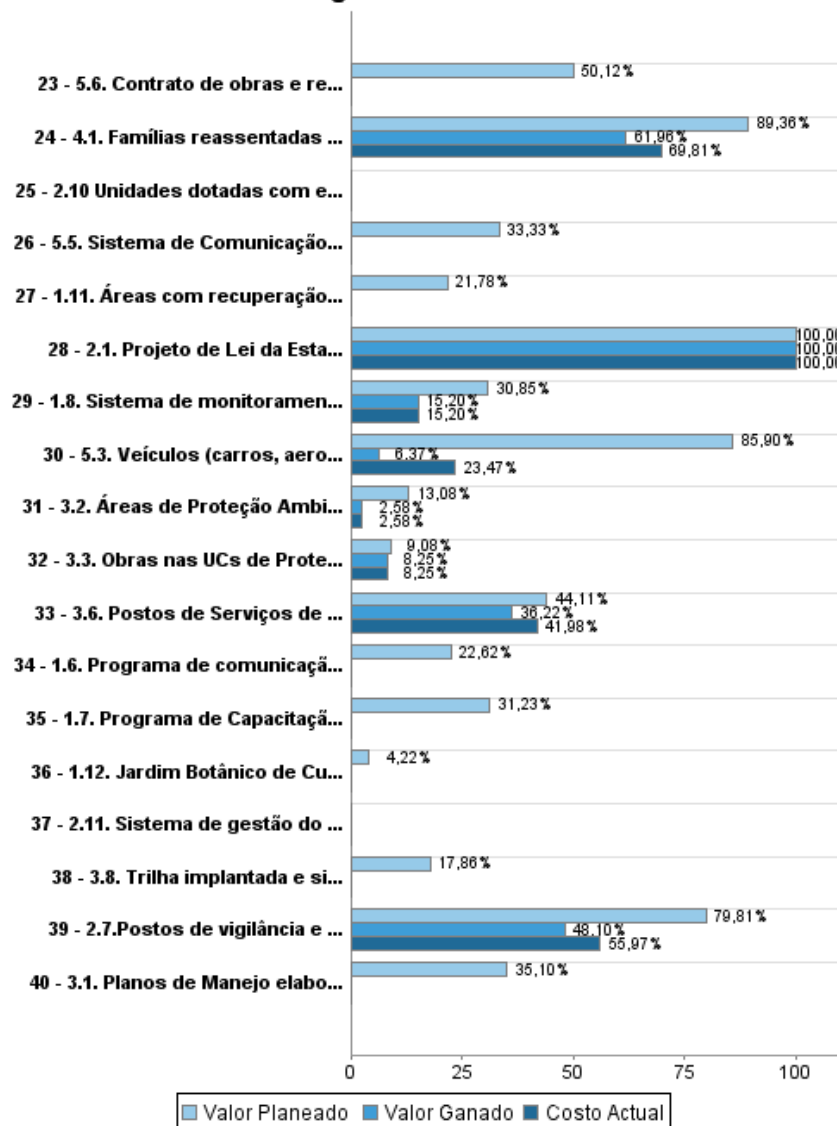

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1241 - Recuperación Socio-Ambiental de Serra do Mar y Sistema Mosaicos de Mata Atlántica
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Progreso Acumulado

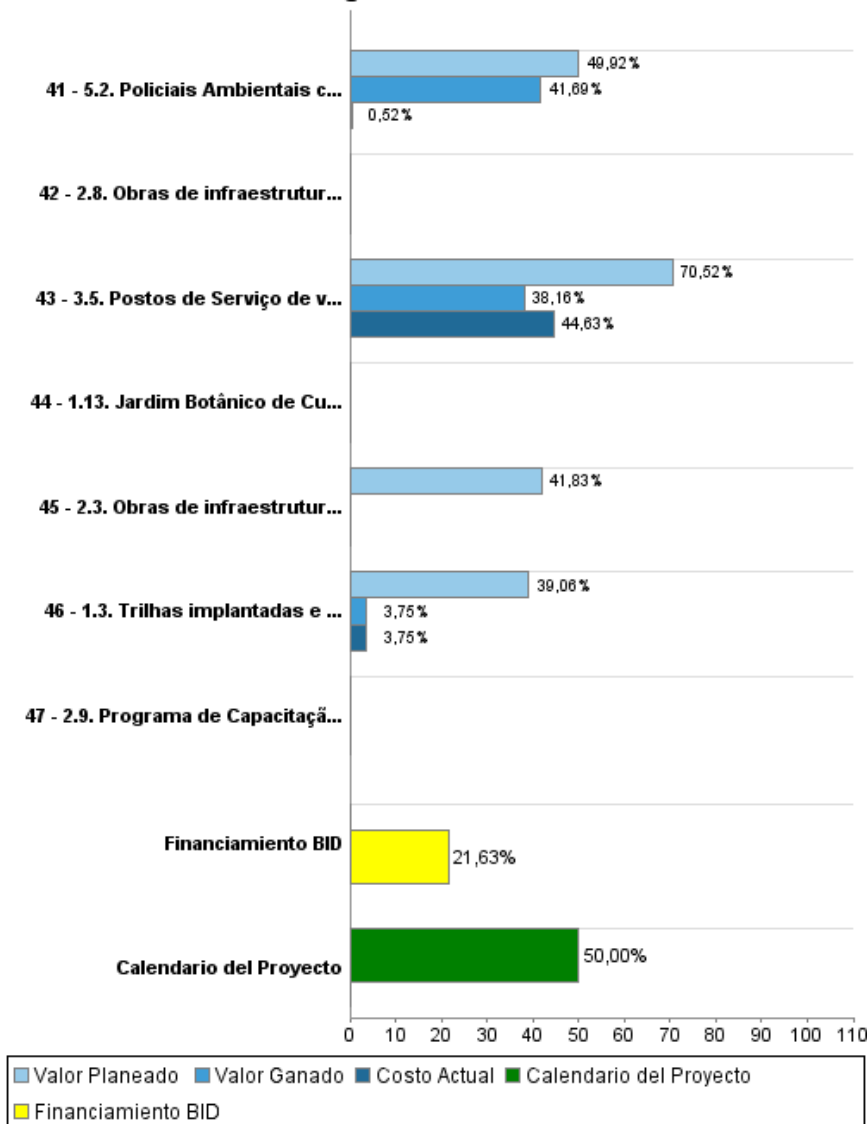

Resultados

Resultado: Resultado 1: GESTÃO DAS UCs MELHORADAS

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	Fin de Proyecto
Número de habitações reocupando áreas que tem sido desocupadas pelo programa	Habitações		2010	P A		
Índice de ilegalidade, medindo o nivel de ocupação ilegal	%	10.44	2010	P A	9.40	9.40
Índice de cobertura de fiscalização, indicando % de setores das UCs fiscalizadas	%		2010	P A	100.00	100.00
Índice de Qualidade da Eficácia e Gestão das Unidades de Conservação do Programa	Pontos	66.70	2010	P A	71.00	71.00

Resultado: Resultado 2: IMPACTO ANTRÓPICO REDUZIDO

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	Fin de Proyecto
% del área antropizada no Parque Estadual Serra do Mar (PESM) del total del área del PESH (315.000 ha)	%	5.00	2010	P A	3.00	3.00
Área liberada en el PESH para recuperação ambiental	Há		2010	P A	90.00	90.00

Resultado: Resultado 3: QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO PROJETO MELHORADA

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	Fin de Proyecto
Índice de Qualidade de Vida das familias reassentadas	%		2010	P A		
Índice de Qualidade de Vida das familias permanentes	%		2010	P A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descrição	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
COMPONENTE 1:PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO									
1.1. Projeto de lei contendo os novos limites do Parque Estadual Serra do Mar (PESM) desenvolvido	Proyectos	1,00			1,00	234.193,00			234.193,00
1.2. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública do PESM completadas	Obras	4,00	1,00		20,00	2.589.421,00	659.890,00		4.696.999,00
1.3. Trilhas implantadas e sinalizadas	Trilhas				6,00	767.544,00	39.740,00		2.061.403,00
1.4. Núcleos atendidos com equipamento e custeio operacional	Núcleos				9,00	1.023.868,00	278.700,00		3.277.884,00
1.5. Postos de vigilância e monitores ambientais contratados	Posto	35,00			120,00	2.014.176,00	394.370,00		7.383.601,00
1.6. Programa de comunicação e divulgação do PESM desenvolvido e implantado	Programa				1,00	301.096,00			1.331.359,00
1.7. Programa de Capacitação de gestores e equipe operacional	Progama				2,00	195.175,00			624.999,00
1.8. Sistema de monitoramento ambiental e micro zoneamento das áreas críticas desenvolvida	Sistema				1,00	315.792,00	123.464,00		1.229.623,00
1.9. Áreas com eliminação de exóticas	Hectares				200,00	297.298,00			1.762.282,00
1.10. Áreas de enriquecimento florestal	Hectares				850,00	336.468,00			1.371.649,00
1.11. Áreas com recuperação ambiental - Cubatão	Hectares	45,00			90,00	263.158,00			1.208.175,00
1.12. Jardim Botânico de Cubatão (JBC) construído	Jardim Botânico				1,00	723.201,00			17.145.631,00
1.13. Jardim Botânico de Cubatão (JBC) operando	Jardim Botânico				1,00				1.898.938,00
1.14. Projetos pilotos em metodologia e procedimentos para a regularização fundiária implementados no PESM	Projetos Pilotos				2,00	32.807,00			2.595.921,00
2.1. Projeto de Lei da Estação Ecológica (E.Ec.) Jureia-Itatins encaminhado pela Assembléia Legislativa	Proyectos	1,00	1,00		1,00				25.629,00
2.2. Estudo sobre procedimentos para regularização fundiária e reassentamento na E. Ec. finalizados	Estudo				1,00	200.073,00			1.852.441,00
2.3. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública	Obras	1,00			6,00	1.993.636,00			4.766.267,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1241 - Recuperación Socio-Ambiental de Serra do Mar y Sistema Mosaicos de Mata Atlántic
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 20/09/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
2.4. Programa de Capacitação nas Unidades de Proteção Integral	Programa				1,00	130.884,00			505.240,00
2.5. Trilhas implantadas com Plano de Riscos e Contingências	km2				25,00	63.962,00			285.087,00
2.6 Unidade dotada com equipamentos e manutenção operacional	UC				1,00	343.677,00	278.740,00		1.245.237,00
2.7.Postos de vigilância e monitoramento ambiental implementado	Postos	15,00			46,00	1.399.094,00	347.230,00		4.412.661,00
2.8. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública nas UCs do Mosaico	Obras				7,00				1.843.799,00
2.9. Programa de Capacitação nas Unidades de Uso Sustentável	Programa				1,00				357.479,00
2.10 Unidades dotadas com equipamentos e manutenção operacional	UC				6,00				391.063,00
2.11. Sistema de gestão do Mosaico Jureia-Itatins desenvolvido e em execução	Sistema				3,00				1.574.562,00
2.12. Planos de Uso Sustentável elaborados	Planos				2,00				1.190.791,00
3.1. Planos de Manejo elaborados	Plano				4,00	597.300,00			1.701.757,00
3.2. Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Marinhas com manutenção operacional instalados	APA				3,00	82.919,00			789.472,00
3.3. Obras nas UCs de Proteção Integral do Mosaico de UCs Marinhas completadas	Obra				5,00	18.208,00			2.192.183,00
3.4. UCs com sinalização parcial dos limites e atrativos completados	UC				2,00	21.930,00			213.597,00
3.5. Postos de Serviço de vigilância patrimonial contratados	Posto	10,00			26,00	853.849,00	170.710,00		2.638.991,00
3.6. Postos de Serviços de Monitores Ambientais contratados	Monitor Ambiental	5,00			19,00	80.674,00	58.820,00		1.021.929,00
3.7. APAs Marinhas e UCs Marinhas de Proteção Integral equipados e operacionalizado	UC				8,00	775.791,00	225.640,00		1.654.777,00
3.8. Trilha implantada e sinalizada	Trilha				1,00	21.930,00			122.808,00
3.9. Programa de comunicação e divulgação implantado	Programa				1,00	149.123,00			629.202,00
3.10. Organizações capacitados através do Programa de Capacitação para Sustentabilidade das APAs Marinhas	Organizações				48,00	153.509,00			324.561,00
3.11. Sistema de gestão, monitoramento e informação das APAs Marinhas implantado	Sistema				1,00	109.650,00			497.806,00
COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS SOCIAIS									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1241 - Recuperación Socio-Ambiental de Serra do Mar y Sistema Mosaicos de Mata Atlántic
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 20/09/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
4.1. Famílias reassentadas de acordo com o Plano de Reassentamento	Famílias	1.299,00	241,00		6.550,00	98.434.007,00	25.014.000,00		375.643.970,00
4.2. Famílias com ocupação consolidada por meio da urbanização e regularização fundiária	Famílias	900,00	525,00		2.410,00	40.622.944,00	14.904.000,00		73.883.645,00
4.3. Projeto básico de urbanização e reassentamento para famílias nos sectores sul e norte do PESH elaborado	Projeto				1,00	6.358.000,00	3.156.000,00		9.895.000,00
COMPONENTE 3: FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO									
5.1. Estudantes capacitados através do Programa de Educação Socioambiental	Estudantes				30.000,00	344.440,00			573.384,00
5.2. Policiais Ambientais capacitados através do Programa de Capacitação Técnica	Policiais	180,00	150,00		565,00	670.506,00			1.357.175,89
5.3. Veículos (carros, aeronave e embarcações) comprados	Veiculos	7,00			108,00	14.593.391,00	3.138.460,00		18.349.251,00
5.4. Contratos de Operação e Manutenção essencial dos equipamentos a serem utilizados na fiscalização das UCs	Contrato	2,00	1,00		7,00	2.738.793,00	156.339,00		6.892.262,00
5.5. Sistema de Comunicação Digital implantado	Sistema				1,00	50.000,00			150.000,00
5.6. Contrato de obras e reformas das bases para execução da fiscalização executados	Obras				7,00	6.545.871,00			13.059.980,00
5.7. Sistema GIS implantado	Sistema				1,00	614.028,00			614.028,00
Outros									
Administração, Supervisão e Custos Indiretos.	N/A					307.768,00	314.870,00		10.739.000,00
TOTAL						187.370.154,00	49.260.973,00		588.217.691,89
