
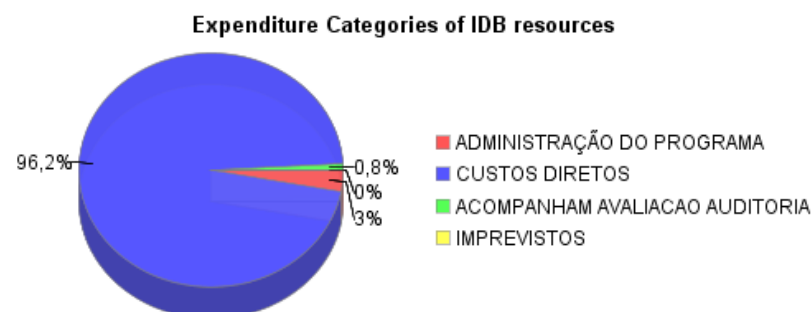
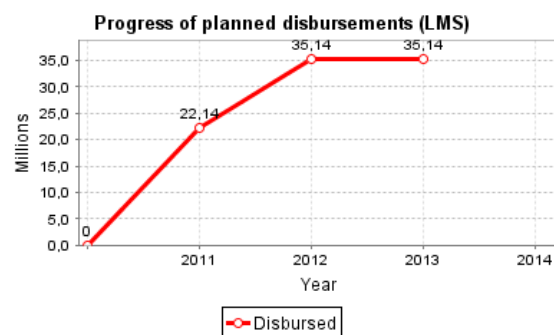



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Secretaría de Medio Ambiente São Paulo				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE				
Loan Number(s):	2376/OC-BR	Current Approved Amount:	162.454.000,00	Original IDB:	162.454.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	35.137.733,70	Current IDB:	162.454.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	21,63	Pari-passu:	35,00
Related Operation(s):	RG-P1400	Balance:	127.316.266,30	Co-Financing/Country:	307.709.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	470.163.000,00
				Amortization Period (months):	246

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: A	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 08-abr-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013

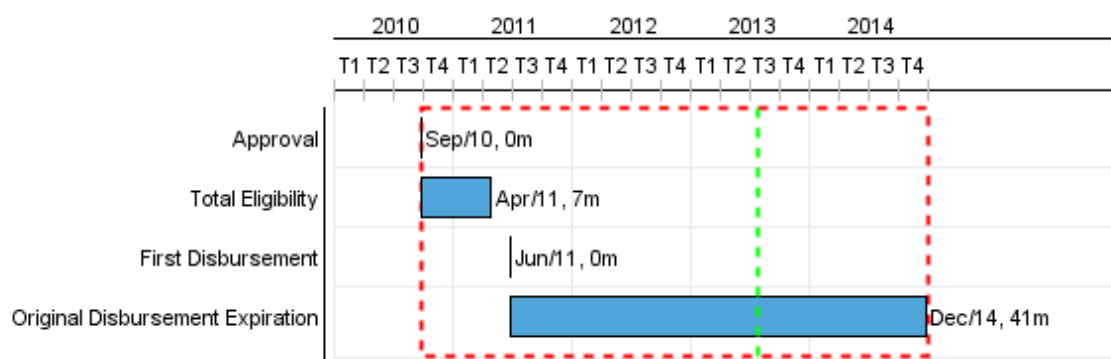


Accumulated Progress as of 2012

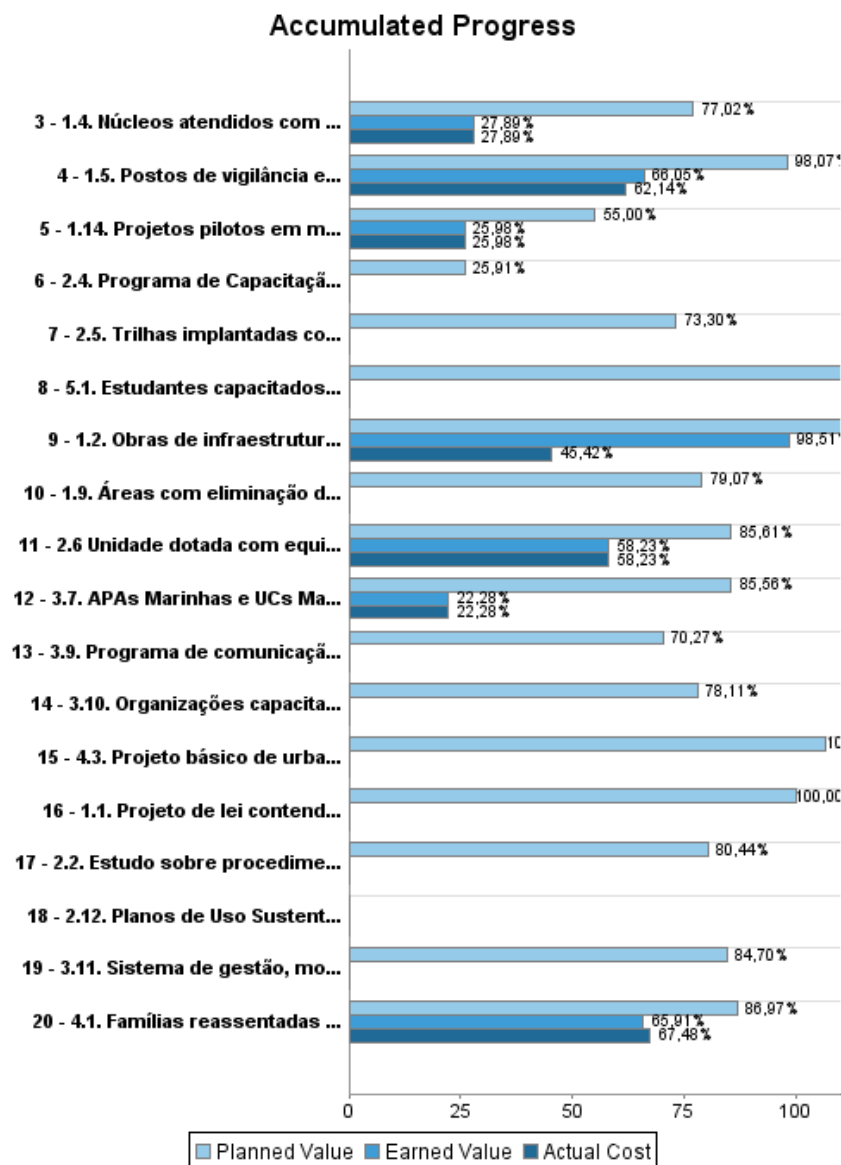

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1241 - Serra do Mar and Atlantic Forest Mosaics System Socioenvironmental Recovery
2012 2º period closed in (7-May-2013)


Accumulated Progress

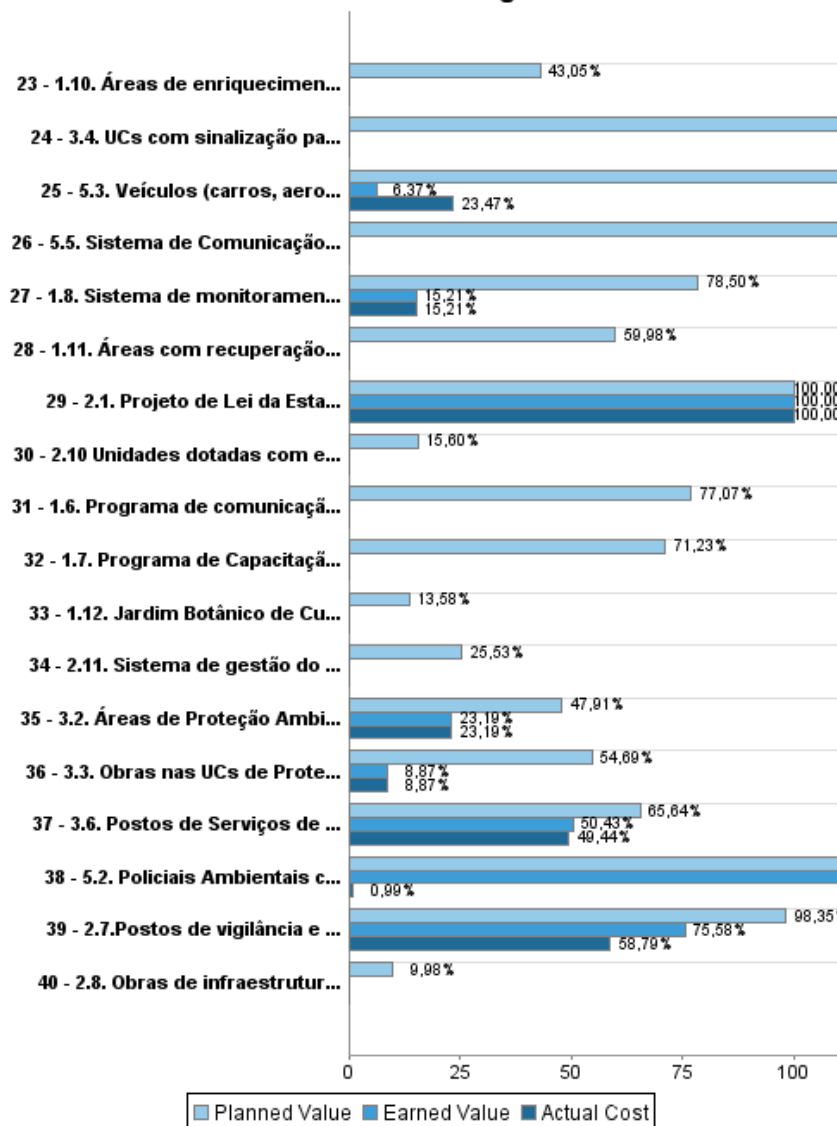

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1241 - Serra do Mar and Atlantic Forest Mosaics System Socioenvironmental Recovery
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Accumulated Progress

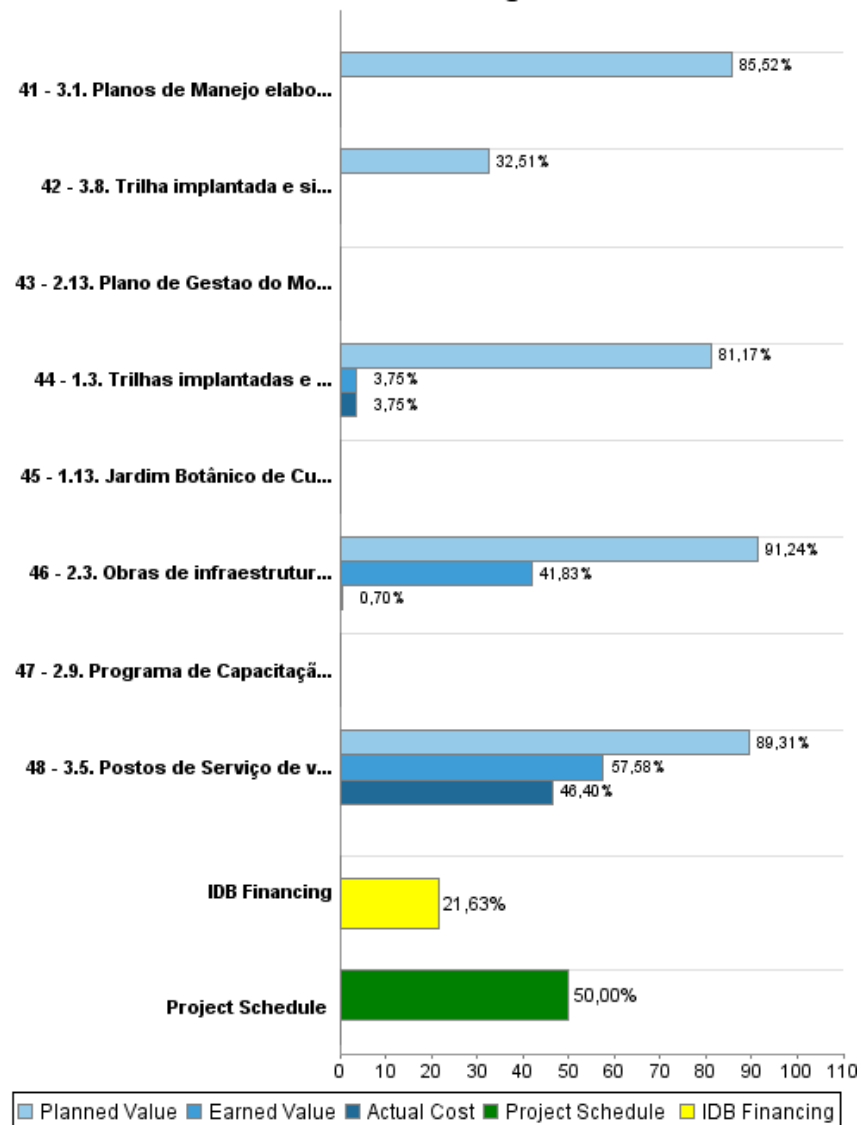

Outcomes

Outcome: Resultado 1: GESTÃO DAS UCs MELHORADAS

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	End of project
Número de habitações reocupando áreas que tem sido desocupadas pelo programa	Habitações		2010	P A		
Índice de ilegalidade, medindo o nível de ocupação ilegal	%	10,44	2010	P A	9,40	9,40
Índice de cobertura de fiscalização, indicando % de setores das UCs fiscalizadas	%	50,00	2011	P A	100,00	100,00
Índice de Qualidade da Eficácia e Gestão das Unidades de Conservação do Programa	Pontos	66,70	2010	P A	71,00	71,00

Outcome: Resultado 2: IMPACTO ANTRÓPICO REDUZIDO

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	End of project
% del área antropizada no Parque Estadual Serra do Mar (PESM) del total del área del PESH (315.000 ha)	%	5,00	2010	P A	3,00	3,00
Área liberada en el PESH para recuperación ambiental	Há		2010	P A	90,00	90,00

Outcome: Resultado 3: QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO PROJETO MELHORADA

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	End of project
Índice de Qualidade de Vida das famílias reassentadas	Pontos		2010	P A		0,60
Índice de Qualidade de Vida das famílias permanentes	Pontos		2010	P A		0,51

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
COMPONENTE 1:PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO									
1.1. Projeto de lei contendo os novos limites do Parque Estadual Serra do Mar (PESM) desenvolvido	Projeto	1,00			1,00	234.193,00			234.193,00
1.2. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública do PESH completadas	Obras	4,00	5,00		20,00	2.589.421,00	743.234,85		4.696.999,00
1.3. Trilhas implantadas e sinalizadas	Trilhas				6,00	767.544,00	39.742,86		2.061.403,00
1.4. Núcleos atendidos com equipamento e custeio operacional	Núcleos				9,00	1.023.868,00	352.316,02		3.277.884,00
1.5. Postos de vigilância e monitores ambientais contratados	Posto	35,00	14,00		120,00	2.014.176,00	517.203,00		7.383.601,00
1.6. Programa de comunicação e divulgação do PESH desenvolvido e implantado	Programa				1,00	301.096,00			1.331.359,00
1.7. Programa de Capacitação de gestores e equipe operacional	Progama				2,00	195.175,00			624.999,00
1.8. Sistema de monitoramento ambiental desenvolvida	Sistema				1,00	315.792,00	123.464,61		1.229.623,00
1.9. Áreas com eliminação de exóticas	Hectares				200,00	297.298,00			1.256.282,00
1.10. Áreas de enriquecimento florestal	Hectares				850,00	336.468,00			1.371.649,00
1.11. Áreas com recuperação ambiental - Cubatão	Hectares	45,00			90,00	263.158,00			1.714.175,00
1.12. Jardim Botânico de Cubatão (JBC) construído	Jardim Botânico				1,00	723.201,00			17.145.631,00
1.13. Jardim Botânico de Cubatão (JBC) operando	Jardim Botânico				1,00				1.898.938,00
1.14. Projetos pilotos em metodologia e procedimentos para a regularização fundiária implementados no PESH	Projetos Pilotos				2,00	32.807,00	674.517,90		2.595.921,00
2.1. Projeto de Lei da Estação Ecológica (E.Ec.) Jureia-Itatins encaminhado pela Assembléia Legislativa	Projeto	1,00	1,00		1,00				25.629,00
2.2. Estudo sobre procedimentos para regularização fundiária e reassentamento na E. Ec. finalizados	Estudo				1,00	200.073,00			1.852.441,00
2.3. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública	Obras	1,00	1,00		6,00	1.993.636,00	33.427,31		4.766.267,00
2.4. Programa de Capacitação nas Unidades de Proteção Integral	Programa				1,00	130.884,00			505.240,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1241 - Serra do Mar and Atlantic Forest Mosaics System Socioenvironmental Recovery
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 03/04/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
2.5. Trilhas implantadas com Plano de Riscos e Contingências	km				12,00	63.962,00			285.087,00
2.6 Unidade dotada com equipamentos e manutenção operacional	UC				1,00	343.677,00	295.795,10		1.245.237,00
2.7.Postos de vigilância e monitoramento ambiental implementado	Postos	15,00	13,00		46,00	1.399.094,00	471.518,71		4.412.661,00
2.8. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública nas UCs do Mosaico	Obras				7,00				1.843.799,00
2.9. Programa de Capacitação nas Unidades de Uso Sustentável	Programa				1,00				357.479,00
2.10 Unidades dotadas com equipamentos e manutenção operacional	UC				6,00				391.063,00
2.11. Sistema de gestão do Mosaico Jureia-Itatins desenvolvido e em execução	Sistema				3,00				1.574.562,00
2.12. Planos de Uso Sustentável elaborados	Planos				2,00				1.190.791,00
3.1. Planos de Manejo elaborados	Plano				4,00	597.300,00			1.701.757,00
3.2. Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Marinhas com manutenção operacional instalados	APA				3,00	82.919,00	162.758,05		789.472,00
3.3. Obras nas UCs de Proteção Integral do Mosaico de UCs Marinhas completadas	Obra				5,00	18.208,00	13.731,29		2.192.183,00
3.4. UCs com sinalização parcial dos limites e atrativos completados	UC				2,00	21.930,00			213.597,00
3.5. Postos de Serviço de vigilância patrimonial contratados	Posto	10,00	6,00		26,00	853.849,00	217.210,64		2.638.991,00
3.6. Postos de Serviços de Monitores Ambientais contratados	Monitor Ambiental	5,00	9,00		26,00	80.674,00	135.058,29		1.021.929,00
3.7. APAs Marinhas e UCs Marinhas de Proteção Integral equipados e operacionalizado	UC				8,00	775.791,00	236.563,63		1.654.777,00
3.8. Trilha implantada e sinalizada	Trilha				1,00	21.930,00			122.808,00
3.9. Programa de comunicação e divulgação implantado	Programa				1,00	149.123,00			629.202,00
3.10. Organizações capacitados através do Programa de Capacitação para Sustentabilidade das APAs Marinhas	Organizações				48,00	153.509,00			324.561,00
3.11. Sistema de gestão, monitoramento e informação das APAs Marinhas implantado	Sistema				1,00	109.650,00			497.806,00
2.13. Plano de Gestao do Mosaico Jureia Itatins	Plano				1,00				
COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS SOCIAIS									

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1241 - Serra do Mar and Atlantic Forest Mosaics System Socioenvironmental Recovery
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 03/04/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
4.1. Famílias reassentadas de acordo com o Plano de Reassentamento	Famílias	1.299,00	963,00		6.980,00	98.434.007,00	57.056.102,00		436.124.970,00
4.2. Famílias com ocupação consolidada por meio da urbanização e regularização fundiária	Famílias	900,00	525,00		1.980,00	40.622.944,00	39.849.891,00		119.422.645,00
4.3. Projeto básico de urbanização e reassentamento para famílias nos sectores sul e norte do PESM elaborado	Projeto				5,00	6.358.000,00			8.539.000,00
COMPONENTE 3: FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO									
5.1. Estudantes capacitados através do Programa de Educação Socioambiental	Estudantes				30.000,00	344.440,00			573.384,00
5.2. Policiais Ambientais capacitados através do Programa de Capacitação Técnica	Policiais	180,00	300,00		565,00	670.506,00	3.114,29		1.016.175,89
5.3. Veículos (carros, aeronave e embarcações) comprados	Veiculos	7,00			69,00	14.593.391,00	3.138.461,65		18.349.251,00
5.4. Contratos de Operação e Manutenção essencial dos equipamentos a serem utilizados na fiscalização das UCs	Contrato	2,00	1,00		7,00	2.738.793,00	605.417,83		6.857.262,00
5.5. Sistema de Comunicação Digital implantado	Sistema				1,00	50.000,00			150.000,00
5.6. Contrato de obras e reformas das bases para execução da fiscalização executados	Obras				7,00	6.545.871,00			13.059.980,00
5.7. Sistema GIS implantado	Sistema				1,00	614.028,00			614.028,00
Outros									
Administração, Supervisão e Custos Indiretos.	N/A					307.768,00	715.636,08		10.739.000,00
TOTAL						187.370.154,00	105.385.165,11		692.505.691,89
