
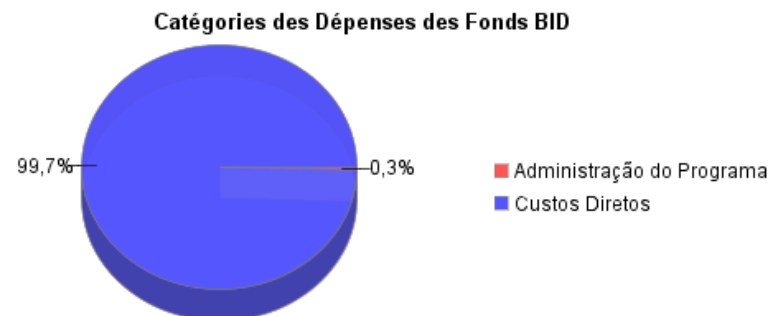




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Perfeitura Municipal de São José dos Campos	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT			
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2323/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	85.672.400,00	Initial BID:	85.672.400,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	85.672.400,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	48,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1374	Solde:	85.672.400,00	Cofinancement/Pays:	92.353.800,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	178.026.200,00
				Période d'Amortissement (mois):	168

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Nov 18, 2011 Validé par le Représentant: Nov 18, 2011

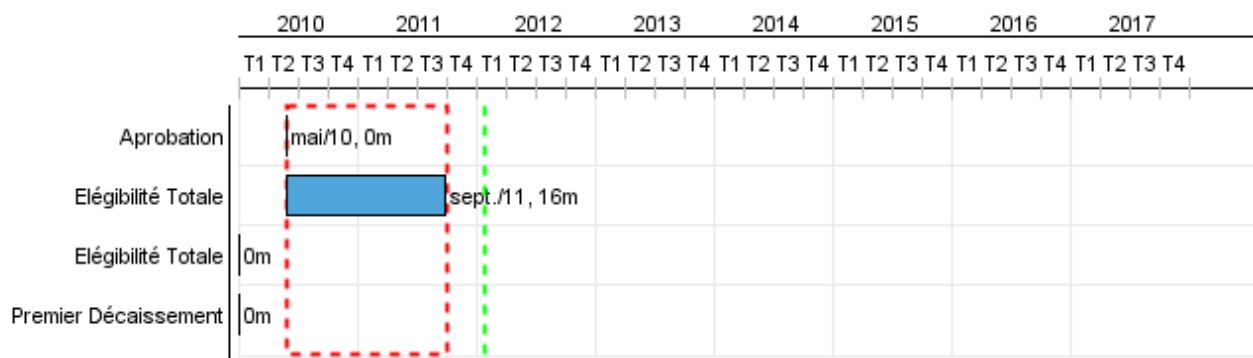

Progrès Cumulé à 2011

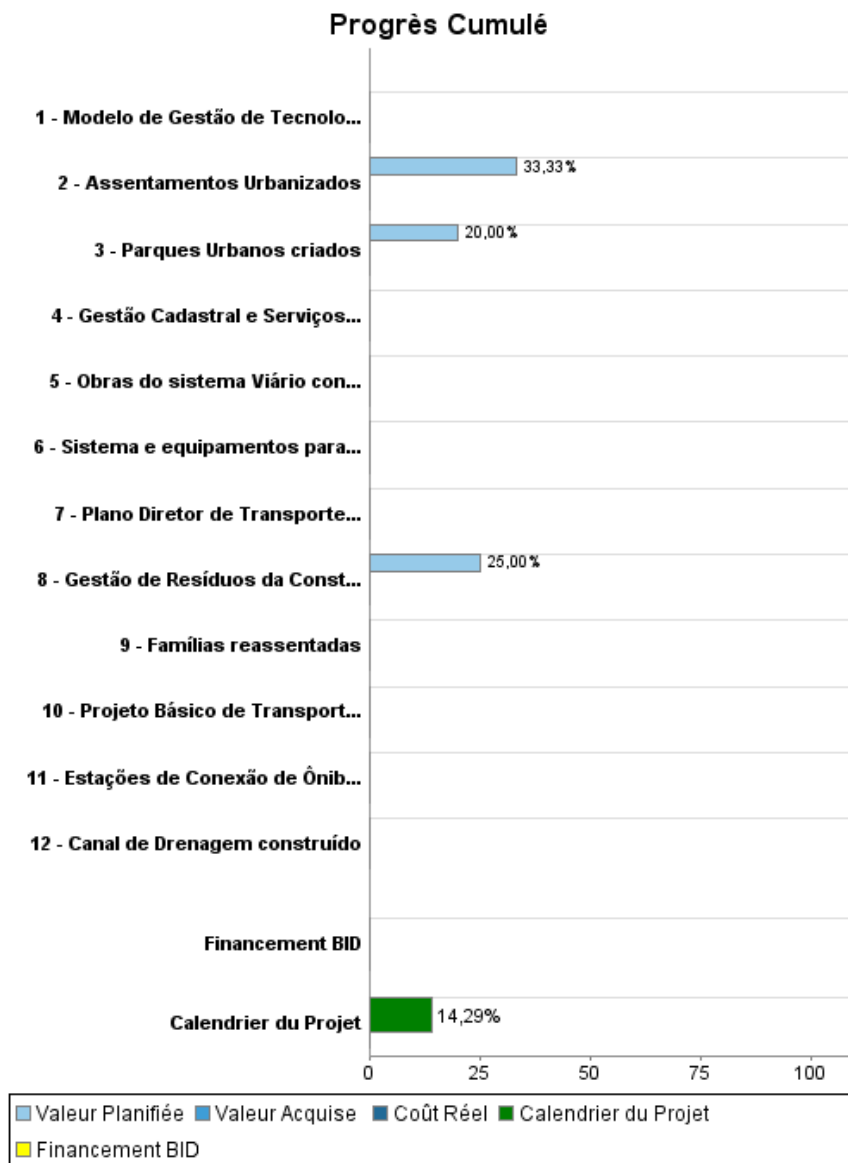

Résultats

Résultat:	Desenvolvimento Urbano do Municipio de São José dos Campos estruturado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Nº de favelas existentes	Favela	1,00	2010	P A						0,00
Indice de passageiros por km (IPK) percorrido.	IPK (%)	1,60	2010	P A		2,10				2,10
Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	US\$	39.000.000,00	2010	P A	105,00	116,00	127,00	140,00		58.000.000,00
							148,00			

Résultat:	Melhorias urbano-ambientais implementadas
Suposições:	área verde de 7,4 m2 por habitante

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
incremento no m2 de área verde por habitante	m2	7,40	2010	P A					7,80	7,80

Résultat:	Resíduos de construção civil não descartados clandestinamente incrementados
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Resíduos não descartadas clandestinamente	toneladas		2010	P A	8.640,00	17.280,00	24.480,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00

Résultat:	Assentamentos regularizados
Suposições:	SH (Secretaría de Vivienda); predios con matrículas individualizadas (depiende de la acción de la Notaría de Registro de Inmuebles)

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Predios con matrículas individualizadas nos assentamentos	Predios		2010	P A		530,00	802,00	548,00	1.880,00	1.880,00

Résultat:	Famílias de la favela do banhado reubicadas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
------------	-----------------	---------------	---------------------	--	------	------	------	------	------	---------------

tasa de permanencia de las familias asentadas	%		2010	P					80,00	80,00
				A						
zona liberada para la integración al area de preservación ambiental	m2		2010	P	223.102,00					223.102,00
				A						

Résultat:	Mejorías en cuanto a movilidad de la población implantadas
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Via do Banhado - velocidad promedio para el acceso y transposición del Centro	km/h	29,00	2010	P					45,00	45,00
				A						
Cambuí - velocidad media comparada con la alternativa actual	Km/h	36,00	2010	P					45,00	45,00
				A						
Centro de control de operaciones - tiempo de espera en el semáforo	minuto	2,50	2010	P					1,00	1,00
				A						
Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de lineas en funcionamiento)	lineas	37,00	2010	P					34,00	34,00
				A						

Résultat:	Fortalecimiento institucional implementado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento	dias	35,00	2010	P					25,00	28,00
				A						
Capacidad de getión de servicios electrónicos	servidores	36,00	2010	P					18,00	18,00
				A						
Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos	dias	172,00	2010	P					148,00	148,00
				A						

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I: Mejorías urbano-ambientales									
Parques Urbanos criados	Parques	1,00			5,00	3.000.097,14			15.000.485,73
Gestão de Resíduos da Construção Civil implementada	Postos	6,00			21,00	709.150,33			2.836.601,34
Assentamentos Urbanizados	Assentamentos	2,00			5,00	2.142.213,84			6.426.641,54
Famílias reassentadas	Famílias				399,00				14.300.000,00
Canal de Drenagem construído	Canal				1,00				2.930.371,39
Componente II: Mejorías en cuanto a movilidad urbana									
Obras do sistema Viário concluídas	Km				14,50				104.296.082,99
Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	Sistema				1,00				3.320.000,00
Estações de Conexão de Ônibus construídas	Estação				13,00				2.706.895,72
Plano Diretor de Transporte Urbano elaborado	Plano				1,00				1.987.000,00
Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto				1,00				1.692.659,29
Componente III: Fortalecimiento institucional									
Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação implantada	Modelo				1,00				150.000,00
Gestão Cadastral e Serviços eletrônicos de registro de contribuintes imobiliários implantados	Registros				180.000,00				16.687.200,00
Administracion del Programa									
Imprevistos									
TOTAL						5.851.461,31			172.333.938,00
