

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	Perfeitura Municipal de São José dos Campos
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Número(s) de Préstamo:	2323/OC-BR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1374
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	85.672.400,00
Monto Desembolsado a la fecha:	5.514.863,12
% Desembolsado:	6,44
Saldo:	80.157.536,88

Costo total y Fuente

BID Original:	85.672.400,00
Actual BID:	85.672.400,00
Pari-passu:	48,00
Co-financiamiento/País:	92.353.800,00
Estimado Original:	178.026.200,00
Período de Amortización (meses):	168

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:




B

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 24-abr-2012
Validado por Representante de País: 24-abr-2012

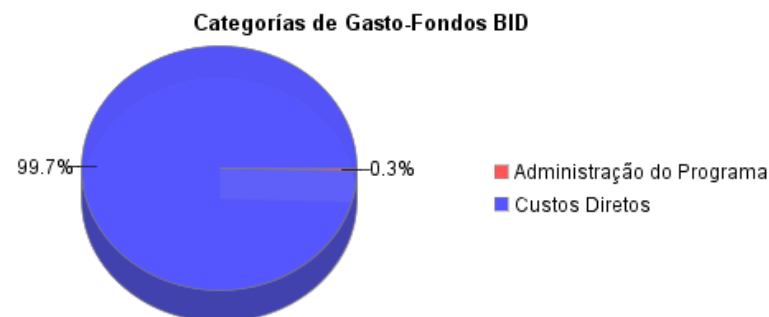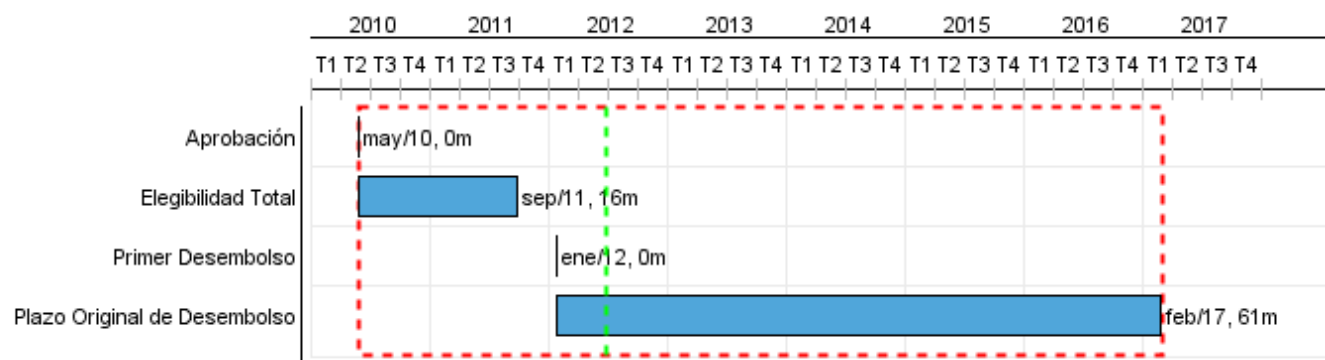

Progreso Acumulado al 2011

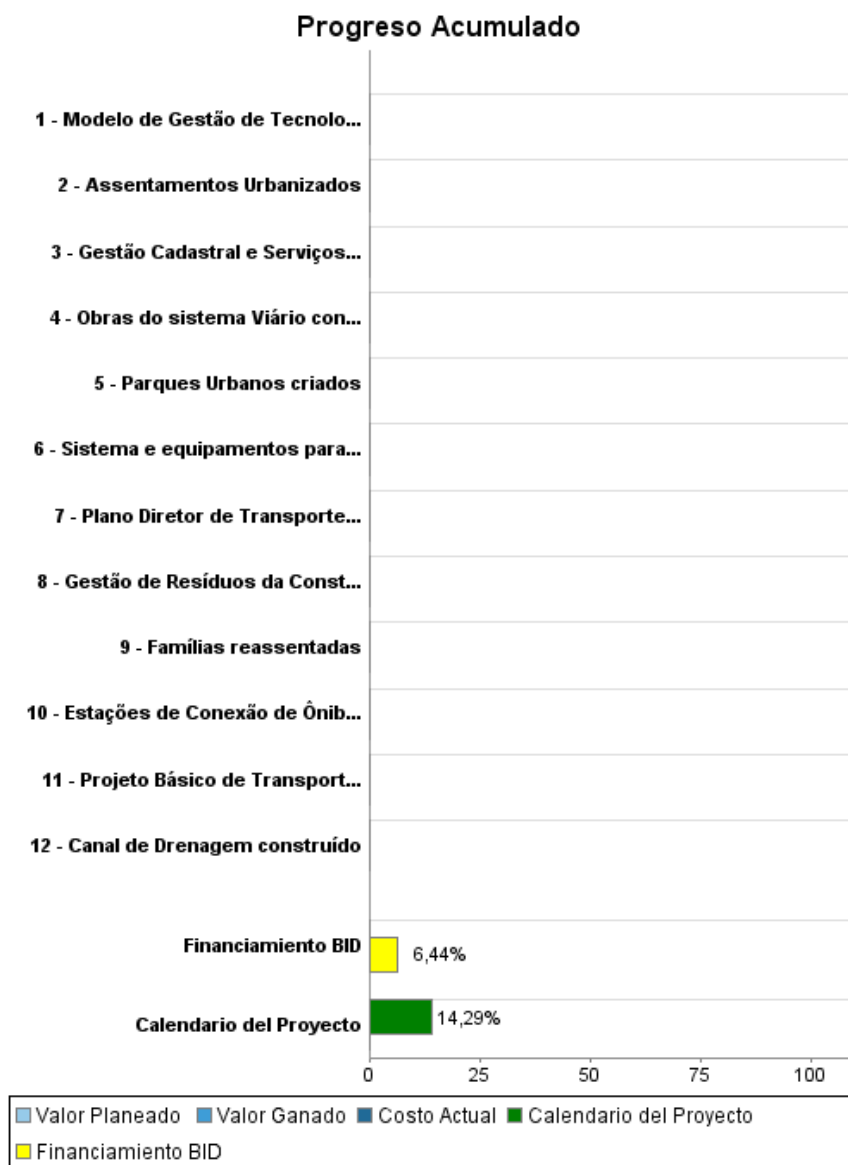

Resultados

Resultado: Desenvolvimento Urbano do Municipio de São José dos Campos estruturado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Nº de favelas existentes	Favela	1.00	2010	P A						0,00
Índice de passageiros por km (IPK) percorrido.	IPK (%)	1.60	2010	P A		2.10				2,10
Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	US\$	39,000,000.00	2010	P A	105.00	116.00	127.00 148.00	140.00		58.000.000,00

Resultado: Melhorias urbano-ambientais implementadas

Supuestos: área verde de 7,4 m2 por habitante

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
incremento no m2 de área verde por habitante	m2	7.40	2010	P A					7.80	7,80

Resultado: Resíduos de construção civil não descartados clandestinamente incrementados

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Resíduos não descartadas clandestinamente	toneladas		2010	P A	8,640.00	17,280.00	24,480.00	30,240.00	30,240.00	30.240,00

Resultado: Assentamentos regularizados

Supuestos: SH (Secretaría de Vivienda); predios con matrículas individualizadas (depende de la acción de la Notaría de Registro de Inmuebles)

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Predios con matrículas individualizadas nos assentamentos	Predios		2010	P A		530.00	802.00	548.00	1,880.00	1.880,00

Resultado: Famílias de la favela do banhado reubicadas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
tasa de permanencia de las familias asentadas	%		2010	P A					80.00	80,00
zona liberada para la integración al área de preservación ambiental	m2		2010	P A	223,102.00					223.102,00

Resultado:	Mejorías en cuanto a movilidad de la población implantadas
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Via do Banhado - velocidad promedio para el acceso y transposición del Centro	km/h	29.00	2010	P					45.00	45,00
				A						
Cambuí - velocidad media comparada con la alternativa actual	Km/h	36.00	2010	P					45.00	45,00
				A						
Centro de control de operaciones - tiempo de espera en el semáforo	minuto	2.50	2010	P					1.00	1,00
				A						
Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de líneas en funcionamiento)	lineas	37.00	2010	P					34.00	34,00
				A						

Resultado:	Fortalecimiento institucional implementado
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento	días	35.00	2010	P					25.00	28,00
				A						
Capacidad de gestión de servicios electrónicos	servidores	36.00	2010	P					18.00	18,00
				A						
Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos	días	172.00	2010	P					148.00	148,00
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I: Mejorías urbano-ambientales									
Parques Urbanos criados	Parques				5,00				15.000.485,73
Gestão de Resíduos da Construção Civil implementada	Postos				27,00				2.836.601,34
Assentamentos Urbanizados	Assentamentos				7,00				6.426.641,54
Famílias reassentadas	Famílias				399,00				14.300.000,00
Canal de Drenagem construído	Canal				1,00				2.930.371,39
Componente II: Mejorías en cuanto a movilidad urbana									
Obras do sistema Viário concluídas	Km				14,50				104.296.082,99
Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	Sistema				1,00				3.320.000,00
Estações de Conexão de Ônibus construídas	Estação				13,00				2.706.895,72
Plano Diretor de Transporte Urbano elaborado	Plano				1,00				1.987.000,00
Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto				1,00				1.692.659,29
Componente III: Fortalecimiento institucional									
Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação implantada	Modelo				1,00				150.000,00
Gestão Cadastral e Serviços eletrônicos de registro de contribuintes imobiliários implantados	Registros				180.000,00				16.687.200,00
Administración del Programa									
Imprevistos									
TOTAL									172.333.938,00
