

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secteur: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Numéro(s) de Prêt(s): 2323/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): RG-P1374, BR-T1225
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 85.672.400,00
Montant Décaissé à ce Jour: 5.514.863,12
% Décaissé: 6,44
Solde: 80.157.536,88

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 85.672.400,00
Courant BID: 85.672.400,00
Pari Passu: 48,00
Cofinancement/Pays: 92.353.800,00
Estimation Initiale: 178.026.200,00
Période d'Amortissement (mois): 168

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 21-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012

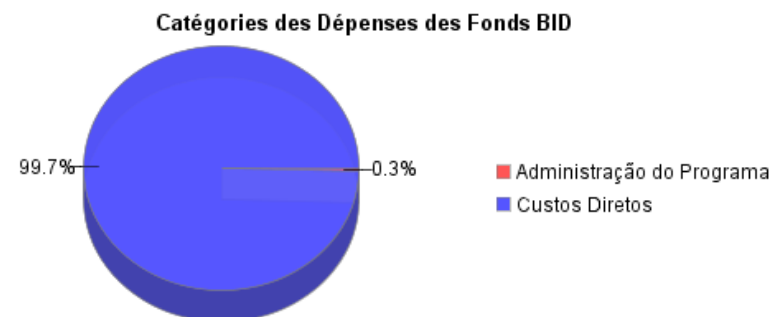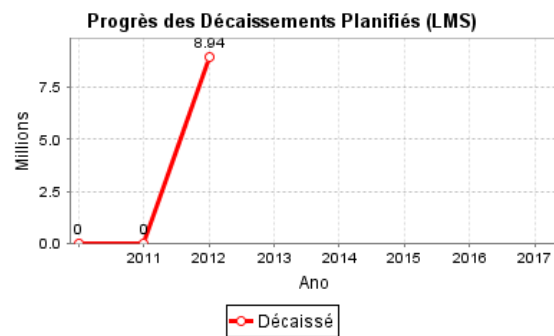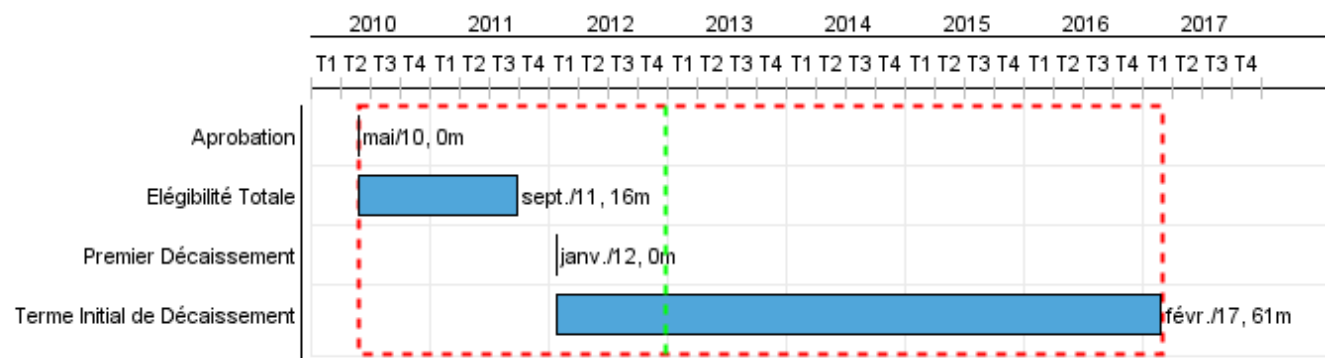

Progrès Cumulé à 2012

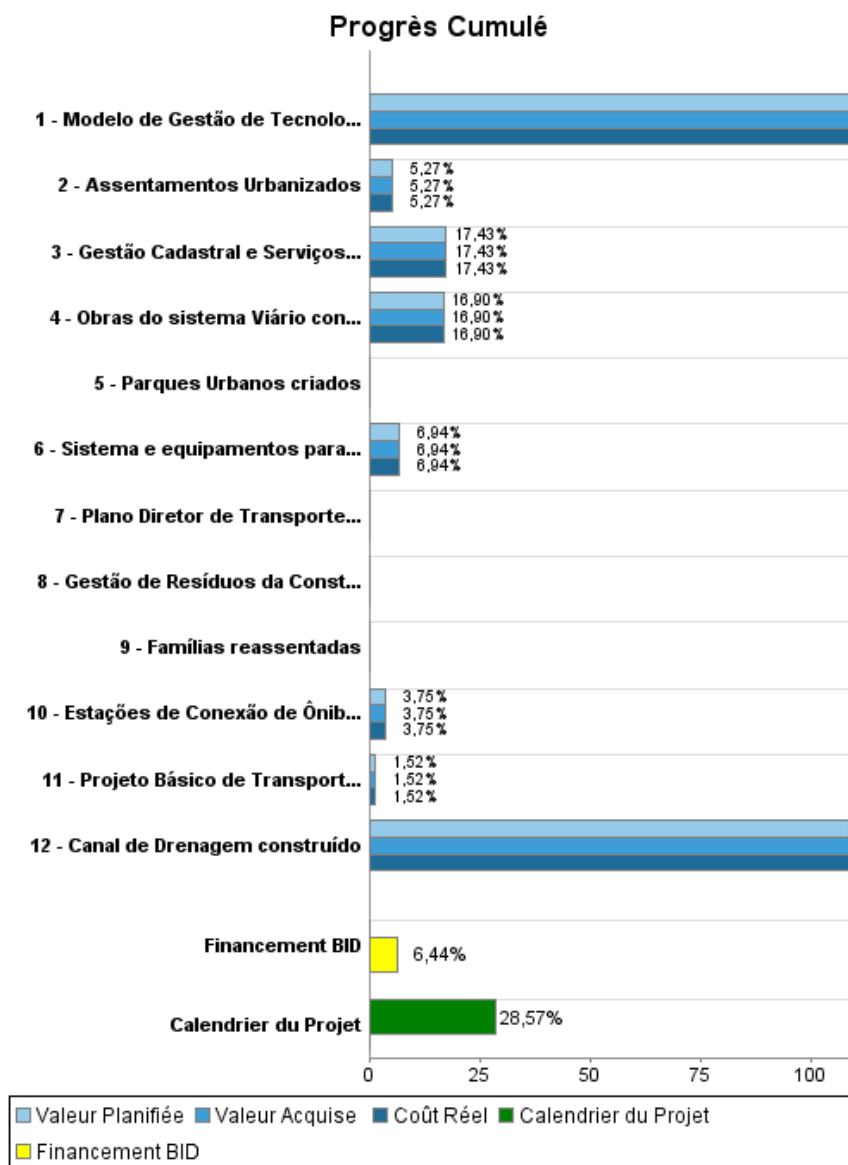

Résultats

Résultat:	Desenvolvimento Urbano do Municipio de São José dos Campos estruturado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Nº de favelas existentes	Favela	1.00	2010	P A						
Indice de passageiros por km (IPK) percorrido.	IPK (%)	1.60	2010	P A		2.10				2.10
Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	US\$	39,000,000.00	2010	P A	105.00	116.00	127.00	140.00		58,000,000.00

Résultat:	Melhorias urbano-ambientais implementadas
Suposições:	área verde de 7,4 m2 por habitante

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
incremento no m2 de área verde por habitante	m2	7.40	2010	P A					7.80	7.80

Résultat:	Resíduos de construção civil não descartados clandestinamente incrementados
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Resíduos não descartadas clandestinamente	toneladas		2010	P A	8,640.00	17,280.00	24,480.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00

Résultat:	Assentamentos regularizados
Suposições:	SH (Secretaría de Vivienda); predios con matrículas individualizadas (depiende de la acción de la Notaría de Registro de Inmuebles)

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Predios con matrículas individualizadas nos assentamentos	Predios		2010	P A		530.00	802.00	548.00	1,880.00	1,880.00

Résultat:	Familias de la favela do banhado reubicadas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
------------	-----------------	---------------	---------------------	--	------	------	------	------	------	---------------

tasa de permanencia de las familias asentadas	%		2010	P					80.00	80.00
				A						
zona liberada para la integración al area de preservación ambiental	m2		2010	P	223,102.00					223,102.00
				A						

Résultat:	Mejoras en cuanto a movilidad de la población implantadas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Via do Banhado - velocidad promedio para el acceso y transposición del Centro	km/h	29.00	2010	P					45.00	45.00
				A						
Cambuí - velocidad media comparada con la alternativa actual	Km/h	36.00	2010	P					45.00	45.00
				A						
Centro de control de operaciones - tiempo de espera en el semáforo	minuto	2.50	2010	P					1.00	1.00
				A						
Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de lineas en funcionamiento)	lineas	37.00	2010	P					34.00	34.00
				A						

Résultat:	Fortalecimiento institucional implementado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento	dias	35.00	2010	P					25.00	28.00
				A						
Capacidad de getión de servicios electrónicos	servidores	36.00	2010	P					18.00	18.00
				A						
Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos	dias	172.00	2010	P					148.00	148.00
				A						

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I: Mejorías urbano-ambientales									
Parques Urbanos criados	Parques				5,00				15.000.485,73
Gestão de Resíduos da Construção Civil implementada	Postos				27,00				2.836.601,34
Assentamentos Urbanizados	Assentamentos				7,00		338.732,32		6.426.641,54
Famílias reassentadas	Famílias				399,00				14.300.000,00
Canal de Drenagem construído	Canal				1,00		3.178.621,09		2.930.371,39
Componente II: Mejorías en cuanto a movilidad urbana									
Obras do sistema Viário concluídas	Km				14,50		17.628.344,03		104.296.082,99
Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	Sistema				1,00		230.450,03		3.320.000,00
Estações de Conexão de Ônibus construídas	Estação				13,00		101.449,90		2.706.895,72
Plano Diretor de Transporte Urbano elaborado	Plano				1,00				1.987.000,00
Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto				1,00		25.701,44		1.692.659,29
Componente III: Fortalecimiento institucional									
Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação implantada	Modelo				1,00		280.201,87		150.000,00
Gestão Cadastral e Serviços eletrônicos de registro de contribuintes imobiliários implantados	Registros				180.000,00		2.908.401,34		16.687.200,00
Administracion del Programa									
Auditoria, monitoramento, avaliação, UGP, fiscalização de obras	N/A								3.912.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								1.780.262,00
TOTAL							24.691.902,02		178.026.200,00
