
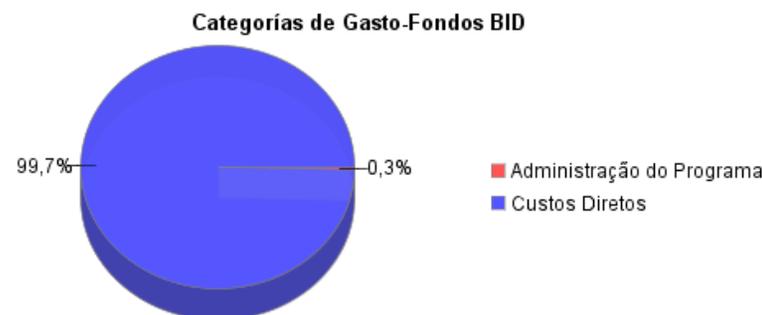
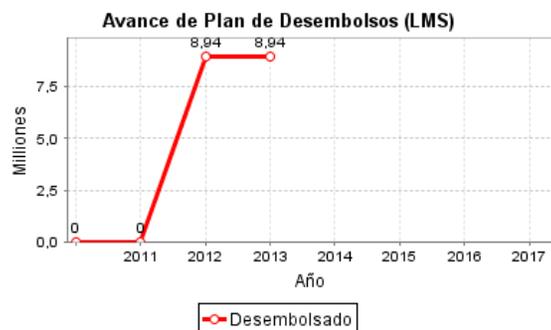


## Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Perfeitura Municipal de São José dos Campos				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Número(s) de Préstamo:	2323/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	85.672.400,00	BID Original:	85.672.400,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	8.940.586,42	Actual BID:	85.672.400,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	10,44	Pari-passu:	48,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1374, BR-T1225	Saldo:	76.731.813,58	Co-financiamiento/País:	92.353.800,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	178.026.200,00
				Período de Amortización (meses):	168

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 23-sep-2013 Validado por Representante de País: 25-sep-2013

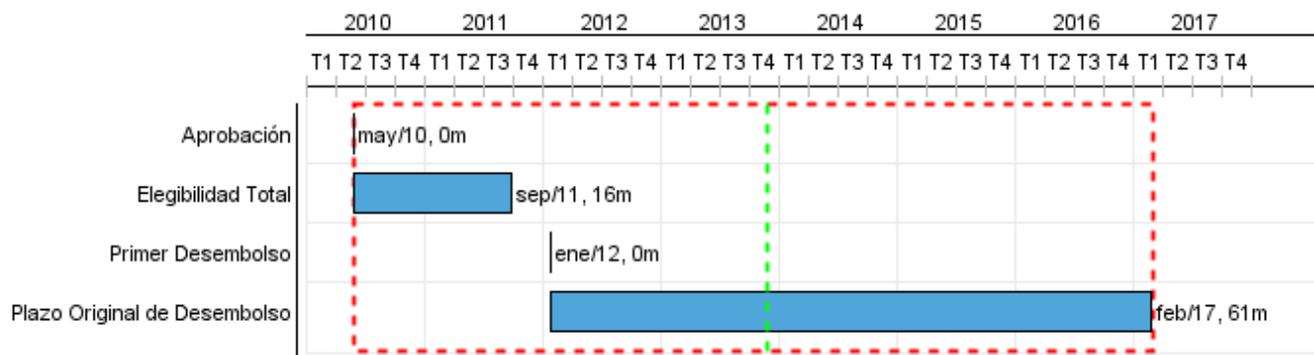

**Progreso Acumulado al 2013**

**Progreso Acumulado**

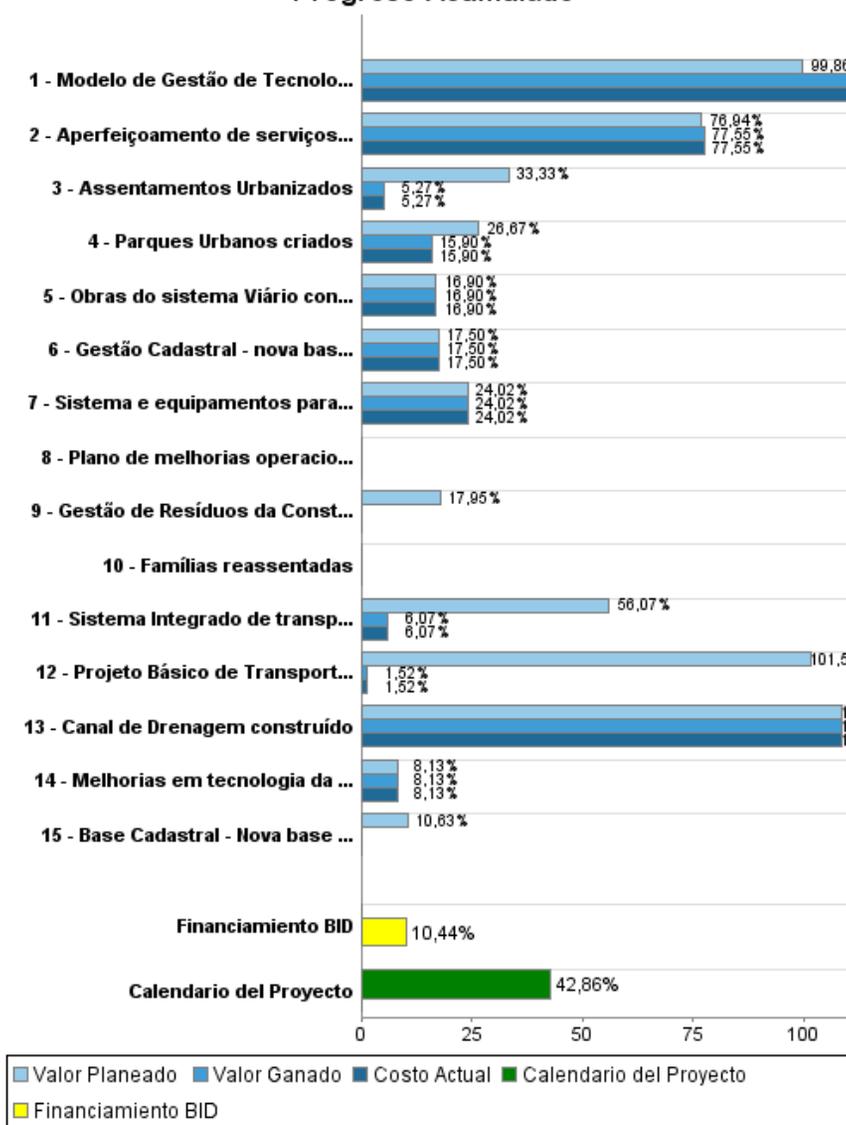

## Resultados

**Resultado:** Desenvolvimento Urbano do Municipio de São José dos Campos estruturado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Nº de favelas existentes	Favela	1,00	2010	P A						
Índice de pasajeros por km (IPK) recorrido.	IPK (%)	1,60	2010	P A		2,10				2,10
Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	US\$	39.000.000,00	2010	P A	105,00	116,00	127,00	140,00		58.000.000,00

**Resultado:** Melhorias urbano-ambientais implementadas

**Supuestos:** área verde de 7,4 m2 por habitante

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
incremento no m2 de área verde por habitante	m2	7,40	2010	P A					7,80	7,80

**Resultado:** Resíduos de construção civil não descartados clandestinamente incrementados

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Resíduos não descartadas clandestinamente	toneladas		2010	P A	8.640,00	17.280,00	24.480,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00

**Resultado:** Assentamentos regularizados

**Supuestos:** SH (Secretaría de Vivienda); predios con matrículas individualizadas (depende de la acción de la Notaría de Registro de Inmuebles)

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Predios con matrículas individualizadas nos assentamentos	Predios		2010	P A		530,00	802,00	548,00	1.880,00	1.880,00

**Resultado:** Famílias de la favela do banhado reubicadas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
tasa de permanencia de las familias asentadas	%		2010	P A					80,00	80,00
zona liberada para la integración al área de preservación ambiental	m2		2010	P A	223.102,00					223.102,00

**Resultado:** Mejorías en cuanto a movilidad de la población implantadas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Via do Banhado - velocidad promedio para el acceso y transposición del Centro	km/h	29,00	2010	P					45,00	45,00
				A						
Cambuí - velocidad media comparada con la alternativa actual	Km/h	36,00	2010	P					45,00	45,00
				A						
Centro de control de operaciones - tiempo de espera en el semáforo	minuto	2,50	2010	P					1,00	1,00
				A						
Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de líneas en funcionamiento)	lineas	37,00	2010	P					34,00	34,00
				A						

**Resultado:** Fortalecimiento institucional implementado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento	dias	35,00	2010	P					25,00	28,00
				A						
Capacidad de gestión de servicios electrónicos	servidores	36,00	2010	P					18,00	18,00
				A						
Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos	dias	172,00	2010	P					148,00	148,00
				A						

### Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente I: Mejorías urbano-ambientales</b>									
Parques Urbanos criados	Parques	1,00			5,00	1.615.000,00			15.000.485,73
Gestão de Resíduos da Construção Civil implementada	Postos				21,00	509.150,33			2.836.601,34
Assentamentos Urbanizados	Assentamentos	2,00			7,00	1.803.000,00			6.426.641,54
Famílias reassentadas	Famílias				399,00				14.300.000,00
Canal de Drenagem construído	Canal				1,00				2.930.371,39
<b>Componente II: Mejorías en cuanto a movilidad urbana</b>									
Obras do sistema Viário concluídas	Km				5,00				104.296.082,99
Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	%	10,00			100,00				3.320.000,00
Sistema Integrado de transporte público em operação	%	10,00			100,00	1.353.447,86			2.706.895,72
Plano de melhorias operacionais na Secretaria de Transporte implementado	Plano				1,00				1.987.000,00
Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto	1,00			1,00	1.692.659,29			1.692.659,29
<b>Componente III: Fortalecimiento institucional</b>									
Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação - ferramentas para planejamento de TI implantada.	ferramentas				2,00	25.000,00	44.209,19		150.000,00
Melhorias em tecnologia da informação (solução de armazenamento e processamento de dados) implementadas	%				100,00				3.444.464,35
Aperfeiçoamento de serviços de governo eletrônico - softwares de governo eletrônicos implementados	softwares				4,00	120.000,00	148.694,35		4.691.480,95
Base Cadastral - Nova base de dados geoterritoriais integrada	%				100,00	600.000,00			5.646.600,00
Gestão Cadastral - nova base de dados cadastrais e multifinalitários implantada	%				100,00		11.276,18		16.687.200,00
<b>Administración del Programa</b>									
Auditoria, monitoramento, avaliação, UGP, fiscalização de obras	N/A					682.400,00			3.912.000,00
<b>Imprevistos</b>									
Imprevistos	N/A					256.052,40			1.780.262,00
<b>TOTAL</b>						<b>8.656.709,88</b>	<b>204.179,72</b>		<b>191.808.745,30</b>
