

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1151	Chief of Operations Validation Date	04/09/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/09/20
Last Update	03/27/20	Country Representative Validation Date	04/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Integrated Urban Solid Waste Management Program.	Loan Number	3249/OC-AR, 3249/OC-AR-1, 3249/OC-AR-2
Executing Agency	Ministerio de Turismo, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Sector/Subsector	AS-SOS - WATER AND SANITATION-SOLID WASTE, SOCIAL PROJECTS
Team Leader	OYAMADA KROUG, JORGE RUBEN	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto en ejecución visitado en Mar del Plata presenta un avance significativo frente a la acción correctiva de agosto 2019 relacionada con la gestión de lixiviados, al haber sido construida una laguna de evaporación. Sin embargo, la falta de su mantenimiento genera un riesgo de contaminación y no existe monitoreo de calidad de agua, suelos, ni aire. Esta situación refleja en general una baja de capacidad de los municipios para operar y mantener los proyectos. Las acciones correctivas notadas en el Informe de Supervisión de agosto 2019 han sido cumplidas en su mayoría. La sanación de los pasivos relacionados a Bariloche y Villa Traful será condición de inclusión en el Programa de nuevos proyectos en estas localidades.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1151	150,000,000	150,000,000	37,500,000	0	187,500,000	150,000,000	55,920,000	37.28%	94,080,000
Aggregated	150,000,000	150,000,000	37,500,000	0	187,500,000	150,000,000	55,920,000	37.28%	94,080,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

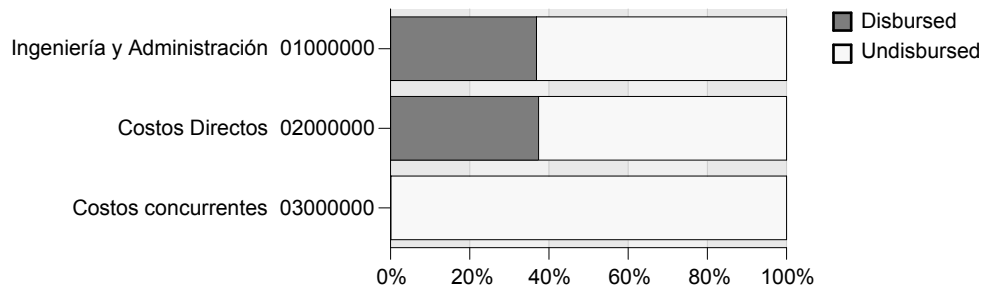

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Hogares que disponen sus residuos en rellenos sanitarios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Hogares que disponen sus residuos en rellenos sanitarios	porcentaje	64.70	2010	P			
					P(a)			72.00
					A			
Details								
Means of verification: Informes de la UE basados en reportes de municipios								
Observations: .								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Componente I - Gestión Operativa: Mejorar la capacidad operativa y de gestión de entes operadores

Observation:

Outcome Nbr. 1: Componente II - Infraestructura y Equipamiento: Incremento en los niveles de recuperación y reciclaje y mejora en los servicios de recolección y disposición final

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.0	Hogares que disponen sus residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios	%	64.70	2015	P			
					P(a)			72.00
					A			

Details

Means of verification: Informes de la unidad ejecutora, basados en reportes de los municipios beneficiarios del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Componente III - Gestión Ambiental y Social: Formalización e inclusión de Recuperadores y aprovechamiento de RSU

Observation:

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I - Mejorar la capacidad operativa y de gestión de entes operadores (Gestión Operativa)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Planes de mejoramiento de la gestión GIRSU desarrollados (subprograma 1)	Planes	P	3	6	1,600,000	3,100,000
			P(a)	3	6	0	3,100,000
			A	0	0	0	0
1.2	Planes de difusión y concientización comunitaria elaborados (subprograma 1)	Planes	P	1	52	50,000	2,600,000
			P(a)	0	0	0	2,600,000
			A	0	0	0	0
1.3	Planes de mejoramiento de la gestión GIRSU desarrollados (subprograma 2)	Planes	P	0	8	0	965,604.5
			P(a)	0	2	0	156,032
			A	0	2	0	156,032
1.4	Planes de difusión y concientización comunitaria elaborados (subprograma 2)	Planes	P	0	8	0	965,605
			P(a)	0	2	0	94,980
			A	2	2	46,701	94,980
1.5	Planes provinciales para la gestion integral de residuos solidos elaborados y/o actualizados (Subprograma 1)	Planes	P		0		0
			P(a)	0	1	0	1,500,000
			A	0	1	0	0

Component Nbr. 2 Componente II - Incremento en los niveles de recuperación y reciclaje y mejora en los servicios de recolección y disposición final (Infraestructura y Equipamiento)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Rellenos sanitarios construidos (subprograma 1)	Rellenos Sanitarios	P	2	9	6,900,000	62,987,799.14
			P(a)	3	6	2,824,230	61,834,078
			A	2	3	1,729,946	12,098,575
2.2	Plantas de separación construidas (Subprograma 1)	Plantas	P	5	14	2,500,000	15,071,788.09
			P(a)	2	5	823,352	15,014,605
			A	2	3	1,582,841	4,406,899
2.3	Plantas de transferencia construidas (Subprograma 1)	Plantas	P	3	4	0	2,057,837.85
			P(a)	2	4	735,317	3,377,189
			A	2	2	324,010	3,218,871
2.4	Basurales a cielo abierto clausurados (subprograma 1)	BCA	P	7	17	1,000,000	8,565,757
			P(a)	5	17	705,803	9,691,796
			A	5	6	1,831,842	4,493,963
2.5	Equipamiento de disposición final y/o recolección (Subprograma 1)	Equipamiento entregado	P	1	5	758,821.38	3,316,817.95
			P(a)	2	25	0	10,997,929.46
			A	2	2	315,420	315,420
2.6	Rellenos sanitarios construidos (subprograma 2)	Rellenos Sanitarios	P	0	3	0	13,924,703.46
			P(a)	0	3	0	10,201,320
			A	0	3	149,070	10,201,320
2.7	Plantas de separación construidas (Subprograma 2)	Plantas	P	0	3	0	12,377,514.17
			P(a)	0	2	0	7,565,932
			A	0	2	42,122	7,565,932
2.8	Basurales a cielo abierto clausurados (subprograma 2)	BCA	P	0	3	0	21,062,403.3
			P(a)	0	8	0	15,996,186
			A	0	8	174,901	15,996,186

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III - Formalización e inclusión de Recuperadores y aprovechamiento de RSU (Gestión Ambiental)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Planes de Comunicación Ambiental y Social (PCAS) elaborados y/o Actualizados (Subcomponente 1)	Planes	P	1	13	950,000	3,600,410.81
			P(a)	1	14	0	3,600,410
			A	2	2	0	0
3.2	Planes de Inclusión Social (PiSo) y Planes Sociales Abreviados (PSA) implementados (Subcomponente 1)	Planes	P	1	13	1,047,864.54	3,549,589.19
			P(a)	1	12	19,270	4,524
			A	0	3	4,524	4,524
3.3	Planes de Comunicación Ambiental y Social (PCAS) elaborados y/o Actualizados (Subcomponente 2)	Planes	P	0	4	0	980,000
			P(a)	0	2	0	152,206
			A	0	2	46,701	152,206
3.4	Planes de Inclusión Social (PiSo) y Planes Sociales Abreviados (PSA) implementados (Subcomponente 2)	Planes	P	0	8	0	980,000
			P(a)	0	1	0	180,781
			A	0	1	180,781	180,781

Other Cost

	Subprograma 1	P			6,044,986.2	20,150,000
		P(a)			294,200	5,217,586
		A			309,884	3,756,095
	Subprograma 2	P			3,000,000	11,244,170
		P(a)			0	1,877,666
		A			24,230	1,877,666
	Monto sin asignar Subprograma 2 a acordar con el gobierno su traspaso al Subprograma 1	P				0
		P(a)			0	34,336,780
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			23,851,672.12	187,500,000.46
		P(a)			5,402,172	187,500,000.46
		A			6,762,973	64,519,450

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Basurales a cielo abierto clausurados (subprograma 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral presentado por el organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/26/2020
	Equipamiento de disposición final y/o recolección (Subprograma 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral presentado por el organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/26/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/20/2020
	Planes de Inclusión Social (PISo) y Planes Sociales Abreviados (PSA) implementados (Subcomponente 2)	Replanificación de acuerdo a informe semestral presentado por el organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/26/2020
	Planes de difusión y concientización comunitaria elaborados (subprograma 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral presentado por el organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/20/2020
	Plantas de separación construidas (Subprograma 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral presentado por el organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/20/2020
	Plantas de transferencia construidas (Subprograma 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral presentado por el organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/26/2020
	Rellenos sanitarios construidos (subprograma 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral presentado por el organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/26/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/20/2020
	Rellenos sanitarios construidos (subprograma 2)	Replanificación de acuerdo a informe semestral presentado por el organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/26/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
