
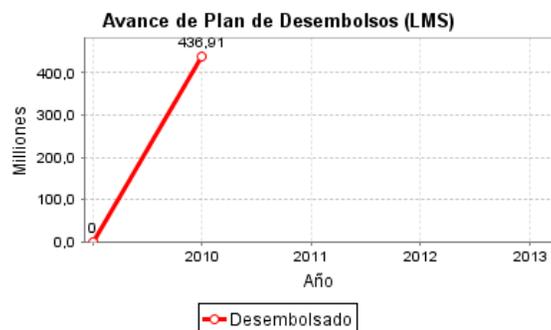



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	C.V.G. ELECTRIFICACION DEL CARONI, S.A. (EDELCA)	Monto Aprobado Actual:	800.000.000,00	BID Original:	800.000.000,00
Sector:	ENERGY-HYDROELECTRIC ENERGY	Monto Desembolsado a la fecha:	507.292.830,96	Actual BID:	800.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	1686/OC-VE-1	% Desembolsado:	63,41	Pari-passu:	96,46
Etapas:	Approved	Saldo:	292.707.169,04	Co-financiamiento/País:	
Tipo de Operación:	INV - Inversión	Estimado Original:		800.000.000,00	
Operación(es) Relacionada(s):		Período de Amortización (meses):		156	
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 30, 2011 Validado por Representante de País: Apr 12, 2011

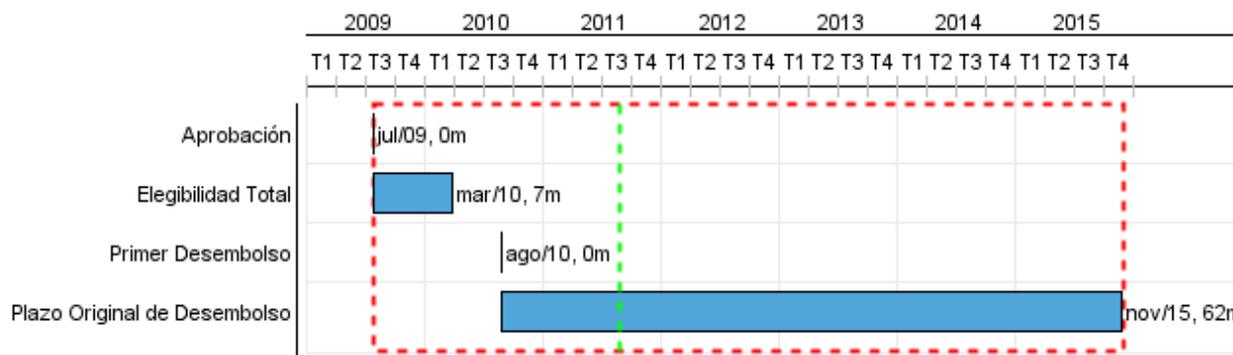

Progreso Acumulado al 2010

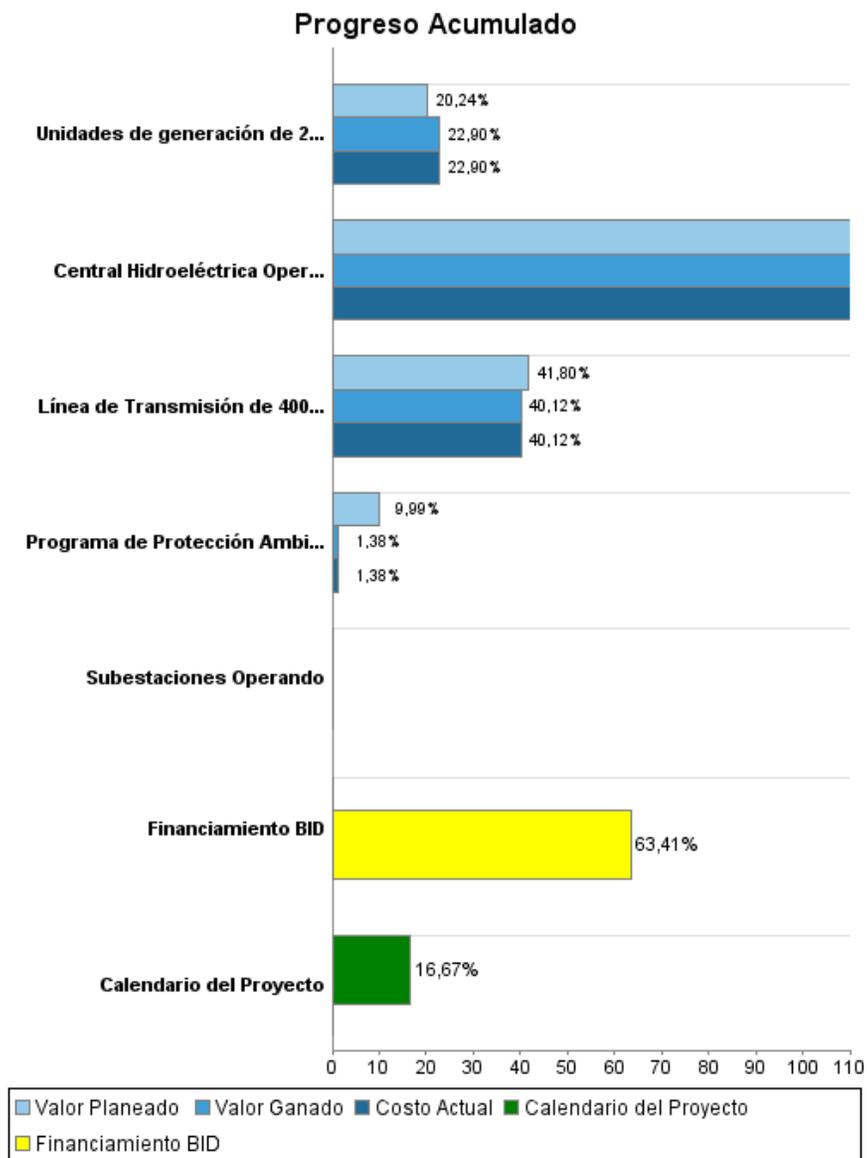

Resultados

Resultado: Producción Energética incrementada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Producción Energética Anual TOCOMA	GWh		2003	P A	1.854,00	11.126,00	18.543,00	18.545,00	18.545,00

Resultado: Costo Promedio de la Capacidad Instalada reducido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Costo Promedio de la Capacidad Instalada	US\$/MW		2011	P A			2.245,00	2.245,00	2.245,00

Resultado: Costo Promedio de la Energía Producida reducido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Costo Promedio de la Energía Producida	US\$/KWh		2003	P A			5,87	5,87	5,87

Resultado: Deuda de la empresa EDELCA reducida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Relación entre deuda financiera total y EBITDA de EDELCA	Unidades	1,80	2011	P A			2,99	2,99	2,99

Resultado: Nivel de Ingreso de las Familias Reubicadas mantenido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Nivel de Ingresos Anuales de las Familias reubicadas/compensadas a precios de 2003	Bs	250.000,00	2011	P A				250.000,00	250.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Central Hidroeléctrica									
Central Hidroeléctrica Operando	Unidad				1,00	522.670.130,00	504.134.840,00		190.035.178,00
Unidades de generación de 216 MW cada una con operación comercial iniciada	unidad				1,00	140.904.340,00	159.408.480,00		696.159.850,00
Líneas de Transmisión y Subestaciones									
Línea de Transmisión de 400KV operando	unidad				1,00	21.124.590,00	20.278.730,00		50.541.560,00
Subestaciones Operando	unidad				1,00				63.527.440,00
Protección Ambiental									
Programa de Protección Ambiental Implementado	Informes				1,00	3.409.420,00	469.580,00		34.116.540,00
Ingeniería, Administración y Auditoría									
Sin Asignación Específica									
Gastos Financieros									
TOTAL						688.108.480,00	684.291.630,00		1.034.380.568,00
