

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Secteur:	ENERGY-HYDROELECTRIC ENERGY
Numéro(s) de Prêt(s):	1664/OC-CO
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	200.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	199.099.999,99
% Décaissé:	99,55
Solde:	900.000,01

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	200.000.000,00
Courant BID:	200.000.000,00
Pari Passu:	22,00
Cofinancement/Pays:	711.000.000,00
Estimation Initiale:	911.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	150

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A(R)




### Reformulation

( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


### Validation

Validé par le Chef de Division: Oct 20, 2011

Validé par le Représentant: Oct 24, 2011

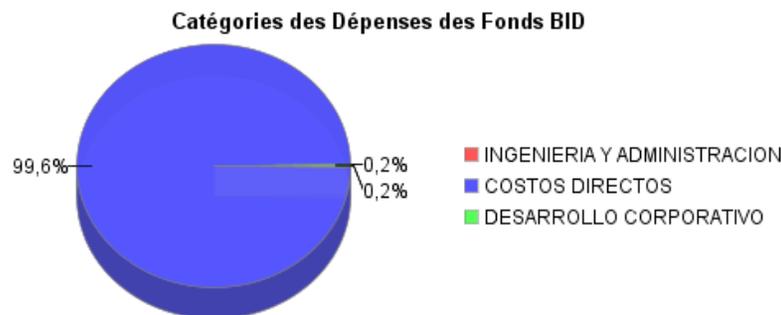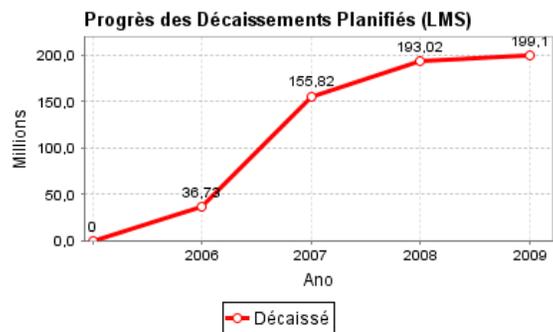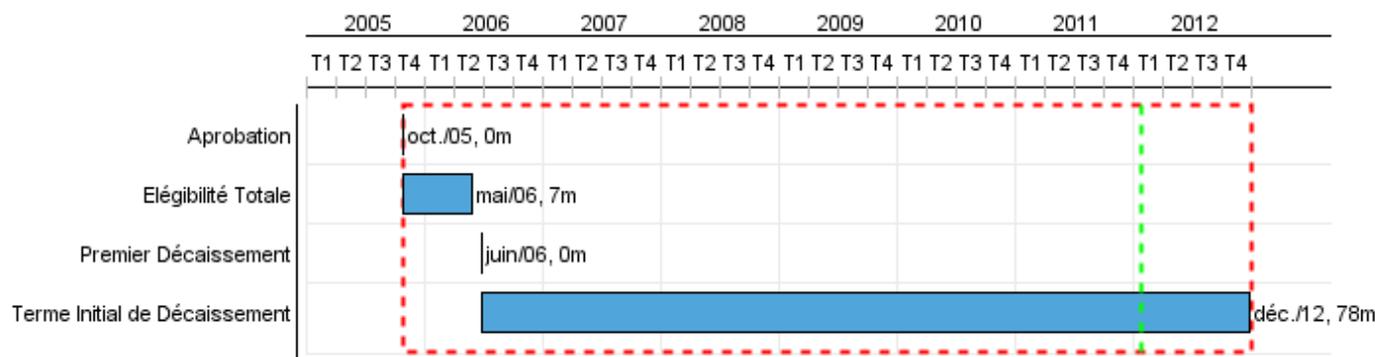

**Progrès Cumulé à 2011**

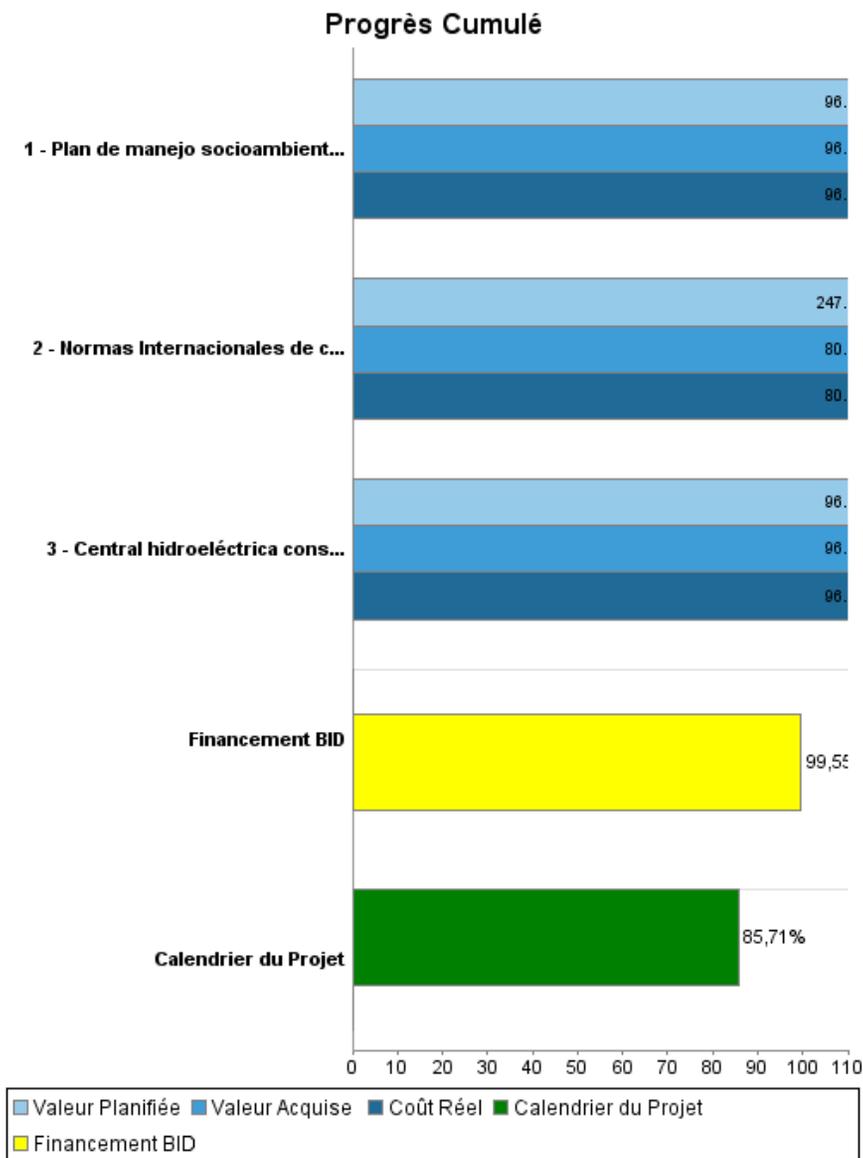

**Résultats**

**Résultat:** Demanda satisfecha de electricidad del país, utilizando los recursos hidráulicos del río Porce de manera eficiente y sustentable, incrementanda

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Demanda incremental servida de energía firme del proyecto.	GWh año		2005	P			582,00	2.910,00	3.105,00	3.105,00
				A						
El costo promedio por kW instalado	US\$/kW		2005	P				1.380,00		1.380,00
				A						
El costo real del proyecto	US\$ millones	911,00	2005	P				911,00		911,00
				A		1.319,00	1.319,55			
Prácticas internacionales de Gobierno Corporativo adoptadas por EPM	practicadas		2005	P					1,00	1,00
				A						

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Central hidroeléctrica construída y operando.</b>									
Central hidroeléctrica construída y operando.	Central	1,00	1,00		1,00		1.217,97		1.217,97
<b>Plan de manejo socioambiental ejecutado</b>									
Plan de manejo socioambiental ejecutado	Plan	1,00	1,00		1,00		56,81		56,81
<b>Estabilidad financiera e institucional</b>									
Normas Internacionales de contabilidad (NIIC) aplicadas y reflejadas en los sistemas internos de EPM aplicando las NIIC	Norma				1,00	600,00	0,36		0,36
<b>Costos Administrativos</b>									
	<b>TOTAL</b>					<b>600,00</b>	<b>1.275,14</b>		<b>1.275,14</b>
