
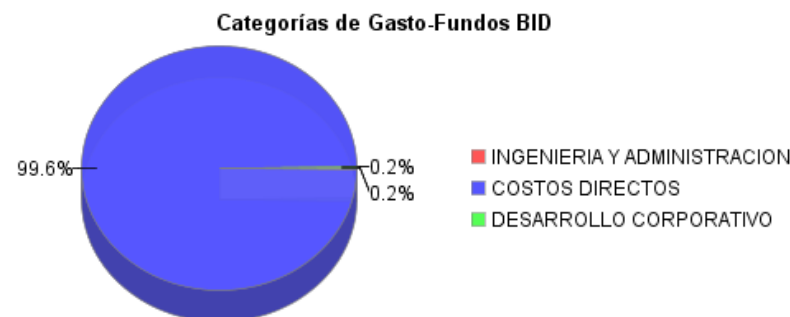
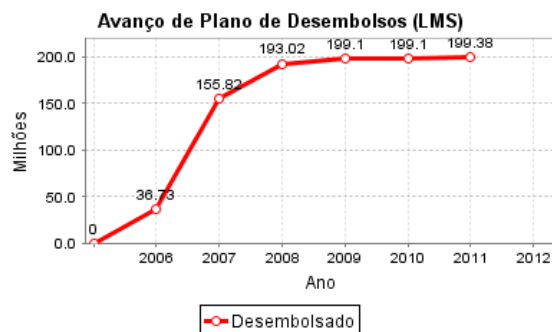



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		
Sector: ENERGY-HYDROELECTRIC ENERGY		
Número da Operação: 1664/OC-CO	Atual: 200.000.000,00	Original BID: 200.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 199.378.546,87	Corrente BID: 200.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 99,69	Pari-passu: 22,00
Operação Relacionada:	Saldo: 621.453,13	Cofinanciamento/País: 711.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 911.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 150

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: A(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 18-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 18-abr-2012

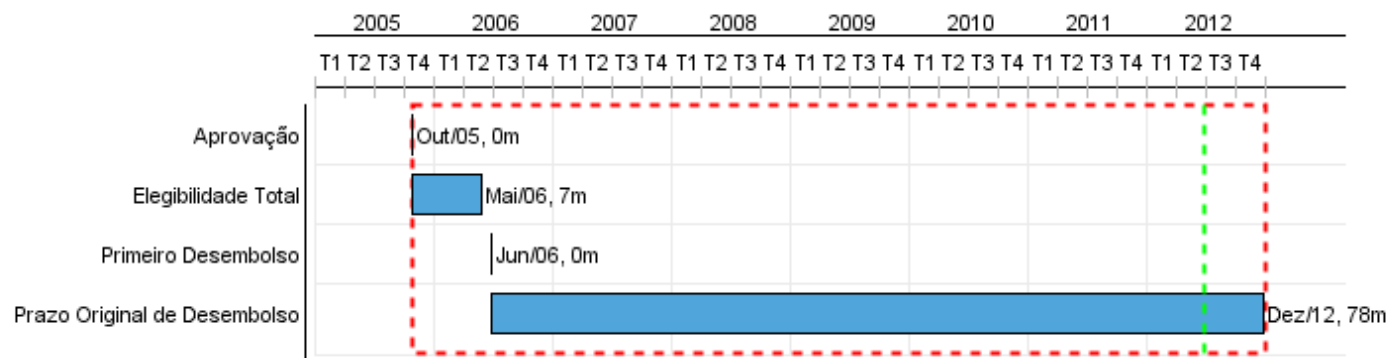

Progresso Acumulado até 2011

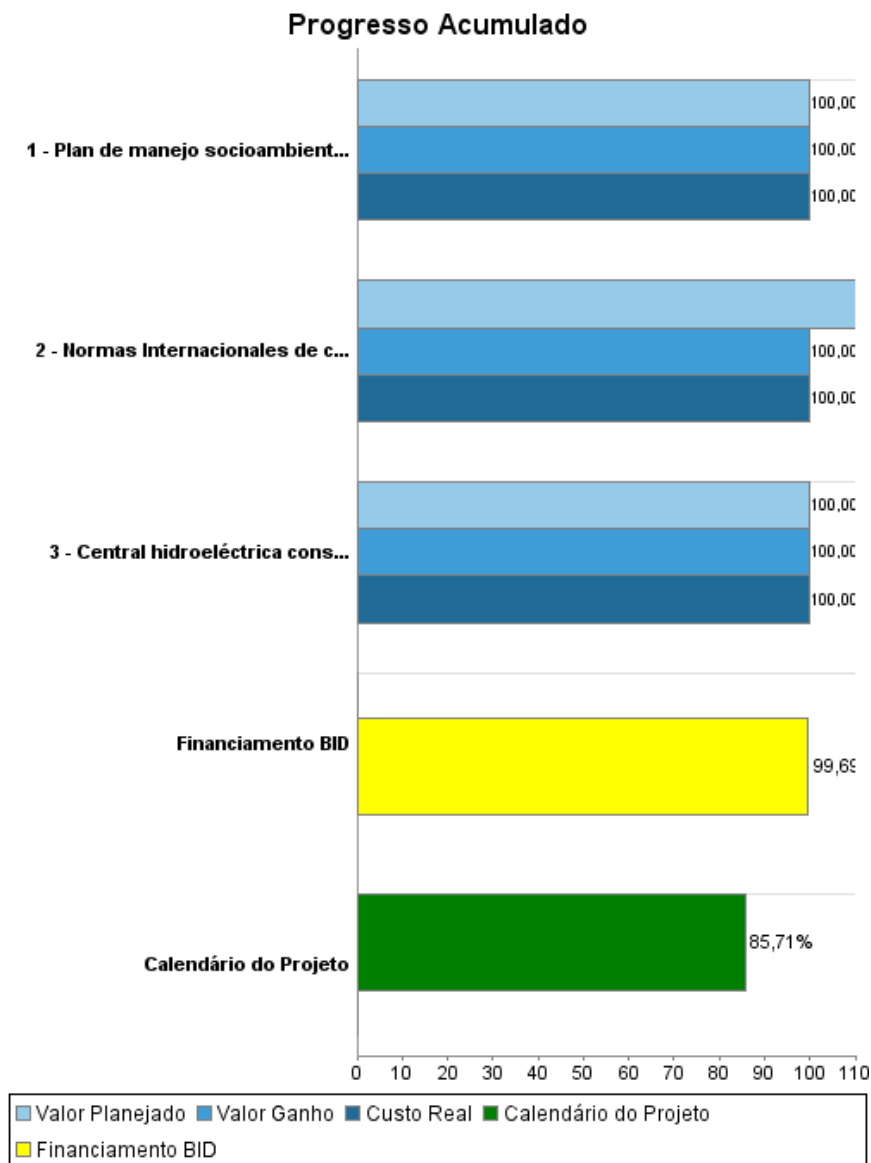

Resultados

Resultado:	Demanda satisfecha de electricidad del país, utilizando los recursos hidráulicos del río Porce de manera eficiente y sustentable, incrementanda
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Demanda incremental servida de energía firme del proyecto.	GWh año		2005	P			582.00	2,910.00		3.105,00
				A				3,354.00		
El costo promedio por kW instalado	US\$/kW	1,200.00	2005	P				1,380.00		1.380,00
				A				1,999.00		
El costo real del proyecto no excede el costo presupuestado	US\$ millones	911.00	2005	P				911.00		911,00
				A		1,319.00	1,319.55	1,357.98		
Prácticas internacionales de Gobierno Corporativo adoptadas por EPM	practicass		2005	P					1.00	1,00
				A						

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Central hidroeléctrica construída y operando.									
Central hidroeléctrica construída y operando.	Central	1,00	1,00		1,00		87.680,00		1.261.310,00
Plan de manejo socioambiental ejecutado									
Plan de manejo socioambiental ejecutado	Plan	1,00	1,00		1,00		3.700,00		58.370,00
Estabilidad financiera e institucional									
Normas Internacionales de contabilidad (NIIC) aplicadas y reflejadas en los sistemas internos de EPM aplicando las NIIC	Norma		1,00		1,00	600,00	130,00		420,00
Costos Administrativos									
TOTAL						600,00	91.510,00		1.320.100,00
