




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INCLUSION	
Número da Operação:	2630/OC-ES	Atual: 50.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:
Operação Relacionada:	ES-T1085, ES-T1097, RG-P1442, ES-T1161	Saldo: 50.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation	Original BID: 50.000.000,00
		Corrente BID: 50.000.000,00
		Pari-passu: 100,00
		Cofinanciamento/País:
		Original Estimado: 50.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 30-mar-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012

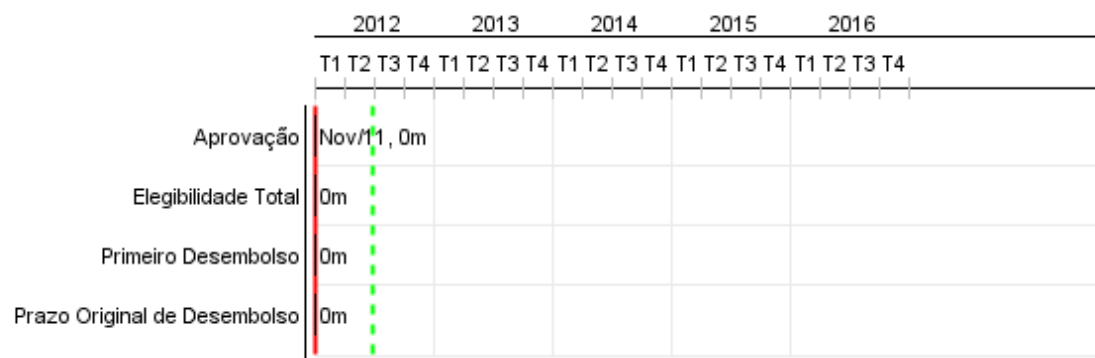

Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Condiciones de vida de familias expuestas a riesgos de inundaciones y deslizamientos en Asentamientos Precarios Urbanos (AUP) el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mejoradas
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2014	Final do Projeto
Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) que han disminuido su nivel de susceptibilidad a riesgos por inundaciones	Número		2011	P A			10,00
Hogares incluidos en la ficha técnica del Ministerio de Salud	Porcentaje		2011	P A			90,00
Volúmenes de agua retenidos	Millones de m3		2011	P A			0,50
Numero de hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares		2012	P A		2,000.00	2.000,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Mejoramiento integral y mitigación de riesgo de AUP de CSU en AMSS									
Asentamientos Urbanos Precarios con obras de mejoramiento ejecutadas	Asentamientos				8,00				28.000.000,00
Reducción de vulnerabilidad en AUP a través de inversiones estructurales en el AMSS									
Lagunas de laminación construidas	Lagunas				7,00				16.000.000,00
Plan Maestro de Drenajes	Plan				1,00				3.000.000,00
Bóvedas reparadas	Bóvedas								2.000.000,00
Fortalecimiento de la gestión de la operación									
Unidad Coordinadora de Proyecto constituida	Unidad				1,00				300.000,00
Sistema de monitoreo y seguimiento implementado	Sistema				1,00				450.000,00
Auditoría realizada	Auditoría				5,00				250.000,00
TOTAL									50.000.000,00
