

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Sector:	ENERGY-HYDROELECTRIC ENERGY
Número(s) de Préstamo:	1664/OC-CO
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	200.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	199.378.546,87
% Desembolsado:	99,69
Saldo:	621.453,13

Costo total y Fuente

BID Original:	200.000.000,00
Actual BID:	200.000.000,00
Pari-passu:	22,00
Co-financiamiento/País:	711.000.000,00
Estimado Original:	911.000.000,00
Período de Amortización (meses):	150

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: A(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 18-abr-2012
Validado por Representante de País: 18-abr-2012

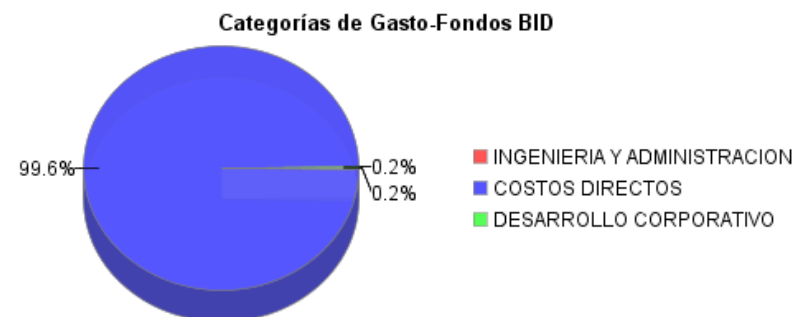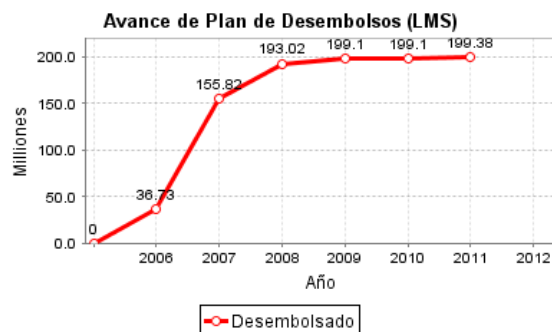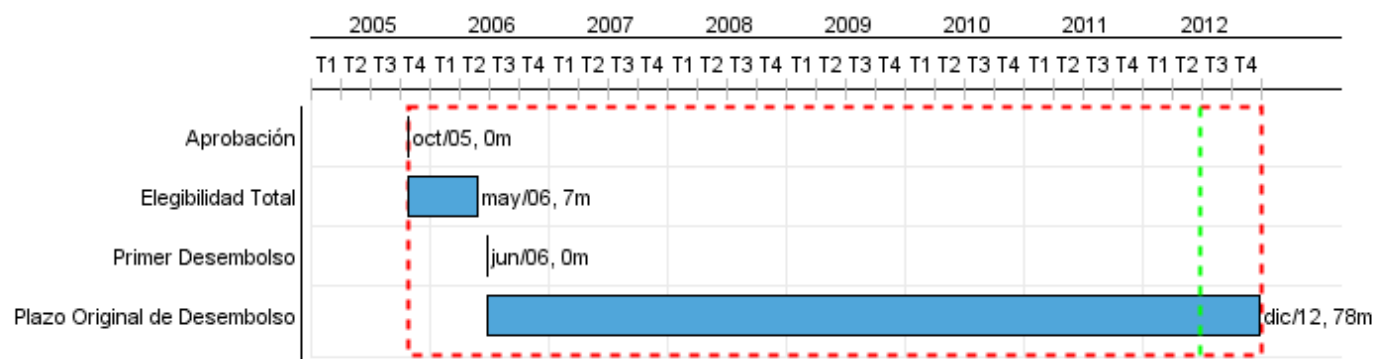

Progreso Acumulado al 2011

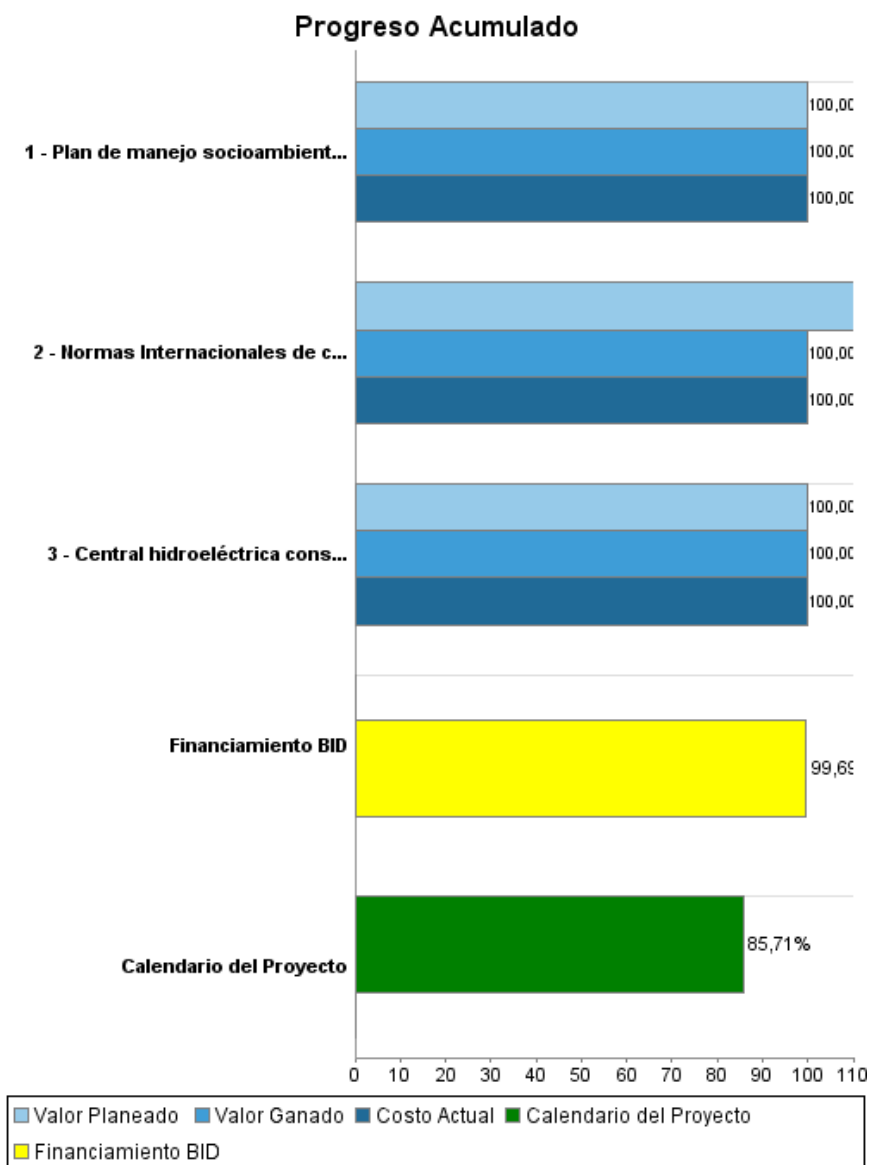

Resultados

Resultado:	Demanda satisfecha de electricidad del país, utilizando los recursos hidráulicos del río Porce de manera eficiente y sustentable, incrementanda
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2007	2009	2010	2011	2012	Fin de Proyecto
Demanda incremental servida de energía firme del proyecto.	GWh año		2005	P			582.00	2,910.00		3.105,00
				A				3,354.00		
El costo promedio por kW instalado	US\$/kW	1,200.00	2005	P				1,380.00		1.380,00
				A				1,999.00		
El costo real del proyecto no excede el costo presupuestado	US\$ millones	911.00	2005	P				911.00		911,00
				A		1,319.00	1,319.55	1,357.98		
Prácticas internacionales de Gobierno Corporativo adoptadas por EPM	practicar		2005	P					1.00	1,00
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Central hidroeléctrica construída y operando.									
Central hidroeléctrica construída y operando.	Central	1,00	1,00		1,00		87.680,00		1.261.310,00
Plan de manejo socioambiental ejecutado									
Plan de manejo socioambiental ejecutado	Plan	1,00	1,00		1,00		3.700,00		58.370,00
Estabilidad financiera e institucional									
Normas Internacionales de contabilidad (NIIC) aplicadas y reflejadas en los sistemas internos de EPM aplicando las NIIC	Norma		1,00		1,00	600,00	130,00		420,00
Costos Administrativos									
TOTAL						600,00	91.510,00		1.320.100,00
