
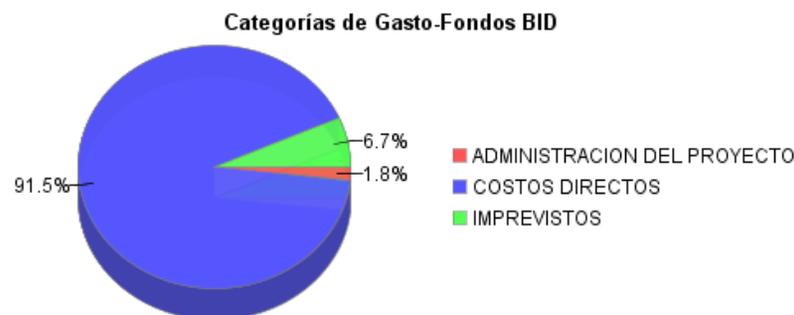
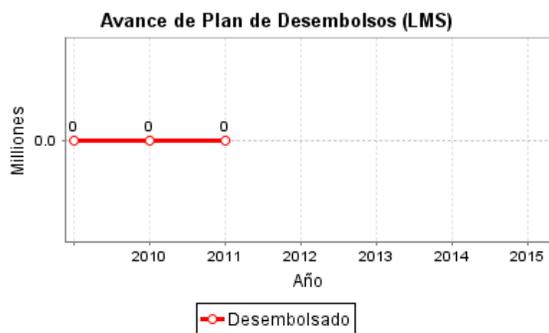


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE SALUD	Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00	BID Original:	30.000.000,00
Sector:	WATER AND SANITATION	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	30.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	1719/OC-PN-1	% Desembolsado:		Pari-passu:	77,00
Etapas:	Approved	Saldo:	30.000.000,00	Co-financiamiento/País:	9.180.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	39.180.000,00
Operación(es) Relacionada(s):				Período de Amortización (meses):	228
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 26-abr-2012 Validado por Representante de País: 27-abr-2012

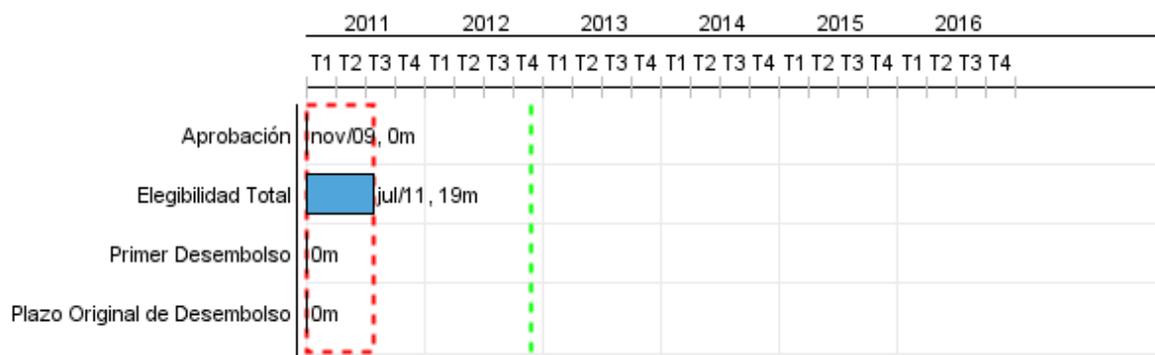

Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Condiciones sanitarias y ambientales en barrios de bajos ingresos y en los cauces y ríos urbanos Mejoradas.
Supuestos:	1.- Poblacion con disposicion a pagar el costo real de los servicios; 2.- Otras fuentes de contaminacion a cauces y rios son interceptadas y tratadas;3.- IDAAN brindando una gestion adecuada del servicio y una oportuna operacion y mantenimiento al mismo.
Observaciones:	i) Limitacion del financiamiento del Banco por alto costo percapita por conexion, dada la dispersion de casas en barrios ii) Se requiere de una campana fuerte de concienciacion a la poblacion: iii) Se requiere un programa especial para promover las conexiones intradomiciliares para cada beneficiario

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Inversiones Prioritarias					
Imprevisto					
Administración del Programa					
