
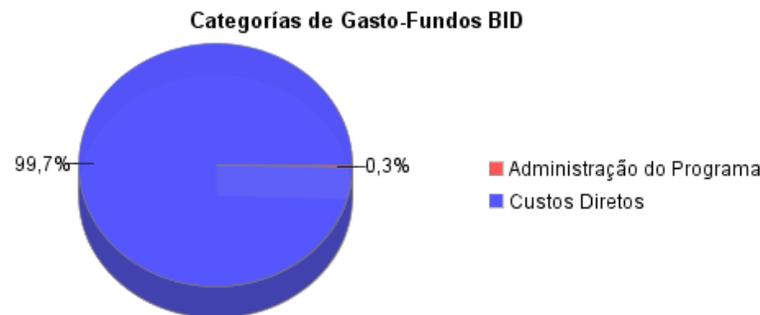


Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	Perfeitura Municipal de São José dos Campos	Atual:	85.672.400,00	Original BID:	85.672.400,00
Setor:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING	Desembolsado:	8.940.586,42	Corrente BID:	85.672.400,00
Número da Operação:	2323/OC-BR	% Desembolsado:	10,44	Pari-passu:	48,00
Estágio:	Approved	Saldo:	76.731.813,58	Cofinanciamento/País:	92.353.800,00
Tipo Operação:	INV - Investimento			Original Estimado:	178.026.200,00
Operação Relacionada:	RG-P1374, BR-T1225			Período de Amortização (meses):	168
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation				

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 12-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 15-abr-2013

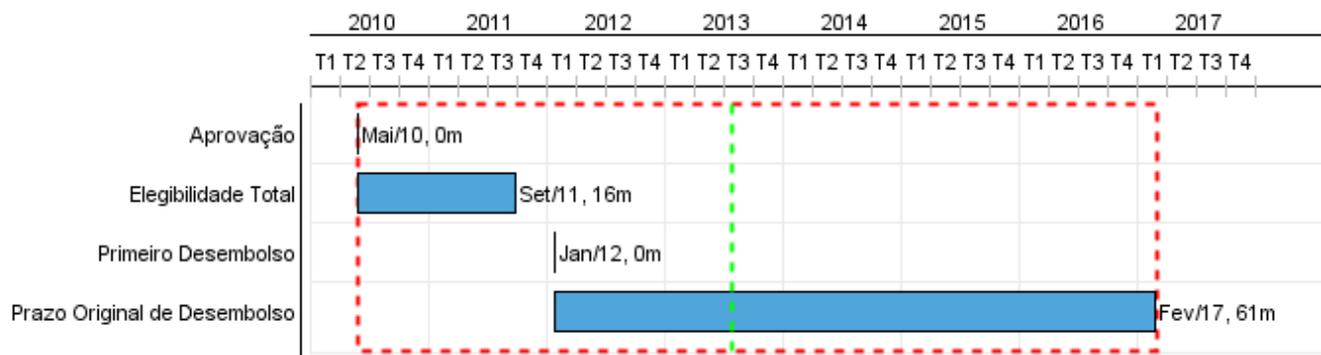

Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado

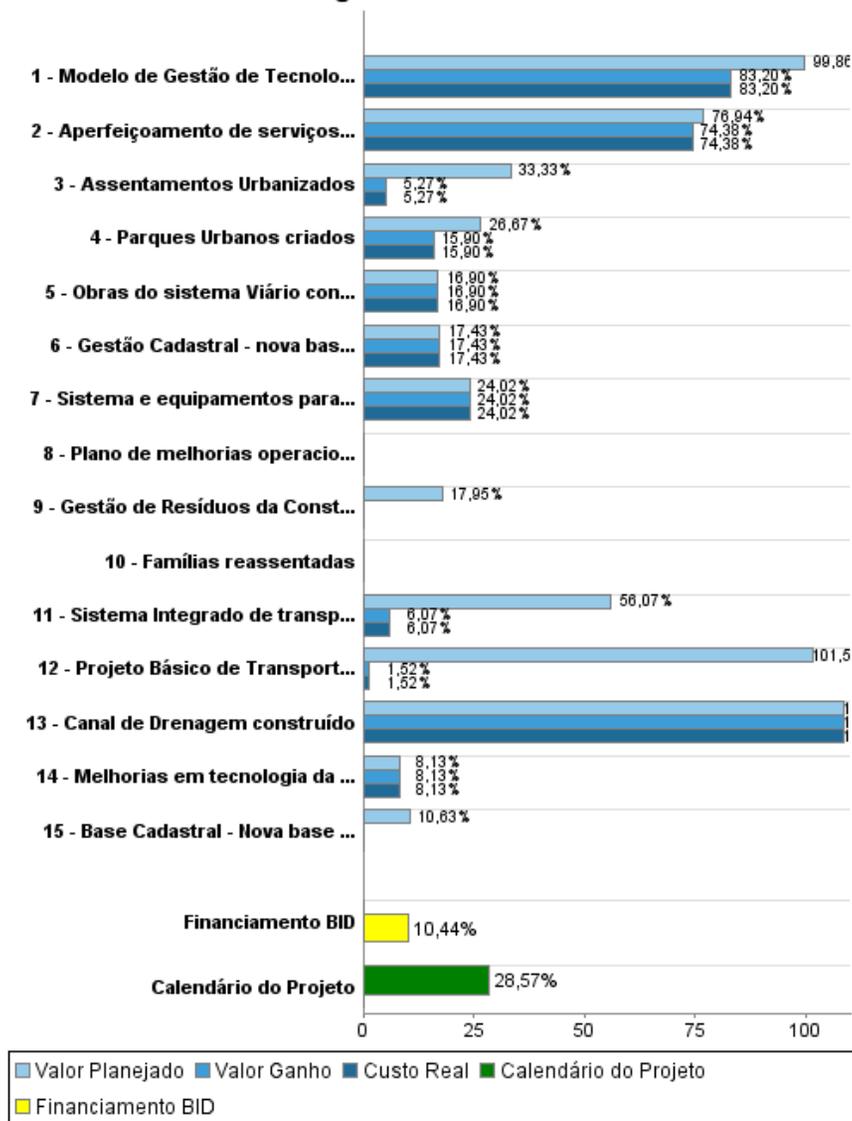

Resultados
Resultado: Desenvolvimento Urbano do Município de São José dos Campos estruturado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Nº de favelas existentes	Favela	1,00	2010	P A						
Índice de passageiros por km (IPK) percorrido.	IPK (%)	1,60	2010	P A		2,10				2,10
Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	US\$	39.000.000,00	2010	P A	105,00	116,00	127,00	140,00		58.000.000,00

Resultado: Melhorias urbano-ambientais implementadas

Suposições: área verde de 7,4 m2 por habitante

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
incremento no m2 de área verde por habitante	m2	7,40	2010	P A					7,80	7,80

Resultado: Resíduos de construção civil não descartados clandestinamente incrementados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Resíduos não descartadas clandestinamente	toneladas		2010	P A	8.640,00	17.280,00	24.480,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00

Resultado: Assentamentos regularizados

Suposições: SH (Secretaría de Vivienda); predios con matrículas individualizadas (depende de la acción de la Notaría de Registro de Inmuebles)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Predios con matrículas individualizadas nos assentamentos	Predios		2010	P A		530,00	802,00	548,00	1.880,00	1.880,00

Resultado: Famílias de la favela do banhado reubicadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
tasa de permanencia de las familias asentadas	%		2010	P A					80,00	80,00
zona liberada para la integración al area de preservación ambiental	m2		2010	P A	223.102,00					223.102,00

Resultado: Melhorias en cuanto a movilidad de la población implantadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Via do Banhado - velocidade promedio para el acceso y transposición del Centro	km/h	29,00	2010	P A					45,00	45,00
Cambuí - velocidad media comparada con la alternativa actual	Km/h	36,00	2010	P A					45,00	45,00
Centro de control de operaciones - tiempo de espera en el semáforo	minuto	2,50	2010	P A					1,00	1,00
Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de líneas en funcionamiento)	lineas	37,00	2010	P A					34,00	34,00

Resultado: Fortalecimiento institucional implementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento	dias	35,00	2010	P A					25,00	28,00
Capacidad de getión de servicios electrónicos	servidores	36,00	2010	P A					18,00	18,00
Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos	dias	172,00	2010	P A					148,00	148,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I: Melhorias urbano-ambientais									
Parques Urbanos criados	Parques				5,00		2.385.316,96		15.000.485,73
Gestão de Resíduos da Construção Civil implementada	Postos		11,00		21,00				2.836.601,34
Assentamentos Urbanizados	Assentamentos		2,00		7,00		338.732,32		6.426.641,54
Famílias reassentadas	Famílias				399,00				14.300.000,00
Canal de Drenagem construído	Canal		1,00		1,00		3.178.621,89		2.930.371,39
Componente II: Melhorias en cuanto a movilidad urbana									
Obras do sistema Viário concluídas	Km		3,00		5,00		17.628.344,03		104.296.082,99
Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	%		30,00		100,00		797.319,23		3.320.000,00
Sistema Integrado de transporte público em operação	%				100,00		164.234,71		2.706.895,72
Plano de melhorias operacionais na Secretaria de Transporte implementado	Plano				1,00				1.987.000,00
Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto				1,00		25.701,44		1.692.659,29
Componente III: Fortalecimiento institucional									
Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação - ferramentas para planejamento de TI implantada.	ferramentas		2,00		2,00		124.797,09		150.000,00
Melhorias em tecnologia da informação (solução de armazenamento e processamento de dados) implementadas	%				100,00		280.201,87		3.444.464,35
Aperfeiçoamento de serviços de governo eletrônico - softwares de governo eletrônicos implementados	softwares		2,00		4,00		3.489.532,77		4.691.480,95
Base Cadastral - Nova base de dados geoterritoriais integrada	%				100,00				5.646.600,00
Gestão Cadastral - nova base de dados cadastrais e multifinalitários implantada	%				100,00		2.908.401,34		16.687.200,00
Administracion del Programa									
Auditoria, monitoramento, avaliação, UGP, fiscalização de obras	N/A						17.272,59		3.912.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								1.780.262,00
TOTAL							31.338.476,24		191.808.745,30
