


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo BID/Fondo	Costo AECID (USD)	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
								S1	S2												
0	Programa Nacional de Caminos Vecinales (PR-L 1084)	1460 días	mié 26/11/14	mar 30/06/20		\$100.000.000...	\$25.000.000...														
1	Actividades preparatorias para la ejecución del préstamo	262 días	mié 26/11/14	vie 27/11/15		\$0,00	\$0,00														
2	Aprobación del contrato por parte del Directorio del Banco	1 día	mié 26/11/14	mié 26/11/14		\$0,00	\$0,00														
3	Firma del Contrato de Prestamo por parte del Prestatario	75 días	jue 27/11/14	mié 11/03/15	2	\$0,00	\$0,00														
4	Aprobación del Contrato de Prestamo por parte de la Asamblea Legis	79 días	jue 12/03/15	mar 30/06/15	3	\$0,00	\$0,00														
5	Cumplimiento de Condiciones Contractuales	90 días	mié 01/07/15	mar 03/11/15		\$0,00	\$0,00														
6	Normas Generales de contrato previas al primer desembolso	90 días	mié 01/07/15	mar 03/11/15		\$0,00	\$0,00														
7	Envío al Banco de los informes jurídicos	60 días	mié 01/07/15	mar 22/09/15	4	\$0,00	\$0,00														
8	Comunicación al Banco del Registro de firmas autorizadas	30 días	mié 01/07/15	mar 11/08/15	4	\$0,00	\$0,00														
9	Envío al Banco del Informe Inicial	90 días	mié 01/07/15	mar 03/11/15	4	\$0,00	\$0,00														
10	Envío al Banco del Plan de Cuentas del Proyecto	30 días	mié 01/07/15	mar 11/08/15	4	\$0,00	\$0,00														
11	Condiciones especiales previas al primer desembolso	60 días	mié 01/07/15	mar 22/09/15		\$0,00	\$0,00														
12	Puesta en vigencia del Manual de Operaciones	60 días	mié 01/07/15	mar 22/09/15	4	\$0,00	\$0,00														
13	Elegibilidad del contrato de prestamo, aceptación al cumplimiento de clausulas contractuales previas	5 días	mié 04/11/15	mar 10/11/15	5	\$0,00	\$0,00														
14	Diseño de Obras disponibles	0 días	vie 27/11/15	vie 27/11/15	13	\$0,00	\$0,00														
15	Ejecución del contrato de Préstamo	1384 días	jue 12/03/15	mar 30/06/20	13	\$100.000.000...	\$25.000.000...														
16	Componente 1. Obras Civiles	1384 días	jue 12/03/15	mar 30/06/20		\$90.530.000,00	\$24.770.000,00														
17	Obras de Rehabilitación de Caminos vecinales (390 km)	611 días	jue 23/04/15	jue 24/08/17		\$53.000.000,00	\$23.000.000,00														
18	Grupo 1: Caazapa - Caaguazu (156 Km)	611 días	jue 23/04/15	jue 24/08/17		\$30.135.000,00	\$0,00														
19	Licitación Pública Internacional - Obras, Bienes y Servicios de No Consultoría.	229 días	jue 23/04/15	mar 08/03/16		\$0,00	\$0,00														
42	Ejecución del contrato	390 días	vie 26/02/16	jue 24/08/17		\$0,00	\$0,00														
45	Costo Grupo 1	0 días	vie 26/02/16	vie 26/02/16	43CC	\$30.135.000,00	\$0,00														
46	Grupo 2: San Pedro (122 Km)	611 días	jue 23/04/15	jue 24/08/17		\$1.185.000,00	\$23.000.000,00														

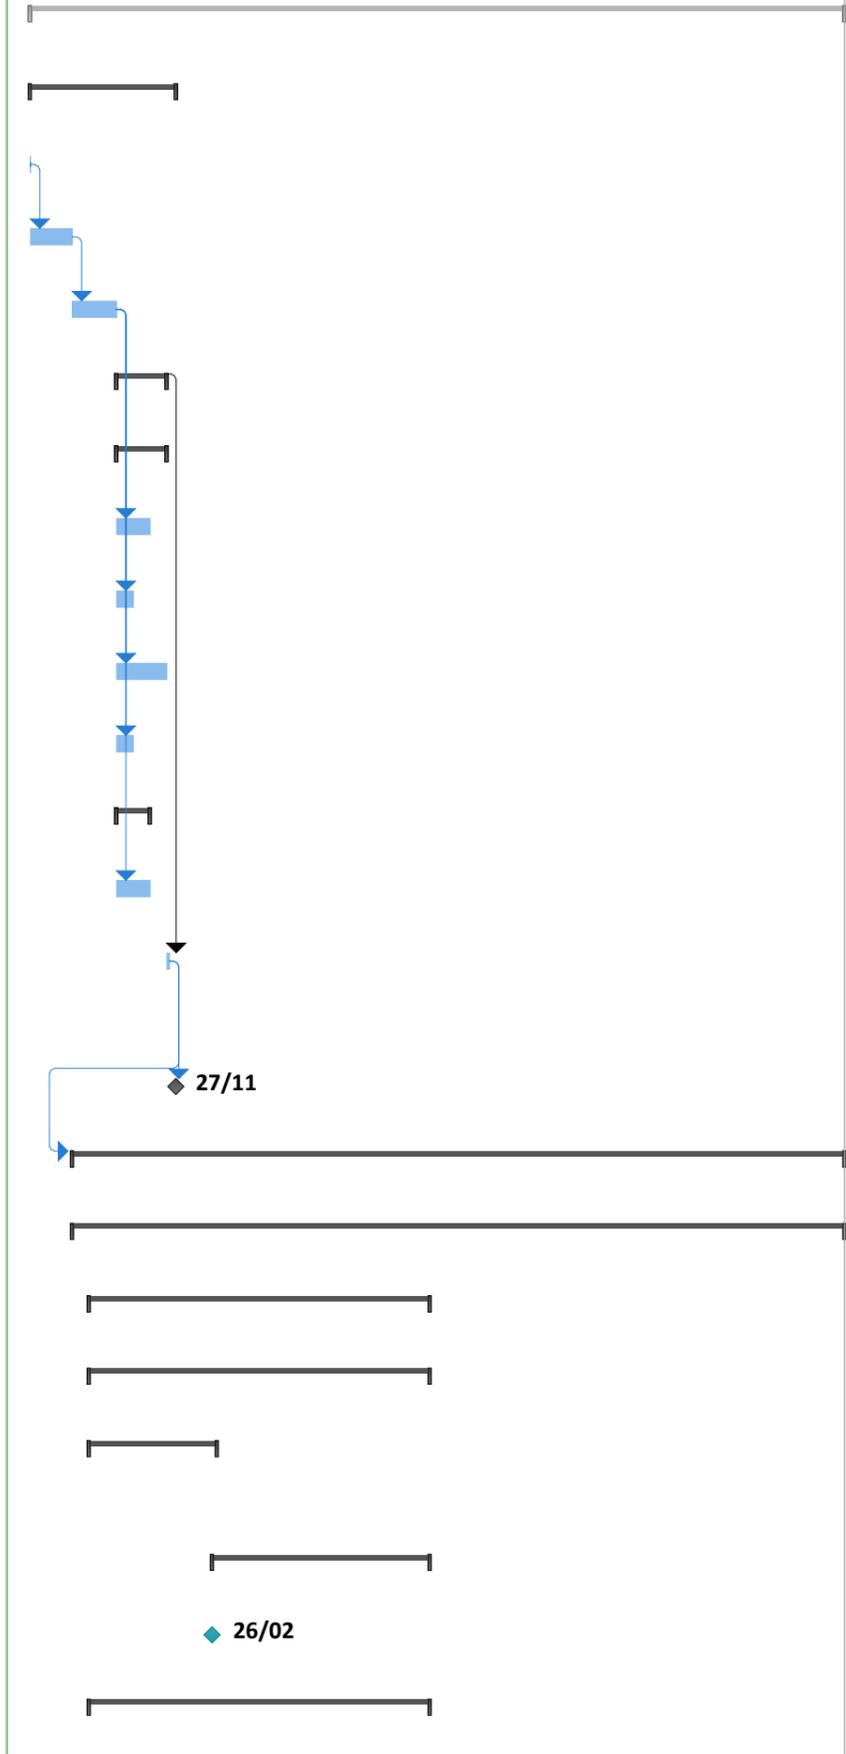

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo BID/Fondo	Costo AECID (USD)	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
								S1	S2												
47	Licitación Pública Internacional - Obras, Bienes y Servicios de No Consultoría.	229 días	jue 23/04/15	mar 08/03/16		\$0,00	\$0,00														
70	Ejecución del contrato	390 días	vie 26/02/16	jue 24/08/17		\$0,00	\$0,00														
73	Costo Grupo 2	0 días	vie 26/02/16	vie 26/02/16	71CC	\$1.185.000,00	\$23.000.000,00														
74	Grupo 3: Canindeyu (112 Km)	606 días	jue 30/04/15	jue 24/08/17		\$21.680.000,00	\$0,00														
75	Licitación Pública Internacional - Obras, Bienes y Servicios de No Consultoría.	224 días	jue 30/04/15	mar 08/03/16		\$0,00	\$0,00														
98	Ejecución del contrato	390 días	vie 26/02/16	jue 24/08/17		\$0,00	\$0,00														
101	Costo Grupo 3	0 días	vie 26/02/16	vie 26/02/16	99CC	\$21.680.000,00	\$0,00														
102	Plan de Gestión de Mantenimiento (530 Km)	863 días	vie 10/03/17	mar 30/06/20		\$4.000.000,00	\$0,00														
103	Mantenimiento por Convenio con Gobiernos Locales	723 días	vie 22/09/17	mar 30/06/20		\$1.800.000,00	\$0,00														
104	Tramo Grupo 1	723 días	vie 22/09/17	mar 30/06/20	44FC+20 días	\$0,00	\$0,00														
105	Costo	0 días	vie 22/09/17	vie 22/09/17	104CC	\$1.800.000,00	\$0,00														
106	Mantenimiento por Contrato con Empresas	863 días	vie 10/03/17	mar 30/06/20		\$1.800.000,00	\$0,00														
107	Licitación Pública Nacional - Obras, Bienes y Servicios de No Consultoría	153 días	vie 10/03/17	mar 10/10/17		\$0,00	\$0,00														
130	Ejecución del contrato	718 días	vie 29/09/17	mar 30/06/20		\$0,00	\$0,00														
132	Costo	0 días	vie 01/06/18	vie 01/06/18	131CC	\$1.800.000,00	\$0,00														
133	Mantenimiento a través de Microempresas (MEMV)	769 días	jue 20/07/17	mar 30/06/20		\$400.000,00	\$0,00														
134	Contratación de Firma Consultora - SBCC	150 días	jue 20/07/17	mié 14/02/18		\$0,00	\$0,00														
158	Ejecución del contrato	620 días	mié 14/02/18	mar 30/06/20		\$0,00	\$0,00														
160	Costo	0 días	mié 14/02/18	mié 14/02/18	159CC	\$400.000,00	\$0,00														
161	Reemplazo de Puentes de madera por puentes de H°A° en tramos no mejorados (1900 ml)	535 días	mar 05/01/16	lun 22/01/18		\$28.500.000,00	\$0,00														
162	Licitación Pública Internacional - Obras, Bienes y Servicios de No Consultoría	151 días	mar 05/01/16	mar 02/08/16		\$0,00	\$0,00														
185	Ejecución del contrato	390 días	mar 26/07/16	lun 22/01/18		\$0,00	\$0,00														
188	Costo	0 días	mar 26/07/16	mar 26/07/16	186CC	\$28.500.000,00	\$0,00														

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo BID/Fondo	Costo AECID (USD)	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
								S1	S2												
189	Fiscalización Técnica y Ambiental de las Obras	771 días	jue 12/03/15	jue 22/02/18		\$5.030.000,00	\$1.770.000,00														
190	Grupo 1: Caazapa - Caaguazu (156 Km)	663 días	jue 12/03/15	lun 25/09/17		\$1.930.000,00	\$0,00														
191	Contratación de Firma Consultora - SBCC	232 días	jue 12/03/15	vie 29/01/16		\$0,00	\$0,00														
215	Ejecución del contrato	432 días	vie 29/01/16	lun 25/09/17		\$0,00	\$0,00														
217	Costo	0 días	vie 29/01/16	vie 29/01/16	216CC	\$1.930.000,00	\$0,00														
218	Grupo 2: San Pedro (122 Km)	663 días	jue 12/03/15	lun 25/09/17		\$0,00	\$1.770.000,00														
219	Contratación de Firma Consultora - SBCC	232 días	jue 12/03/15	vie 29/01/16		\$0,00	\$0,00														
243	Ejecución del contrato	432 días	vie 29/01/16	lun 25/09/17		\$0,00	\$0,00														
245	Costo	0 días	vie 29/01/16	vie 29/01/16	244CC	\$0,00	\$1.770.000,00														
246	Grupo 3: Canindeyu (112 Km)	603 días	jue 04/06/15	lun 25/09/17		\$1.300.000,00	\$0,00														
247	Contratación de Firma Consultora - SBCC	172 días	jue 04/06/15	vie 29/01/16		\$0,00	\$0,00														
271	Ejecución del contrato	432 días	vie 29/01/16	lun 25/09/17		\$0,00	\$0,00														
273	Costo	0 días	vie 29/01/16	vie 29/01/16	272CC	\$1.300.000,00	\$0,00														
274	Reemplazo de Puentes de madera por puentes de H°A° en tramos no mejorados (1900 ml)	597 días	mié 11/11/15	jue 22/02/18		\$1.800.000,00	\$0,00														
275	Contratación de Firma Consultora - SBCC	150 días	mié 11/11/15	mar 07/06/16		\$0,00	\$0,00														
299	Ejecución del contrato	435 días	vie 24/06/16	jue 22/02/18		\$0,00	\$0,00														
301	Costo	0 días	jue 07/07/16	jue 07/07/16	300CC	\$1.800.000,00	\$0,00														
302	Componente 2. Ingeniería, evaluación y administración	1384 días	jue 12/03/15	mar 30/06/20		\$8.400.000,00	\$0,00														
303	Ingenieria	562 días	jue 03/12/15	vie 26/01/18		\$2.400.000,00	\$0,00														
304	Estudios y proyectos de ingenieria de caminos y puentes	339 días	jue 03/12/15	mar 21/03/17		\$2.000.000,00	\$0,00														
305	Contratación de Firma Consultora - SBCC	150 días	jue 03/12/15	mié 29/06/16		\$0,00	\$0,00														
329	Ejecución del contrato	190 días	mié 29/06/16	mar 21/03/17		\$0,00	\$0,00														
331	Costo	0 días	jue 07/07/16	jue 07/07/16	330CC	\$2.000.000,00	\$0,00														
332	Estudios de catastro socioeconomico de familias	252 días	mié 23/12/15	jue 08/12/16		\$100.000,00	\$0,00														

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo BID/Fondo	Costo AECID (USD)	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
								S1	S2												
333	Selección Basada en Calificaciones del Consultor	95 días	mié 23/12/15	mar 03/05/16		\$0,00	\$0,00														
353	Ejecución del contrato	150 días	vie 13/05/16	jue 08/12/16		\$0,00	\$0,00														
355	Costo	0 días	vie 13/05/16	vie 13/05/16	354CC	\$100.000,00	\$0,00														
356	Estudio de alternativas de mantenimiento de caminos y puentes	240 días	mié 03/02/16	mar 03/01/17		\$100.000,00	\$0,00														
357	Selección Basada en Calificaciones del Consultor	95 días	mié 03/02/16	mar 14/06/16		\$0,00	\$0,00														
377	Ejecución del contrato	150 días	mié 08/06/16	mar 03/01/17		\$0,00	\$0,00														
379	Costo	0 días	mié 08/06/16	mié 08/06/16	378CC	\$100.000,00	\$0,00														
380	Estudios de actualización y consolidación de PVP	240 días	mié 16/03/16	mar 14/02/17		\$100.000,00	\$0,00														
381	Selección Basada en Calificaciones del Consultor	95 días	mié 16/03/16	mar 26/07/16		\$0,00	\$0,00														
401	Ejecución del contrato	150 días	mié 20/07/16	mar 14/02/17		\$0,00	\$0,00														
403	Costo	0 días	vie 05/08/16	vie 05/08/16	402CC	\$100.000,00	\$0,00														
404	Otros Estudios	240 días	lun 27/02/17	vie 26/01/18		\$100.000,00	\$0,00														
405	Selección Basada en Calificaciones del Consultor	95 días	lun 27/02/17	vie 07/07/17		\$0,00	\$0,00														
425	Ejecución del contrato	150 días	lun 03/07/17	vie 26/01/18		\$0,00	\$0,00														
427	Costo	0 días	lun 03/07/17	lun 03/07/17	426CC	\$100.000,00	\$0,00														
428	Auditoría, Monitoreo y Evaluación del Programa	1384 días	jue 12/03/15	mar 30/06/20		\$750.000,00	\$0,00														
429	Auditoría del Programa	1210 días	mié 11/11/15	mar 30/06/20		\$500.000,00	\$0,00														
430	Contratación de Firma Auditora Externa del Programa - SBCC	150 días	mié 11/11/15	mar 07/06/16		\$0,00	\$0,00														
454	Ejecución del contrato	1060 días	mié 08/06/16	mar 30/06/20		\$0,00	\$0,00														
456	Costo	0 días	mié 08/06/16	mié 08/06/16	455CC	\$500.000,00	\$0,00														
457	Monitoreo y Evaluación de Impacto	1317 días	jue 12/03/15	vie 27/03/20		\$250.000,00	\$0,00														
458	Levantamiento de Linea de Base	375 días	jue 12/03/15	mié 17/08/16		\$125.000,00	\$0,00														
459	Selección Basada en Calificaciones del Consultor - (SBC)	205 días	jue 12/03/15	mié 23/12/15		\$0,00	\$0,00														
479	Ejecución del contrato	175 días	jue 17/12/15	mié 17/08/16		\$0,00	\$0,00														
481	Costo	0 días	jue 17/12/15	jue 17/12/15	480CC	\$125.000,00	\$0,00														

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo BID/Fondo	Costo AECID (USD)	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
								S1	S2												
482	Evaluación de Impacto	285 días	dom 24/02/19	vie 27/03/20		\$125.000,00	\$0,00														
483	Selección Basada en Calificaciones del Consultor - (SBC)	94 días	dom 24/02/19	jue 04/07/19		\$0,00	\$0,00														
503	Ejecución del contrato	196 días	vie 28/06/19	vie 27/03/20		\$0,00	\$0,00														
505	Costo	0 días	vie 28/06/19	vie 28/06/19	504CC	\$125.000,00	\$0,00														
506	Administración del Programa	1210 días	mié 11/11/15	mar 30/06/20		\$5.250.000,00	\$0,00														
507	Unidad Ejecutora del Programa	1210 días	mié 11/11/15	mar 30/06/20		\$750.000,00	\$0,00														
508	Contratación del Coordinador General	1210 días	mié 11/11/15	mar 30/06/20		\$300.000,00	\$0,00														
509	Etapa previa	17 días	mié 11/11/15	jue 03/12/15		\$0,00	\$0,00														
513	Proceso de Contratación Consultor Individual	41 días	vie 04/12/15	vie 29/01/16		\$0,00	\$0,00														
525	Ejecución del contrato	1152 días	lun 01/02/16	mar 30/06/20	524	\$0,00	\$0,00														
526	Costo	0 días	mié 17/02/16	mié 17/02/16	525CC	\$300.000,00	\$0,00														
527	Contratación Coordinador Administrativo	1210 días	mié 11/11/15	mar 30/06/20		\$200.000,00	\$0,00														
528	Etapa previa	17 días	mié 11/11/15	jue 03/12/15		\$0,00	\$0,00														
532	Proceso de Contratación Consultor Individual	41 días	vie 04/12/15	vie 29/01/16		\$0,00	\$0,00														
544	Ejecución del contrato	1136 días	mar 23/02/16	mar 30/06/20	543	\$0,00	\$0,00														
545	Costo	0 días	mié 17/02/16	mié 17/02/16	544CC	\$200.000,00	\$0,00														
546	Contratación de Coordinador Técnico	1210 días	mié 11/11/15	mar 30/06/20		\$250.000,00	\$0,00														
547	Etapa previa	17 días	mié 11/11/15	jue 03/12/15		\$0,00	\$0,00														
551	Proceso de Contratación Consultor Individual	41 días	vie 04/12/15	vie 29/01/16		\$0,00	\$0,00														
563	Ejecución del contrato	1136 días	mar 23/02/16	mar 30/06/20	562	\$0,00	\$0,00														
564	Costo	0 días	mié 17/02/16	mié 17/02/16	563CC	\$250.000,00	\$0,00														
565	Contratación de Empresa Especializada de Gestión de Proyecto	1210 días	mié 11/11/15	mar 30/06/20		\$4.500.000,00	\$0,00														
566	Etapa previa	5 días	mié 11/11/15	mar 17/11/15		\$0,00	\$0,00														
568	Expresión de interes	41 días	mié 18/11/15	mié 13/01/16		\$0,00	\$0,00														
574	Proceso de Contratación	104 días	jue 14/01/16	mar 07/06/16		\$0,00	\$0,00														

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo BID/Fondo	Costo AECID (USD)	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
								S1	S2												
589	Ejecución del contrato	1060 días	mié 08/06/16	mar 30/06/20		\$0,00	\$0,00														
591	Costo	0 días	mié 08/06/16	mié 08/06/16	590CC	\$4.500.000,00	\$0,00														
592	Componente 3. Mitigacion Ambiental y Social	265 días	jue 03/12/15	mié 07/12/16		\$1.070.000,00	\$230.000,00														
593	Servicios Ambientales	140 días	vie 26/02/16	jue 08/09/16		\$855.000,00	\$230.000,00														
594	Grupo 1: Caazapa - Caaguazu (156 Km)	0 días	vie 26/02/16	vie 26/02/16		\$0,00	\$0,00														
595	Grupo 2: San Pedro (122 Km)	0 días	vie 26/02/16	vie 26/02/16		\$0,00	\$0,00														
596	Grupo 3: Canindeyu (112 Km)	0 días	vie 26/02/16	vie 26/02/16		\$0,00	\$0,00														
597	Reemplazo de Puentes de madera por puentes de H°A° en tramos no mejorados (1900 ml)	0 días	vie 19/08/16	vie 19/08/16		\$0,00	\$0,00														
598	Costo	140 días	vie 26/02/16	jue 08/09/16	594CC,596FF	\$855.000,00	\$230.000,00														
599	Plan de Formación Socio Ambiental y Género	265 días	jue 03/12/15	mié 07/12/16		\$215.000,00	\$0,00														
600	Selección Basada en Calificaciones del Consultor - (SBC)	95 días	jue 03/12/15	mié 13/04/16		\$0,00	\$0,00														
620	Ejecución del contrato	175 días	jue 07/04/16	mié 07/12/16		\$0,00	\$0,00														
622	Costo	0 días	jue 07/04/16	jue 07/04/16	621CC	\$215.000,00	\$0,00														

