



Operation Number: **BR-L1187**
 Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
 Last Update: **3/28/2016**
 PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/01/2016**
 Division Chief validation date: **04/07/2016**
 Country Representative validation date: **04/29/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	PROCIDADES - Novo Hamburgo	Loan Number:	2752/OC-BR
Executing Agency (EA):	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO		
Team Leader:	Silva Casseb, Marcia Maria	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1187	\$23,910,000.00	\$23,910,000.00	\$23,910,000.00	\$0.00	\$47,820,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1187	\$23,910,000.00	\$1,880,000.00	7.86%	\$22,030,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

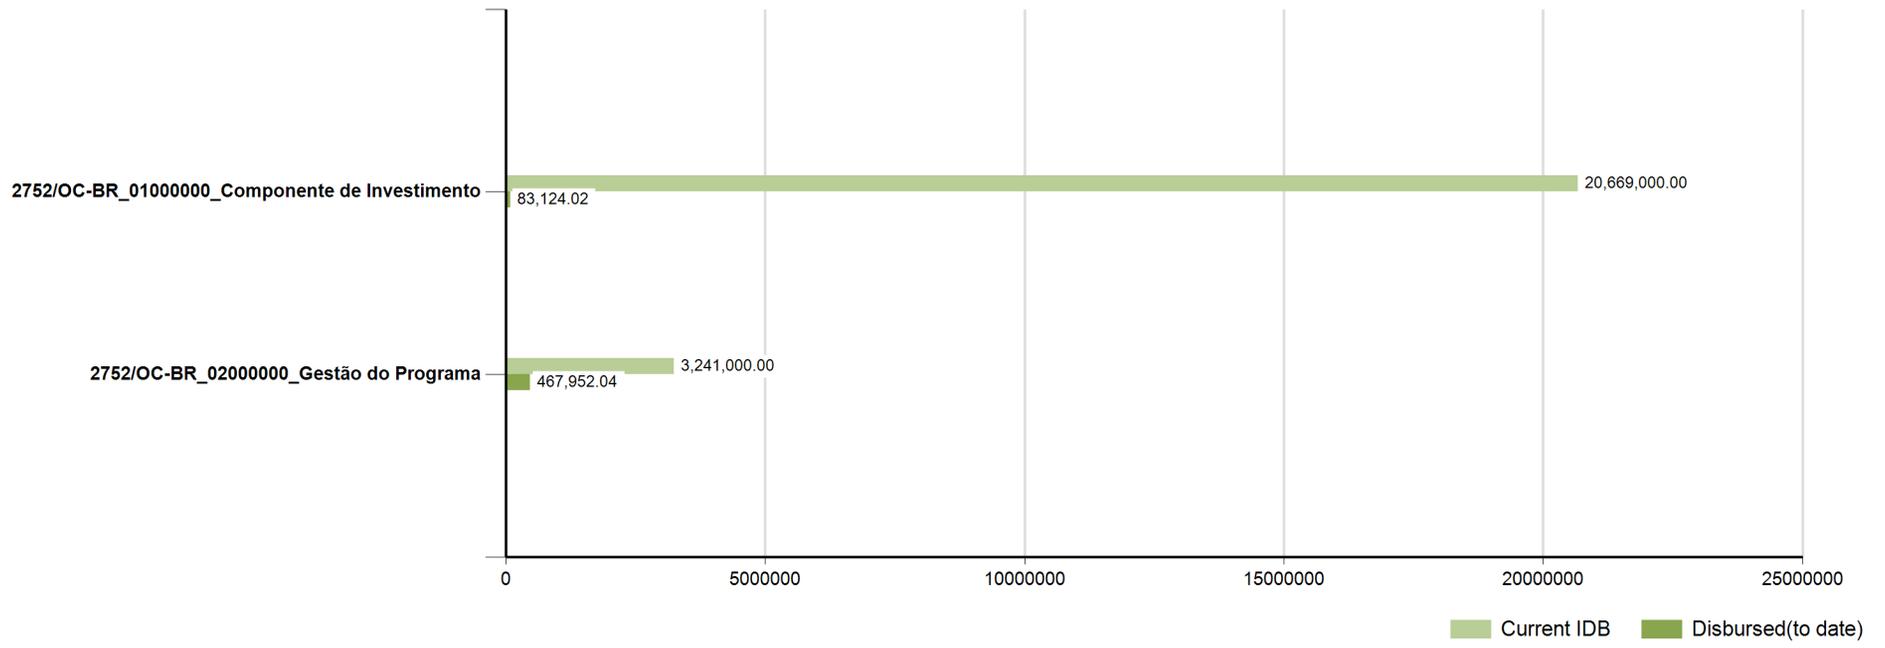

Results Matrix

Impacts

Impact:		1 Condiciones Socioeconómicas del Municipio de Novo Hamburgo Mejoradas										
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	EOP	
1.1 Inmueble en el área de influencia de las obras del arroyo Pampa		R\$/m2	220.59	2010	Fase preparación: evaluación económica del programa - Fuente: Unidad Ejecutora del Programa (UEP)	Encuesta para verificar la "Valoración de los Inmuebles" del área determinada y en el área de control.	P			375.00		375.00
	P(a)								375.00		375.00	
	A											
1.2 Facturación de las empresas ubicadas en el Centro Histórico Hamburgo Viejo		millones R \$	159.03	2010	Fuente: Unidad Ejecutora del Programa (UEP) / Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo (PMNH)	Medido por el aumento en la recaudación del Impuesto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Informe Semestral de Recaudación	P			166.96		166.96
	P(a)								166.96		166.96	
	A											

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Áreas Urbanas de la Ciudad Revitalizada Urbanística y Ambientalmente
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	EOP
1.1 Satisfacción de los usuarios con el Área Central de la ciudad de Novo Hamburgo		%	68.50	2010	Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP) - Encuesta: Departamento de Apoio a Pesquisa (DAP) por la implementación de las obras.	Por satisfacción entendiese los encuestados que consideran las obras importantes o muy importantes. La DAP se repetirá después de la conclusión de las obras.	P		73.60		73.60
	P(a)							73.60		73.60	
	A										
1.2 Visitantes en la Fundación Scheffel		Visitantes/Año	6,229.00	2010	Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.	Registro del: Libro de Registros Fundación Scheffel. Medio de Verificación: Informe Semestral a partir del 2º año del Programa	P		8,046.00		8,046.00
	P(a)							8,046.00		8,046.00	
	A										
1.3 Visitantes en la Casa Schmitt Presser		Visitantes/Año	5,220.00	2010	Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.	Registro del: Libro de Registros da Casa Schmitt Presser. Medio de Verificación: Informe Semestral a partir del 2º año del Programa	P		6,742.00		6,742.00
	P(a)							6,742.00		6,742.00	
	A										

1.4 Visitantes en la Casa Lar das Meninas					Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.	Registro del: Libro de Registros Casa Lar das Meninas . Meio de Verificação: Informe Semestral a partir do 2º ano do Programa	P			6,000.00		6,000.00
							P(a)			6,000.00		6,000.00
							A					
	Visitantes/Año	0.00	2010									
1.5 Visitantes del Parcão					Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.	Registro del: Libro de Registros del Parcão. Meio de Verificação: Informe Semestral a partir do 2º ano do Programa	P			49,484.00		49,484.00
							P(a)			49,484.00		49,484.00
							A					
	Visitantes/Año	32,500.00	2010									

Outcome: [2 Desarrollo Económico Sostenible del Municipio Promovido](#)

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	EOP	
2.1 Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Sectorial (PES) 1					Fuente: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo (PMNH) / Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo (SEDETUR)	Informe Semestral de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)	P			20.00		20.00
							P(a)			20.00		20.00
							A					
		Empresas	0.00	2010								

2.2 Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Setorial (PES) 2	Empresas	0.00	2010	Fuente: Prefectura Municipal de Novo Hamburgo (PMNH) / Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDETUR)	Informe Semestral de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)	P			40.00		40.00
						P(a)			40.00		40.00
						A					

Outcome: [3 Criminalidad Juvenil en los Barrios Carenciados Controlada](#)

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	EOP	
3.1 Tasa de homicidios en los barrios de Canudos y Santo Afonso.		Homicidios /100mil habitantes	89.00	2010	Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP) - Oficina de Gestión Integrada-Municipal - OGI-M (*)		P			62.00		62.00
							P(a)			62.00		62.00
							A					

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Revitalização Urbana - Requalificação da Sub-Bacia do Arroio Pampa		Physical Progress		Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP	
Infraestrutura viária e pavimentação da Avenida Alcântara implantada	Km	P			0.00	
		P(a)	0.40	0.90	725,000.00	1,954,000.00
		A	0.90	0.90	1,954,000.00	1,954,000.00
Famílias Reassentadas	Famílias	P	0.00	0.00	0.00	
		P(a)	10.00	0.00	309,000.00	184,000.00
		A	0.00	0.00	0.00	184,000.00
Ciclovias implantadas	Km	P		0.00	0.00	
		P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00
Margens do Arroio Pampa restauradas (revegetação e muro de contenção)	Km	P		0.00	0.00	
		P(a)	0.00	0.30	0.00	613,000.00
		A	0.00	0.30	0.00	613,000.00
Interseção da Avenida Alcântara com a Avenida do Município Implantada	Intercesão	P		0.00	0.00	
		P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbanização da Vila Kliping Concluída	m2	P		0.00	0.00	
		P(a)	2,000.00	10,000.00	725,000.00	3,625,000.00
		A	1,299.00	1,299.00	417,000.00	588,000.00
Urbanização da Vila Getúlio Vargas Concluída	m2	P		0.00	0.00	
		P(a)	6,000.00	0.00	1,023,000.00	59,000.00
		A	0.00	0.00	0.00	59,000.00
Urbanização da Vila Palmeira		P		0.00	0.00	
		P(a)		374.00		5,116,000.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00
Revitalização Urbana - Revitalização da Área Central da Cidade		Physical Progress		Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP	
Infraestrutura dos cabos elétricos da iluminação pública enterrada e aérea - instalada	Km	P		0.00	0.00	
		P(a)	0.20	0.00	189,312.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00
Passeios Públicos Implantados	Km	P		0.00	0.00	
		P(a)	0.80	0.00	206,016.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00
Praças Construídas	Praças	P		0.00	0.00	
		P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00
Vias Implantadas	Km	P		0.00	0.00	
		P(a)	0.80	0.00	305,312.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciclovias Implantadas	Km	P		0.00	0.00	
		P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00
Revitalização Urbana - Revitalização do Centro Histórico Hamburgo Velho		Physical Progress		Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP	

Praças Revitalizadas	Praça	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Edifício Histórico - Casa Lar das Meninas Restaurado	Edifício	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	506,030.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	506,030.00
Paseos Públicos Implantados	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.30	0.00	P(a)	91,200.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	20.00	0.00	P(a)	458,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Revitalização Urbana - Vinculação entre Centro Histórico Hamburgo Velho e a Área Central		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Ciclovias Implantadas	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Praças Revitalizadas	Praças	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Paseos Públicos Implantados	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.50	0.00	P(a)	309,320.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Revitalização Urbana - Consolidação do Parque Municipal Henrique Luís Roessler - Parcão		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Edifício do Centro Educacional Ambiental Construído	Edifício	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	630,630.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Área do Parque com Vallas	Hectáres	P		0.00	P		0.00
		P(a)	10.00	54.00	P(a)	308,308.00	1,541,540.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Ciclovias Construídas (perto do parque e das calçadas públicas)	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.70	P(a)	0.00	248,060.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Equipamentos Públicos Construídos (banheiros, Vestiários e Etc)	Equipamentos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	20.00	100.00	P(a)	154,154.00	770,770.00
		A	0.00	0.00	A	14,000.00	14,000.00
Desenvolvimento Económico Local		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Projeto Urbanístico do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) - Elaborado	Projeto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Pólo de Inovação Criativa Hamburgtech instalado	Polo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Plano do Distrito Industrial Elaborado (Projetos Básicos, urbanismo e executivo)	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano de Comunicação e Marketing do DEL	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	141,000.00
		A	0.00	0.00	A	15,000.00	15,000.00
Plano Estratégico Integrado de Comércio, Turismo e Serviços	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano para Dinamização do Setor de TI - Concurso	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano para Reconcepção de Cursos Profissionalizantes e de Capacitação	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano para Reestruturação Organizacional da SEDETUR e Capacitação Técnica	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Prevenção da Violência - Ações para o Fortalecimento Institucional para a Prevenção da Violência		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Jovens Atendidos no Projeto para Jovens nos Bairros Canudos e Santo Afonso	Jovens	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano Municipal de Segurança Pública - Elaborado	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	107,000.00
		A	0.00	0.00	A	13,000.00	13,000.00
Fórum Municipal de Segurança para a Validação e Seguimento do Plano Constituído	Fórum	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	107,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Prevenção da Violência - Ações de Prevenção Social da Violência		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Projeto de Apoio sócio-educativo técnico-profissional, recreativo, desportivo e de formação em valores para Jovens Elaborado	Projeto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Projeto de Formação de Mulheres/Mães de Família como Agentes de Mudanças em Relação a Violência Elaborado	Projeto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Projeto de Fortalecimento de Serviços de Solução de Conflitos - Elaborados	Projeto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Prevenção da Violência - Gestão da Informação e Conhecimento para a Prevenção da Violência		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Observatório de Crime e de Violência - Implantado	Observatório	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	33,000.00	33,000.00
Informe do Observatório - Elaborado	nº de Informes	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Administração do Programa / Estudos e Projetos		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Sistema de Gestão das Informações	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Planta dos Valores Atualizada	Planta	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano de Transporte e Mobilidade Elaborado	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	427,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Projetos Executivos de Revitalização Urbana Executado	Projetos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	862,000.00	1,210,000.00
		A	1.00	1.00	A	27,000.00	375,000.00

Other Cost		2015	Cost
Administração do Programa / Estudos e Projetos	P		
	P(a)	\$654,994.00	\$3,274,970.00
	A	\$69,000.00	\$69,000.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P		
	P(a)	\$6,747,616.00	\$20,288,000.00
	A	\$2,542,000.00	\$4,423,030.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Projetos Executivos de Revitalização Urbana Executado	Modify Physical P(a) value	Produtos remanescentes retirados do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/28/2016	3/28/2016
Output	Infraestrutura dos cabos elétricos da iluminação pública enterrada e aérea - instalada	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/28/2016	3/28/2016
Output	Plano de Transporte e Mobilidade Elaborado	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Planta dos Valores Atualizada	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução. Objetado por meio da CBR 636/2016.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Sistema de Gestão das Informações	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Informe do Observatório - Elaborado	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Jovens Atendidos no Projeto para Jovens nos Bairros Canudos e Santo Afonso	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Plano para Reestruturação Organizacional da SEDETUR e Capacitação Técnica	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução. Objetado por meio da CBR 1074/2016.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Plano para Reconcepção de Cursos Profissionalizantes e de Capacitação	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Plano para Dinamização do Setor de TI - Concurso	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/24/2016	3/28/2016

Output	Plano Estratégico Integrado de Comércio, Turismo e Serviços	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução. Anexo III da Ajuda Memória da Missão de Supervisão dos dias 12 a 14/08/2015 - IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Plano do Distrito Industrial Elaborado (Projetos Básicos, urbanismo e executivo)	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução. Anexo III da Ajuda Memória da Missão de Supervisão dos dias 12 a 14/08/2015 - IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Pólo de Inovação Criativa Hamburgtech instalado	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Projeto Urbanístico do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) - Elaborado	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução. Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela PMNH (Ver AM de Agosto de 2015)	3/24/2016	3/28/2016
Output	Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Paseos Públicos Implantados	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Praças Revitalizadas	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Ciclovias Implantadas	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Paseos Públicos Implantados	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Edifício Histórico - Casa Lar das Meninas Restaurado	Modify Financial P(a) value	Produto retirado do Programa.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Praças Revitalizadas	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Ciclovias Implantadas	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/24/2016	3/28/2016
Output	Vias Implantadas	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/24/2016	3/28/2016
Output	Praças Construídas	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/24/2016	3/28/2016
Output	Passeios Públicos Implantados	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/24/2016	3/28/2016
Output	Infraestrutura dos cabos elétricos da iluminação pública enterrada e aérea - instalada	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/24/2016	3/28/2016
Output	Interseção da Avenida Alcântara com a Avenida do Município Implantada	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa, por descumprimento do projeto básico pela PMN, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Margens do Arroio Pampa restauradas (revegetação e muro de contenção)	Modify Financial P(a) value	Ações remanescentes excluídas do programa, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162, por descumprimento do projeto básico pela PMNH.	3/24/2016	3/28/2016

Output	Ciclovias implantadas	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa, por descumprimento do projeto básico pela PMN, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Famílias Reassentadas	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa, por descumprimento do projeto básico pela PMN, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Infraestrutura viária e pavimentação da Avenida Alcântara implantada	Modify Financial P(a) value	Ação retirada do programa, por descumprimento do projeto básico pela PMN, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Plano de Transporte e Mobilidade Elaborado	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Informe do Observatório - Elaborado	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Jovens Atendidos no Projeto para Jovens nos Bairros Canudos e Santo Afonso	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Plano para Reestruturação Organizacional da SEDETUR e Capacitação Técnica	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução. Objetado por meio da CBR 1074/2016.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Plano para Dinamização do Setor de TI - Concurso	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução	3/24/2016	3/28/2016
Output	Pólo de Inovação Criativa Hamburgtech instalado	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução	3/24/2016	3/28/2016
Output	Ciclovias Implantadas	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Vias Implantadas	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/24/2016	3/28/2016
Output	Praças Construídas	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/24/2016	3/28/2016
Output	Passeios Públicos Implantados	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/24/2016	3/28/2016
Output	Infraestrutura viária e pavimentação da Avenida Alcântara implantada	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa, por descumprimento do projeto básico pela PMN, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/24/2016	3/28/2016
Output	Planta dos Valores Atualizada	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução. Objetado por meio da CBR 636/2016.	3/16/2016	3/28/2016
Output	Plano para Reconcepção de Cursos Profissionalizantes e de Capacitação	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução.	3/16/2016	3/28/2016
Output	Plano Estratégico Integrado de Comércio, Turismo e Serviços	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução. Anexo III da Ajuda Memória da Missão de Supervisão dos dias 12 a 14/08/2015 - IDBDOCS #39974162.	3/16/2016	3/28/2016
Output	Plano do Distrito Industrial Elaborado (Projetos Básicos, urbanismo e executivo)	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução. Anexo III da Ajuda Memória da Missão de Supervisão dos dias 12 a 14/08/2015 - IDBDOCS #39974162.	3/16/2016	3/28/2016
Output	Projeto Urbanístico do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) - Elaborado	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa, por não haver tempo hábil para sua execução. Anexo III da Ajuda Memória da Missão de Supervisão dos dias 12 a 14/08/2015 - IDBDOCS #39974162.	3/16/2016	3/28/2016

Output	Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/16/2016	3/28/2016
Output	Paseos Públicos Implantados	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/16/2016	3/28/2016
Output	Praças Revitalizadas	Modify Physical P(a) value	As metas físicas e financeiras foram reajustada para refletir o atual cenário de Evolução do Programa e foram objetos de discussão na Missão de Supervisão realizada em Agosto de 2015 (Ajuda Memória IDBDOCS#39974162), bem como no Relatório Semestral de Progresso do 2º Semestre de 2015 (IDBDOCS#40182986).	3/16/2016	3/16/2016
Output	Ciclovía Implantada	Modify Physical P(a) value	As metas físicas e financeiras foram reajustada para refletir o atual cenário de Evolução do Programa e foram objetos de discussão na Missão de Supervisão realizada em Agosto de 2015 (Ajuda Memória IDBDOCS#39974162), bem como no Relatório Semestral de Progresso do 2º Semestre de 2015 (IDBDOCS#40182986).	3/16/2016	3/16/2016
Output	Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/16/2016	3/28/2016
Output	Paseos Públicos Implantados	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa, porque o Projeto Executivo não foi finalizado e não há tempo hábil para execução das obras até o prazo final do contrato (outubro 2016)	3/16/2016	3/28/2016
Output	Edifício Histórico - Casa Lar das Meninas Restaurado	Modify Physical P(a) value	Produto retirado do Programa.	3/16/2016	3/28/2016
Output	Praças Revitalizadas	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162. 24	3/16/2016	3/28/2016
Output	Urbanização da Vila Palmeira	Create Output	As metas físicas e financeiras foram reajustada para refletir o atual cenário de Evolução do Programa e foram objetos de discussão na Missão de Supervisão realizada em Agosto de 2015 (Ajuda Memória IDBDOCS#39974162), bem como no Relatório Semestral de Progresso do 2º Semestre de 2015 (IDBDOCS#40182986).	3/16/2016	3/16/2016
Output	Interseção da Avenida Alcântara con a Avenida do Município Implantada	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa, por descumprimento do projeto básico pela PMN, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/16/2016	3/28/2016
Output	Margens do Arroio Pampa restauradas (revegetação e muro de contenção)	Modify Physical P(a) value	Ações remanescentes excluídas do programa, conforme AM de Agosto de 2015, por descumprimento do projeto básico pela PMNH.	3/16/2016	3/16/2016
Output	Ciclovias implantadas	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa em função da não execução do projeto executivo pela Prefeitura de Novo Hamburgo, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/16/2016	3/28/2016
Output	Famílias Reassentadas	Modify Physical P(a) value	Ação retirada do programa, por descumprimento do projeto básico pela PMN, conforme consta na Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em 12 a 14/08/2015, disponível no IDBDOCS #39974162.	3/16/2016	3/28/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
