



Operation Number: **BR-L1076**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/21/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/21/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	PROCIDADES - Economic Development Program of Distrito Federal-ADEs	Loan Number:	2957/OC-BR
Executing Agency (EA):	Secretaría de Estado de Desarrollo Econó mico		
Team Leader:	Lopez-Lamia,Alejandro J.	Sector/Subsector:	DU
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	DISTRITO FEDERAL DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRAZIL	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1076	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$21,430,000.00		\$71,430,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1076	\$50,000,000.00	\$1,857,000.00	3.71%	\$48,143,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

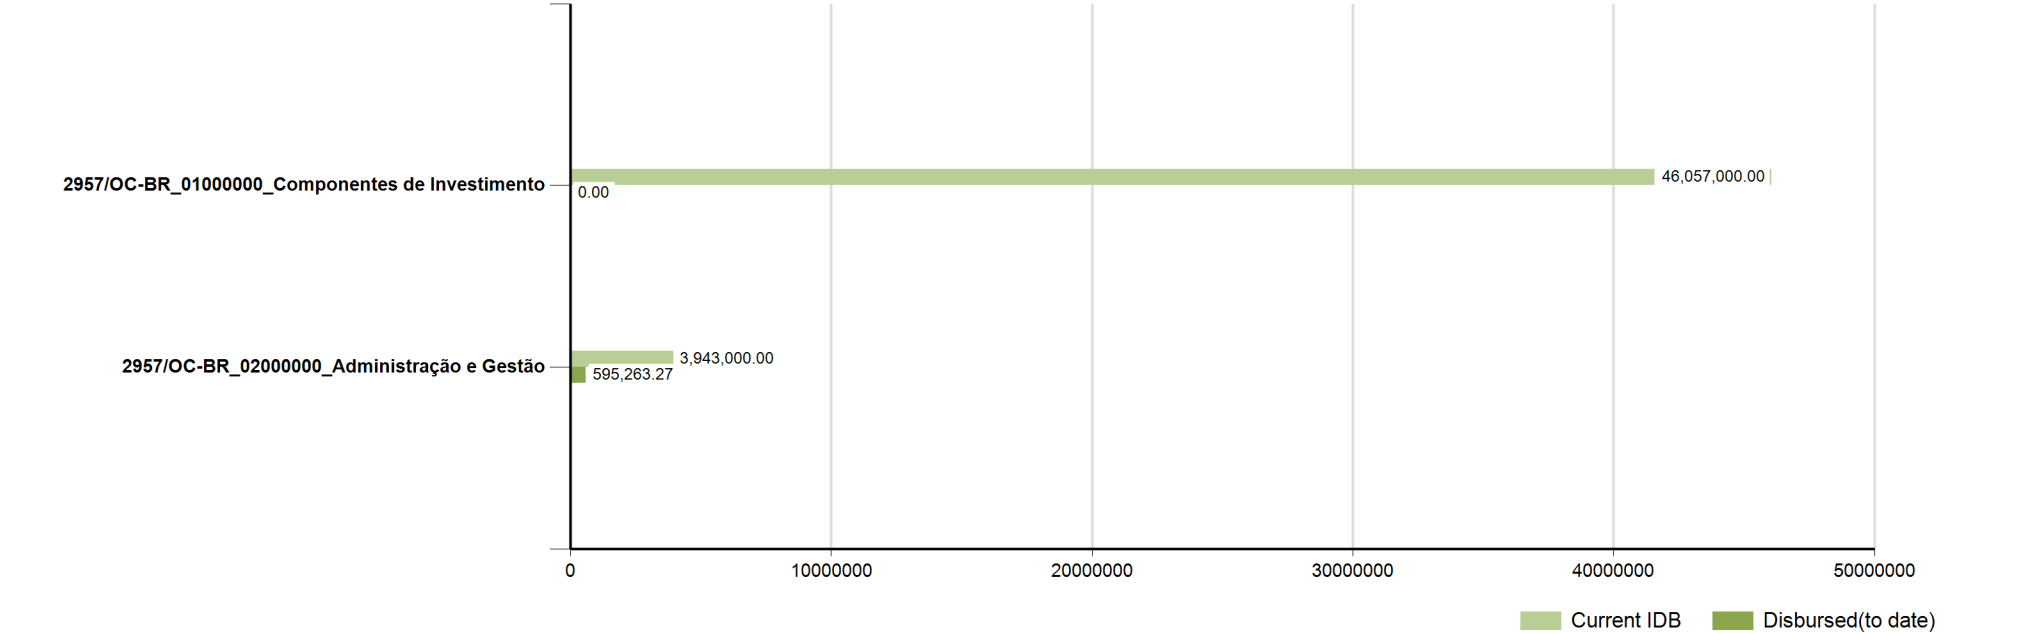

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Melhorar no Ambiente de Negócios no Distrito Federal									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP			
							P			
1.1 Empresas cadastradas no novo sistema da SEDS		Empresas	0.00	2014	Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa, com base nos dados administrativos gerados pela SEDS.		P	200.00		
	P(a)						7,000.00			
	A									
1.1 Janela única implantada (sistema de atendimento ao empresário)		Sistema	0.00	2014	Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa, com base nos dados administrativos gerados pela SEDS.		P			
	P(a)						1.00			
	A									
Outcome:	2 Melhorar o Sistema de Promoção de Investimentos do Distrito Federal									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP			
							P			
2.1 Investidores atendidos pelo Programa Brasília Negócios		Investidores	0.00	2014	Fonte: UGP, dados administrativos incluídos nos relatórios semestrais do programa		P	20.00		
	P(a)						100.00			
	A									

2.2 Investidores atendidos que fizeram negócios dentro do Programa Brasília Negócios		%	0.00	2014	Fonte: UGP/Avaliação do final do programa, utilizando dados administrativos o número efetivo de negócios realizados dentro do Programa Brasília Negócios		P	100.00
							P(a)	2.00
							A	

Outcome:	3 Melhoria nas ADEs
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.0 Lotes nas ADEs, atendidos pelo pacote básico de infraestrutura (água, esgoto, eletricidade, pavimentação e drenagem)		%	80.00	2014	Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa. Serão utilizados dados administrativos gerados pela SEDS		P	
							P(a)	100.00
							A	

Outcome:	3 Aumento do número de empresas localizadas nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) e melhora das condições das ADEs e proximidades (*)
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Faturamento das empresas participantes do Programa de Desenvolvimento Empresarial		#	0.00	2014	Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa, com base nos dados administrativos gerados pela SEDS		P	570.00
							P(a)	10.00
							A	

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Desenvolvimento Institucional Estratégico		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Ferramentas Desenhadas para Fortalecer a Capacidade Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)	# Ferramentas	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Novo Site da Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF) - Implantado	Site	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Avaliação, Estabelecimento da linha de base e redesenho do Pro-DF realizada	Estudo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	150,000.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Elaboração e implantação do sistema de TI concluída	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	107,500.00	615,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Modernização institucional (adequação ao novo modelo do PRO-DF concluída)	Estudo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	50,000.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Complementação da Infraestrutura da SDE - Aquisição de softwares, equipamentos, implantação e treinamento) realizada	Pacote Tecnológico	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	200,000.00	1,350,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Capacitação da equipe técnica realizada	Cursos Oferecidos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	50,000.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Campanhas de conscientização do Pró-DF realizadas	Campanhas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa de Atração de Investimentos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Plano Estratégico para Atração de Investimentos concluído	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano de Negócios do Brasília Negócios - Elaborado	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Sistema "Client Relationship Management (CRM) - Desenvolvido	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Equipe montada para o Programa de Atração de Investimento	Equipe	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	195,000.00	1,505,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Equipe Técnica Capacitada	Cursos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	0.00	160,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Manual para Atração de Investimentos aprovado	Manual	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Plano de pré-viabilidade concluído	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	3,104,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Eventos e Campanhas de Marketing realizadas	Eventos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	3,251,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Desenvolvimento Empresarial nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Diagnóstico e Projetos Setoriais elaborados	diagnósticos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Núcleos Avançados Fixos Instalados	# de Núcleos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Empresários Capacitados nos Temas de Gestão e de Competitividade	# de Empresários	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Fortalecimento das empresas das ADEs realizado	Programa	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,525,988.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Trabalhadores nas ADEs capacitados	Programa	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	340,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Novos Empresários Capacitados nos temas de Gestão e de Competitividade nas ADEs	# de Empresários	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Certificações de Negócios Emitidas	# Certificações	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Empresas Âncoras Registradas	# de Empresas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Empresas Provedoras Registradas	# de Empresas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Site - COMPR-ADE Implantado	Site	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Modernização tecnológica disponibilizada	Programa	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	773,333.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa piloto de qualificação de fornecedores realizado	Programa	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Rede de Esgoto - Implantada	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		

Projetos de infraestrutura urbana nas ADEs concluídos	Projetos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	40,000.00	340,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	20,000.00
Ciclovias Implantadas	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Projetos de sistema de energia elétrica concluídos	Projetos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	70,000.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	30,000.00
Pontos de Ônibus - Implantados	# de pontos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Obras de infraestrutura urbana nas ADEs concluídas	Obras	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	1,264,286.00	34,465,181.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Áreas Verdes das Praças Centrais - Implantadas	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Sistema elétrico implantado	Obras	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	7,260,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Calçadas Implantadas (Iluminação Pública)	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Parking Implantado	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Jogo de Equipamento e Mobiliário Urbano - Instalado	Jogo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Mat. de Construção		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Rede de Esgoto - Implantada	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Ciclovias Construídas	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Pontos de Ônibus □ Implantados	# de Pontos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Áreas Verdes das Praças Centrais - Implantadas	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Calçadas Implantadas (Iluminação Pública)	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Parking Implantado	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		

Jogo de Equipamento e Mobiliário Urbano - Instalado	Jogo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Setor de Indústrias		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Implantação da Pavimentação	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Sistema de Drenagem - Implantado	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Ciclovias Construídas	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Pontos de Ônibus □ Implantados	# de Pontos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Áreas Verdes das Praças Centrais - Implantadas	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Calçadas Implantadas (Iluminação Pública)	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Parking Implantado	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Jogo de Equipamentos e Mobiliário Urbano - Instalado	Jogo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Atividades do Gama		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Rede de Energia Elétrica Implantada	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Projeto de Urbanismo - Preparado	Projeto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Pólo JK		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Projeto de Drenagem Pluvial - Preparado	# de Projetos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Projeto de Urbanismo - Preparado	# de Projetos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Rede de Energia Elétrica - Implantada	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		

Pavimentação Implantada	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Rede de Abastecimento de agua - Implantada	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Rede de Esgoto - Implantada	Metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		

Other Cost		2016	Cost
Gestão, ambiental e Social - PGAS	P		\$0.00
	P(a)	\$269,167.00	\$3,230,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Supervisão das obras e supervisão ambiental	P		\$0.00
	P(a)	\$291,667.00	\$3,500,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Gestão do programa, monitoria e avaliação	P		\$0.00
	P(a)	\$1,064,163.00	\$4,233,000.00
	A	\$329,078.00	\$779,078.00
Contingenciamento	P		\$0.00
	P(a)	\$223,125.00	\$2,677,498.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P		
	P(a)	\$3,974,908.00	\$71,430,000.00
	A	\$329,078.00	\$829,078.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
