

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA DE ENERGIA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN PABLO
Secteur: WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY
Numéro(s) de Prêt(s): 2500/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 115.700.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:
% Décaissé:
Solde: 115.700.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 115.700.000,00
Courant BID: 115.700.000,00
Pari Passu: 58,00
Cofinancement/Pays: 84.080.000,00
Estimation Initiale: 199.780.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 17-abr-2012

Validé par le Représentant: 22-abr-2012

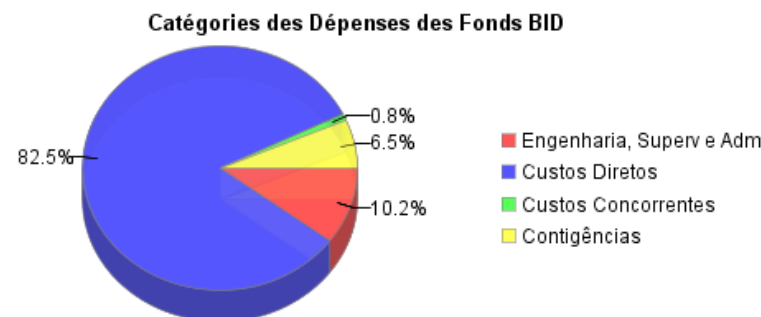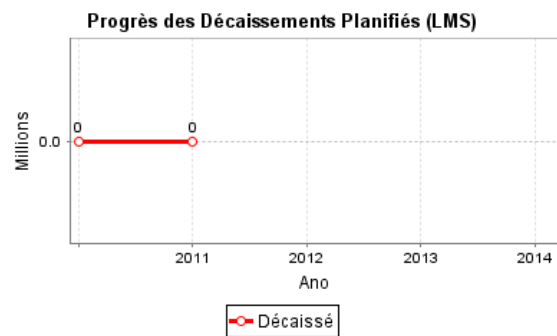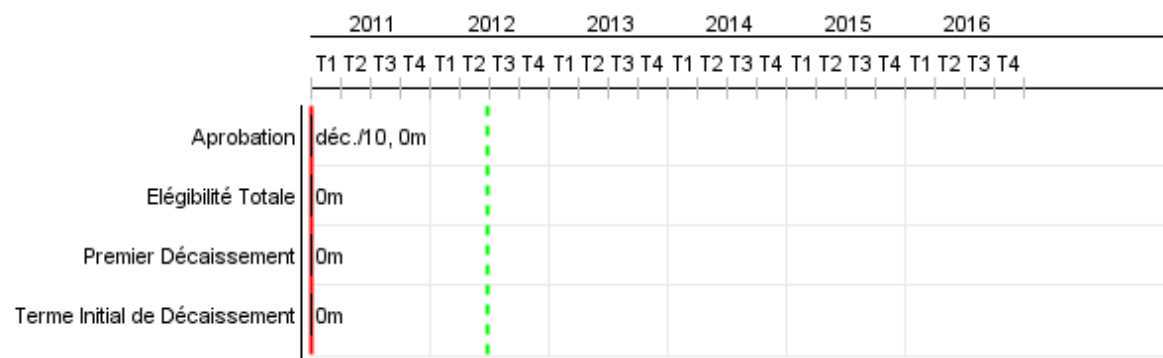

Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat: Capacidade de retenção de água no trecho superior da bacia do rio Tietê ampliada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Tempo de retenção das águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	Horas	12.00	2010	P	12.00	12.00	12.00	13.00	14.00	14,00
				A						
Capacidade de retenção de águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	10^6 m3		2011	P		0.80	1.30	1.80	2.80	2,80
				A						

Résultat: Opções de recreação na área do projeto incrementadas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
População beneficiada com opções de recreação.	milhares de habitantes	50.00	2010	P	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	80,00
				A						

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
OBRAS									
Obras de canalizacao e protecao de cursos d'agua executadas	m				2.000,00				11.523.000,00
Redes Coletoras construidas	m				18.000,00				4.212.000,00
Aterros nas áreas de várzeas removidos	10^3 m3				1.150,00				17.689.000,00
Espaco de Convivencia Jardim Helena construido	Espaco de Convivencia				1,00				18.623.000,00
Espaco de Convivencia Itaim Biacica construido	Espaco de Convivencia				1,00				13.048.000,00
Espaco de Convivencia Jardim Any Jaci construido	Espaco de Convivencia				1,00				10.181.000,00
Vias parque implantadas	km				25,00				17.620.000,00
Ciclovias implantadas	km				25,00				4.406.000,00
REASSENTAMENTO									
Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas	m²				574.955,00				36.352.000,00
Famílias reassentadas com atendimento social	famílias reassentadas				500,00				20.020.000,00
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL									
Matas Ciliares recompostas	ha				72,00				14.954.000,00
Plano de Gestao do Parque implantado	plano				1,00				1.498.000,00
Eventos de Educação Ambiental realizada	evento				15,00				2.168.000,00
OUTROS									
TOTAL									172.294.000,00
