
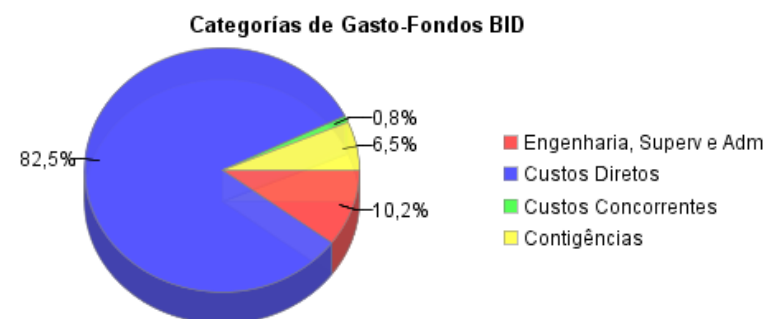
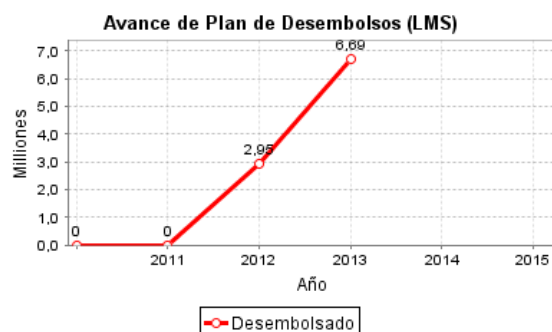



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE ENERGIA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN PABLO		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	2500/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	115.700.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	6.686.963,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	5,78
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	109.013.037,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	115.700.000,00
		Actual BID:	115.700.000,00
		Pari-passu:	58,00
		Co-financiamiento/País:	84.080.000,00
		Estimado Original:	199.780.000,00
		Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: A	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 03-oct-2013 Validado por Representante de País: 04-oct-2013

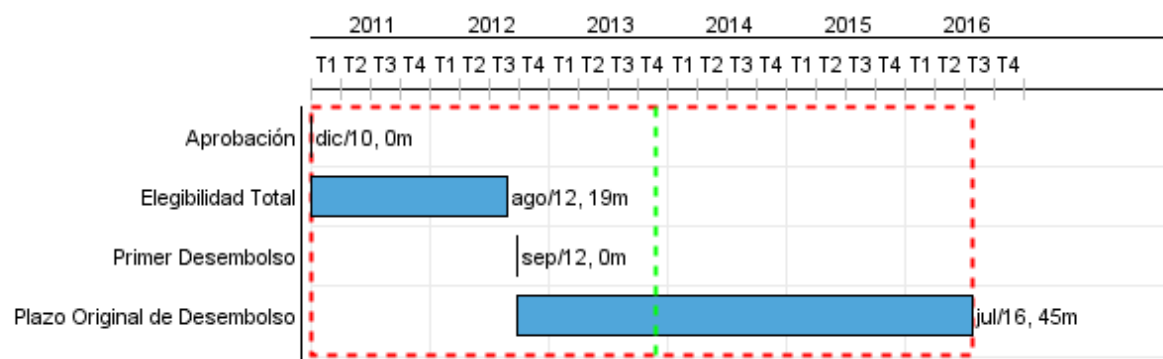

Progreso Acumulado al 2013

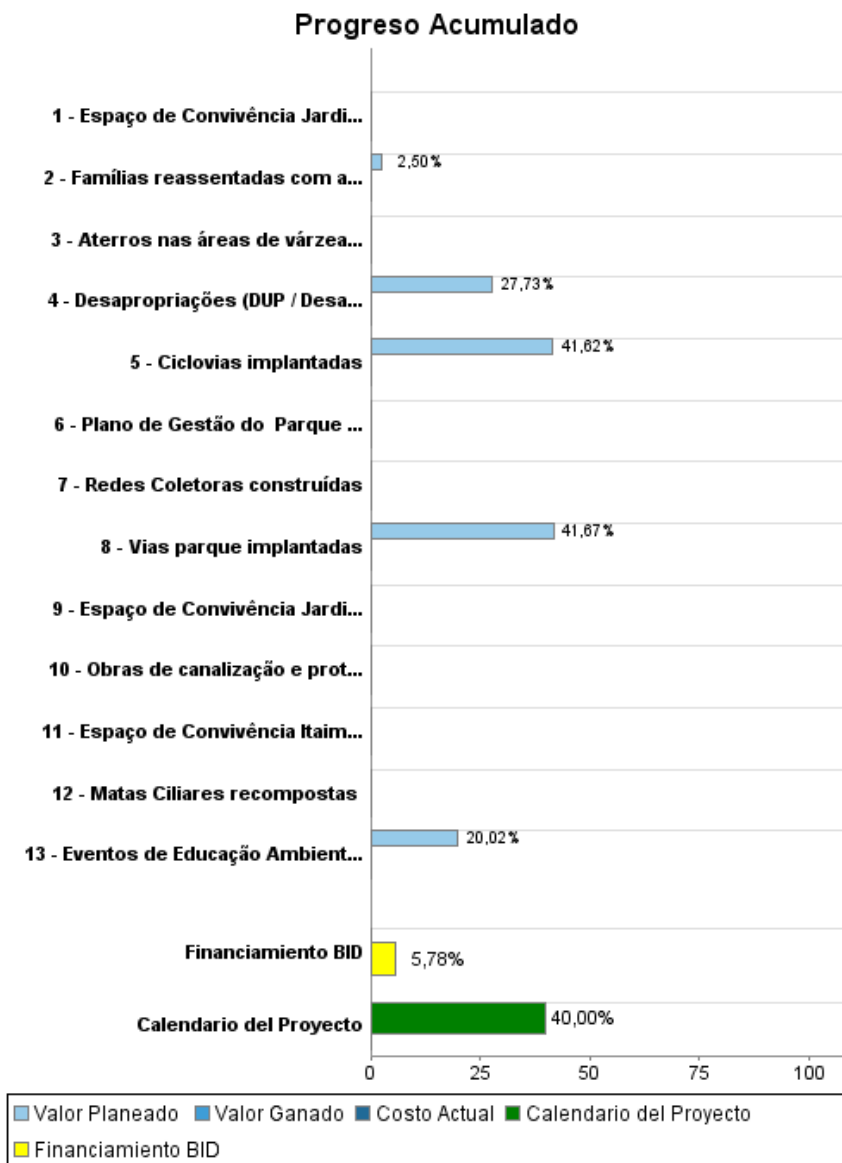

Resultados

Resultado: Capacidade de retenção de água no trecho superior da bacia do rio Tietê ampliada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Tempo de retenção das águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	Horas	12,00	2010	P	12,00	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00
				A		12,00				
Capacidade de retenção de águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	1.000.000 m3		2011	P		0,80	1,30	1,80	2,40	2,80
				A		0,80				

Resultado: Opções de recreação na área do projeto incrementadas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
População beneficiada com opções de recreação.	milhares de habitantes	50,00	2010	P	50,00	50,00	50,00	60,00	80,00	80,00
				A		50,00				

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
OBRAS									
Obras de canalização e proteção de cursos d'água executadas	metro				2.000,00				11.523.000,00
Redes Coletoras construídas	metro				18.000,00				4.212.000,00
Aterros nas áreas de várzeas removidos	1.000.000 m3	50,00			1.150,00				17.689.000,00
Espaço de Convivência Jardim Helena construído	Espaço de Convivência				1,00				19.902.000,00
Espaço de Convivência Itaim Biacica construído	Espaço de Convivência				1,00				13.048.000,00
Espaço de Convivência Jardim Any Jaci construído	Espaço de Convivência				1,00				11.457.000,00
Vias parque implantadas	kilômetro	13,00			48,00	6.425.000,00			15.418.000,00
Ciclovias implantadas	kilômetro	13,00			48,00	2.750.000,00			6.608.000,00
REASSENTAMENTO									
Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas	m²	500.000,00			1.081.172,00	8.500.000,00			30.657.000,00
Famílias reassentadas com atendimento social	Domicílios				500,00	500.000,00			20.020.000,00
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL									
Matas Ciliares recompostas	hectares				72,00				14.954.000,00
Plano de Gestão do Parque implantado	plano				1,35				1.498.000,00
Eventos de Educação Ambiental realizados	evento				15,00	434.000,00			2.168.000,00
OUTROS									
Estudos e Projetos	N/A					4.153.000,00			7.594.000,00
Gerência e Supervisão	N/A					6.714.000,00	1.733.000,00		22.132.000,00
Avaliação	N/A								450.000,00
Auditoria Financeira do Programa	N/A					135.000,00			450.000,00
Custos concorrentes, contingenciais e custos financeiros	N/A								
TOTAL						29.611.000,00	1.733.000,00		199.780.000,00
