



Operation Number: **BR-L1216**
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2014**
Last Update: **10/20/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **10/20/2014**
Division Chief validation date: **10/21/2014**
Country Representative validation date: **10/22/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa Várzeas del Tietê	Loan Number:	2500/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ENERGIA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN PABLO		
Team Leader:	Altafin,Irene Guimarães	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO SAO PAULO	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1216	\$115,700,000.00	\$115,700,000.00	\$84,080,000.00	\$0.00	\$199,780,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1216	\$115,700,000.00	\$12,109,363.00	10.47%	\$103,590,637.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	A
Safeguard Performance Rating:	Partially Unsatisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	O PER ainda não foi elaborado e é um dos documentos claves para poder proceder como o processo de reassentamento pelas famílias.

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

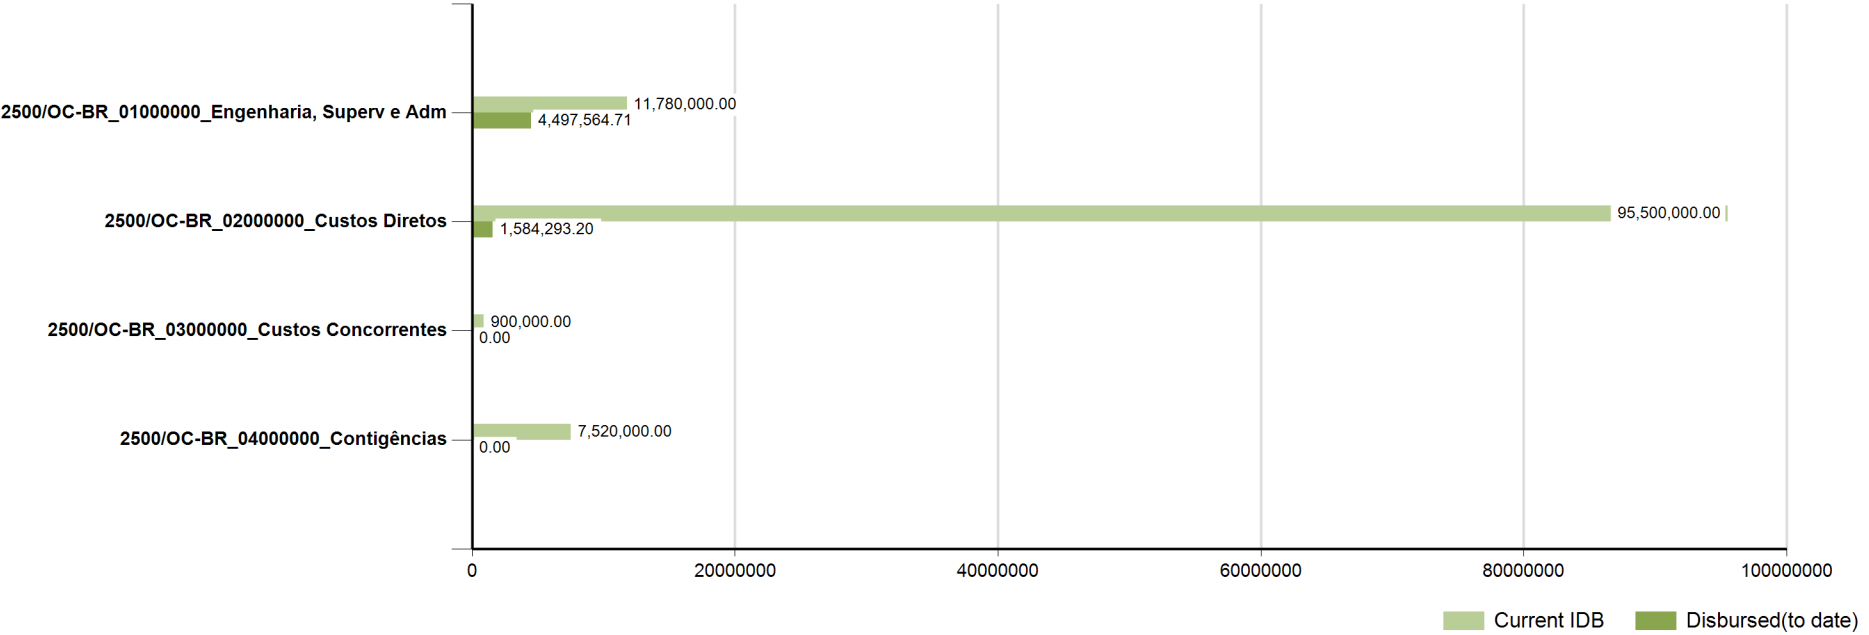

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Áreas de várzeas do Alto Tietê recuperadas								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	EOP
1.1 Permeabilidade das áreas de várzeas		ha permeáveis	0.00	2010	Cálculo de áreas de remoção, desaterro e recuperação de mata ciliar	A Matriz de Resultados não contempla o indicador de impacto, criado para atender ao PMR.	P		128.00
							P(a)	56.50	56.50
							A		

RF - RF Indicator SI - Sector Indicator CI - Country Indicator PG - Pro-Gender PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Capacidade de retenção de água no trecho superior da bacia do rio Tietê ampliada												
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations						
								2011	2012	2013	2014	2015	EOP
1.1 Tempo de retenção das águas no trecho superior da bacia do rio Tietê		Horas	12.00	2010	Informe pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE de medição de propagação de cheias na represa da Penha		P	12.00	12.00	12.00	13.00	14.00	14.00
							P(a)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.50	13.00
	A							12.00	12.00	0.00			
1.2 Capacidade de retenção de águas no trecho superior da bacia do rio Tietê		1.000.000 m3	0.00	2011	Informes pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE de medição de propagação das cheias na represa da Penha		P		0.80	1.30	1.80	2.40	2.80
							P(a)		0.80	1.30	0.80	1.10	1.30
	A							0.80	0.80	0.00			
Outcome:	2 Opções de recreação na área do projeto incrementadas												
Observation:													

Outco	2 Opções de recreação na área do projeto incrementadas
--------------	--

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations							
							2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
2.1 População beneficiada com opções de recreação.		milhares de habitantes	50.00	2010	Informes pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE do número de visitas semanais no Parque Várzeas do Tietê (medidos a cada 6 meses)		P	50.00	50.00	50.00	60.00	80.00	80.00
	P(a)						50.00	50.00	50.00	52.00	65.00	80.00	
	A							50.00	50.00	0.00			

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

OBRAS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Obras de canalização e proteção de cursos d'água executadas	metro	P	1,200.00	2,000.00	P	7,321,000.00	11,523,000.00
		P(a)		2,000.00	P(a)		15,378.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Aterros nas áreas de várzeas removidos	1.000.000 m3	P	550.00	1,150.00	P	7,370,000.00	17,688,000.00
		P(a)		160.00	P(a)	0.00	3,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Espaço de Convivência Itaim Biacica construído	Espaço de Convivência	P		1.00	P	8,307,000.00	13,048,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		10,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Vias parque implantadas	quilômetro	P	18.00	48.00	P	3,802,000.00	15,418,000.00
		P(a)	6.00	8.00	P(a)	6,003,000.00	11,016,000.00
		A	6.00	6.30	A	2,462,093.50	4,702,093.50
Ciclovias implantadas	quilômetro	P	18.00	48.00	P	1,629,000.00	6,607,000.00
		P(a)	13.00	16.00	P(a)	3,965,000.00	11,016,000.00
		A	13.00	13.30	A	2,462,093.50	4,702,093.50
Redes Coletoras construídas	metro	P	11,500.00	18,000.00	P	2,676,000.00	4,212,000.00
		P(a)		18,000.00	P(a)	0.00	5,662,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Espaço de Convivência Jardim Helena construído	Espaço de Convivência	P		1.00	P	11,543,000.00	19,902,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		11,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Espaço de Convivência Jardim Any Jaci construído	Espaço de Convivência	P		1.00	P	7,791,000.00	11,457,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		13,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
REASSENTAMENTO		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas	m²	P	410,845.00	1,081,171.00	P	12,823,000.00	30,657,000.00
		P(a)		1,239,815.00	P(a)		98,340,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Famílias reassentadas com atendimento social	Domicílios	P	3,100.00	7,500.00	P	8,089,000.00	20,021,000.00
		P(a)		600.00	P(a)		22,620,000.00
		A	0.00	10.00	A	0.00	0.00
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Matas Ciliares recompostas	hectares	P	6.00	72.00	P	1,196,000.00	14,953,000.00
		P(a)	2.00	40.00	P(a)		5,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano de Gestão do Parque implantado	plano	P		1.35	P	510,000.00	1,499,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Eventos de Educação Ambiental realizados	evento	P		15.00	P	672,000.00	2,168,000.00
		P(a)		15.00	P(a)		4,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
OUTROS							

Other Cost		2014	Cost
Estudos e Projetos	P	\$2,166,000.00	\$7,595,000.00
	P(a)	\$3,274,000.00	\$22,851,622.00
	A	\$357,294.97	\$503,294.97
Gerência e Supervisão	P	\$5,377,000.00	\$22,131,000.00
	P(a)	\$4,975,000.00	\$20,718,000.00
	A	\$1,794,671.20	\$7,438,671.20
Avaliação	P	\$180,000.00	\$450,000.00
	P(a)	\$24,000.00	\$600,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Auditoria Financeira do Programa	P	\$60,000.00	\$450,000.00
	P(a)	\$101,000.00	\$700,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Custos concorrentes, contingenciais e custos financeiros	P		
	P(a)		\$0.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$81,512,000.00	\$199,779,000.00
	P(a)	\$18,342,000.00	\$61,898,153.17
	A	\$7,076,153.17	\$17,346,153.17

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
