
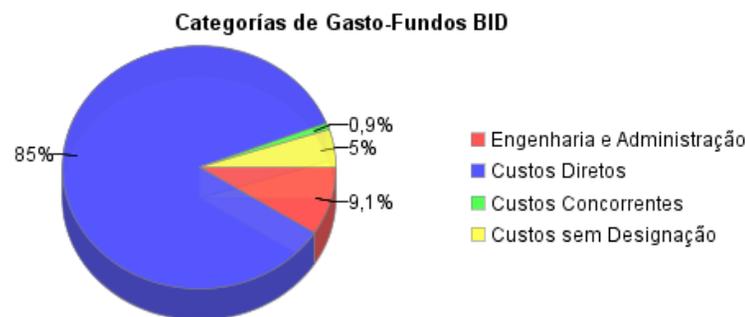



## Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (SABESP)	Atual:	600.000.000,00	Original BID:	600.000.000,00
Setor:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY	Desembolsado:	949.075,55	Corrente BID:	600.000.000,00
Número da Operação:	2202/OC-BR	% Desembolsado:	0,16	Pari-passu:	36,52
Estágio:	Approved	Saldo:	599.050.924,45	Cofinanciamento/País:	200.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento			Original Estimado:	800.000.000,00
Operação Relacionada:				Período de Amortização (meses):	222
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation				

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 24, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 20, 2011

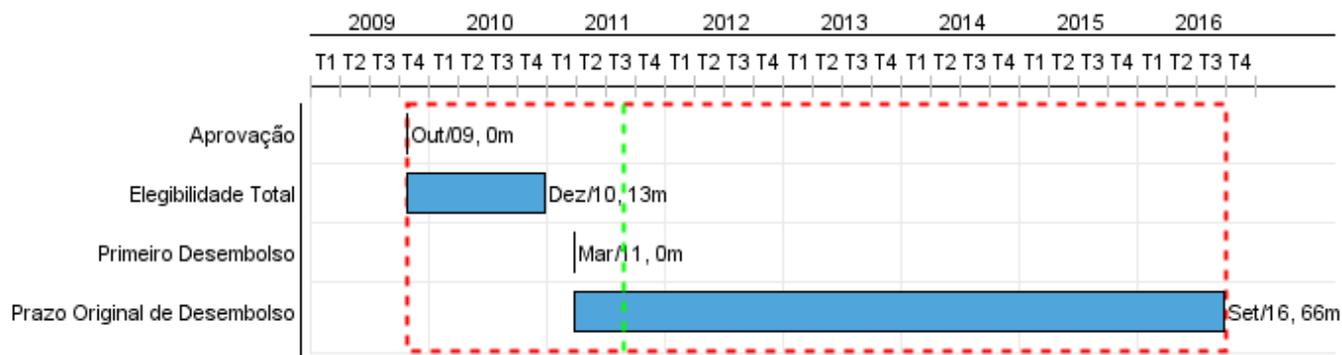

## Progresso Acumulado até 2010

Progresso Acumulado

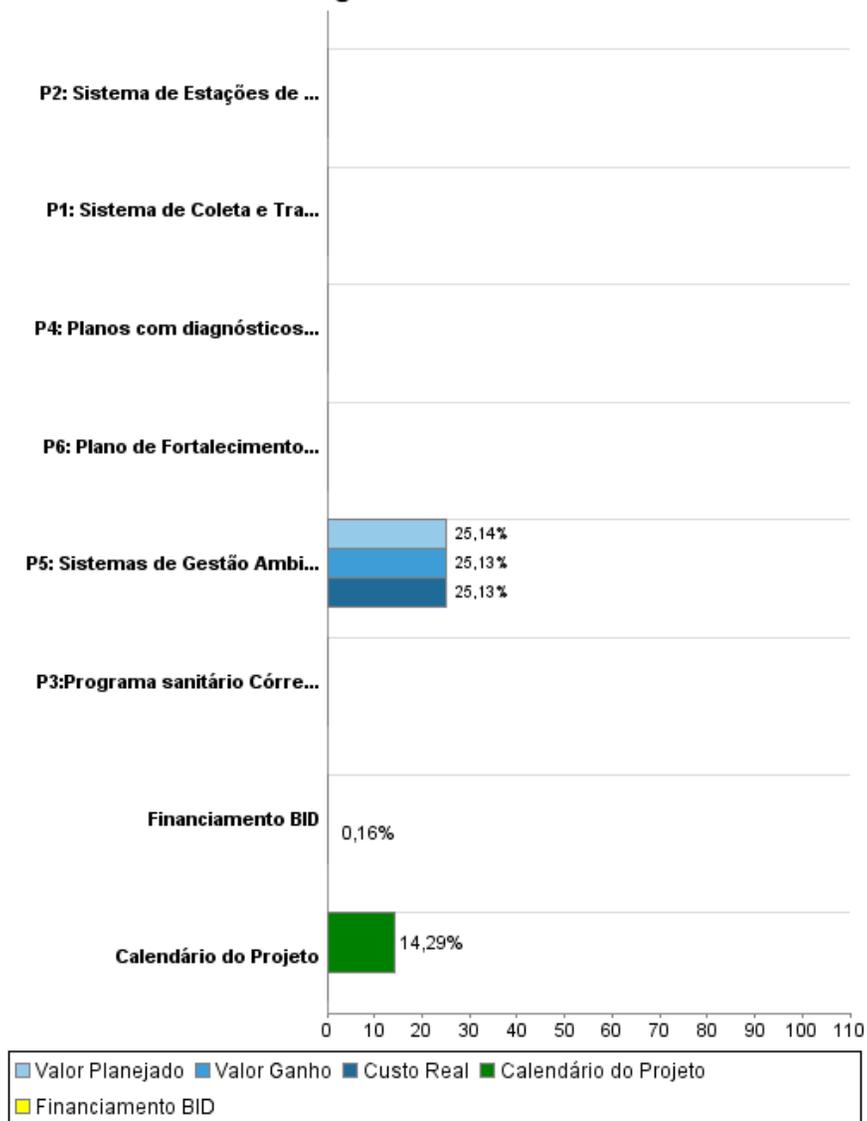

## Resultados

**Resultado:** Coleta e tratamento do esgoto pela SABESP, na RMSP, ampliado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Incremento do Índice de Coleta do esgoto na RMSP.	%	83,00	2008	P A	87,00
Incremento no Índice de Tratamento do esgoto coletado na RMSP.	%	66,00	2008	P A	84,00
Média anual de volume de esgoto tratado pela SABESP, na RMSP.	M3/Seg	14,00	2008	P A	21,00

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010**

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>COMPONENTE 1: Infraestrutura da rede sanitária da SABESP, na RMSP, ampliada.</b>									
P1: Sistema de Coleta e Transporte de esgoto da SABESP na RMSP, ampliado / Numero de conexoes de esgoto.	Hogares				200.000,00				360.765.000,00
P2: Sistema de Estações de Tratamento de esgotos na RMSP, ampliado	Estações				14,00				157.800.000,00
P3: Programa sanitário Córrego Limpo, implantado.	Programa				1,00				40.000.000,00
<b>COMPONENTE 2: Resultados Operacionais e Institucionais do Sistema SABESP, incrementados.</b>									
P4: Planos com diagnósticos para melhorias e	Planos				6,00				22.500.000,00
P5: Sistemas de Gestão Ambiental e de Controle de cargas para fortalecer o Sistema SABESP, implantado.	Sistemas				2,00	1.445.340,00	1.445.000,00		5.750.000,00
P6: Plano de Fortalecimento do Departamento Técnico Operacional da SABESP, implantado.	Plano				1,00				17.100.000,00
<b>COMPONENTE 3: Outros custos p/ monitoramento</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.445.340,00</b>	<b>1.445.000,00</b>		<b>603.915.000,00</b>
