
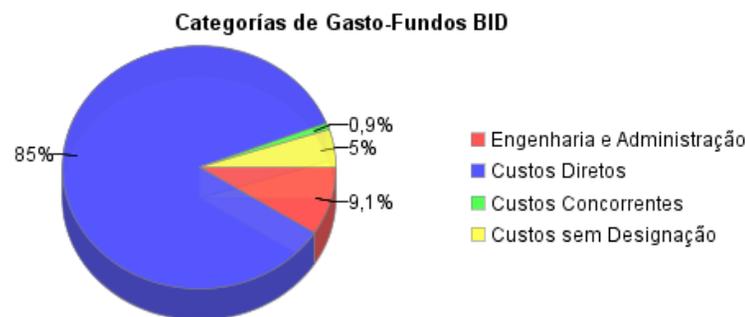


Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (SABESP)	Atual:	600.000.000,00	Original BID:	600.000.000,00
Setor:	WATER AND SANITATION	Desembolsado:	169.325.867,96	Corrente BID:	600.000.000,00
Número da Operação:	2202/OC-BR	% Desembolsado:	28,22	Pari-passu:	75,00
Estágio:	Approved	Saldo:	430.674.132,04	Cofinanciamento/País:	200.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento			Original Estimado:	800.000.000,00
Operação Relacionada:				Período de Amortização (meses):	222
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation				

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 06-may-2013 Validado pelo Representante do País: 06-may-2013

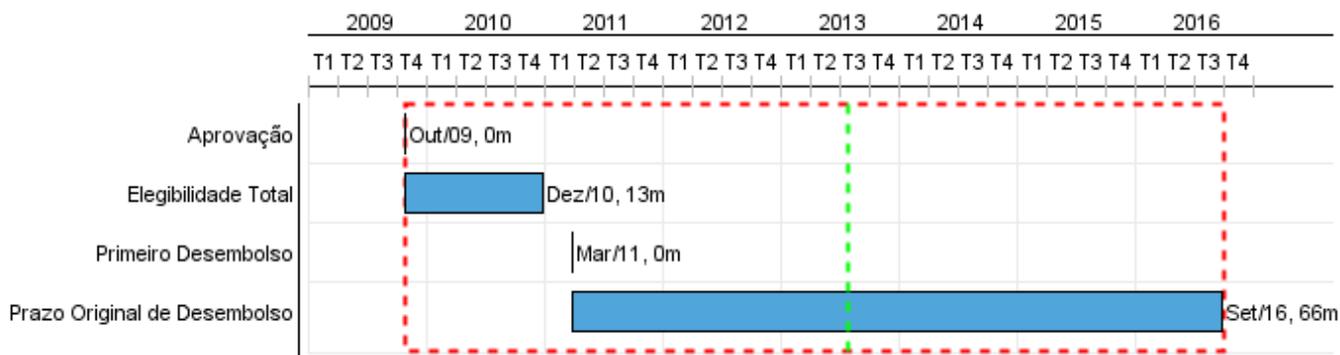

Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado

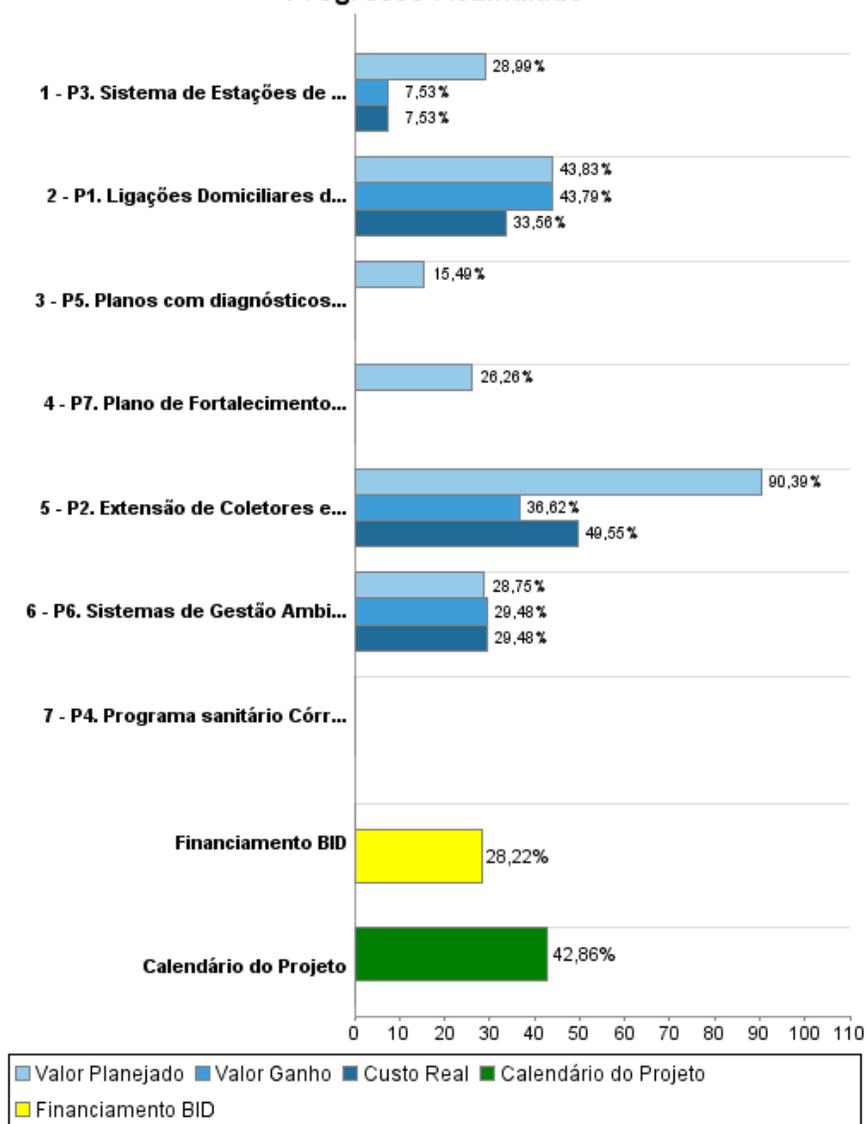

Resultados

Resultado: Coleta de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ampliada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Índice de Coleta do esgoto na RMSP, na área de atuação da SABESP.	%	83,00	2008	P A	87,00

Resultado: Tratamento de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo, ampliado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Índice de Tratamento do esgoto coletado na RMSP, na área de atuação da SABESP.	%	66,00	2008	P A	84,00
Média anual de volume de esgoto tratado pela SABESP, na RMSP.	m3/seg	14,00	2008	P A	21,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
COMPONENTE 1: Sistemas de Esgotos da SABESP, na RMSP, ampliado.									
P1. Ligações Domiciliares de Esgotos, executadas	Hogares	197.943,00	454.268,00		602.593,00	18.721.000,00	25.496.000,00		118.265.000,00
P2. Extensão de Coletores e Interceptores, implantados	km	65,00	46,00		420,00	78.199.000,00	78.862.000,00		242.500.000,00
P3. Sistema de Estações de Tratamento de esgotos na RMSP, ampliado	Estações				13,00	11.864.000,00	7.347.000,00		157.800.000,00
P4. Programa sanitário Córrego Limpo, implantado.	Programa				1,00				40.000.000,00
COMPONENTE 2: Melhoria dos Processos Operacionais e Institucionais do Sistema SABESP.									
P5. Planos com diagnósticos para melhorias e fortalecimento institucional executados.	Planos				6,00	2.000.000,00			22.500.000,00
P6. Sistemas de Gestão Ambiental e de Controle de cargas para fortalecer o Sistema SABESP, implantado.	Sistemas				2,00				5.750.000,00
P7. Plano de Fortalecimento do Departamento Técnico Operacional da SABESP, implantado.	Plano	2,00			5,00				17.100.000,00
COMPONENTE 3: Outros custos p/ monitoramento									
P8. Monitoramento das Atividades de Supervisão e Administração.	N/A					21.001.000,00	16.363.000,00		196.085.000,00
TOTAL						131.785.000,00	128.068.000,00		800.000.000,00
