
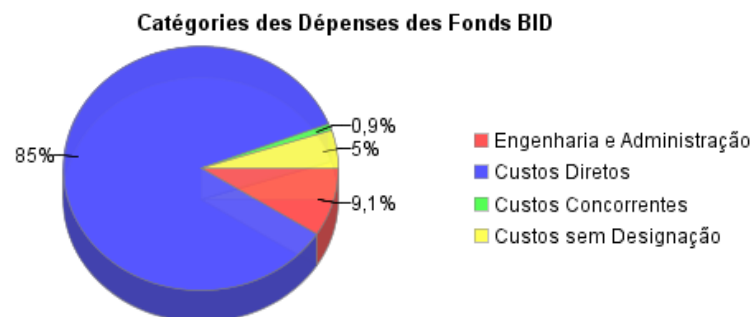
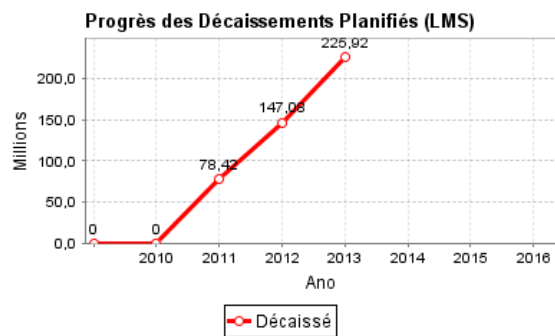



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (SABESP)				
Secteur:	WATER AND SANITATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	2202/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	600.000.000,00	Initial BID:	600.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	211.202.107,78	Courant BID:	600.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	35,20	Pari Passu:	75,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	388.797.892,22	Cofinancement/Pays:	200.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	800.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	222

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 20-sep-2013 Validé par le Représentant: 25-sep-2013

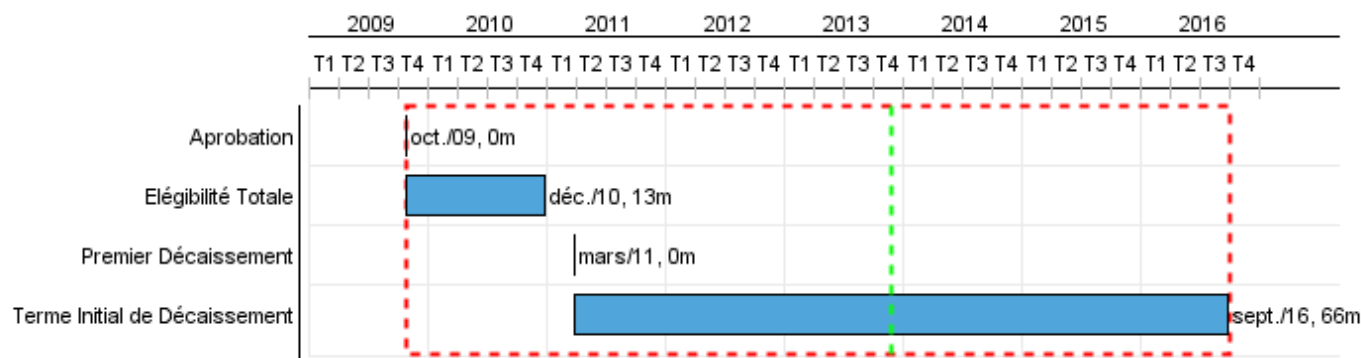

Progrès Cumulé à 2013

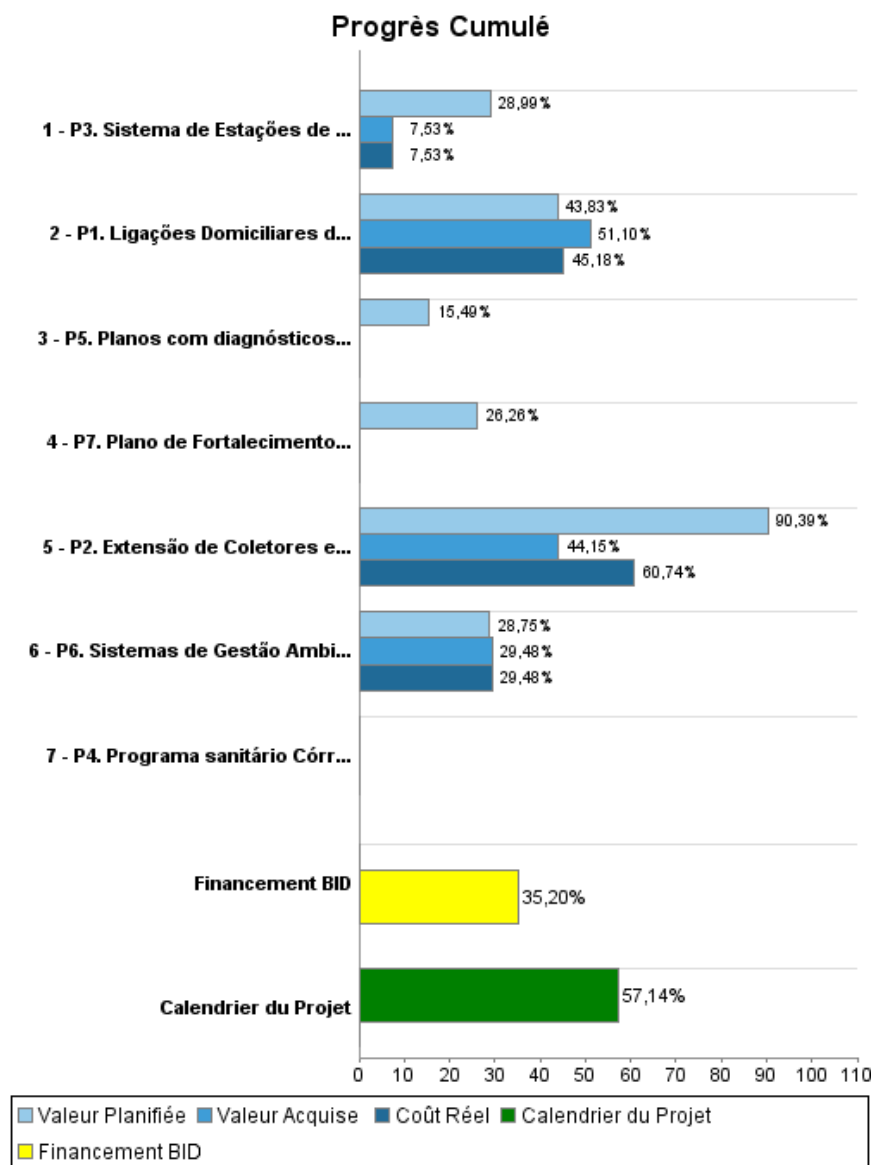

Résultats

Résultat:	Coleta de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ampliada.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	2015	Fin du Projet
Indice de Coleta do esgoto na RMSP, na área de atuação da SABESP.	%	83,00	2008	P A			87,00

Résultat:	Tratamento de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo, ampliado.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	2015	Fin du Projet
Indice de Tratamento do esgoto coletado na RMSP, na área de atuação da SABESP.	%	66,00	2008	P A			84,00
Média anual de volume de esgoto tratado pela SABESP, na RMSP.	m3/seg	14,00	2008	P A			21,00
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Domicílios		2013	P A	50.000,00	45.732,00	602.593,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
COMPONENTE 1: Sistemas de Esgotos da SABESP, na RMSP, ampliado.									
P1. Ligações Domiciliares de Esgotos, executadas	Domicílios	50.000,00	25.000,00		602.593,00	17.294.000,00	13.746.000,00		118.265.000,00
P2. Extensão de Coletores e Interceptores, implantados	km	65,00	12,00		420,00	98.914.000,00	27.127.000,00		242.500.000,00
P3. Sistema de Estações de Tratamento de esgotos na RMSP, ampliado	Estações				13,00	24.750.000,00			157.800.000,00
P4. Programa sanitário Córrego Limpo, implantado.	Programa				1,00				40.000.000,00
COMPONENTE 2: Melhoria dos Processos Operacionais e Institucionais do Sistema SABESP.									
P5. Planos com diagnósticos para melhorias e fortalecimento institucional executados.	Planos				6,00	1.486.000,00			22.500.000,00
P6. Sistemas de Gestão Ambiental e de Controle de cargas para fortalecer o Sistema SABESP, implantado.	Sistemas				2,00				5.750.000,00
P7. Plano de Fortalecimento do Departamento Técnico Operacional da SABESP, implantado.	Plano	2,00			5,00	4.490.000,00			17.100.000,00
COMPONENTE 3: Outros custos p/ monitoramento									
P8. Monitoramento das Atividades de Supervisão e Administração.	N/A					19.629.000,00	9.102.000,00		196.085.000,00
TOTAL						166.563.000,00	49.975.000,00		800.000.000,00
