

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	Secretaria de Medio Ambiente São Paulo
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Numéro(s) de Prêt(s):	2376/OC-BR
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1400
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	162.454.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	35.137.733,70
% Décaissé:	21,63
Solde:	127.316.266,30

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	162.454.000,00
Courant BID:	162.454.000,00
Pari Passu:	35,00
Cofinancement/Pays:	307.709.000,00
Estimation Initiale:	470.163.000,00
Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 08-abr-2013

Validé par le Représentant: 12-abr-2013

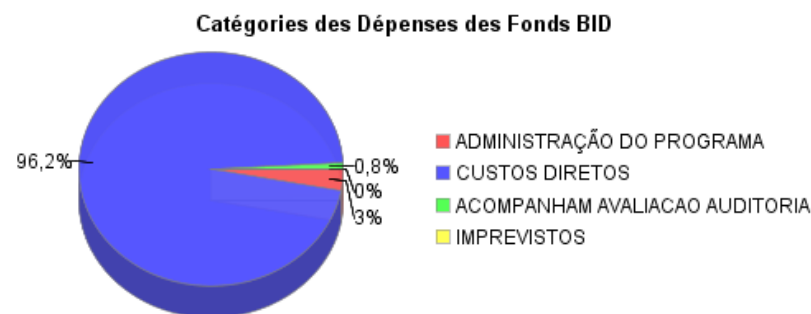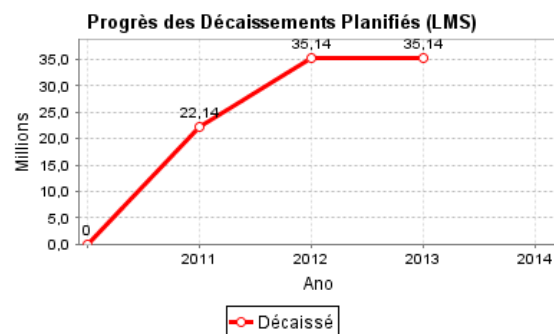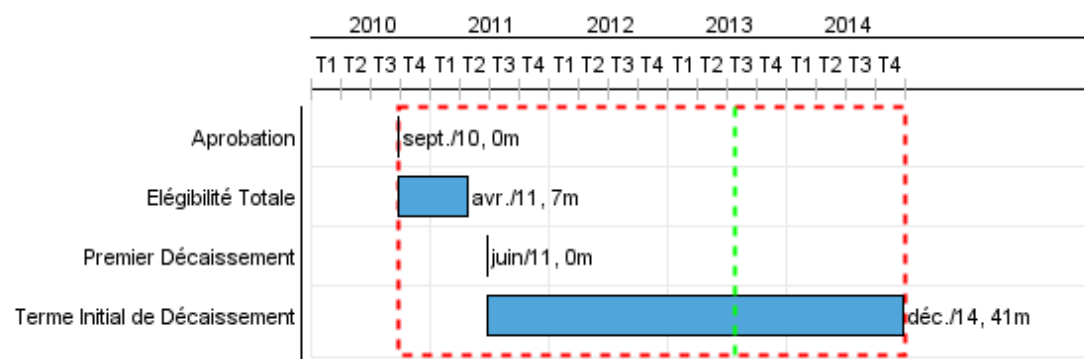

Progrès Cumulé à 2012

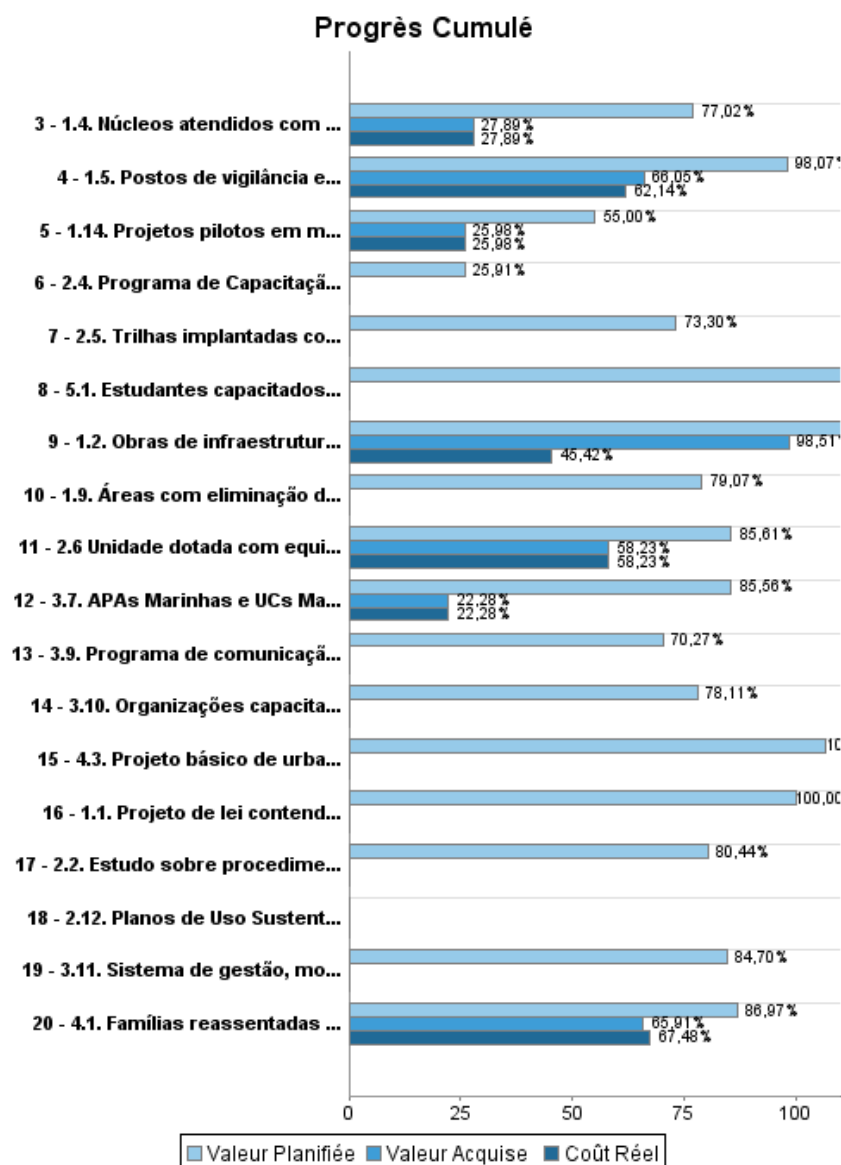


RAPPORT DE SUIVI

BR-L1241 - Serra do Mar and Atlantic Forest Mosaics System Socioenvironmental
Recovery
2012 2º período com cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 03/04/2013

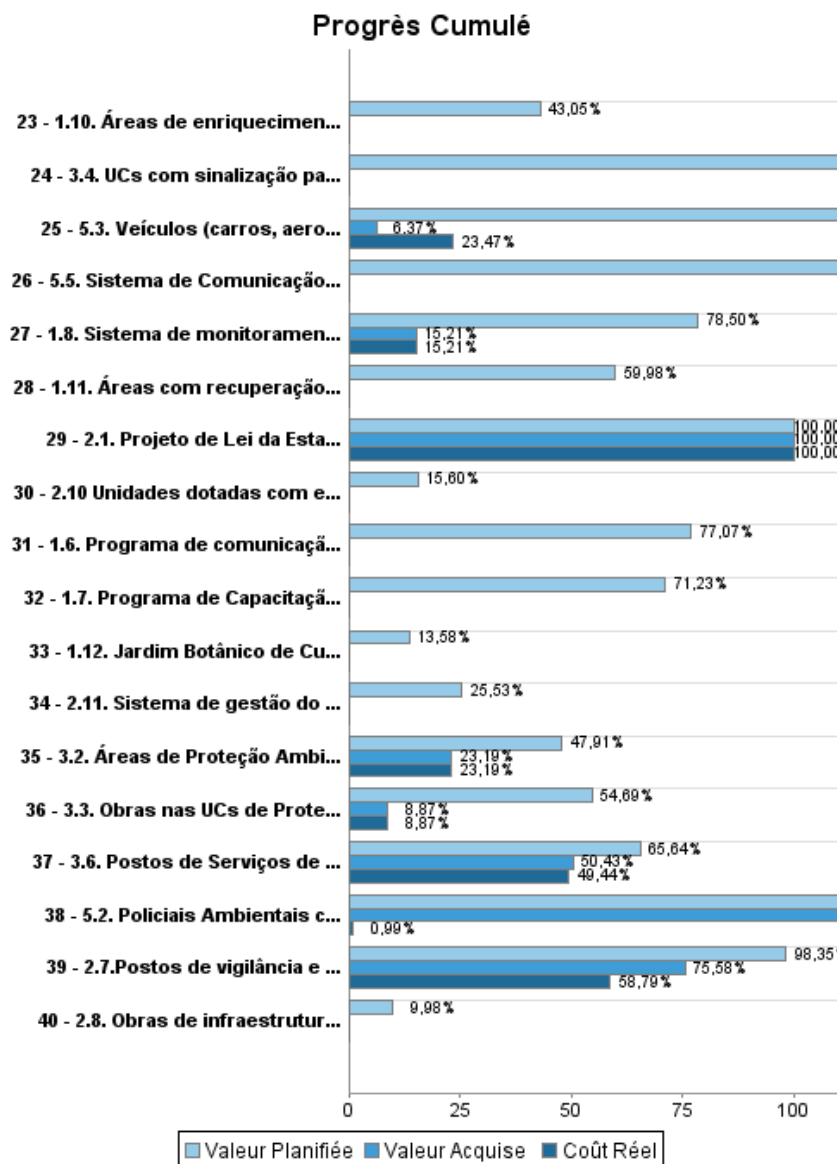


RAPPORT DE SUIVI

BR-L1241 - Serra do Mar and Atlantic Forest Mosaics System Socioenvironmental
Recovery
2012 2º período com cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 03/04/2013

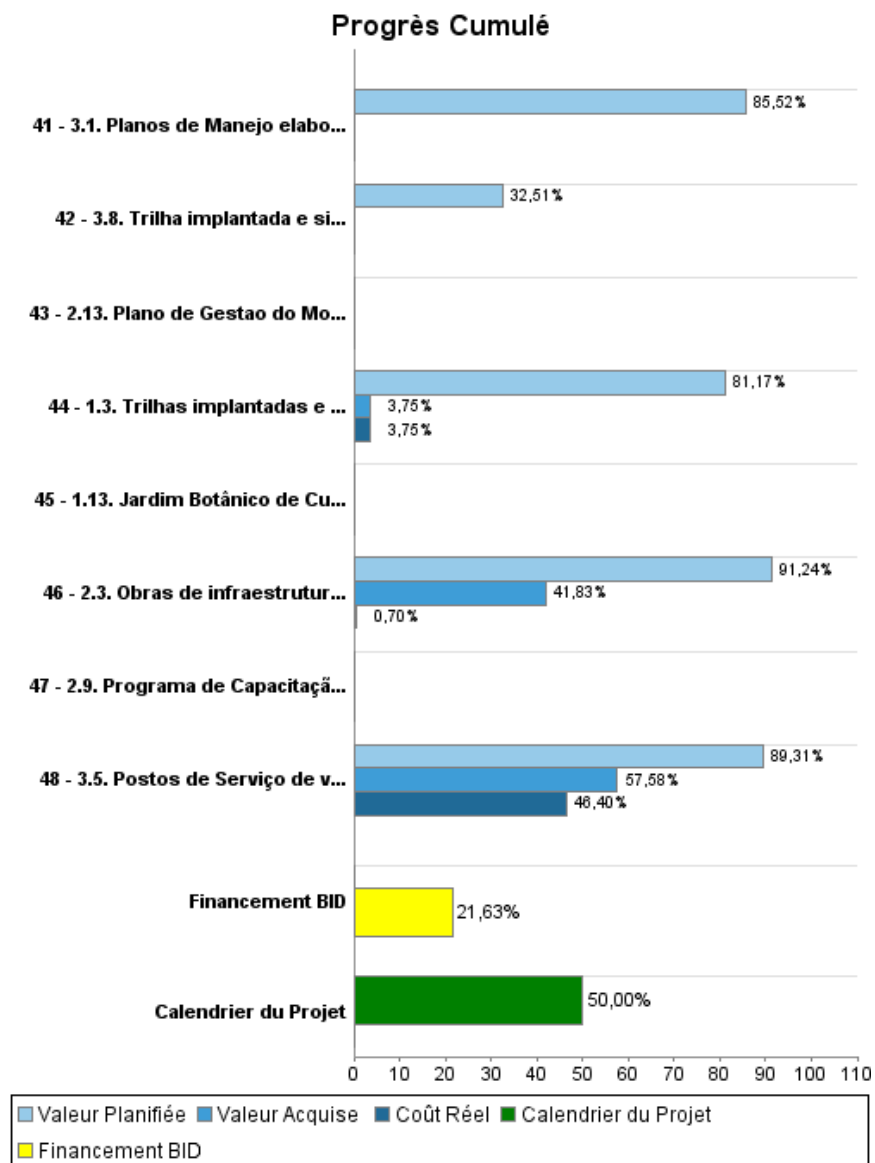

Résultats

Résultat:	Resultado 1: GESTÃO DAS UCs MELHORADAS
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
Número de habitações reocupando áreas que tem sido desocupadas pelo programa	Habitações		2010	P A		
Índice de ilegalidade, medindo o nível de ocupação ilegal	%	10,44	2010	P A	9,40	9,40
Índice de cobertura de fiscalização, indicando % de setores das UCs fiscalizadas	%	50,00	2011	P A	100,00	100,00
Índice de Qualidade da Eficácia e Gestão das Unidades de Conservação do Programa	Pontos	66,70	2010	P A	71,00	71,00

Résultat:	Resultado 2: IMPACTO ANTRÓPICO REDUZIDO
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
% del área antropizada no Parque Estadual Serra do Mar (PESM) del total del área del PESH (315.000 ha)	%	5,00	2010	P A	3,00	3,00
Área liberada en el PESH para recuperación ambiental	Há		2010	P A	90,00	90,00

Résultat:	Resultado 3: QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO PROJETO MELHORADA
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
Índice de Qualidade de Vida das famílias reassentadas	Pontos		2010	P A		0,60
Índice de Qualidade de Vida das famílias permanentes	Pontos		2010	P A		0,51

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
COMPONENTE 1:PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO									
1.1. Projeto de lei contendo os novos limites do Parque Estadual Serra do Mar (PESM) desenvolvido	Projeto	1,00			1,00	234.193,00			234.193,00
1.2. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública do PESH completadas	Obras	4,00	5,00		20,00	2.589.421,00	743.234,85		4.696.999,00
1.3. Trilhas implantadas e sinalizadas	Trilhas				6,00	767.544,00	39.742,86		2.061.403,00
1.4. Núcleos atendidos com equipamento e custeio operacional	Núcleos				9,00	1.023.868,00	352.316,02		3.277.884,00
1.5. Postos de vigilância e monitores ambientais contratados	Posto	35,00	14,00		120,00	2.014.176,00	517.203,00		7.383.601,00
1.6. Programa de comunicação e divulgação do PESH desenvolvido e implantado	Programa				1,00	301.096,00			1.331.359,00
1.7. Programa de Capacitação de gestores e equipe operacional	Progama				2,00	195.175,00			624.999,00
1.8. Sistema de monitoramento ambiental desenvolvida	Sistema				1,00	315.792,00	123.464,61		1.229.623,00
1.9. Áreas com eliminação de exóticas	Hectares				200,00	297.298,00			1.256.282,00
1.10. Áreas de enriquecimento florestal	Hectares				850,00	336.468,00			1.371.649,00
1.11. Áreas com recuperação ambiental - Cubatão	Hectares	45,00			90,00	263.158,00			1.714.175,00
1.12. Jardim Botânico de Cubatão (JBC) construído	Jardim Botânico				1,00	723.201,00			17.145.631,00
1.13. Jardim Botânico de Cubatão (JBC) operando	Jardim Botânico				1,00				1.898.938,00
1.14. Projetos pilotos em metodologia e procedimentos para a regularização fundiária implementados no PESH	Projetos Pilotos				2,00	32.807,00	674.517,90		2.595.921,00
2.1. Projeto de Lei da Estação Ecológica (E.Ec.) Jureia-Itatins encaminhado pela Assembléia Legislativa	Projeto	1,00	1,00		1,00				25.629,00
2.2. Estudo sobre procedimentos para regularização fundiária e reassentamento na E. Ec. finalizados	Estudo				1,00	200.073,00			1.852.441,00
2.3. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública	Obras	1,00	1,00		6,00	1.993.636,00	33.427,31		4.766.267,00
2.4. Programa de Capacitação nas Unidades de Proteção Integral	Programa				1,00	130.884,00			505.240,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
2.5. Trilhas implantadas com Plano de Riscos e Contingências	km				12,00	63.962,00			285.087,00
2.6 Unidade dotada com equipamentos e manutenção operacional	UC				1,00	343.677,00	295.795,10		1.245.237,00
2.7.Postos de vigilância e monitoramento ambiental implementado	Postos	15,00	13,00		46,00	1.399.094,00	471.518,71		4.412.661,00
2.8. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública nas UCs do Mosaico	Obras				7,00				1.843.799,00
2.9. Programa de Capacitação nas Unidades de Uso Sustentável	Programa				1,00				357.479,00
2.10 Unidades dotadas com equipamentos e manutenção operacional	UC				6,00				391.063,00
2.11. Sistema de gestão do Mosaico Jureia-Itatins desenvolvido e em execução	Sistema				3,00				1.574.562,00
2.12. Planos de Uso Sustentável elaborados	Planos				2,00				1.190.791,00
3.1. Planos de Manejo elaborados	Plano				4,00	597.300,00			1.701.757,00
3.2. Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Marinhas com manutenção operacional instalados	APA				3,00	82.919,00	162.758,05		789.472,00
3.3. Obras nas UCs de Proteção Integral do Mosaico de UCs Marinhas completadas	Obra				5,00	18.208,00	13.731,29		2.192.183,00
3.4. UCs com sinalização parcial dos limites e atrativos completados	UC				2,00	21.930,00			213.597,00
3.5. Postos de Serviço de vigilância patrimonial contratados	Posto	10,00	6,00		26,00	853.849,00	217.210,64		2.638.991,00
3.6. Postos de Serviços de Monitores Ambientais contratados	Monitor Ambiental	5,00	9,00		26,00	80.674,00	135.058,29		1.021.929,00
3.7. APAs Marinhas e UCs Marinhas de Proteção Integral equipados e operacionalizado	UC				8,00	775.791,00	236.563,63		1.654.777,00
3.8. Trilha implantada e sinalizada	Trilha				1,00	21.930,00			122.808,00
3.9. Programa de comunicação e divulgação implantado	Programa				1,00	149.123,00			629.202,00
3.10. Organizações capacitados através do Programa de Capacitação para Sustentabilidade das APAs Marinhas	Organizações				48,00	153.509,00			324.561,00
3.11. Sistema de gestão, monitoramento e informação das APAs Marinhas implantado	Sistema				1,00	109.650,00			497.806,00
2.13. Plano de Gestao do Mosaico Jureia Itatins	Plano				1,00				
COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS SOCIAIS									

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
4.1. Famílias reassentadas de acordo com o Plano de Reassentamento	Famílias	1.299,00	963,00		6.980,00	98.434.007,00	57.056.102,00		436.124.970,00
4.2. Famílias com ocupação consolidada por meio da urbanização e regularização fundiária	Famílias	900,00	525,00		1.980,00	40.622.944,00	39.849.891,00		119.422.645,00
4.3. Projeto básico de urbanização e reassentamento para famílias nos sectores sul e norte do PESM elaborado	Projeto				5,00	6.358.000,00			8.539.000,00
COMPONENTE 3: FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO									
5.1. Estudantes capacitados através do Programa de Educação Socioambiental	Estudantes				30.000,00	344.440,00			573.384,00
5.2. Policiais Ambientais capacitados através do Programa de Capacitação Técnica	Policiais	180,00	300,00		565,00	670.506,00	3.114,29		1.016.175,89
5.3. Veículos (carros, aeronave e embarcações) comprados	Veiculos	7,00			69,00	14.593.391,00	3.138.461,65		18.349.251,00
5.4. Contratos de Operação e Manutenção essencial dos equipamentos a serem utilizados na fiscalização das UCs	Contrato	2,00	1,00		7,00	2.738.793,00	605.417,83		6.857.262,00
5.5. Sistema de Comunicação Digital implantado	Sistema				1,00	50.000,00			150.000,00
5.6. Contrato de obras e reformas das bases para execução da fiscalização executados	Obras				7,00	6.545.871,00			13.059.980,00
5.7. Sistema GIS implantado	Sistema				1,00	614.028,00			614.028,00
Outros									
Administração, Supervisão e Custos Indiretos.	N/A					307.768,00	715.636,08		10.739.000,00
TOTAL						187.370.154,00	105.385.165,11		692.505.691,89
