
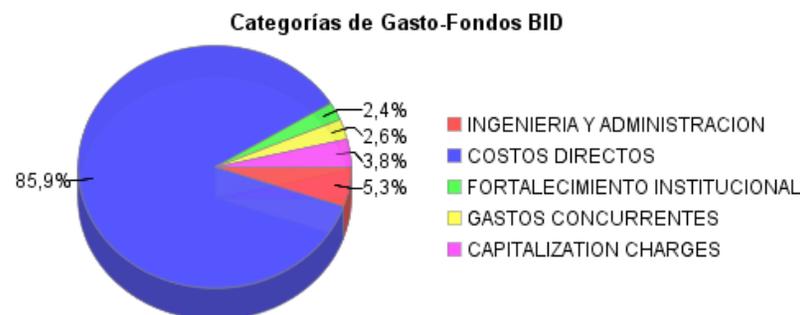
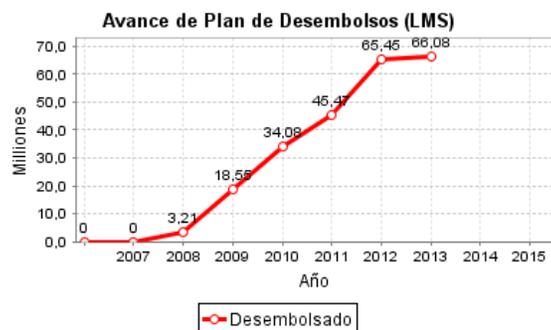


Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Administradora Boliviana de Carreteras	Monto Aprobado Actual:	120.000.000,00	BID Original:	120.000.000,00
Sector:	TRANSPORT	Monto Desembolsado a la fecha:	65.750.270,34	Actual BID:	120.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	1833/SF-BO	% Desembolsado:	54,79	Pari-passu:	100,00
Etapas:	Approved	Saldo:	54.249.729,66	Co-financiamiento/País:	
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	120.000.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	BO-T1054			Período de Amortización (meses):	354
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 02-oct-2013 Validado por Representante de País: 08-oct-2013

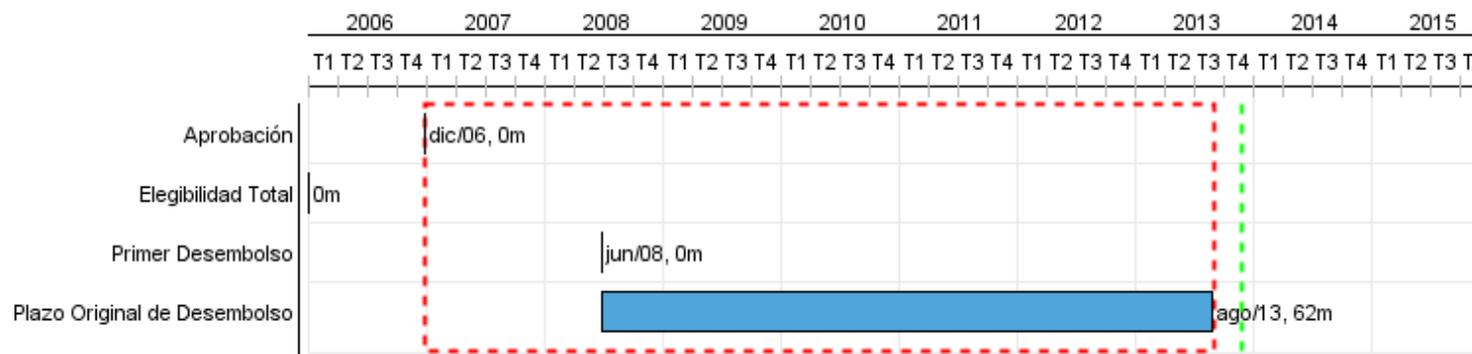

Progreso Acumulado al 2013

Progreso Acumulado

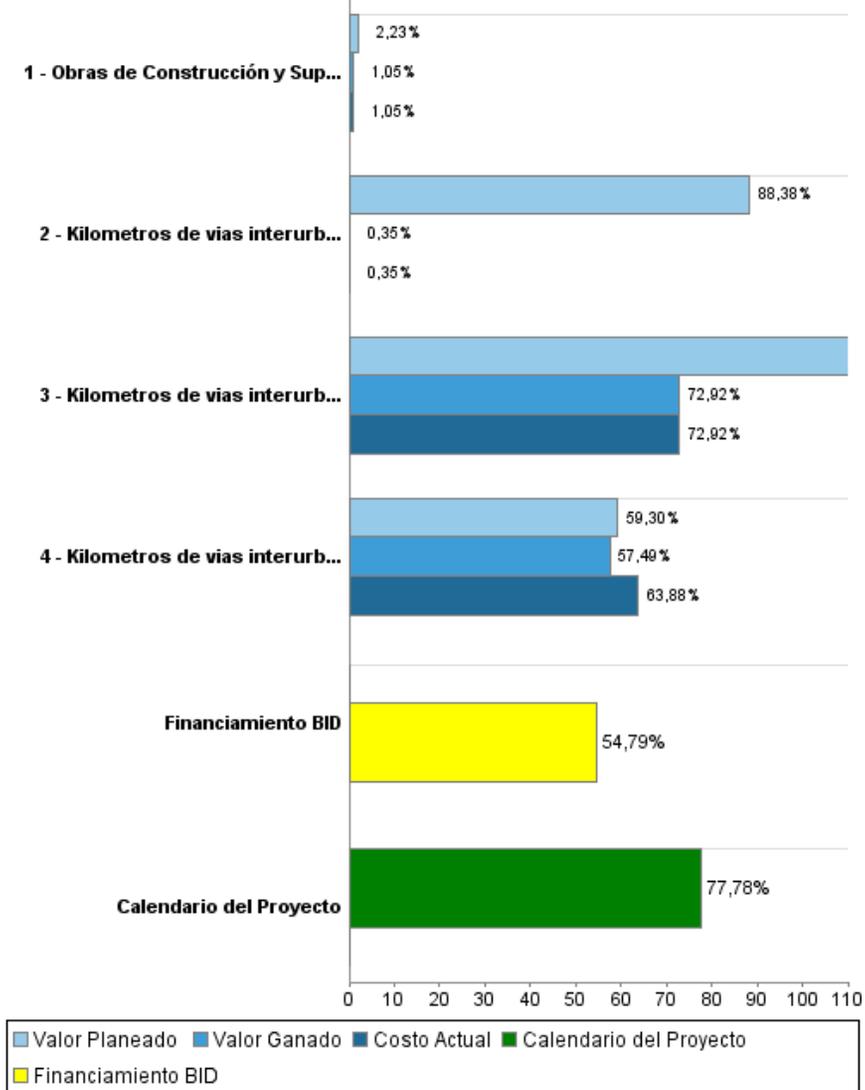

Resultados
Resultado: Red vial en el corredor Quiquibey -Yucumo - Rurrenabaque mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	Fin de Proyecto
Tiempo de viaje de vehículos pesados.	Hrs	18,50	2010	P A		12,00
IRI	IRI	6,50	2010	P A		3,00
Tráfico vehicular diario en tramo Yucumo - Rurrenabaque.	Vehículos	209,00	2007	P A		575,00
Tráfico vehicular diario en tramo Yucumo - San Borja.	Vehículos	360,00	2007	P A		575,00
Costos de operación vehicular tramo Yucumo - Rurrenabaque.	Porcentaje	100,00	2011	P A	20,00	80,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
COMPONENTE 1: Mejoramiento, Rehabilitación y Pavimentación Vial									
Kilometros de vías interurbanas construidas (Tramo Quiquibey-Yucumo rehabilitado y pavimentado)	Kilómetros				41,00	6.000.000,00			18.243.020,00
Kilometros de vías interurbanas construidas (Tramo Yucumo-Rurrenabaque pavimentado)	Kilómetros	20,00			101,00	10.000.000,00	4.376.000,00		68.493.360,00
Kilometros de vías interurbanas construidas (Tramo Yucumo-San-Borja mejorado en afirmado)	Kilómetros				53,00	500.000,00			5.162.640,00
Componente 2: Construcción del Puente Rurrenabaque - San Buenaventura.									
Obras de Construcción y Supervisión Técnica del Puente Rurrenabaque - San Buenaventura y sus Accesos.	Puente				1,00				17.000.000,00
Componente 3: Fortalecimiento Institucional.									
Plan de gestión ambiental elaborado	N/A					50.000,00			500.000,00
Apoyo a la gestión de la ABC - Consultorías y estudios	N/A					250.000,00	37.000,00		1.666.200,00
Apoyo a la gestión de la ABC - Adquisición de bienes, equipos y vehículos	N/A					100.000,00			1.179.800,00
Apoyo a la gestión de la ABC - Capacitación de RRHH y Alta Gerencia de la ABC	N/A					20.000,00			64.000,00
Componente 4: Otros									
Indemnizaciones	N/A					1.350.000,00			2.600.000,00
Unidad de administración del programa	N/A					25.000,00	6.700,00		300.000,00
Auditoría	N/A					20.000,00			241.000,00
Gastos Financieros	N/A					1.000.000,00	296.320,00		4.550.000,00
TOTAL						19.315.000,00	4.716.020,00		120.000.020,00
