

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	Perfeitura Municipal de São José dos Campos
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Número da Operação:	2323/OC-BR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	RG-P1374
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	85.672.400,00
Desembolsado:	5.514.863,12
% Desembolsado:	6,44
Saldo:	80.157.536,88

Custo Total e Fonte

Original BID:	85.672.400,00
Corrente BID:	85.672.400,00
Pari-passu:	48,00
Cofinanciamento/País:	92.353.800,00
Original Estimado:	178.026.200,00
Período de Amortização (meses):	168

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 24-abr-2012
Validado pelo Representante do País: 24-abr-2012

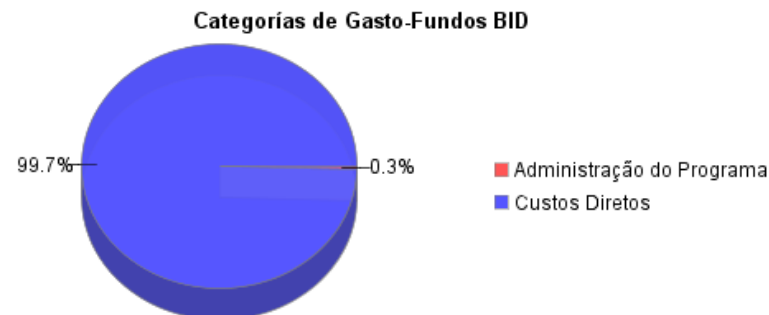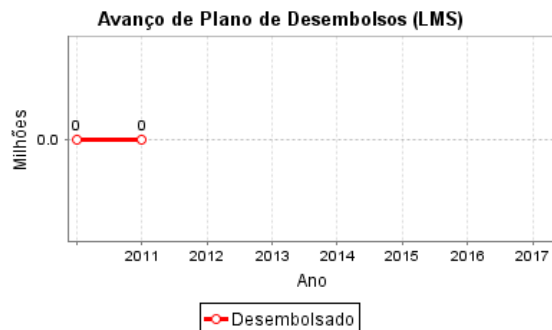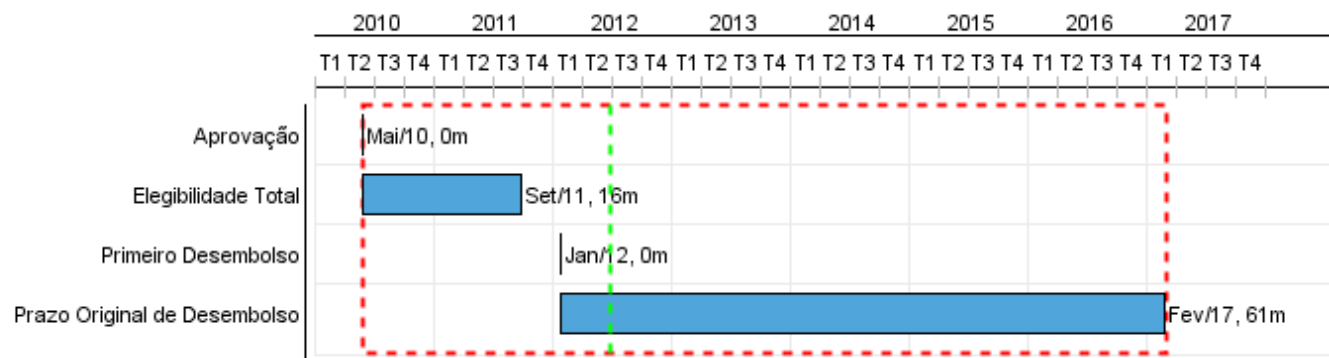

Progresso Acumulado até 2011

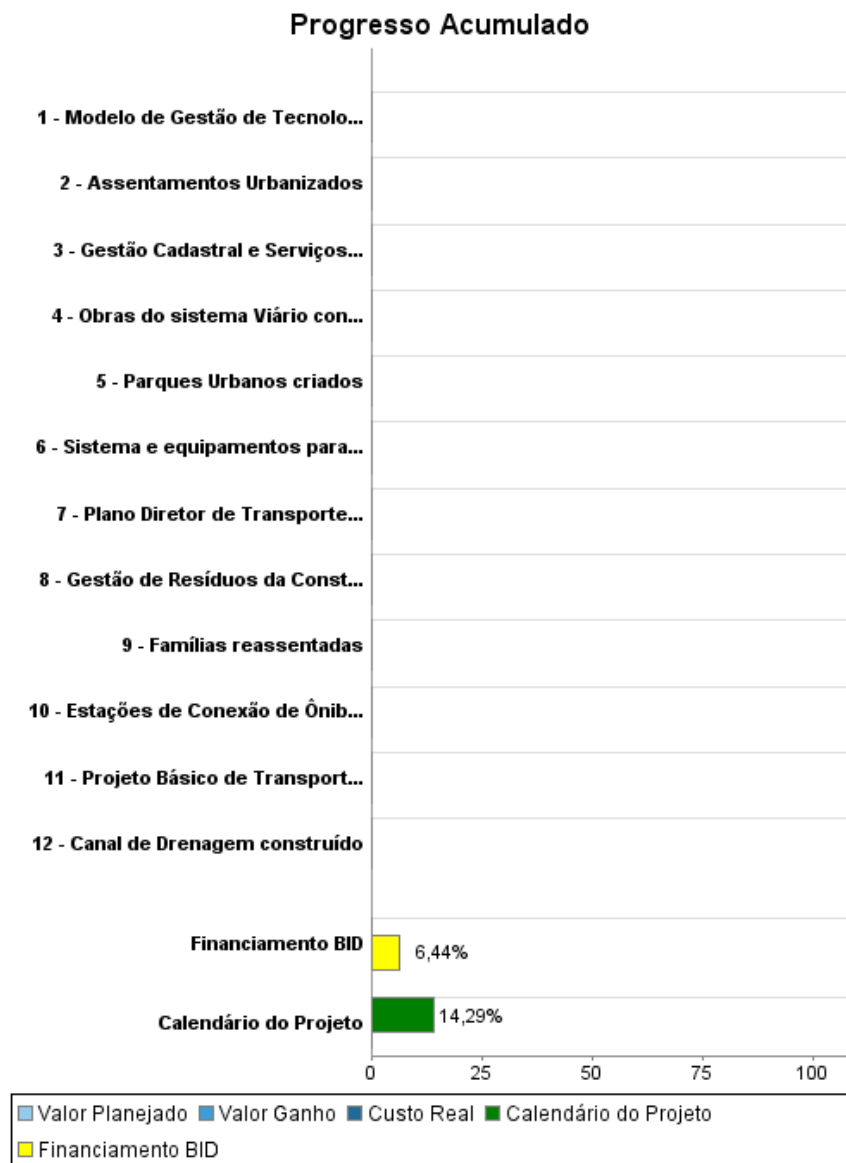

Resultados

Resultado: Desenvolvimento Urbano do Município de São José dos Campos estruturado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Nº de favelas existentes	Favela	1.00	2010	P A						0,00
Índice de passageiros por km (IPK) percorrido.	IPK (%)	1.60	2010	P A		2.10				2,10
Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)	US\$	39,000,000.00	2010	P A	105.00	116.00	127.00 148.00	140.00		58.000.000,00

Resultado: Melhorias urbano-ambientais implementadas

Suposições: área verde de 7,4 m2 por habitante

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
incremento no m2 de área verde por habitante	m2	7.40	2010	P A					7.80	7,80

Resultado: Resíduos de construção civil não descartados clandestinamente incrementados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Resíduos não descartados clandestinamente	toneladas		2010	P A	8,640.00	17,280.00	24,480.00	30,240.00	30,240.00	30.240,00

Resultado: Assentamentos regularizados

Suposições: SH (Secretaría de Vivienda); predios con matrículas individualizadas (depende de la acción de la Notaría de Registro de Inmuebles)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Predios con matrículas individualizadas nos assentamentos	Predios		2010	P A		530.00	802.00	548.00	1,880.00	1.880,00

Resultado: Famílias de la favela do banhado reubicadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
tasa de permanencia de las familias asentadas	%		2010	P A					80.00	80,00
zona liberada para la integración al area de preservación ambiental	m2		2010	P A	223,102.00					223.102,00

Resultado:	Mejorías en cuanto a movilidad de la población implantadas
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Via do Banhado - velocidad promedio para el acceso y transposición del Centro	km/h	29.00	2010	P					45.00	45,00
				A						
Cambuí - velocidad media comparada con la alternativa actual	Km/h	36.00	2010	P					45.00	45,00
				A						
Centro de control de operaciones - tiempo de espera en el semáforo	minuto	2.50	2010	P					1.00	1,00
				A						
Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de lineas en funcionamiento)	lineas	37.00	2010	P					34.00	34,00
				A						

Resultado:	Fortalecimiento institucional implementado
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento	dias	35.00	2010	P					25.00	28,00
				A						
Capacidad de getión de servicios electrónicos	servidores	36.00	2010	P					18.00	18,00
				A						
Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos	dias	172.00	2010	P					148.00	148,00
				A						

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I: Melhorias urbano-ambientais									
Parques Urbanos criados	Parques				5,00				15.000.485,73
Gestão de Resíduos da Construção Civil implementada	Postos				27,00				2.836.601,34
Assentamentos Urbanizados	Assentamentos				7,00				6.426.641,54
Famílias reassentadas	Famílias				399,00				14.300.000,00
Canal de Drenagem construído	Canal				1,00				2.930.371,39
Componente II: Melhorias en cuanto a movilidad urbana									
Obras do sistema Viário concluídas	Km				14,50				104.296.082,99
Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	Sistema				1,00				3.320.000,00
Estações de Conexão de Ônibus construídas	Estação				13,00				2.706.895,72
Plano Diretor de Transporte Urbano elaborado	Plano				1,00				1.987.000,00
Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto				1,00				1.692.659,29
Componente III: Fortalecimiento institucional									
Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação implantada	Modelo				1,00				150.000,00
Gestão Cadastral e Serviços eletrônicos de registro de contribuintes imobiliários implantados	Registros				180.000,00				16.687.200,00
Administracion del Programa									
Imprevistos									
TOTAL									172.333.938,00
