

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	Administradora Boliviana de Carreteras
Secteur:	TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS
Numéro(s) de Prêt(s):	1597/SF-BO
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	TC0210054
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	33.148.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	16.493.518,23
% Décaissé:	49,76
Solde:	16.654.481,77

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	33.148.000,00
Courant BID:	33.148.000,00
Pari Passu:	80,00
Cofinancement/Pays:	8.287.000,00
Estimation Initiale:	41.435.000,00
Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A(R)




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 23-abr-2012

Validé par le Représentant: 27-abr-2012

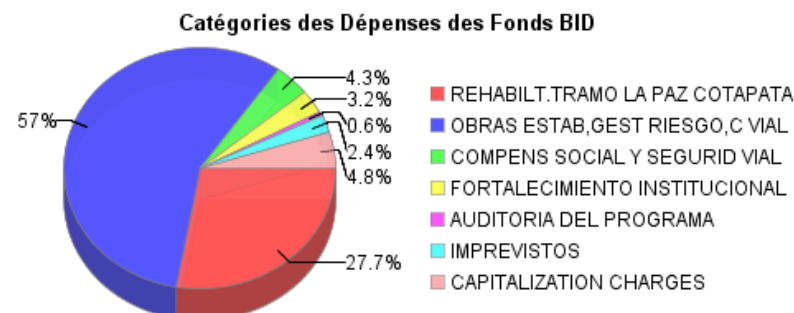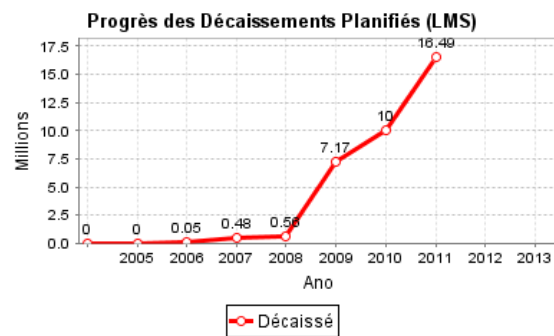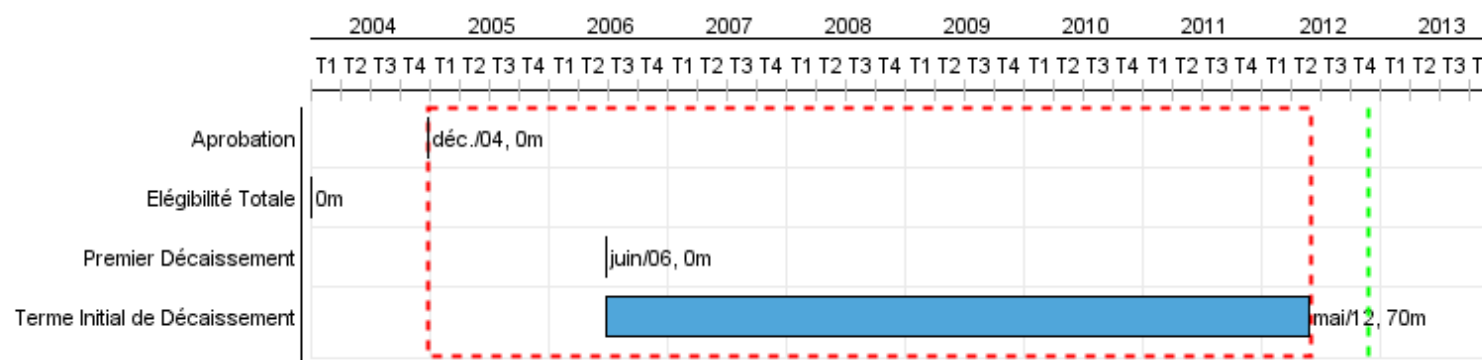

Progrès Cumulé à 2011

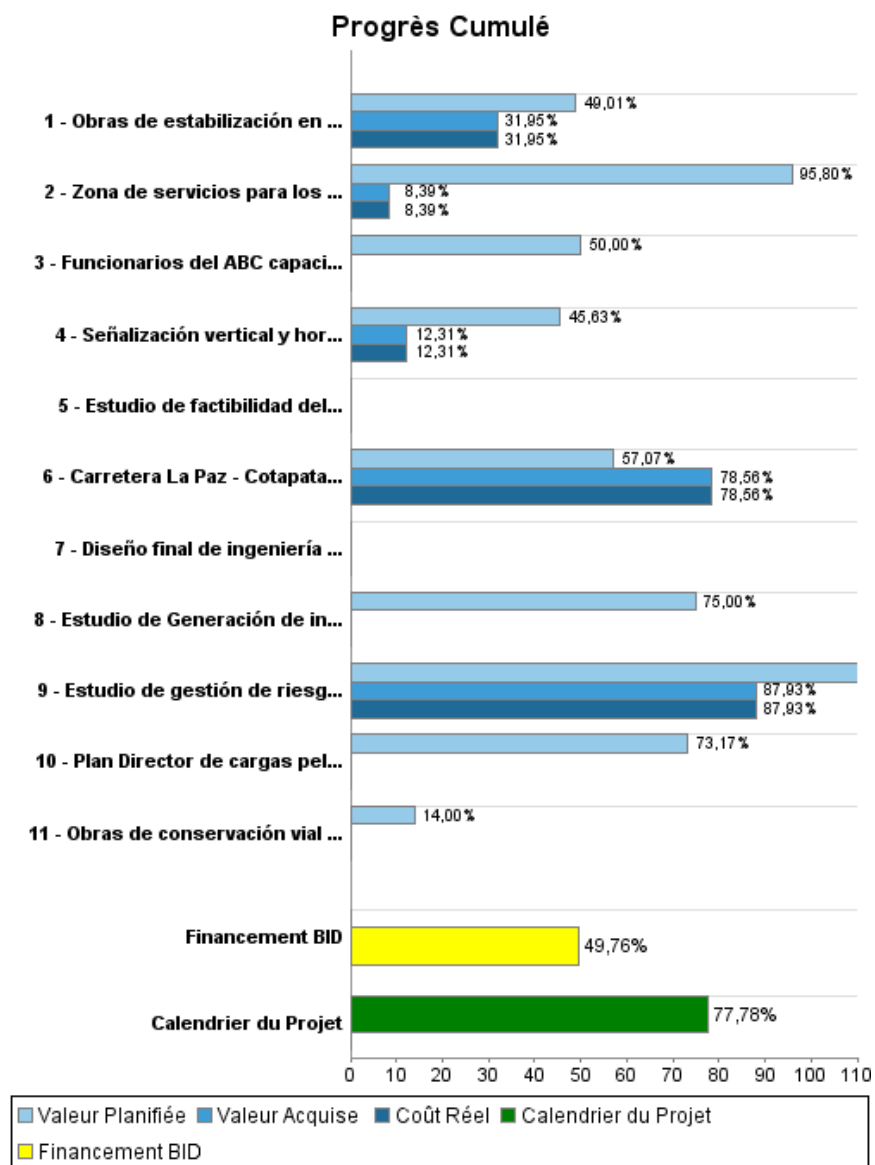

Résultats

Résultat:	Condiciones de integración de los Deptos. de Beni y Pando con el Depto. de La Paz mejoradas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Días de cierre de la vía.	Días/Año	60.00	2004	P A	15,00
Empleos en la población de Yolosa.	Empleos		2004	P A	41,00
Tasa anual de crecimiento de tráfico en la carretera Cotapata-Santa Bárbara.	Tasa	4.60	2004	P A	4,60

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Rehabilitación del tramo La Paz - Cotapata									
Carretera La Paz - Cotapata rehabilitada.	Kilómetros		34,02		44,00	310.000,00	2.866.426,86		10.950.000,00
Construcción de Obras de estabilización del tramo Cotapata-Santa Bárbara.									
Obras de estabilización en la carretera Cotapata - Santa Barbara (Paquetes I, II y III) ejecutadas.	Kilómetros		27,92		49,00	1.873.330,00	3.282.659,13		17.450.000,00
Gestión de Riesgos de la carretera La Paz - Santa Bárbara									
Estudio de gestión de riesgo carretera La Paz - Santa Bárbara realizado.	Estudio		1,00		1,00	103.000,00	46.013,40		424.000,00
Compensación Social Localidad de Yolosa									
Zona de servicios para los habitantes de Yolosa construida	Edificacion				1,00	844.650,00			1.170.000,00
Fortalecimiento Institucional									
Plan Director de cargas peligrosas desarrollado	Plan				1,00				41.000,00
Estudio de Generación de indicadores realizado.	Estudio				1,00				40.000,00
Funcionarios del ABC capacitados	Funcionarios				30,00				120.000,00
Conservación vial de la carretera La Paz - Santa Bárbara									
Obras de conservación vial de la carretera La Paz - Santa Bárbara ejecutadas.	Kilómetros				94,00	804.310,00			5.745.000,00
Segurida Vial									
Señalización vertical y horizontal para seguridad vial instalada en la carretera La Paz - Santa Barbara	Kilometro		12,00		94,00	115.000,00	63.418,12		515.000,00
Diseño para el mejoramiento del tramo Santa Bárbara - Caranavi, que serán cancelados y cuya reformulación se halla en trámite									
Estudio de factibilidad del corredor, EIA, y diseño preliminar realizado.	Estudio								
Diseño final de ingeniería vial realizado	Estudio								
Imprevistos									
TOTAL						4.050.290,00	6.258.517,51		36.455.000,00
