
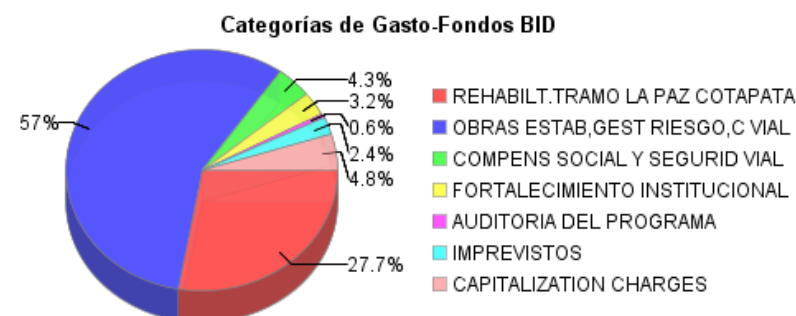
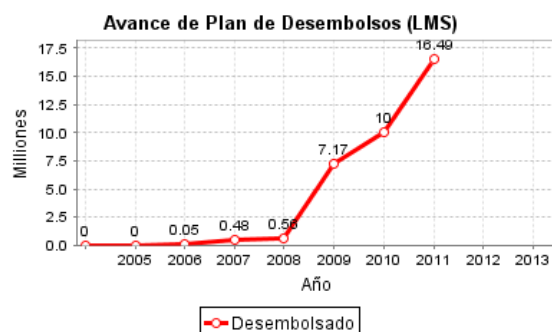



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Administradora Boliviana de Carreteras		
Sector:	TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS		
Número(s) de Préstamo:	1597/SF-BO	Monto Aprobado Actual:	33.148.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	16.493.518,23
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	49,76
Operación(es) Relacionada(s):	TC0210054	Saldo:	16.654.481,77
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	33.148.000,00
		Actual BID:	33.148.000,00
		Pari-passu:	80,00
		Co-financiamiento/País:	8.287.000,00
		Estimado Original:	41.435.000,00
		Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: A(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 23-abr-2012 Validado por Representante de País: 27-abr-2012

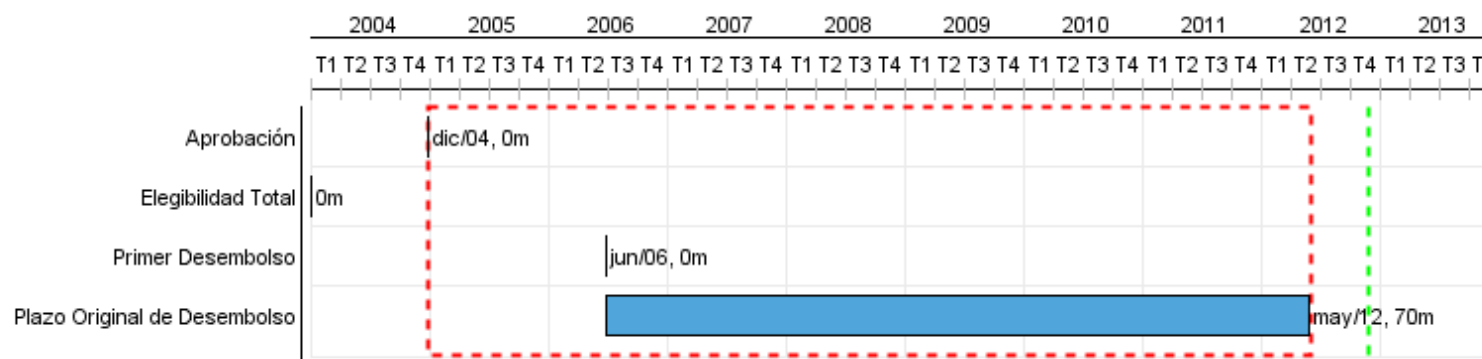

Progreso Acumulado al 2011

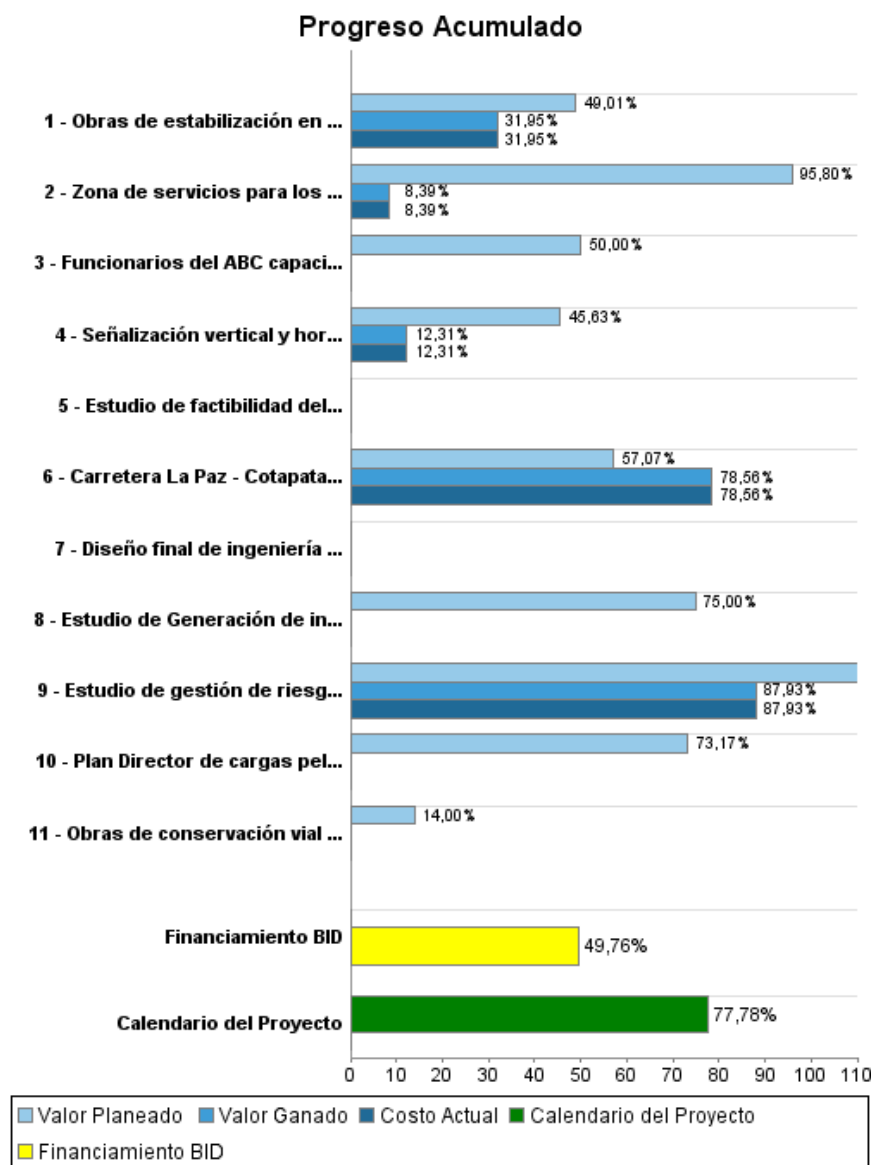

Resultados

Resultado:	Condiciones de integración de los Deptos. de Beni y Pando con el Depto. de La Paz mejoradas
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Días de cierre de la vía.	Días/Año	60.00	2004	P	15,00
				A	
Empleos en la población de Yolosa.	Empleos		2004	P	41,00
				A	
Tasa anual de crecimiento de tráfico en la carretera Cotapata-Santa Bárbara.	Tasa	4.60	2004	P	4,60
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Rehabilitación del tramo La Paz - Cotapata									
Carretera La Paz - Cotapata rehabilitada.	Kilómetros		34,02		44,00	310.000,00	2.866.426,86		10.950.000,00
Construcción de Obras de estabilización del tramo Cotapata-Santa Bárbara.									
Obras de estabilización en la carretera Cotapata - Santa Barbara (Paquetes I, II y III) ejecutadas.	Kilómetros		27,92		49,00	1.873.330,00	3.282.659,13		17.450.000,00
Gestión de Riesgos de la carretera La Paz - Santa Bárbara									
Estudio de gestión de riesgo carretera La Paz - Santa Bárbara realizado.	Estudio		1,00		1,00	103.000,00	46.013,40		424.000,00
Compensación Social Localidad de Yolosa									
Zona de servicios para los habitantes de Yolosa construida	Edificacion				1,00	844.650,00			1.170.000,00
Fortalecimiento Institucional									
Plan Director de cargas peligrosas desarrollado	Plan				1,00				41.000,00
Estudio de Generación de indicadores realizado.	Estudio				1,00				40.000,00
Funcionarios del ABC capacitados	Funcionarios				30,00				120.000,00
Conservación vial de la carretera La Paz - Santa Bárbara									
Obras de conservación vial de la carretera La Paz - Santa Bárbara ejecutadas.	Kilómetros				94,00	804.310,00			5.745.000,00
Segurida Vial									
Señalización vertical y horizontal para seguridad vial instalada en la carretera La Paz - Santa Barbara	Kilometro		12,00		94,00	115.000,00	63.418,12		515.000,00
Diseño para el mejoramiento del tramo Santa Bárbara - Caranavi, que serán cancelados y cuya reformulación se halla en trámite									
Estudio de factibilidad del corredor, EIA, y diseño preliminar realizado.	Estudio								
Diseño final de ingeniería vial realizado	Estudio								
Imprevistos									
TOTAL						4.050.290,00	6.258.517,51		36.455.000,00
