



Operation Number: **AR-L1121**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/4/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/18/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Reconquista River Basin Environmental Sanitation Program	Loan Number:	3256/OC-AR
Executing Agency (EA):	Subsecretaria de Coordinación con Estado s Organismos de Credito Internacionales		
Team Leader:	Gonnelli,Gustavo Victor	Sector/Subsector:	SANITATION RURAL AND PERI-URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1121	\$230,000,000.00	\$230,000,000.00	\$57,500,000.00		\$287,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1121	\$230,000,000.00	\$4,500,000.00	1.96%	\$225,500,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	A
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

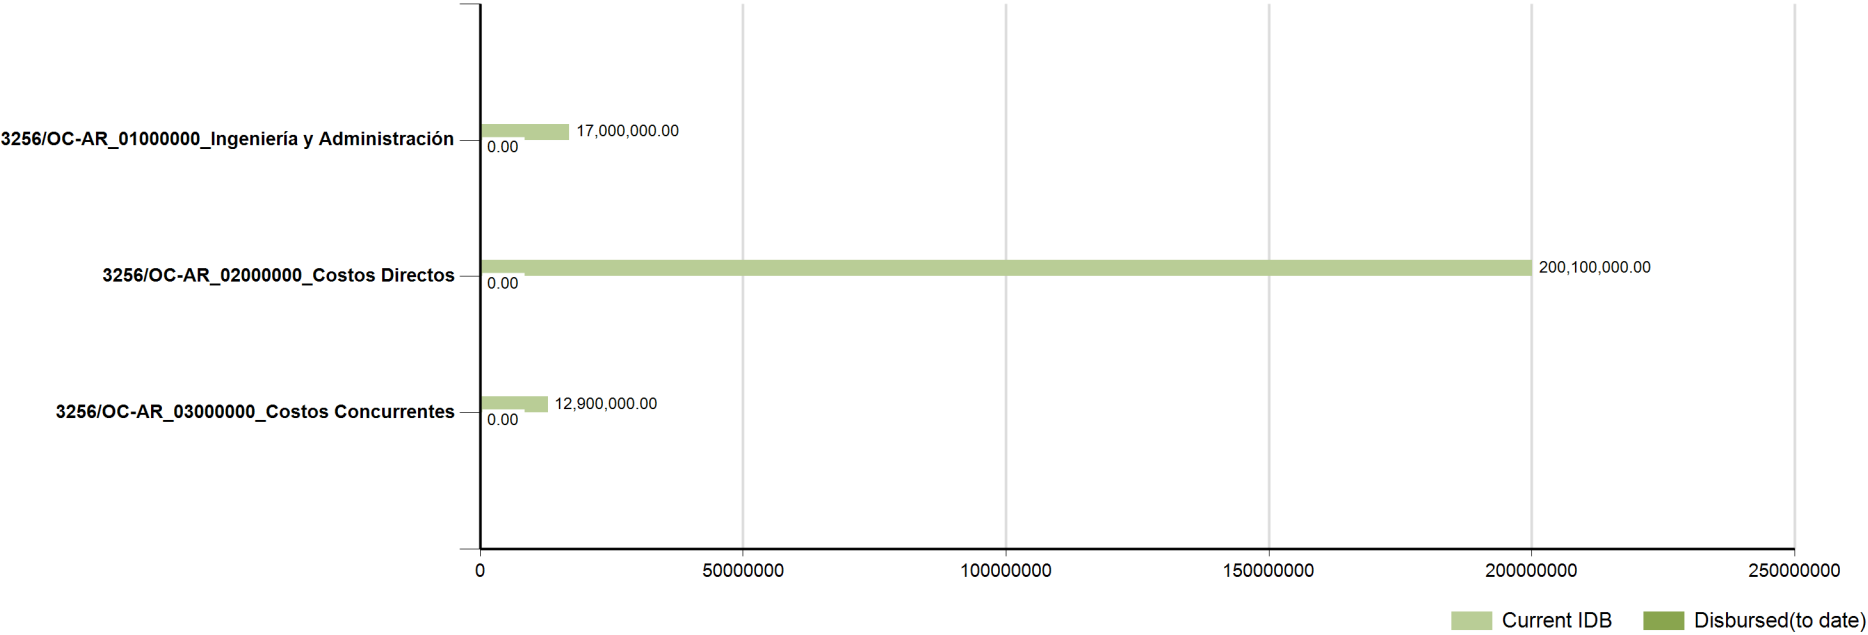

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Cobertura de agua potable y saneamiento en la Cuenca del Río Reconquista incrementada													
Observation:	MV: Certificados de avance de obra- Acta de recepcion provisoria y definitiva de la DIPAC. Responsable: OS/DIPAC													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP	
							P		1,000.00	5,000.00	4,000.00			10,000.00
							P(a)		0.00	5,000.00	5,000.00			10,000.00
							A		0.00					
1.1 Nuevos hogares con disponibilidad de acceso domiciliario a agua potable por red a través de nuevos sistemas o sistemas ampliados en la Cuenca del Río Reconquista.														
								</						

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP
2.0 Superficie de basurales a cielo abierto (BCA) recuperada			Hectáreas	0.00	2014	MV: Certificados de avance de obra- Acta de recepcion provisoria y definitiva del COMIREC e informes de supervisión de la OPDS al finalizar las obras.	Responsable: OS/CO MIREC	P		3.00		6.00		9.00
								P(a)			3.00	6.00		9.00
								A						
2.1 PLAN GIRSU en funcionamiento			Municipio	10.00	2013	MV: Instrumento legal municipal adoptando el Plan.	Responsable: OS/CO MIREC	P			6.00	2.00		18.00
								P(a)			6.00	2.00		18.00
								A						
2.2 Funcionarios municipales capacitados en gestión de RSU			Funcionarios	0.00	2014			P			48.00	6.00		54.00
								P(a)			48.00	6.00		54.00
								A						
Outcome:		3 Vialidad, accesibilidad y drenaje en los barrios de la Cuenca del Río Reconquista mejorados												
Observation:		MV: Encuestas socioeconómicas ex post a beneficiarios. Responsable: OE/ OS/ DIPSOH												
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP
3.0 Días de clase perdidos por año escolar debido a la intransitabilidad de las calles intra-urbanas en los asentamientos no urbanizados de la cuenca del Río Reconquista.			Días	20.00	2011	MV: Encuestas socioeconómicas ex post a beneficiarios	Responsable: OE/ OS	P					0.00	0.00
								P(a)					0.00	0.00
								A						
3.1 Porcentaje de Hogares que sufrieron de inundaciones en los partidos intervenidos por el Programa.			%	18.40	2012	MV: Encuestas socioeconómicas ex post a beneficiarios.	Responsable: OE/ OS/ DIPSOH	P					0.00	0.00
								P(a)					0.00	0.00
								A						
Outcome:		3 Gestión ambiental y social de la Cuenca del Río Reconquista mejorada												

Observation:	4.1 MV: Acta de aprobación del Plan y subsecuente publicación en el sitio web del COMIREC. Responsable: OS / COMIREC. 4.2 MV: Informes del COMIREC Responsable:OS / COMIREC. 4.3 MV: Reportes de Calidad de Agua y Aire del Río reconquista del sistema e Informes del COMIREC. Responsable: OS / COMIREC. 4.4 MV: informes del SSTUV Responsable: OS / SSTUV
--------------	---

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations								
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP	
3.0 Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Reconquista (PGICRR) aprobado por el COMIREC y por los actores claves de la cuenca (stakeholders)		Plan	0.00	2014	MV: Acta de aprobación del Plan y subsecuente publicación en el sitio web del COMIREC.	Responsable: OS / COMIREC	P				1.00		1.00	
							P(a)				1.00		1.00	
							A							
3.1 Porcentaje de situaciones de alerta detectadas por el sistema de monitoreo del PGICRR		%	0.00	2014	MV: Informes del COMIREC	Responsable: OS / COMIREC	P					100.00	100.00	
							P(a)					100.00	100.00	
							A							
3.2 Número de reportes de calidad de agua y aire en el Río reconquista generados anualmente por el sistema de monitoreo del PGICRR		Número	0.00	2014	MV: Reportes de Calidad de Agua y Aire del Río reconquista del sistema e Informes del COMIREC.	Responsable: OS / COMIREC	P					4.00	4.00	
							P(a)					4.00	4.00	
							A							
3.3 Número de Hogares reasentados a áreas sin exposición a riesgo sanitario		Número	0.00	2014	MV: informes del SSTUV	Responsable: OS / SSTUV	P				200.00	300.00	250.00	750.00
							P(a)				200.00	300.00	250.00	750.00
							A							

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Agua Potable y Saneamiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Acueducto nexo de Agua (obra primaria de agua) construído	Km	P	2.00	9.50	P	1,433,600.00	8,300,000.00
		P(a)	0.00	9.50	P(a)	0.00	15,950,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Troncal abastecimiento de agua construído	Km	P	2.40	13.70	P	2,651,520.00	12,000,000.00
		P(a)	0.00	7.90	P(a)	0.00	6,700,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Colector e impulsor cloacal construido	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	5.80	P(a)	0.00	10,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Redes secundarias (finas) de distribucion de agua potable construídas	Km	P	1.00	25.00	P	1,089,480.00	12,000,000.00
		P(a)	0.00	25.00	P(a)	0.00	12,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Redes secundarias (finas) de desagues cloacales construídas	Km	P	5.00	152.00	P	2,609,600.00	26,000,000.00
		P(a)	0.00	152.00	P(a)	146,000.00	13,650,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Residuos Sólidos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Planes de gestión integral de residuos sólidos diseñados	Planes	P		8.00	P	59,500.00	1,200,000.00
		P(a)	0.00	19.00	P(a)	0.00	2,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Planta de áridos construida	Planta	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	10,600,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Basurales a cielo abierto clausurados	Basurales	P	1.00	3.00	P	1,660,000.00	4,500,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	5,800,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Planes de gestión integral de residuos sólidos actualizados	Planes	P	10.00	10.00	P	220,000.00	300,000.00
		P(a)	0.00	220,010.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa de limpieza de márgenes y espejo de agua implementado	Programa	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	3,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Vialidad, Accesibilidad y Drenaje		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Camino de Borde construido	Km	P	1.00	13.30	P	3,404,648.00	27,568,000.00
		P(a)	0.00	12.80	P(a)	0.00	31,128,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Caminos intra-urbanos mejorados y/o rehabilitados	Km	P		33.00	P	1,320,185.00	28,825,000.00
		P(a)	0.00	37.80	P(a)	0.00	28,825,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistemas de drenaje construidos	Sistema	P		5.00	P	5,966,500.00	36,907,000.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	2,023,000.00	36,907,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Gestión Ambiental y Social		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Reconquista elaborado	Plan	P		1.00	P	750,000.00	3,000,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	5,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Diagnóstico industrial elaborado	Diagnóstico	P		1.00	P	150,000.00	3,000,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	3,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de Monitoreo instalado	Sistema	P		3.00	P		12,890,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	10,890,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Diagnóstico de base urbano-territorial elaborado	Diagnóstico	P	1.00	1.00	P	350,000.00	350,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	650,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Talleres sociales del proyecto ejecutivo integral (PEI) realizados	Talleres	P		1.00	P	386,759.00	1,600,000.00
		P(a)	0.00	7.00	P(a)	0.00	238,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Centros de atención primaria de la salud construidos/mejorados	Centros	P		3.00	P	1,247,850.00	4,500,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	3,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Módulos de intervención socio urbana constituidos	Número	P		10.00	P		1,600,000.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	220,000.00	4,600,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Viviendas construidas	Solución Habitacional	P		750.00	P	4,290,000.00	38,300,000.00
		P(a)	0.00	400.00	P(a)	0.00	23,100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Viviendas mejoradas	Viviendas	P		400.00	P	887,744.00	7,760,000.00
		P(a)	0.00	200.00	P(a)	0.00	3,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2016	Cost
Administración del Programa	P	\$1,674,000.00	\$9,300,000.00
	P(a)	\$22,000.00	\$9,300,000.00
	A	\$12,599.00	\$12,599.00
Inspección y Supervisión de Obras	P	\$5,870,731.00	\$11,700,000.00
	P(a)	\$1,737,000.00	\$11,700,000.00
	A	\$22,553.00	\$61,643.00
Estudios y Proyectos	P	\$850,000.00	\$5,700,000.00
	P(a)	\$0.00	\$5,700,000.00
	A		\$0.00
Auditoría, Monitoreo y Evaluación	P	\$100,000.00	\$500,000.00
	P(a)	\$0.00	\$500,000.00
	A		\$0.00
Escalamiento e imprevistos	P	\$3,000,000.00	\$17,400,000.00
	P(a)	\$0.00	\$17,400,000.00
	A		\$0.00
Intereses	P	\$440,000.00	\$11,300,000.00
	P(a)	\$12,000.00	\$11,300,000.00
	A	\$42,899.00	\$55,663.00

Comisión de Crédito	P	\$480,000.00	\$1,000,000.00
	P(a)	\$400,000.00	\$1,000,000.00
	A	\$774,207.00	\$1,212,622.00
Recursos operativos para el componente 4	P		
	P(a)	\$79,000.00	\$562,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$40,892,117.00	\$287,500,000.00
	P(a)	\$4,639,000.00	\$287,500,000.00
	A	\$852,258.00	\$1,342,527.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.
