
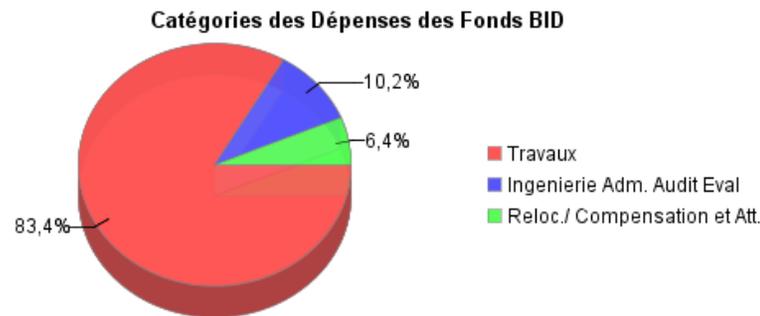
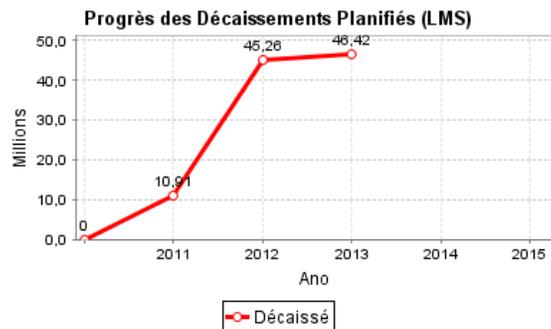



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
Secteur:	TRANSPORT		
Numéro(s) de Prêt(s):	2552/GR-HA	Montant Courant Approuvé:	55.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	46.419.292,22
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	84,40
Opération(s) Connexe(s):	HA-T1134, HA-T1135, RG-P1442, HA-L1081, HA-T1179, HA-T1180, HA-T1181, HA-T1182	Solde:	8.580.707,78
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation		
		Initial BID:	55.000.000,00
		Courant BID:	55.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	55.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 02-may-2013
		Validé par le Représentant: 03-may-2013

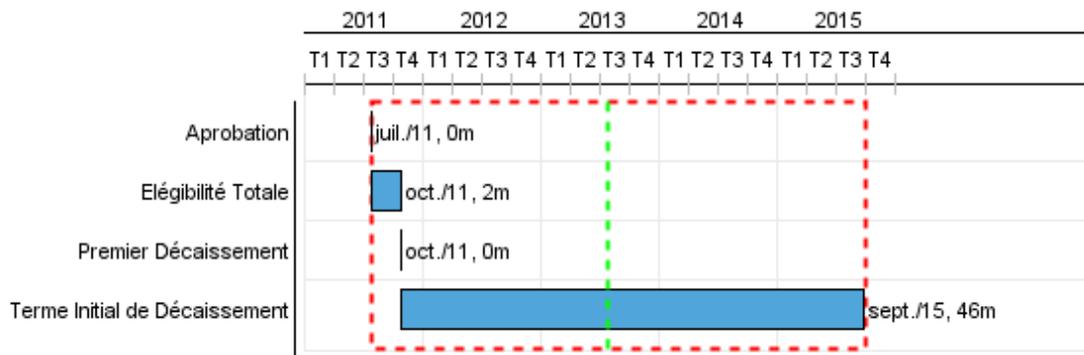

Progrès Cumulé à 2012

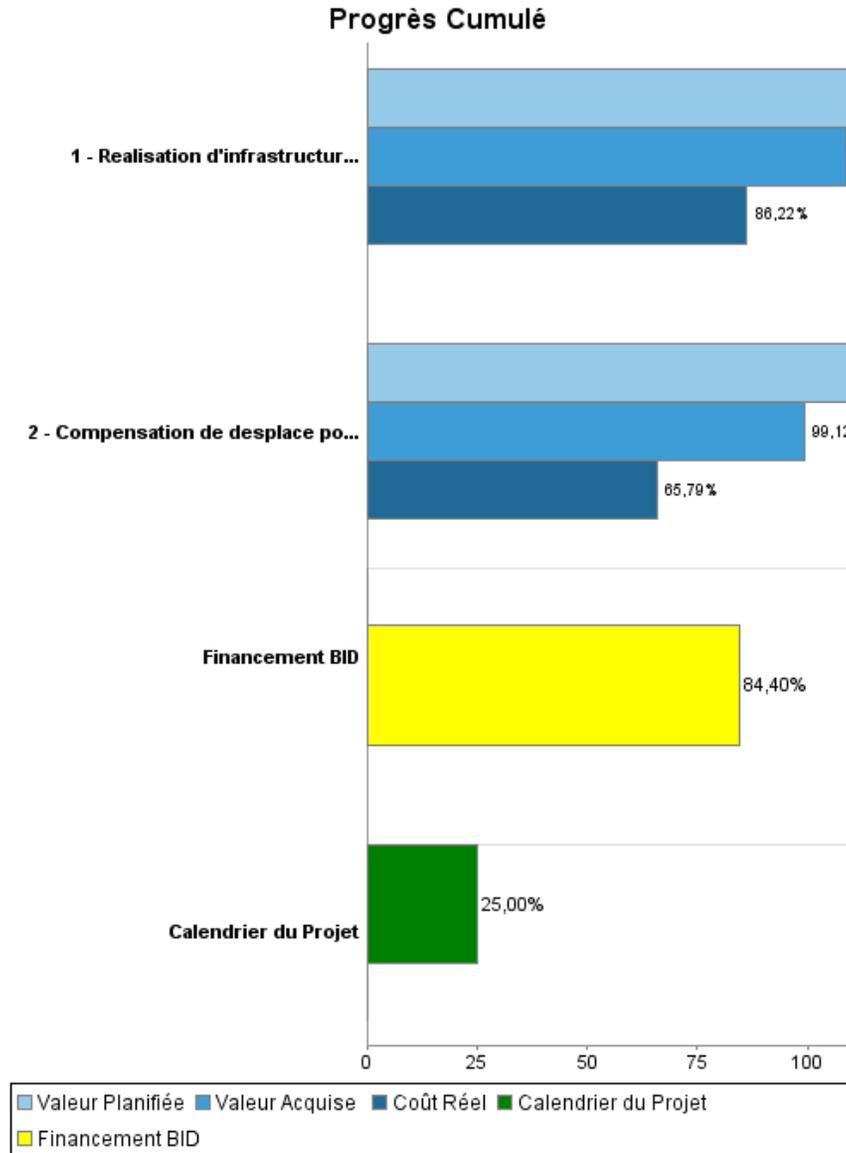

Résultats

Résultat: Parc industriel du Nord construit

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	Fin du Projet
Montant total des investissements étrangers faits pour le Parc industriel du Nord	Millions US\$		2011	P A	40,00	40,00	40,00	120,00
Emplois locaux générés par l'opération du Parc industriel du Nord	Nombre		2011	P A	3.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
Valeur annuelle des biens produits dans le Parc industriel du Nord	Millions US\$		2011	P A				37,00
Différentiel des salaires journalier pour 3 catégories	US\$		2011	P A				1,50
Taux interne de rentabilité	Pourcentage	22,00	2011	P A				12,00

Résultat: Investissements directs réalisés dans la réhabilitation de l'infrastructure économique de base

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	Fin du Projet
Pourcentage de routes en bonnes conditions	Pourcentage	5,00	2011	P A				5,15
Pourcentage de la population en milieu rural ayant accès à une desserte en eau améliorée	Pourcentage (%)	30,00	2011	P A				30,15
Pourcentage de la population en milieu rural ayant accès à des services de santé	Pourcentage (%)	10,00	2011	P A				10,10

Résultat: Protection environnemenale de la mangrove de la Baie de Caracol réalisée

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	Fin du Projet
Superficie de la mangrove protégée	Hectare	2.000,00	2011	P A				2.000,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Financement de réhabilitation de l'infrastructure de bas									
Travaux									
Realisation d'infrastructure du Parc Industrielle de Caracol (batiments).	# buildings	6,00	6,00		7,00	39.000.000,00	28.721.168,27		46.071.000,00
Relocalisation y Compensation et atténuation sociale et environnementale									
Compensation de desplace pour el Parc Industrielle	# people	300,00	300,00		600,00	1.200.000,00	594.801,33		1.816.000,00
Administration - category 02									
Administration, audit, evaluation, consultancies	N/A						2.500.000,00		7.113.000,00
TOTAL						40.200.000,00	31.815.969,60		55.000.000,00
