
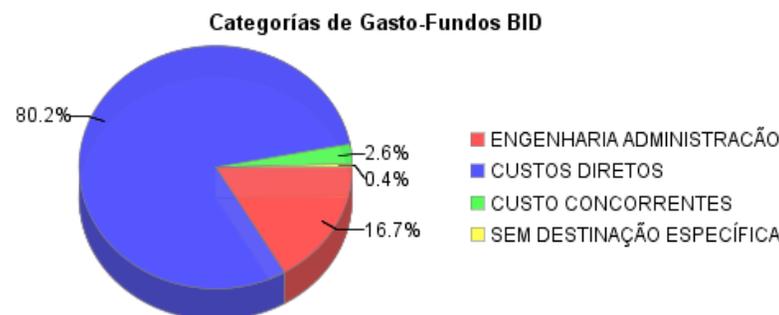
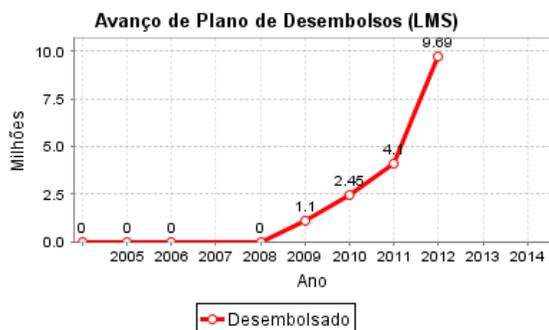


Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	PREFECTURA MUNICIPAL DE GOIANIA	Atual:	56.700.000,00	Original BID:	56.700.000,00
Setor:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING	Desembolsado:	8.286.269,07	Corrente BID:	56.700.000,00
Número da Operação:	1980/OC-BR	% Desembolsado:	14,61	Pari-passu:	60,00
Estágio:	Approved	Saldo:	48.413.730,93	Cofinanciamento/País:	37.800.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento			Original Estimado:	94.500.000,00
Operação Relacionada:				Período de Amortização (meses):	234
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation				

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012

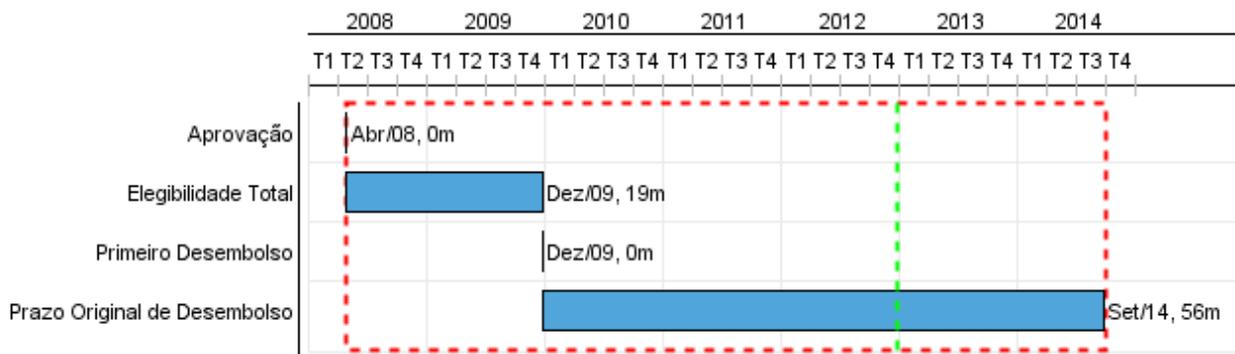


Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado

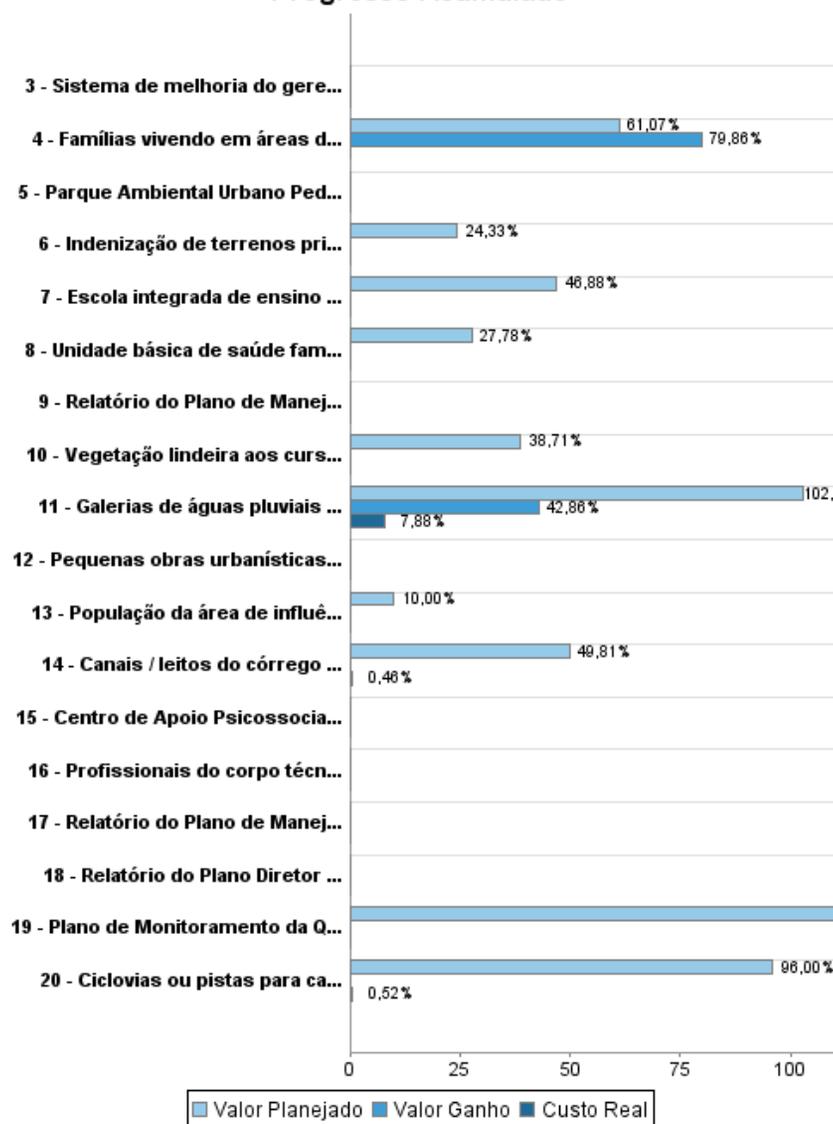

Progresso Acumulado

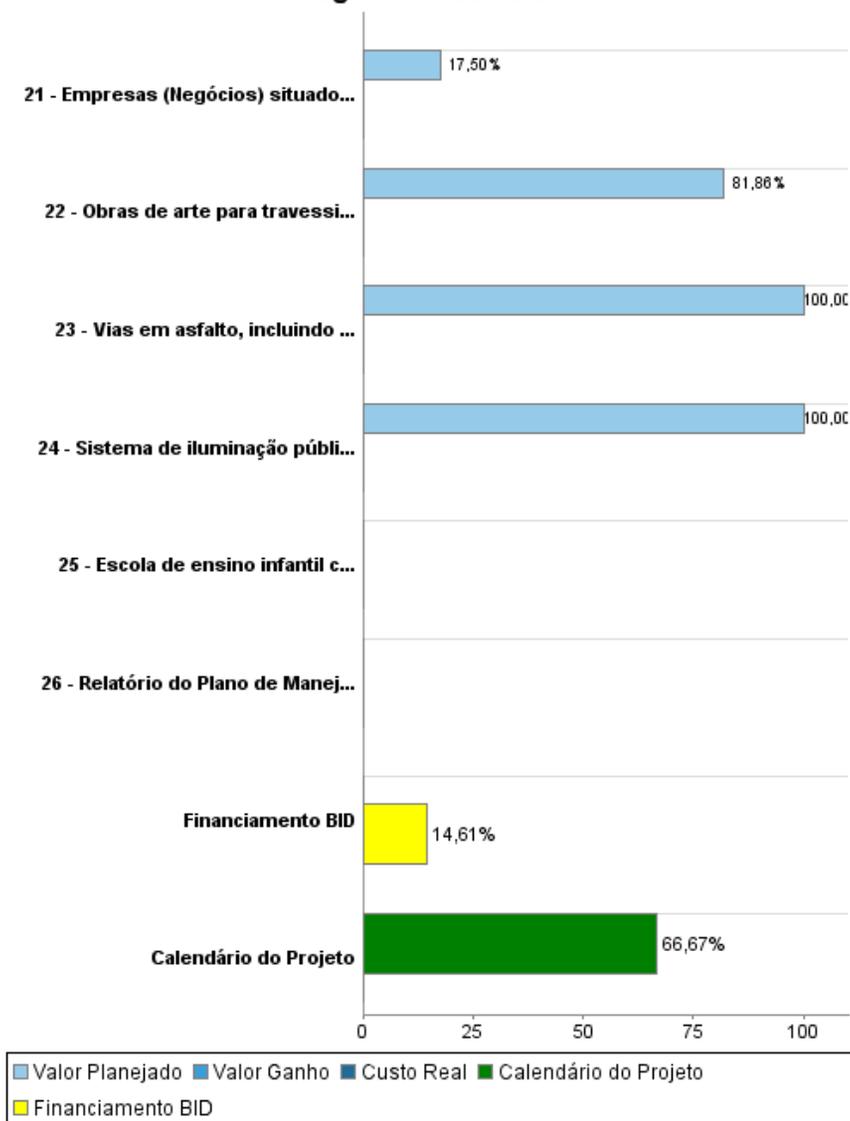

Resultados

Resultado: Problemas socioambientais que afetam a população nas áreas de intervenção do projeto reduzidos.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Contaminação no córrego Macambira	DBO5 (mg/l)	15.00	2005	P A	6.00
Contaminação no Ribeirão Anicuns	DBO5 (mg/l)	60.00	2005	P A	24.00
Pessoas afetadas por inundação nas áreas de riscos das ladeiras ao Parque Linear no córrego Macambira equacionados para chuvas com período de retorno de 10 anos	peessoas	50.00	2005	P A	
Pessoas afetadas por inundação nas áreas de risco lindeiras ao Parque Linear no Ribeirão Anicuns equacionados para chuvas com período de retorno de 10 anos	peessoas	1,250.00	2005	P A	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Ordenamento Urbano Ambiental									
Canais / leitos do córrego Macambira e do ribeirão Anicuns reabilitados	km	7,00			26,50	6.600.000,00	60.372,48		13.250.000,00
Vegetação lindeira aos cursos d'água, com proteção ambiental adequada, recuperada	ha	114,00			232,00	2.400.000,00			6.200.000,00
Ciclovias ou pistas para caminhada de pedestres implantadas	km	14,00			26,50	1.200.000,00	6.511,18		1.250.000,00
Galerias de águas pluviais e dispositivos finais de lançamento nos cursos d'água contruídas	km	3,00	1,25		5,00	1.800.000,00	137.897,23		1.750.000,00
Obras de arte para travessias dos cursos d'água envolvidos no Programa construídas	m	60,00			300,00	3.561.000,00			4.350.000,00
Parque Ambiental Urbano Macambira, incluindo proteção e recuperação de área natural, implantado	ha	25,00			25,50	3.850.000,00	2.625,40		5.200.000,00
Parque Ambiental Urbano Pedreira, incluindo proteção e recuperação de área natural, implantado	ha				10,20				2.000.000,00
Famílias vivendo em áreas de risco, reassentadas	famílias	13,00	17,00		227,00	3.835.000,00			6.280.000,00
Empresas (Negócios) situados dentro dos limites do Parque reinstaladas	empresas	18,00			24,00	126.000,00			720.000,00
Indenização de terrenos privados situados dentro dos limites do Parque pagas	terrenos	192,00			382,00	1.703.000,00			7.000.000,00
Consolidação da Infraestrutura dos Bairros									
Vias em asfalto, incluindo sistema de drenagem pluvial, pavimentadas	km	10,00			10,00	3.500.000,00			3.500.000,00
Sistema de iluminação pública de vias em áreas de abrangência do programa, implantados	km	50,00			50,00	500.000,00			500.000,00
Escola integrada de ensino básico construída.	escola	1,00			3,00	1.500.000,00			3.200.000,00
Escola de ensino infantil construída	escola				3,00				3.300.000,00
Unidade básica de saúde familiar construída	unidade de saúde	2,00			5,00	1.500.000,00			5.400.000,00
Centro de Apoio Psicossocial instalado	centro de apoio				1,00				1.100.000,00
Pequenas obras urbanísticas de valorização comunitária executadas	obras				2,00				2.000.000,00
Sustentabilidade Social e Institucional									
Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns implantado	relatório	2,00			6,00	30.000,00			75.000,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Campanha de comunicação social do Programa implementada	campanha	1,00			2,00	100.000,00			500.000,00
Relatório do Plano de Manejo para o Parque Linear elaborado	relatório				1,00				300.000,00
Relatório do Plano de Manejo para o Parque Urbano Macambira elaborado	relatório				1,00				200.000,00
Relatório do Plano de Manejo para o Parque Urbano da Pedreira elaborado	relatório				1,00				200.000,00
Relatório do Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o Programa elaborado	relatório				1,00				600.000,00
Profissionais do corpo técnico da Amma capacitados	funcionários				70,00				925.000,00
População da área de influência do Programa capacitada em educação sanitária e ambiental	peçoas	150,00			500,00	50.000,00			500.000,00
Sistema de melhoria do gerenciamento da gestão viária implantado	sistema				1,00				1.000.000,00
Outros									
Outros custos (administração, financeiro, auditoria, etc...)	N/A					5.300.000,00	669.243,17		23.200.000,00
TOTAL						37.555.000,00	876.649,46		94.500.000,00
