
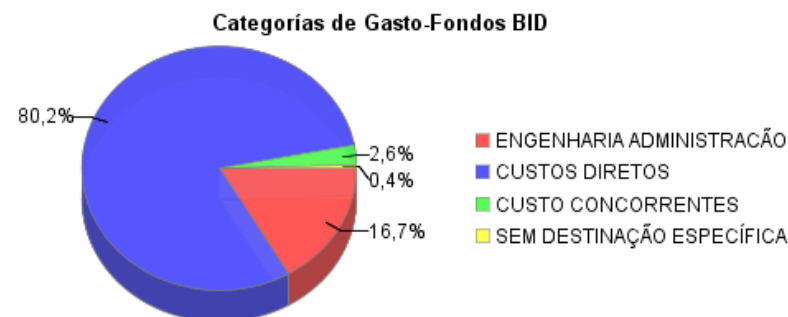
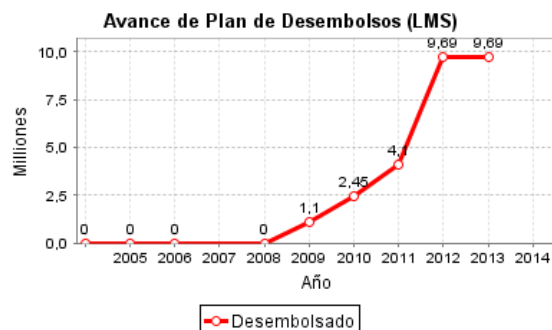


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	PREFECTURA MUNICIPAL DE GOIANIA				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Número(s) de Préstamo:	1980/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	56.700.000,00	BID Original:	56.700.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	9.687.276,82	Actual BID:	56.700.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	17,09	Pari-passu:	60,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	47.012.723,18	Co-financiamiento/País:	37.800.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	94.500.000,00
				Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 01-abr-2013 Validado por Representante de País: 12-abr-2013

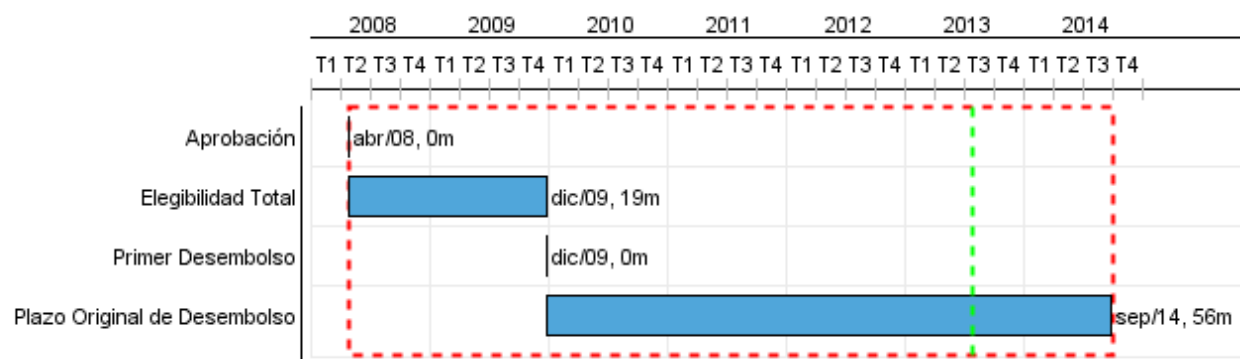

Progreso Acumulado al 2012




INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1006 - Programa Urbano-Ambiental Macambira Anicuns
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 25/03/2013

Progreso Acumulado

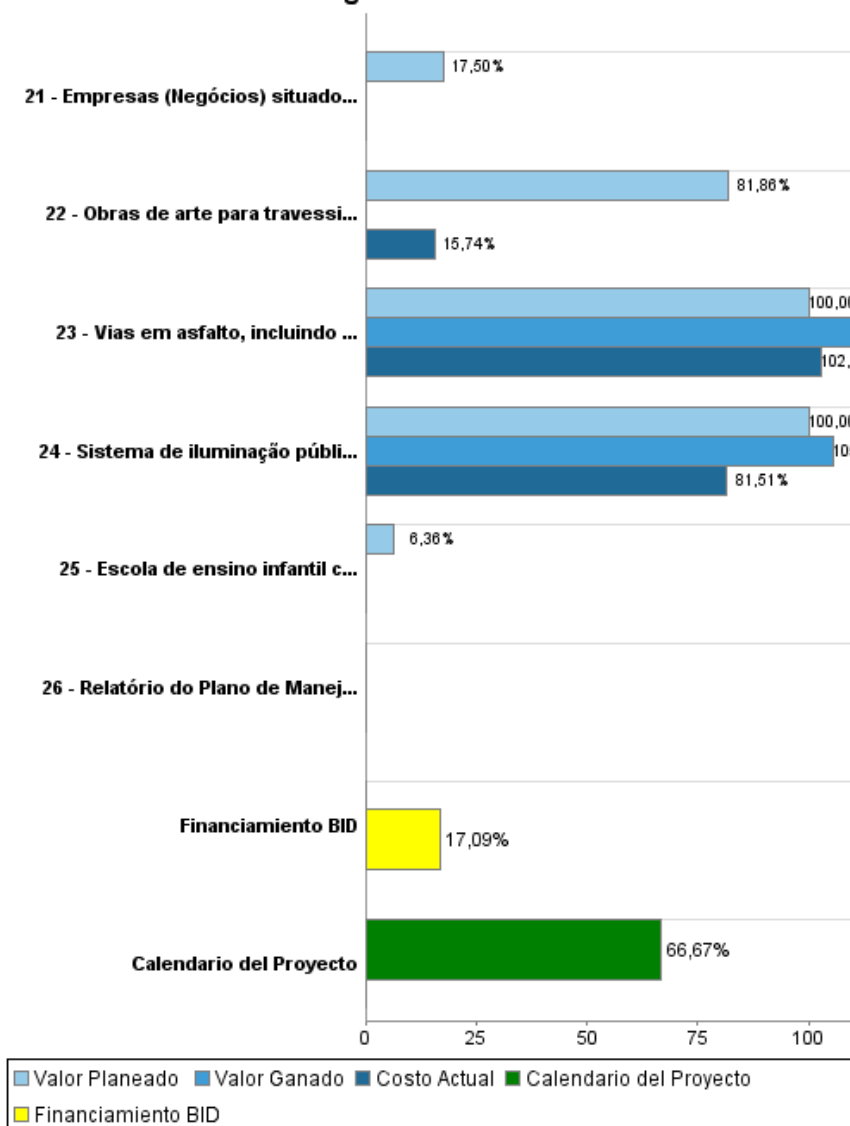

Resultados

Resultado:	Problemas socioambientais que afetam a população nas áreas de intervenção do projeto reduzidos.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Contaminação no córrego Macambira	DBO5 (mg/l)	15,00	2005	P	6,00
				A	
Contaminação no Ribeirão Anicuns	DBO5 (mg/l)	60,00	2005	P	24,00
				A	
Pessoas afetadas por inundação nas áreas de riscos das ladeiras ao Parque Linear no córrego Macambira equacionados para chuvas com período de retorno de 10 anos	personas	50,00	2005	P	
				A	
Pessoas afetadas por inundação nas áreas de risco lindeiras ao Parque Linear no Ribeirão Anicuns equacionados para chuvas com período de retorno de 10 anos	personas	1.250,00	2005	P	
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descrição	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Ordenamento Urbano Ambiental									
Canais / leitos do córrego Macambira e do ribeirão Anicuns reabilitados	km	7,00			26,50	6.600.000,00	81.134,34		13.250.000,00
Vegetação lindeira aos cursos d'água, com proteção ambiental adequada, recuperada	ha	114,00			232,00	2.400.000,00			6.200.000,00
Ciclovias ou pistas para caminhada de pedestres implantadas	km	14,00			26,50	1.200.000,00	8.975,42		1.250.000,00
Galerias de águas pluviais e dispositivos finais de lançamento nos cursos d'água contruídas	km	3,00	1,25		5,00	1.800.000,00	1.202.882,17		1.750.000,00
Obras de arte para travessias dos cursos d'água envolvidos no Programa construídas	m	60,00			300,00	3.561.000,00	684.569,68		4.350.000,00
Parque Ambiental Urbano Macambira, incluindo proteção e recuperação de área natural, implantado	ha	25,00			25,50	3.850.000,00	246.235,30		5.200.000,00
Parque Ambiental Urbano Pedreira, incluindo proteção e recuperação de área natural, implantado	ha				10,20				2.000.000,00
Famílias vivendo em áreas de risco, reassentadas	Domicílios	13,00	21,00		227,00	3.835.000,00	133.663,38		6.280.000,00
Empresas (Negócios) situados dentro dos limites do Parque reinstaladas	empresas	18,00			24,00	126.000,00			720.000,00
Indenização de terrenos privados situados dentro dos limites do Parque pagas	terrenos	192,00			382,00	1.703.000,00	1.466.552,45		7.000.000,00
Consolidação da Infraestrutura dos Bairros									
Vias em asfalto, incluindo sistema de drenagem pluvial, pavimentadas	km	10,00	35,05		10,00	3.500.000,00	3.592.056,07		3.500.000,00
Sistema de iluminação pública de vias em áreas de abrangência do programa, implantados	km	50,00	52,75		50,00	500.000,00	407.562,56		500.000,00
Escola integrada de ensino básico construída.	escola	1,00			3,00	1.500.000,00			3.200.000,00
Escola de ensino infantil construída	escola				3,00				3.300.000,00
Unidade básica de saúde familiar construída	unidade de saúde	2,00			5,00	1.500.000,00			5.400.000,00
Centro de Apoio Psicossocial instalado	centro de apoio				1,00				1.100.000,00
Pequenas obras urbanísticas de valorização comunitária executadas	obras				2,00				2.000.000,00
Sustentabilidade Social e Institucional									
Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns implantado	relatório	2,00			6,00	30.000,00			75.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1006 - Programa Urbano-Ambiental Macambira Anicuns
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 25/03/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Campanha de comunicação social do Programa implementada	campanha	1,00			2,00	100.000,00			500.000,00
Relatório do Plano de Manejo para o Parque Linear elaborado	relatório				1,00				300.000,00
Relatório do Plano de Manejo para o Parque Urbano Macambira elaborado	relatório				1,00				200.000,00
Relatório do Plano de Manejo para o Parque Urbano da Pedreira elaborado	relatório				1,00				200.000,00
Relatório do Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o Programa elaborado	relatório				1,00				600.000,00
Profissionais do corpo técnico da Amma capacitados	funcionários				70,00				925.000,00
População da área de influência do Programa capacitada em educação sanitária e ambiental	peessoas	150,00			500,00	50.000,00			500.000,00
Sistema de melhoria do gerenciamento da gestão viária implantado	sistema				1,00				1.000.000,00
Outros									
Outros custos (administração, financeiro, auditoria, etc...)	N/A					5.300.000,00	4.812.645,88		23.200.000,00
TOTAL						37.555.000,00	12.636.277,25		94.500.000,00
