
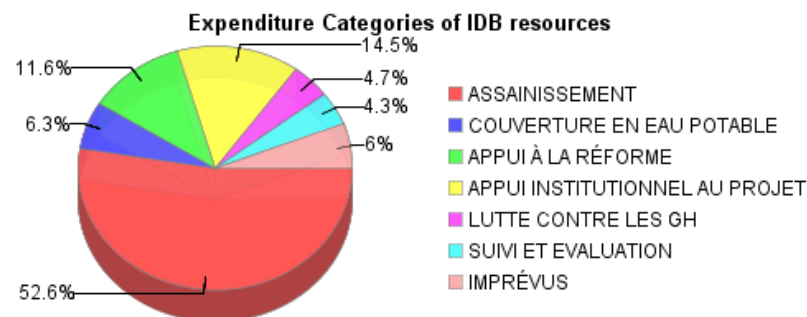
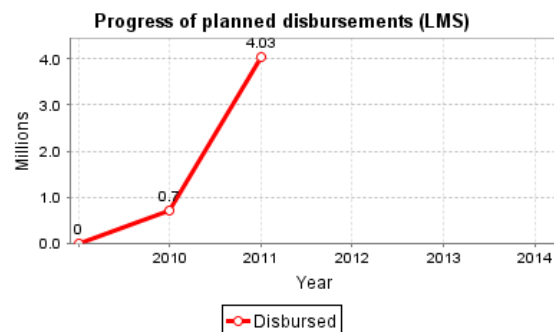



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement				
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Loan Number(s):	2190/GR-HA	Current Approved Amount:	19.000.000,00	Original IDB:	19.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	4.126.387,41	Current IDB:	19.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	21,72	Pari-passu:	49,00
Related Operation(s):	HA-X1013	Balance:	14.873.612,59	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	19.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 29-mar-2012 Validated by Country Representative: 19-abr-2012

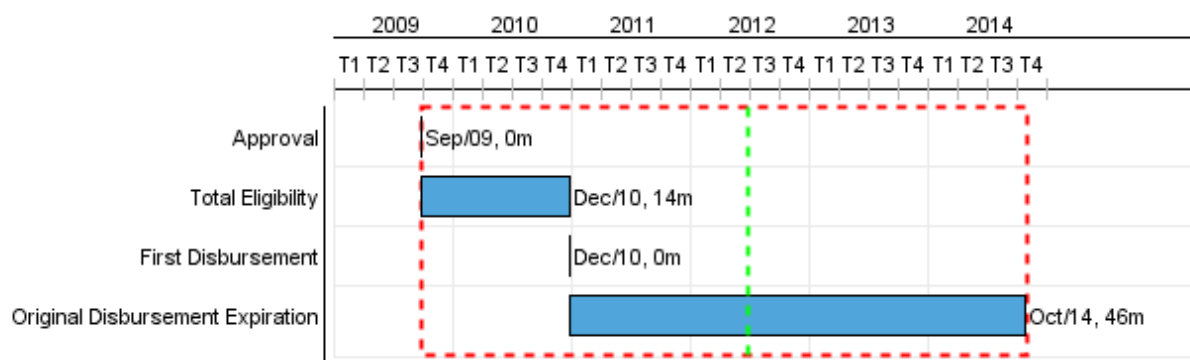

Accumulated Progress as of 2011

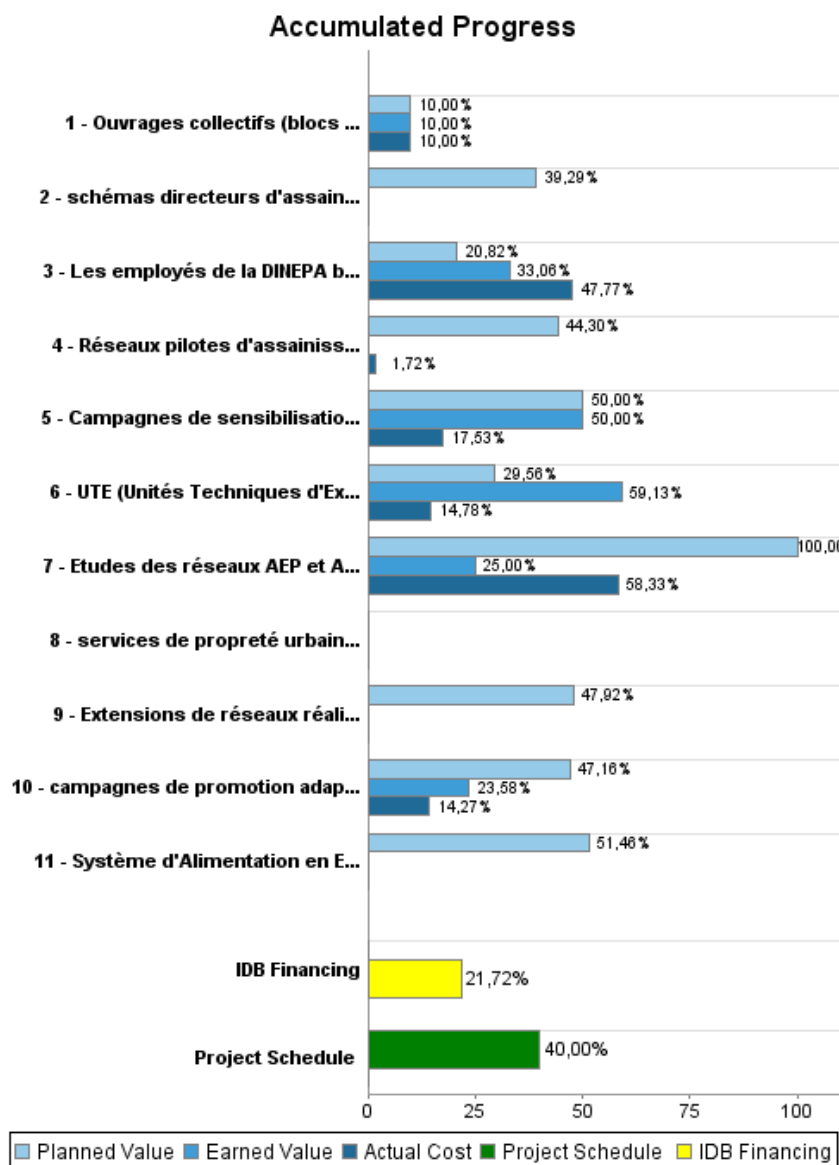

Outcomes

Outcome:	La population ayant accès à un service public ou privé d'eau potable, géré par une structure agréée dans les 5 villes cibles, a augmenté
Suppositions:	le processus de décentralisation des services est mis en place selon le calendrier prévu

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	End of project
Ménages disposant d'un nouveau service d'eau potable ou d'un service amélioré (voir observations)	Households	3,000.00	2010	P		12,000.00	11,000.00	14,180.00	37.180,00
				A	1,435.00				

Outcome:	La population ayant accès à un lieu d'aisance salubre privatif ou collectif a augmenté
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	End of project
Ménages ayant accès à un nouveau service d'assainissement ou à un service amélioré (voir observations)	Houesholds		2010	P		2,000.00	2,580.00	2,800.00	7.380,00
				A					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Comp. 1 : Assainissement									
schémas directeurs d'assainissement pour 5 villes effectués	schema directeur	2,00			4,00	1.000.000,00			2.545.000,00
services de propreté urbaine mise en place	services de propreté				4,00				3.100.000,00
Réseaux pilotes d'assainissement (eaux usées) construits à St Marc et Jacmel	réseau pilote	1,00			2,00	3.500.000,00	136.000,00		7.901.000,00
Ouvrages collectifs (blocs sanitaires publiques) construits dans les 6 villes	ouvrage collectif		1,00		30,00		120.000,00		1.200.000,00
campagnes de promotion adaptées pour la mise en place de latrines familiales dans les 6 villes	campagne	2,00	1,00		6,00	892.600,00	270.000,00		1.892.600,00
Comp. 2 : Couverture en Eau Potable									
Système d'Alimentation en Eau Potable (SAEP de Jacmel) construit et gestion (UTE) mise en place	Système d'Alimentation en Eau Potable				1,00	6.000.000,00			11.660.000,00
UTE (Unités Techniques d'Exploitation) en fonction dans les villes de Ouanaminthe, Port-de-Paix et les Cayes	Unités Techniques d'Exploitation	1,00	2,00		3,00	400.000,00	200.000,00		1.352.982,00
Etudes des réseaux AEP et Assainissement de Cap Haïtien réalisées	étude	1,00			1,00	1.125.000,00	500.000,00		1.500.000,00
Extensions de réseaux réalisées dans les 5 villes zones périphériques	km	15,00			35,00	920.000,00			1.920.000,00
Comp. 5 : Lutte contre les Géo-Helminthes									
Campagnes de sensibilisation aux maladies hydriques réalisées dans les 6 villes, deux fois par an.	campagne par ville	6,00	6,00		42,00	445.000,00	156.000,00		890.000,00
Comp. 3, 4, 6 & 7 : renforcement institutionnel et administration									
Les employés de la DINEPA bénéficient d'un contrat, d'une fiche de poste et d'un plan de travail	personnes/an	35,00	65,00		35,00	719.774,00	2.078.000,00		5.038.418,00
TOTAL						15.002.374,00	3.460.000,00		39.000.000,00
