

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1241	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/27/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Serra do Mar and Atlantic Forest Mosaics System Socioenvironmental Recovery	Loan Number	2376/OC-BR
Executing Agency	Secretaria de Medio Ambiente São Paulo	Sector/Subsector	PA-AMB - ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Team Leader	KILLMER,ANNETTE BETTINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO SAO PAULO		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Key resettlement activities are pending, with very tight schedule for completion before the project comes to an end. There are also outstanding social liabilities in relation to some of the housing schemes. The post-resettlement programs are weak. Two Partially Unsatisfactory ratings assigned		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1241	162,454,000	162,454,000	307,709,000	0	470,163,000	162,454,000	113,602,025.15	69.93%	48,851,974.85
Aggregated	162,454,000	162,454,000	307,709,000	0	470,163,000	162,454,000	113,602,025.15	69.93%	48,851,974.85

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

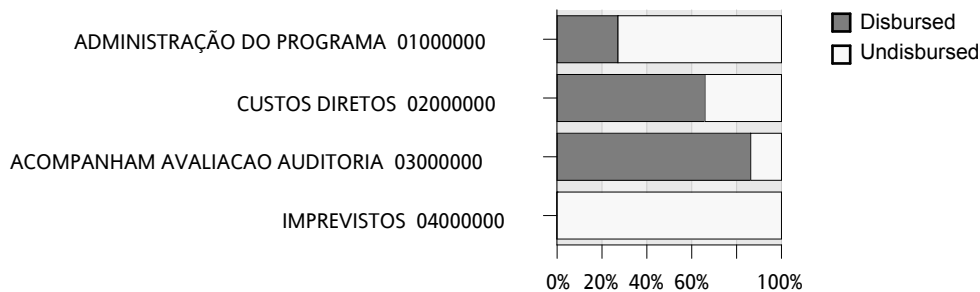

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: BIOMA DA MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA PRESERVADA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
1.1	Ampliar a área protegida na área de influência do Programa de forma a contribuir com a preservação da biodiversidade e a fixação de CO2	%	38.73	2010	P	40.00			40.00
					P(a)	40.00			40.00
					A				

Details

Means of verification: Banco de Dados Georeferenciados da Fundação Florestal

Observations: A Área de Influência do programa é de aproximadamente 1,6 milhões de hectares, sendo a área protegida de 623 mil hectares. Este indicador contribui diretamente a la Meta de Desarrollo Regional 5.4 (Zonas terrestres y marinas protegidas)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Impact Nbr. 2: QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO PAULISTA MELHORADA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
2.1	Indicadores bioquímicos de qualidade da água na Baixada Santista, melhorados	%	62.0	2010	P	62.00			66.00
					P(a)	62.00			66.00
					A				

Details

Means of verification: Metodologia para verificar definida na Ajuda Memoria da Missao do LRR (nov 28-30, 2012; IDBDOCs # 37323079)

Observations: N/a

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
2.1	Pessoas diretamente beneficiadas pela conservacao e/ou o uso mais sustentável de captial natural devido ao Programa	Beneficiaries (#)	0.0	2010	P				
					P(a)				964,000.00
					A				

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Resultado 1: GESTÃO DAS UCs MELHORADAS

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
1.1	Número de habitações reocupando áreas que tem sido desocupadas pelo programa	Habitações	0.0	2010	P	0.00			0.00
					P(a)	0.00			0.00
					A				

Details

Means of verification: Sistema de informação da Polícia Ambiental

Observations: Áreas desocupadas são todas as áreas de remoção previstas no programa; a linha de base é zero porque as áreas ainda não tem sido desocupados, no entanto a meta ao fim do projeto é previr quaisquer reocupação, quer dizer zero habitações nas áreas intervi

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
1.2	Índice de ilegalidade, medindo o nível de ocupação ilegal	%	10.44	2010	P	9.40			9.40
					P(a)	9.40			9.40
					A				

Details

Means of verification: Sistema de informação da Polícia Ambiental

Observations: Autos de Infração Ambiental/Número de Bolentins de Ocorrência (AIA/BO)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
1.3	Índice de cobertura de fiscalização, indicando % de setores das UCs fiscalizadas	%	50.0	2011	P	100.00			100.00
					P(a)	100.00			100.00
					A				

Details

Means of verification: Sistema de informação da Polícia Ambiental

Observations: Linha base definida a partir de 2011.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
1.4	Índice de Qualidade da Eficácia e Gestão das	Pontos	66.7	2010	P	71.00			71.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Unidades de Conservação do Programa	Pontos	66.7	2010	P(a)	71.00			71.00
					A				

Details

Means of verification: Publicação pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA) do Índice, instrumento do Painei da Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo

Observations: O Painei da Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo, apontou um índice de eficácia na gestão das UCs paulistas de 66,77 pontos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
1.4	Área formalmente protegida cuja gestão tem melhorado devido ao Programa	Area (Hectares)	0.0	2010	P			
				P(a)				1,600,000.00
				A				

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Resultado 2: IMPACTO ANTRÓPICO REDUZIDO

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
2.1	% del área antropizada no Parque Estadual Serra do Mar (PESM) del total del área del PESH (315.000 ha)	%	5.0	2010	P	3.00		3.00
				P(a)	3.00			3.00
				A				

Details

Means of verification: Plano de Manejo do PESH e Levantamento do Uso do Solo do PESH em 2014

Observations: N/a

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
2.2	Área liberada en el PESH para recuperación ambiental	Há	0.0	2010	P	90.00		90.00
				P(a)	90.00			90.00
				A				

Details

Means of verification: Levantamento topográfico realizado pela CDHU

Observations: N/a

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 3: Resultado 3: QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO PROJETO MELHORADA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
3.1	Índice de Qualidade de Vida das famílias reassentadas	Pontos	-0.28	2010	P	0.00			0.60
					P(a)	0.00			0.60
					A				

Details

Means of verification: A metodologia para verificacao esta definida na Ajuda Memoria da Missao do LRR (nov 28-30, 2012; IDBDOCs # 37323079)

Observations: Índice e linha de base foram definidos na Ajuda Memoria da Missao do LRR (nov 28-30, 2012; IDBDOCs # 37323079)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2017	2018	EOP 2018
3.2	Índice de Qualidade de Vida das famílias permanentes	Pontos	-0.28	2010	P	0.00			0.51
					P(a)	0.00			0.51
					A				

Details

Means of verification: A metodologia para verificacao esta definida na Ajuda Memoria da Missao do LRR (nov 28-30, 2012; IDBDOCs # 37323079)

Observations: Índice e linha de base foram definidos na Ajuda Memoria da Missao do LRR (nov 28-30, 2012; IDBDOCs # 37323079)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1:PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	1.1. Projeto de lei contendo os novos limites do Parque Estadual Serra do Mar (PESM) desenvolvido	Projeto	P		1		234,193
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.2	1.2. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública do PESM completadas	Obras	P		21		4,696,428.85
			P(a)	3	21	0	2,522,100.85
			A	0	16	0	2,522,100.85
1.3	1.3. Trilhas implantadas e sinalizadas	Trilhas	P		6		2,061,337.86
			P(a)	0	0	300,000	666,707.86
			A	0	0	0	366,707.86
1.4	1.4. Núcleos com equipamento e custeio operacional atendidos	Núcleos	P		9		3,278,187.02
			P(a)	0	0	2,028,108	4,456,907.02
			A	0	0	6,908	1,895,574.02
1.5	1.5. Postos de vigilância e monitores ambientais contratados	Posto	P		120		7,384,163
			P(a)	0	80	0	7,345,090
			A	0	80	102,916	7,373,712
1.6	1.6. Programa de comunicação e divulgação do PESM desenvolvido e implantado	Programa	P		1		1,331,000
			P(a)	0	0	771,833	1,335,139
			A	0	0	0	563,306
1.7	1.7. Programa de Capacitação de gestores e equipe operacional	Progama	P		2		625,000
			P(a)		2	0	209,123
			A	0	1	0	209,123
1.8	1.8. Sistema de monitoramento ambiental desenvolvida	Sistema	P		1		1,229,964.61
			P(a)	0	0	0	186,964.61
			A	0	0	0	186,964.61
1.9	1.9. Áreas com eliminação de exóticas	Hectares	P		200		1,256,000
			P(a)	0	0	163,497	163,497
			A	0	0	0	0
1.10	1.10. Áreas de enriquecimento florestal	Area (Hectares)	P		850		1,372,000
			P(a)	0	0	482,955	650,435
			A	0	0	0	167,480
1.11	1.11. Áreas com recuperação ambiental - Cubatão	Area (Hectares)	P		90		1,714,000
			P(a)	0	30	256,229	414,253
			A	0	30	38,268	196,292
1.12	1.12. Jardim Botânico de Cubatão (JBC) construído	Jardim Botânico	P		1		17,146,000
			P(a)	0	0	0	73,571
			A	0	0	6,404	79,975
1.13	1.13. Jardim Botânico de Cubatão (JBC) operando	Jardim Botânico	P		1		1,898,938
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.14	1.14. Projetos pilotos em metodologia e procedimentos para a regularização fundiária implementados no PESM	Projetos Pilotos	P		2		2,595,517.9
			P(a)	0	0	0	674,517.9
			A	0	0	0	674,517.9
1.15	2.1. Projeto de Lei da Estação Ecológica (E.Ec.) Jureia-Itatins encaminhado pela Assembléia Legislativa	Projetos	P		1		25,629
			P(a)		1		25,629

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.15	2.1. Projeto de Lei da Estação Ecológica (E.Ec.) Jureia-Itatins encaminhado pela Assembléia Legislativa	Projetos	A	0	1	0	25,629
1.16	2.2. Estudo sobre procedimentos para regularização fundiária e reassentamento na E.Ec. finalizados	Estudo	P		1		1,852,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.17	2.3. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública	Obras	P		6		4,766,427.31
			P(a)	1	6	200,000	4,710,435.31
			A	0	3	485,341	3,920,604.31
1.18	2.4. Programa de Capacitação nas Unidades de Proteção Integral	Programa	P		1		505,000
			P(a)		1	0	0
			A	0	0	0	0
1.19	2.5. Trilhas implantadas com Plano de Riscos e Contingências	km	P		12		285,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.20	2.6 Unidade dotada com equipamentos e manutenção operacional	UC	P		1		1,245,163.1
			P(a)	0	0	983,000	2,287,207.1
			A	0	0	20,266	1,056,568.1
1.21	2.7.Postos de vigilância e monitoramento ambiental implementado	Postos	P		46		4,412,171.71
			P(a)		50	197,177	5,258,388.71
			A	0	46	111,717	5,098,634.71
1.22	2.8. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública nas UCs do Mosaico	Obras	P		7		1,844,000
			P(a)	0	7	0	1,782,388
			A	0	1	0	0
1.23	2.9. Programa de Capacitação nas Unidades de Uso Sustentável	Programa	P		1		357,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.24	2.10 Unidades dotadas com equipamentos e manutenção operacional	UC	P		6		391,000
			P(a)	0	6	0	61,231
			A	0	0	471	61,702
1.25	2.11. Sistema de gestão do Mosaico Jureia-Itatins desenvolvido e em execução	Sistema	P		3		1,575,000
			P(a)	0	2	0	0
			A	0	0	0	0
1.26	2.12. Planos de Uso Sustentável elaborados	Planos	P		2		1,191,000
			P(a)	0	2	0	29,046
			A	0	0	0	29,046
1.27	2.13. Plano de Gestão do Mosaico Jureia Itatins	Plano	P		1		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.28	3.1. Planos de Manejo elaborados	Plano	P		4		1,702,000
			P(a)	2	4	225,913	778,017
			A	0	0	0	552,104
1.29	3.2. Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Marinhas com manutenção operacional instalados	APA	P		3		789,096.05
			P(a)	0	3	211,133	1,060,373.05
			A	0	0	72,826	922,066.05
1.30	3.3. Obras nas UCs de Proteção Integral do Mosaico de UCs Marinhas completadas	Obra	P		5		2,191,532.29
			P(a)	1	5	133,272	1,482,839.29

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.30	3.3. Obras nas UCs de Proteção Integral do Mosaico de UCs Marinhas completadas	Obra	A	1	5	451,380	1,589,696.29
1.31	3.4. UCs com sinalização parcial dos limites e atrativos completados	UC	P		2		214,000
			P(a)	0	1	0	27,678
			A	0	1	0	27,678
1.32	3.5. Postos de Serviço de vigilância patrimonial contratados	Posto	P		26		2,639,365.64
			P(a)		32	96,177	2,559,975.64
			A	0	32	27,779	2,491,577.64
1.33	3.6. Postos de Serviços de Monitores Ambientais contratados	Monitor Ambiental	P		26		1,021,199.29
			P(a)		48	272,535	1,569,436.29
			A	0	48	82,109	1,211,856.29
1.34	3.7. APAs Marinhas e UCs Marinhas de Proteção Integral equipados e operacionalizado	UC	P		8		1,654,635.63
			P(a)	0	8	641,532	2,144,643.63
			A	0	0	14,541	1,124,988.63
1.35	3.8. Trilha implantada e sinalizada	Trilha	P		1		123,000
			P(a)	0	0	14,455	17,544
			A	0	0	0	3,089
1.36	3.9. Programa de comunicação e divulgação implantado	Programa	P		1		629,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.37	3.10. Organizações capacitados através do Programa de Capacitação para Sustentabilidade das APAs Marinhas	Organizações	P		48		325,000
			P(a)	0	0	0	21,121
			A	0	0	0	21,121
1.38	3.11. Sistema de gestão, monitoramento e informação das APAs Marinhas implantado	Sistema	P		1		498,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS SOCIAIS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	4.1. Famílias reassentadas de acordo com o Plano de Reassentamento	Households (#)	P		6,980		436,124,581
			P(a)	336	6,106	17,332,066	407,144,982
			A	0	4,652	4,715,126	363,408,345
2.2	4.2. Famílias com ocupação consolidada por meio da urbanização e regularização fundiária	Households (#)	P		1,980		119,423,395
			P(a)	120	1,898	8,652,760	154,927,665
			A	0	1,232	4,434,086	140,120,756
2.3	4.3. Projeto básico de urbanização e reassentamento para famílias nos sectores sul e norte do PESM elaborado	Projeto	P		5		8,539,000
			P(a)		17	923,061	3,904,440
			A	0	10	669,289	3,434,434

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 COMPONENTE 3: FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	5.1. Estudantes capacitados através do Programa de Educação Socioambiental	Estudantes	P		30,000		573,000
			P(a)	0	28,820	0	570,869
			A	0	28,820	0	570,869
3.2	5.2. Policiais Ambientais capacitados através do Programa de Capacitação Técnica	Policiais	P		565		1,016,105.29
			P(a)		1,410	466,727	859,702.29
			A	0	1,410	0	391,498.29
3.3	5.3. Veículos (carros, aeronave e embarcações) comprados	Veiculos	P		69		18,348,318.65
			P(a)		69	298,001	14,348,375.65
			A	0	69	0	14,050,374.65
3.4	5.4. Contratos de Operação e Manutenção essencial dos equipamentos a serem utilizados na fiscalização das UCs	Contrato	P		7		6,856,860.83
			P(a)		6	1,031,043	4,957,326.54
			A	0	6	130,834	4,056,289.83
3.5	5.5. Sistema de Comunicação Digital implantado	Sistema	P		1		150,000
			P(a)		1	0	0
			A	0	1	0	0
3.6	5.6. Contrato de obras e reformas das bases para execução da fiscalização executados	Obras	P		7		13,060,000
			P(a)	0	1	2,785,030	7,483,147
			A	0	0	0	3,297,775
3.7	5.7. Sistema GIS implantado	Sistema	P		1		614,028
			P(a)		1	0	0
			A	0	1	0	0

Other Cost

	Administração, Supervisão e Custos Indiretos.	P				10,738,636.08
		P(a)			2,102,912	10,237,234.08
		A			956,375	7,343,113.08

Total Cost

	Total Cost	P				692,502,875.11
		P(a)			40,569,416	646,948,000.82
		A			12,326,636	569,045,569.11

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	5.2. Policiais Ambientais capacitados através do Programa de Capacitação Técnica	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	4.3. Projeto básico de urbanização e reassentamento para famílias nos sectores sul e norte do PESH elaborado	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	2.12. Planos de Uso Sustentável elaborados	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	4.1. Famílias reassentadas de acordo com o Plano de Reassentamento	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	2.7.Postos de vigilância e monitoramento ambiental implementado	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	5.4. Contratos de Operação e Manutenção essencial dos equipamentos a serem utilizados na fiscalização das UCs	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	2.7.Postos de vigilância e monitoramento ambiental implementado	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	4.2. Famílias com ocupação consolidada por meio da urbanização e regularização fundiária	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	3.2. Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Marinhas com manutenção operacional instalados	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	2.11. Sistema de gestão do Mosaico Jureia-Itatins desenvolvido e em execução	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	4.2. Famílias com ocupação consolidada por meio da urbanização e regularização fundiária	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	2.6 Unidade dotada com equipamentos e manutenção operacional	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	1.7. Programa de Capacitação de gestores e equipe operacional	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	4.1. Famílias reassentadas de acordo com o Plano de Reassentamento	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	1.4. Núcleos com equipamento e custeio operacional atendidos	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	5.6. Contrato de obras e reformas das bases para execução da fiscalização executados	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	3.7. APAs Marinhas e UCs Marinhas de Proteção Integral equipados e operacionalizado	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	3.5. Postos de Serviço de vigilância patrimonial contratados	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	3.7. APAs Marinhas e UCs Marinhas de Proteção Integral equipados e operacionalizado	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	3.6. Postos de Serviços de Monitores Ambientais contratados	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	2.3. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prorrogación del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	3.6. Postos de Serviços de Monitores Ambientais contratados	Modify	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la	09/21/2017	07/28/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
		Output	prorrogação del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.		
Output	2.8. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública nas UCs do Mosaico	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	1.2. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública do PESH completadas	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	4.3. Projeto básico de urbanização e reassentamento para famílias nos sectores sul e norte do PESH elaborado	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	1.5. Postos de vigilância e monitores ambientais contratados	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	5.6. Contrato de obras e reformas das bases para execução da fiscalização executados	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	5.2. Policiais Ambientais capacitados através do Programa de Capacitação Técnica	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	3.3. Obras nas UCs de Proteção Integral do Mosaico de UCs Marinhas completadas	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	2.8. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública nas UCs do Mosaico	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/21/2017	07/28/2017
Output	2.3. Obras de infraestrutura de gestão, proteção e utilização pública	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/23/2017	07/28/2017
Output	2.10 Unidades dotadas com equipamentos e manutenção operacional	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	07/28/2017
Output	3.1. Planos de Manejo elaborados	Modify Output	Se incorporaron a la matriz de resultados valores para 2017 y 2018, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución del programa hasta diciembre de 2018.	09/14/2017	09/28/2017
