

PMR Operational Report

Operation Number	ES-L1016	Chief of Operations Validation Date	03/31/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/03/17
Last Update	03/31/17	Country Representative Validation Date	04/12/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Proposal for Reduction of Vulnerability in informal Urban Neighborhoods in the	Loan Number	2630/OC-ES
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	SANCHEZ,MARIA DENI	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	EL SALVADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La paralización en enero de 2016 de las obras en la AUP San Pedro B está afectando negativamente la calidad de vida de la comunidad, ya que el estado en el que se encuentran las calles impide el acceso de vehículos, expone a las personas a accidentes por caídas en los agujeros que han quedado abiertos tanto en las calles (pozos de inspección) como en algunas viviendas (fosas sépticas).		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1016	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	19,685,159.77	39.37%	30,314,840.23
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	19,685,159.77	39.37%	30,314,840.23

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

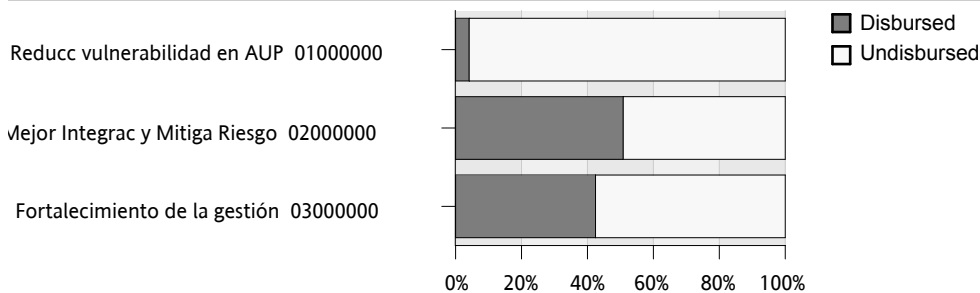

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Condiciones de vida de familias expuestas a riesgos de inundaciones y deslizamientos en Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.1	Familias afectadas por inundaciones y/o deslizamientos en un período de 12 meses en los Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) seleccionados	Porcentaje	17.0	2011	P	0.00
					P(a)	0.00
					A	

Details

Means of verification: Encuesta de vulnerabilidad.

Observations: La meta está planteada en base a tormentas con un periodo de retorno de 50 años.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.2	Incremento en el valor del terreno en Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) beneficiarios	Porcentaje	0.0	2011	P	25.00
					P(a)	25.00
					A	

Details

Means of verification: Peritaje sobre precios de terrenos en AUP beneficiarios.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Condiciones de vida de familias expuestas a riesgos de inundaciones y deslizamientos en Asentamientos Precarios Urbanos (AUP) el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.1	Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) que han disminuido su nivel de susceptibilidad a riesgos por inundaciones	Households (#)	0.0	2011	P		6.00
					P(a)		6.00
					A		

Details

Means of verification: Información de visitas Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Observations: Se mide a nivel de AUP debido a que el indicador de vulnerabilidad del MARN identifica un punto en el mapa, el cual puede o no coincidir con un polígono correspondiente a un AUP. Los puntos de vulnerabilidad tienen tres niveles (alta, media y baja).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.2	Hogares incluidos en la ficha técnica del Ministerio de Salud	Porcentaje	0.0	2011	P		90.00
					P(a)		90.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema Único de información en Salud (SUIS) del Ministerio de Salud.

Observations: El estar incluidos en la ficha técnica del Ministerio de Salud implica que el hogar ya tuvo una primera visita y asesoramiento de los ECOS familiares. Esto también implica que tienen un programa de seguimiento a la salud dependiendo del perfil demográfico de la familia.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.3	Volúmenes de agua retenidos	Millones de m3	0.0	2011	P		0.50
					P(a)		0.50
					A		

Details

Means of verification: Modelación hídrica de propuesta de lagunas

Observations: Monitores en tiempo real a ser instalados en las lagunas.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2018	EOP 2019
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
1.4	Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable	Households (#)	0.0	2011	P		1,574.00
					P(a)		1,574.00
					A		
Details							
Means of verification: informes semestrales de programa							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.4	Hogares con acceso a saneamiento básico nuevo o mejorado	Households (#)	0.0	2011	P		1,574.00
					P(a)		1,574.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes semestrales de progreso e Informe final de ejecución							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento integral y mitigación de riesgo de AUP de CSU en AMSS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	Asentamientos Urbanos Precarios con obras de mejoramiento ejecutadas	Asentamientos	P	3	6	7,774,674	21,994,189
			P(a)	3	6	6,803,331.26	21,994,189
			A	4	5	4,704,963.9	15,107,956.94

Component Nbr. 2 Reducción de vulnerabilidad en AUP a través de inversiones estructurales en el AMSS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	Sistemas de Lagunas de laminación construidas	Lagunas	P	2	5	6,855,311	26,132,230
			P(a)		5	638,400	26,183,893.6
			A	0	0	374,978.61	436,795.61
2.2	Proyecto de Reparación de Bóvedas	Proyecto	P	1	1	683,581	683,581
			P(a)	1	1	683,581	631,917.4
			A	1	1	631,917.4	631,917.4

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la gestión de la operación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
3.1	Sistema de monitoreo y seguimiento implementado (capacidad de generar al menos una Evaluación de Impacto)	Sistema	P		1		390,000
			P(a)		1	77,085.6	390,000
			A	0	0	51,944.97	66,273.37

Other Cost

	Gastos administrativos	P			160,000	800,000
		P(a)			285,000	800,000
		A			198,017.91	550,177.2

Total Cost

	Total Cost	P			15,473,566	50,000,000
		P(a)			8,487,397.86	50,000,000
		A			5,961,822.79	16,793,120.52

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Proyecto de Reparación de Bóvedas	Modify Output	El monto del contrato para la ejecución del proyecto de reparación de bóvedas, fue menor que el costo proyectado para el subcomponente de bóvedas, por lo que los recursos remanentes fueron trasladados al subcomponente de lagunas de laminación.	03/16/2017	03/15/2017
Output	Sistemas de Lagunas de laminación construidas	Modify Output	El monto del contrato para la ejecución del proyecto de reparación de bóvedas, fue menor que el costo proyectado para el subcomponente de bóvedas, por lo que los recursos remanentes fueron trasladados al subcomponente de lagunas de laminación.	03/16/2017	03/15/2017
