

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1151	Chief of Operations Validation Date	03/28/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	03/29/19
Last Update	03/25/19	Country Representative Validation Date	04/10/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Integrated Urban Solid Waste Management Program.	Loan Number	3249/OC-AR, 3249/OC-AR-1, 3249/OC-AR-2
Executing Agency	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Turismo	Sector/Subsector	AS-SOS - WATER AND SANITATION-SOLID WASTE, SOCIAL PROJECTS
Team Leader	OYAMADA KROUG, JORGE RUBEN	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	No han sido presentados los informes de supervisión ambiental y social de obras. Hay falencias en el registro de quejas y sugerencias de todos los subproyectos. Para el proyecto en preparación que tiene RI no se presentó un plan ni se documentaron los reasentamientos. Tampoco se han documentado las consultas con los recuperadores de Guaymallén. No hay avances significativos en los planes de acción acordados en misiones anteriores.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1151	150,000,000	150,000,000	37,500,000	0	187,500,000	150,000,000	55,920,000	37.28%	94,080,000
Aggregated	150,000,000	150,000,000	37,500,000	0	187,500,000	150,000,000	55,920,000	37.28%	94,080,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

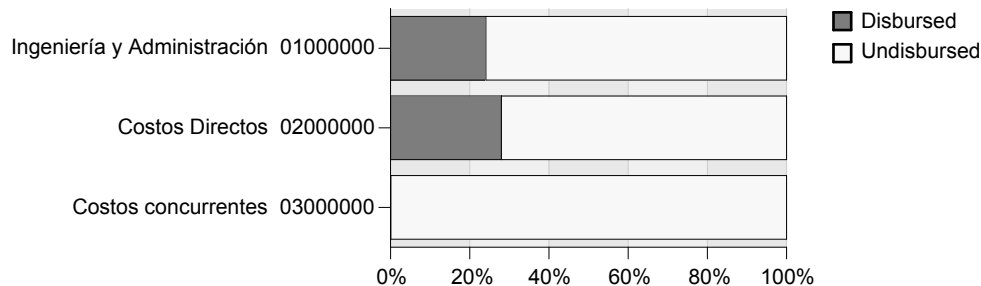

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Hogares que disponen sus residuos en rellenos sanitarios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Hogares que disponen sus residuos en rellenos sanitarios	porcentaje	64.70	2010	P		
					P(a)		72.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de la UE basados en reportes de municipios							
Observations: .							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Componente I - Gestión Operativa: Mejorar la capacidad operativa y de gestión de entes operadores

Observation:

Outcome Nbr. 1: Componente II - Infraestructura y Equipamiento: Incremento en los niveles de recuperación y reciclaje y mejora en los servicios de recolección y disposición final

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.0	Hogares que disponen sus residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios	%	64.70	2015	P		
					P(a)		72.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de la unidad ejecutora, basados en reportes de los municipios beneficiarios del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Componente III - Gestión Ambiental y Social: Formalización e inclusión de Recuperadores y aprovechamiento de RSU

Observation:

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I - Mejorar la capacidad operativa y de gestión de entes operadores (Gestión Operativa)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Planes de mejoramiento de la gestión GIRSU desarrollados (subprograma 1)	Planes	P	3	6	1,500,000	3,100,000
			P(a)	3	6	1,500,000	3,100,000
			A	0	0	0	0
1.2	Planes de difusión y concientización comunitaria elaborados (subprograma 1)	Planes	P	11	52	350,000	2,600,000
			P(a)	25	27	1,300,000	2,600,000
			A	0	0	0	0
1.3	Planes de mejoramiento de la gestión GIRSU desarrollados (subprograma 2)	Planes	P	0	8	0	965,604.5
			P(a)	3	2	152,000	156,032
			A	2	2	156,032	156,032
1.4	Planes de difusión y concientización comunitaria elaborados (subprograma 2)	Planes	P	0	8	0	965,605
			P(a)	3	3	0	48,279
			A	0	0	0	48,279
1.5	Planes provinciales para la gestion integral de residuos solidos elaborados y/o actualizados (Subprograma 1)	Planes	P		0		0
			P(a)	2	1	519,754	1,500,000
			A	1	1	0	0

Component Nbr. 2 Componente II - Incremento en los niveles de recuperación y reciclaje y mejora en los servicios de recolección y disposición final (Infraestructura y Equipamiento)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Rellenos sanitarios construidos (subprograma 1)	Rellenos Sanitarios	P	3	9	16,125,487.81	62,987,799.14
			P(a)	3	7	7,197,063	62,987,799.1
			A	1	1	4,307,924	10,368,629
2.2	Plantas de separación construidas (Subprograma 1)	Plantas	P	5	14	3,492,486.49	15,071,788.09
			P(a)	3	14	1,578,713	15,360,669
			A	1	1	1,256,202	2,824,058
2.3	Plantas de transferencia construidas (Subprograma 1)	Plantas	P	0	4	875,675.68	2,057,837.85
			P(a)	2	4	284,924.85	3,630,178
			A	0	0	1,121,948	2,894,861
2.4	Basurales a cielo abierto clausurados (subprograma 1)	BCA	P	4	17	2,484,013.51	8,565,757
			P(a)	6	17	1,749,701	8,565,757
			A	1	1	1,076,342	2,662,121
2.5	Equipamiento de disposición final y/o recolección (Subprograma 1)	Equipamiento entregado	P	0	5	0	3,316,817.95
			P(a)	1	5	2,404,757	3,316,817
			A	0	0	0	0
2.6	Rellenos sanitarios construidos (subprograma 2)	Rellenos Sanitarios	P	0	3	0	13,924,703.46
			P(a)	0	3	2,600,000	10,052,250
			A	2	3	2,160,395	10,052,250
2.7	Plantas de separación construidas (Subprograma 2)	Plantas	P	0	3	0	12,377,514.17
			P(a)	0	2	1,300,000	7,523,810
			A	2	2	1,301,266	7,523,810
2.8	Basurales a cielo abierto clausurados (subprograma 2)	BCA	P	0	3	0	21,062,403.3
			P(a)	1	6	3,000,000	15,821,285
			A	2	6	2,067,688	15,821,285

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III - Formalización e inclusión de Recuperadores y aprovechamiento de RSU (Gestión Ambiental)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
3.1	Planes de Comunicación Ambiental y Social (PCAS) elaborados y/o Actualizados (Subcomponente 1)	Planes	P	3	13	900,000	3,600,410.81
			P(a)	10	13	1,600,410.81	3,600,410
			A	0	0	0	0
3.2	Planes de Inclusión Social (PiSo) y Planes Sociales Abreviados (PSA) implementados (Subcomponente 1)	Planes	P	3	13	1,430,789.19	3,549,589.19
			P(a)	10	13	1,780,789.19	19,270
			A	3	3	0	0
3.3	Planes de Comunicación Ambiental y Social (PCAS) elaborados y/o Actualizados (Subcomponente 2)	Planes	P	0	4	250,000	980,000
			P(a)	3	2	250,000	105,505
			A	2	2	105,505	105,505
3.4	Planes de Inclusión Social (PiSo) y Planes Sociales Abreviados (PSA) implementados (Subcomponente 2)	Planes	P	0	8	250,000	980,000
			P(a)	0	1	250,000	0
			A	0	1	0	0

Other Cost

	Subprograma 1	P			6,898,374.74	20,150,000
		P(a)			6,898,374.1	3,534,143
		A			572,879	3,239,943
	Subprograma 2	P			3,000,000	11,244,170
		P(a)			410,000	1,771,947
		A			371,028	1,771,947
	Monto sin asignar Subprograma 2 a acordar con el gobierno su traspaso al Subprograma 1	P				
		P(a)			0	43,805,849.36
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			37,556,827.42	187,500,000.46
		P(a)			34,776,486.95	187,500,000.46
		A			14,497,209	57,468,720

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Basurales a cielo abierto clausurados (subprograma 1)		Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
	Basurales a cielo abierto clausurados (subprograma 2)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
	Equipamiento de disposición final y/o recolección (Subprograma 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
						03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
						03/13/2019
	Planes de Comunicación Ambiental y Social (PCAS) elaborados y/o Actualizados (Subcomponente 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
	Planes de Comunicación Ambiental y Social (PCAS) elaborados y/o Actualizados (Subcomponente 2)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
						03/13/2019
	Planes de Inclusión Social (PISo) y Planes Sociales Abreviados (PSA) implementados (Subcomponente 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
	Planes de Inclusión Social (PISo) y Planes Sociales Abreviados (PSA) implementados (Subcomponente 2)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
	Planes de difusión y concientización comunitaria elaborados (subprograma 1)		Modify Output	Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
						03/12/2019
	Planes de difusión y concientización comunitaria elaborados (subprograma 2)		Modify Output	Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
	Planes de mejoramiento de la gestión GIRSU desarrollados (subprograma 1)		Modify Output	Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
	Planes de mejoramiento de la gestión GIRSU desarrollados (subprograma 2)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
						03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
	Planes provinciales para la gestion integral de residuos solidos elaborados y/o actualizados (Subprograma 1)	Replanifiacion de acuerdo a informe de orgnaismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Planes provinciales para la gestion integral de residuos solidos elaborados y/o actualizados (Subprograma 1)	Replanifiacion de acuerdo a informe de orgnaismo ejecutor.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
						03/13/2019
	Plantas de separación construidas (Subprograma 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
	Plantas de separación construidas (Subprograma 2)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
	Plantas de transferencia construidas (Subprograma 1)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
	Rellenos sanitarios construidos (subprograma 1)	Replanifiacion de acuerdo a informe de orgnaismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/06/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/13/2019
	Rellenos sanitarios construidos (subprograma 2)	Replanificación de acuerdo a informe semestral de organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019
				Modify Physical P(a) value	MILAGROSM	03/12/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
Project Management Capacity
