

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1148	Chief of Operations Validation Date	10/16/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	URBAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROGRAM	Loan Number	2929/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS	Sector/Subsector	DU-HER - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Team Leader	SOULIER FAURE, MARTIN NICOLAS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La agencia ejecutora cuenta con la experiencia para gestionar los aspectos ambientales y sociales del Programa aunque presenta debilidades en cuanto a la disponibilidad de especialistas para gestionar los aspectos sociales y los relacionados a salud y seguridad. Se requiere la implementación de mejoras en el caso de las agencias ejecutoras provinciales ya que carecen del personal idóneo para gestionar los aspectos sociambientales de acuerdo a los requerimientos de las Políticas Operativas y, en algunos casos, cuentan con poca experiencia en la implementación y seguimiento adecuado de los PGAS.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1148	250,000,000	250,000,000	28,000,000	0	278,000,000	250,000,000	125,000,000	50.00%	125,000,000
Aggregated	250,000,000	250,000,000	28,000,000	0	278,000,000	250,000,000	125,000,000	50.00%	125,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

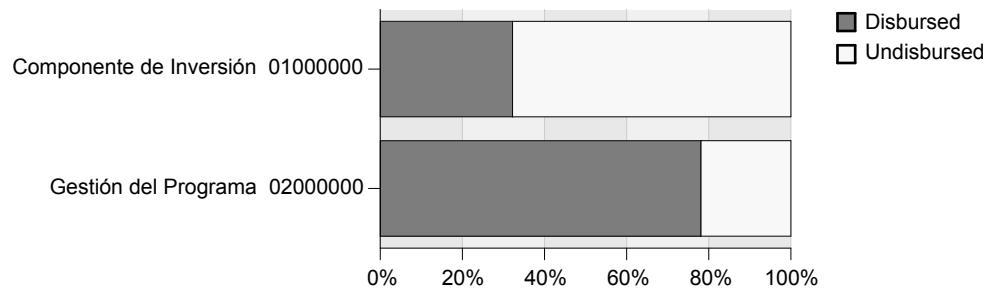

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Cobertura de servicios basicos mejorada

Observation: Fuente LB: evaluación económica del programa. Medio de verificación: evaluación final del programa en base a valores reportados en fichas únicas de proyecto (FUP) al inicio y al finalizar las obras.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.0	Valor del m2 promedio en las zonas intervenidas	USD constantes/m2	68.70	2013	P			72.40
					P(a)			72.40
					A			0.00
Details								
Means of verification: evaluación final del programa en base a valores reportados en fichas únicas de proyecto (FUP) al inicio y al finalizar las obras								
Observations: evaluación final del programa en base a valores reportados en fichas únicas de proyecto (FUP) al inicio y al finalizar las obras								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 2: Recursos del programa focalizados en municipios de menor desarrollo relativo del Norte Grande

Observation: Medio de verificación: informes semestrales incluyendo PMR, evaluación intermedia y final del programa en base a datos de FUP.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
2.0	Recursos de inversión del programa focalizados en municipios del NG	%	0.00	2014	P			70.00
					P(a)			70.00
					A			0.00
Details								
Means of verification: informes semestrales incluyendo PMR, evaluación intermedia y final del programa en base a datos de FUP4.								
Observations: informes semestrales incluyendo PMR, evaluación intermedia y final del programa en base a datos de FUP4.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
2.1	Recursos de inversión del programa focalizados en municipios de menor desarrollo relativo del NG	%	0.00	2014	P			60.00
					P(a)			60.00
					A			0.00
Details								
Means of verification: informes semestrales incluyendo PMR, evaluación intermedia y final del programa en base a datos de FUP.								
Observations: informes semestrales incluyendo PMR, evaluación intermedia y final del programa en base a datos de FUP.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 3: Inversiones del programa previstas de manera eficiente

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation: Medio de verificación: evaluación final del programa en base a valores reportados en FUP al inicio y finalización de las intervenciones.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
3.0	Tasa interna de retorno de una muestra de proyectos	%	30.40	2013	P			30.40
					P(a)			30.40
					A			0.00

Details

Means of verification: evaluación final del programa en base a valores reportados en FUP al inicio y finalización de las intervenciones.

Observations: evaluación final del programa en base a valores reportados en FUP al inicio y finalización de las intervenciones.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
3.1	Tiempo promedio desde elegibilidad de obras por parte del Banco hasta finalización de obras	Meses	30.00	2013	P			18.00
					P(a)			18.00
					A			0.00

Details

Means of verification: evaluación intermedia y final del programa en base a valores reportados en FUP al inicio y finalización de las intervenciones

Observations: evaluación intermedia y final del programa en base a valores reportados en FUP al inicio y finalización de las intervenciones

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Estudios de pre inversion realizados	estudio	P		13	0	1,450,000
			P(a)	3	13	500,000	1,450,000
			A	0	1	0	59,000
1.2	Obras de infraestructura ejecutadas	Government agencies (#)	P	2	57	11,100,000	270,000,000
			P(a)	4	68	30,000,000	270,000,000
			A	1	24	2,808,333	92,237,333
1.3	Obras supervisadas con recursos del programa	Obras	P		20		2,100,000
			P(a)	1	20	525,000	2,100,000
			A	0	1	0	340,000

Component Nbr. 2 Gestion del programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
2.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Unidad ejecutora, aduitoria, monitoreo y evaluacion	P			1,020,000	4,450,000
		P(a)			500,000	4,450,000
		A			373,421	3,598,421

Total Cost

	Total Cost	P			12,120,000	278,000,000
		P(a)			31,525,000	278,000,000
		A			3,181,754	96,234,754

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
