

PMR Public Report

Operation Number	CO-L1156	Chief of Operations Validation Date	04/19/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/19/21
Last Update	04/01/21	Country Representative Validation Date	04/19/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Water, Basic Sanitation, and Electrification Program for the Colombian Pacific R	Loan Number	3610/OC-CO, 3610/OC-CO-1, 3610/OC-CO-2
Executing Agency	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION
Team Leader	ORELLANA AREVALO, EDGAR R.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCAÍFICO		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	En julio de 2019 se produjo un deslizamiento del talud contiguo al área donde se estaban realizando las obras del proyecto de ampliación y optimización de la PTAP Playita I y II, Quibdó. Por razones de seguridad, inmediatamente se procedió a desalojar 4 viviendas que se consideró quedaban en situación de riesgo por el deslizamiento. Las 4 familias afectadas fueron realojadas en viviendas arrendadas por el proyecto y allí permanecen desde entonces. El Ejecutor (FTSP) encargó un estudio para analizar las causas del deslizamiento y definir una solución técnica para estabilizar el talud. El estudio presenta ciertas carencias, por lo cual se ha decidido realizar un nuevo estudio, financiado por el Banco que: (i) ofrezca una solución técnica para el talud; y (ii) sirva de base para decidir si las familias reasentadas pueden volver a sus casas o si deben ser reasentadas de manera definitiva en otras viviendas seguras. Hay reticencias por parte del equipo de proyecto para cubrir con fondos del Programa los gastos asociados al potencial reasentamiento y las obras de estabilización del talud.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1156	231,400,000	231,400,000	0	0	231,400,000	231,400,000	69,261,892.4	29.93%	162,138,107.6
Aggregated	231,400,000	231,400,000	0	0	231,400,000	231,400,000	69,261,892.4	29.93%	162,138,107.6

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

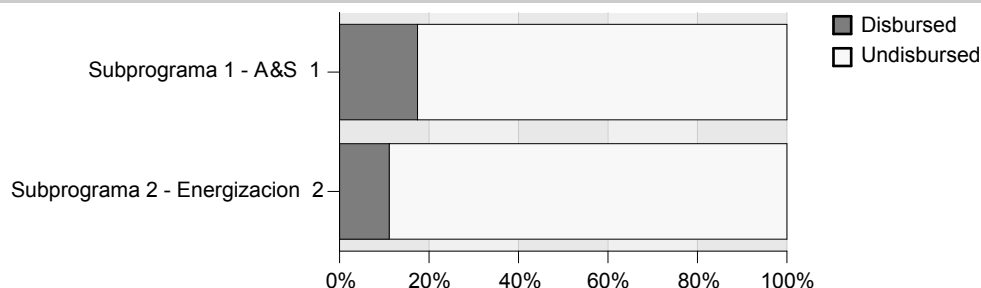

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Servicios de A&S en Quibdó incrementado y mejorado.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Hogares con conexión al sistema de agua potable mejorado en Quibdó.	# of households	0.00	2016	P					22,000.00		22,000.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: Definición de mejorado: horas de continuidad del servicio de 18 horas por día (pasar de 8 a 18 horas por día) 7 días de la semana.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de agua potable mejorado en Quibdó.	Hogar	0.00	2016	P					20,900.00		20,900.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Hogares con conexión nueva al sistema de agua potable en Quibdó. (FINACIACION NACION)	Hogar	8,200.00	2015	P							0.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: Se considera que un hogar tiene una nueva conexión al sistema de agua potable si recibe el servicio al menos de 18 horas al día 7 días a la semana.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de agua potable en Quibdó. (FINACIACION NACION)	Hogar	7,790.00	2015	P							0.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.4	Continuidad del servicio de agua potable en Quibdó.	Horas/día	12.00	2016	P						18.00		18.00
					A								

Details

Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.5	Consumo de agua de usuarios beneficiarios en Quibdó.	m3/hogar-mes	10.10	2016	P						12.60		12.60
					A								

Details

Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.6	Hogares con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Quibdó	Households (#)	0.00	2016	P						11,700.00		11,700.00
					A								

Details

Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: Definición de mejorado: Se entiende sistema de alcantarillado por redes mejoradas aquel que funciona por gravedad, sin reboses ni infiltraciones, salvo eventos fortuitos y de corta duración, y descarga en los lugares previstos en el diseño.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.7	Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Quibdó.	Hogar	4,750.00	2016	P						11,115.00		11,115.00
					A								

Details

Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** Yes

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

0.8	Hogares con conexión nueva al sistema de alcantarillado en Quibdó	Households (#)	0.00	2017	P							6,700.00		6,700.00
					A									
Details														
Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.9	Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de alcantarillado mejorado en Quibdó.	Hogar	0.00	2017	P						6,365.00		6,365.00	
					A									
Details														
Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			Yes						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.10	Calidad de agua de la Quebrada El Caraño.	mg/l o NMP/100 ml	20,000.00	2016	P						5,000.00		5,000.00	
					A									
Details														
Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.11	Toneladas de residuos sólidos dispuestas en la celda transitoria en Quibdó. (FINACIACION NACION)	ton/año	0.00	2015	P								0.00	
					A									
Details														
Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.12	Mujeres recicladoras formalizadas pertenecientes a una organización en Quibdó	Mujeres	0.00	2016	P						22.00		22.00	
					A									
Details														

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.13	Porcentaje de agua no contabilizada en Quibdó	%	70.00	2015	P					50.00		50.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: Definición: Agua Facturada / Agua Producida

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.14	Modelo de gestión del operador de agua y saneamiento de Quibdó aprobado por el Gobierno	Modelo	0.00	2015	P					1.00		1.00
					A							

Details

Means of verification: Informe del Gobierno (SSPD o MVCT) aprobando el modelo

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Servicios de A&S en Buenaventura incrementado y mejorado.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Hogares con conexión al sistema de agua potable mejorado en Buenaventura.	# of households	0.00	2015	P					40,000.00		40,000.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: Definición de mejorado: horas de continuidad del servicio de 18 horas por día (pasar de 4 a 18 horas por día)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de agua potable mejorado en Buenaventura.	Hogar	0.00	2015	P					35,200.00		35,200.00
					A							

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** Yes

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Hogares con conexión nueva al sistema de agua potable en San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria. (FINACIACION NACION)	Hogar	100.00	2015	P							0.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: Se considera hogares con conexión aquellos que reciben el servicio al menos 18 horas por día

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de agua potable en San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria. (FINACIACION NACION)	Hogar	88.00	2015	P							0.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** Yes

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.4	Consumo de agua potable de usuarios beneficiarios en Buenaventura.	m3/hogar-mes	14.20	2015	P					25.00		25.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.5	Continuidad del servicio de agua potable en Buenaventura.	Horas/día	4.00	2017	P					20.00		20.00
					A							

Details

Means of verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.6	Hogares con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Buenaventura.	Households (#)	0.00	2015	P						5,400.00		5,400.00
					A								

Details

Means of verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.7	Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Buenaventura.	Hogar	0.00	2015	P						4,752.00		4,752.00
					A								

Details

Means of verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes
-------------------	----	----------------------	-----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.8	Toneladas de residuos sólidos dispuestas en el relleno sanitario en Buenaventura.	ton/año	0.00	2017	P						100,000.00		100,000.00
					A								

Details

Means of verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.9	Mujeres recicladoras formalizadas pertenecientes a una organización en Buenaventura.	Mujeres	0.00	2016	P						56.00		56.00
					A								

Details

Means of verification: Reporte del UNGR

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.10	Porcentaje de agua no contabilizada en Buenaventura.	%	78.00	2015	P						60.00		60.00
					A								

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details													
Means of verification: Reporte Anual del Operador a UNGR													
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity No									

Specific Development Objectives Nbr. 2: Cobertura de energía en los municipios del Litoral Pacífico incrementada.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Cobertura del servicio de energía eléctrica en los 50 municipios priorizados del Litoral Pacífico.	%	85.40	2015	P	85.40	85.60	87.20	89.00	91.00	92.60	92.60
					A		85.50	86.40				86.40

Details													
Means of verification: Informe MME													
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity No									

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.1	Hogares afrocolombianos con conexión al servicio de energía eléctrica continuo beneficiados por el programa.	Hogar	0.00	2015	P		3,594.00	1,626.00	1,341.00	1,650.00	1,650.00	9,861.00
					A		191.00	1,653.00				1,844.00

Details													
Means of verification: Informe MME													
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity Yes									

Specific Development Objectives Nbr. 3: Consumo de energía de los usuarios beneficiarios conectados al SIN y con soluciones aisladas en las ZNI incrementado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Consumo de energía de los usuarios beneficiados por el programa.	MWh/año	0.00	2017	P					15,076.00		15,076.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details													
Means of verification: Informe de terminación del proyecto.													
Observations: Energía total consumida (MWh/año) por los usuarios conectados al SIN y atendidos con soluciones aisladas en las ZNI													
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity No									

Specific Development Objectives Nbr. 4: Disponibilidad del servicio de energía eléctrica en las ZNI del Litoral Pacífico mejorada

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

		Measure		Year									
4.0	Promedio de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica de nuevos usuarios, en las localidades con sistemas de telemetría instalados.	Hora/día	7.10	2014	P						24.00		24.00
					A	0.00	0.00	0.00					

Details

Means of verification: Informe IPSE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Specific Development Objectives Nbr. 5: Acceso al suministro de energía en establecimientos educativos mejorados.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.0	Escuelas o centros médicos con servicio de energía conectadas al SIN o con soluciones aisladas en las ZNI en los municipios beneficiados	Escuela	0.00	2017	P						210.00		210.00
					A	0.00	2.00	18.00					20.00

Details

Means of verification: Informe MME

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento de la provisión de A&S en Quibdó

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Plantas potabilizadoras La Playita 1 y 2, ampliadas.	Planta	P		2		2,510,000
			P(a)	0	2	731,670	3,404,962
			A	0	1	391,820	1,580,694
1.2	Sistema de captación Río Cabí optimizado.	Sistema	P		1		1,076,000
			P(a)		1	193,002	1,379,037
			A		0	27,380	750,051
1.3	Tanque de almacenamiento de agua PTAP La Loma.	Tanque	P		1		2,897,000
			P(a)		1	1,187,335	3,365,131
			A		0	0	0
1.4	Redes de distribución de agua potable construidas. (FINACIACION NACION)	Km	P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.5	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas. (FINACIACION NACION)	Km	P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.6	Conexiones intradomiciliarias de agua potable construidas. (FINACIACION NACION)	Conexión	P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.7	Plan de Acción de Gestión de la Demanda implementado.	Plan	P	1	1	300,000	1,792,000
			P(a)		1	419,648	2,601,334
			A		0	0	0
1.8	Redes de alcantarillado rehabilitada (ESTE PRODUCTO ES INTEGRADO CON PRODUCTO REDES CONSTRUIDAS Y OPTIMIZADAS)	Km	P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.9	Redes de alcantarillado construidas y optimizadas/rehabilitada.	Km	P	30	100	8,570,400	28,568,000
			P(a)	0	100	370,095	28,804,159
			A	0	25	168,524	5,225,119
1.10	Estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) construidas	Estación	P	1	2	677,000	2,477,000
			P(a)		2	1,342,707	3,180,419
			A		0	27,023	33,763
1.11	Linea de impulsión construida	Km	P	1.2	1.4	1,416,000	1,652,000
			P(a)		2.6	36,318	1,525,290
			A		0	36,219	57,789
1.12	Conexiones intradomiciliarias de alcantarillado construidas	Conexión	P	670	6,700	695,000	6,948,000
			P(a)	0	6,700	250,000	3,503,614
			A	0	0	0	0
1.13	Equipamiento para O&M de redes de alcantarillado (equipo de presión - succión) adquirido.	Equipo	P		1		231,000
			P(a)		1	130,410	387,054
			A		1	79,171	387,054
1.14	Botadero a cielo abierto Marmolejo clausurado. (FINACIACION NACION)	Botadero	P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.15	Celda transitoria construida. (FINACIACION NACION)	Celda	P		0		0
			P(a)		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.15	Celda transitoria construida. (FINACIACION NACION)	Celda	A		0		0
1.16	Plan de inclusión social con perspectiva de género para hombres y mujeres recicladores implementado.	Plan	P		1		125,000
			P(a)		1		125,000
			A		0		0
1.17	Equipos de residuos sólidos. (FINACIACION NACION)	Equipos	P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.18	Modelo de prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y residuos sólidos.	Modelo	P		1		690,000
			P(a)		1	21,748	690,000
			A		0	4,739	4,739
1.19	Estudios de drenaje en Quibdó elaborado.	Estudio	P	1	1	1,034,000	1,034,000
			P(a)		1	0	1,034,000
			A		0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Mejoramiento de la provisión de A&S en Buenaventura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Tanques de almacenamiento construidos.	Tanque	P	1	3	8,488,000	20,488,000
			P(a)		3	1,645,029	21,365,121
			A		2	2,033,680	13,191,726
2.2	Sistema de captación optimizado.	Sistema	P	1	1	1,412,000	7,053,000
			P(a)		1	174,788	7,202,000
			A		0	106,826	110,064
2.3	Líneas de conducción y distribución construidas.	Km	P	8	26	6,711,000	21,822,000
			P(a)	2	26	1,975,376	21,911,657
			A	0	0	87,307	237,847
2.4	Diagnostico y Plan de Acción de Gestión de la Demanda implementado.	Programa	P		1		3,615,000
			P(a)		1	620,437	2,312,000
			A		0	302,749	346,804
2.5	Redes de alcantarillado ampliada.	Km	P	5	10	2,660,000	5,320,000
			P(a)		10	43,579	5,320,000
			A		0	34,368	34,368
2.6	Interceptores y/o colectores rehabilitados.	Km	P	10	25	5,320,000	13,301,000
			P(a)		25	120,000	13,301,000
			A		0	0	0
2.7	Botadero a cielo abierto cerrado.	Botadero	P		1		1,898,000
			P(a)		1		1,898,000
			A		0		0
2.8	Relleno Sanitario en Buenaventura construido.	Relleno	P		1		2,930,000
			P(a)		1		2,930,000
			A		0		0
2.9	Plan macro y micro ruteo implementado.	Plan	P		1		690,000
			P(a)		1		692,760
			A		0		0
2.10	Plan de inclusión social con perspectiva de género para hombres y mujeres recicladores implementado.	Plan	P		1		125,000
			P(a)		1		125,500
			A		0		0
2.11	Equipos de residuos sólidos adquiridos.	Equipo	P		6		345,000
			P(a)		6		519,310
			A		0		0
2.12	Plan de implementación del modelo de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.	Modelo	P		1		1,379,000
			P(a)		1		1,384,516
			A		0	18,957	18,957
2.13	Estudios de drenaje en Buenaventura elaborado.	Estudio	P	1	1	1,034,000	1,034,000
			P(a)		1	0	1,038,136
			A		0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Energización Sostenible en el Litoral

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Nuevos usuarios conectados al SIN.	# of households	P	2,032	9,940	10,160,000	53,345,000
			P(a)	0	9,940	18,200,000	53,345,000
			A	1,743	4,634	8,011,920	16,236,732
3.2	Nuevos usuarios atendidos con soluciones aisladas (soluciones ZNI).	# of households	P	2,000	6,000	10,000,000	30,000,000
			P(a)	0	6,000	1,800,000	30,000,000
			A	0	0	0	0
3.3	Usuarios normalizados.	# of households	P		5,000		2,655,000
			P(a)	1,611	5,000	2,100,000	2,655,000
			A	896	3,180	1,585,260	1,585,260
3.4	Estudios de pre inversión realizados / Estudios de generación y expansión de cobertura.	Estudio	P	4	14	1,000,000	3,500,000
			P(a)	0	14	1,050,000	3,500,000
			A	0	9	700,777	1,086,957
3.5	Esquemas institucionales de operadores sostenibles diseñados o implementados.	Empresa	P	1	3	500,000	1,500,000
			P(a)	0	3	0	1,500,000
			A	0	1	0	0
3.6	Estudios de generación y expansión de cobertura elaborados. (ESTE PRODUCTO ES INTEGRADO CON PRODUCTO 3.4 Estudios de Preinversión)	Estudio	P		0		0
			P(a)		0	0	0
			A		0	0	0

Other Cost

	Seguimiento, Evaluación y Auditoría	P			87,400	850,000
		P(a)			0	850,000
		A			37,033	119,622
	Administración del Programa	P			1,661,700	9,550,000
		P(a)			1,834,445	9,550,000
		A			905,073	3,710,985

Total Cost

	Total Cost	P			61,726,500	231,400,000
		P(a)			34,246,587	231,400,000
		A			14,558,826	44,718,531

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Conexiones intradomiciliarias de alcantarillado construidas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/17/2021
	Equipamiento para O&M de redes de alcantarillado (equipo de presión - succión) adquirido.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/17/2021
	Plan de implementación del modelo de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/08/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities
