

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1187	Chief of Operations Validation Date	04/10/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/25/17
Last Update	04/07/17	Country Representative Validation Date	04/26/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROCIDADES - Novo Hamburgo	Loan Number	2752/OC-BR
Executing Agency	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	SILVA CASSEB,MARCIA MARIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1187	23,910,000	23,910,000	23,910,000	0	47,820,000	23,910,000	2,780,000	11.63%	21,130,000
Aggregated	23,910,000	23,910,000	23,910,000	0	47,820,000	23,910,000	2,780,000	11.63%	21,130,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

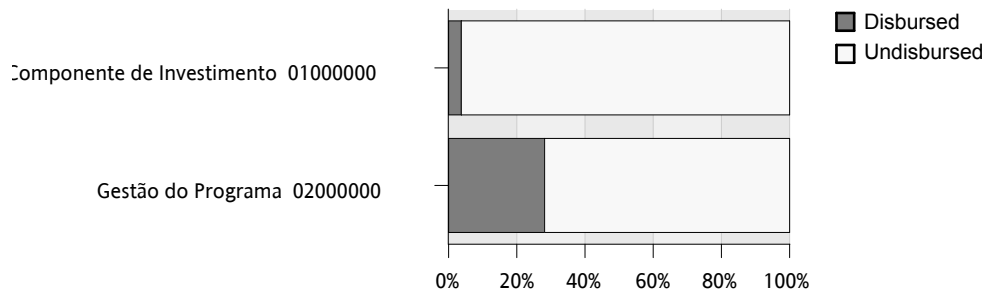

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Condiciones Socioeconómicas del Municipio de Novo Hamburgo Mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2019
1.1	Inmueble en el área de influencia de las obras del arroyo Pampa	R\$/m2	220.59	2010	P			375.00		375.00
					P(a)			375.00		375.00
					A				0.00	

Details

Means of verification: Fase preparación: evaluación económica del programa - Fuente: Unidad Ejecutora del Programa (UEP)

Observations: Encuesta para verificar la "Valoración de los Inmuebles" del área determinada y en el área de control.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2019
1.2	Facturación de las empresas ubicadas en el Centro Histórico Hamburgo Viejo	millones R\$	159.03	2010	P			166.96		166.96
					P(a)			166.96		166.96
					A				0.00	

Details

Means of verification: Fuente: Unidad Ejecutora del Programa (UEP) / Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo (PMNH)

Observations: Medido por el aumento en la recaudación del Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Informe Semestral de Recaudación

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Áreas Urbanas de la Ciudad Revitalizada Urbanística y Ambientalmente

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2019
1.1	Satisfacción de los usuarios con el Área Central de la ciudad de Novo Hamburgo	%	68.5	2010	P			73.60		73.60
					P(a)			73.60		73.60
					A				0.00	

Details

Means of verification: Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP) - Encuste: Departamento de Apoio a Pesquisa (DAP) por la implementación de las obras.

Observations: Por satisfacción entendiase los encuestados que consideram las obras importantes o muy importantes. La DAP se repetirá después de la conclusión de las obras.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2019
1.2	Visitantes en la Fundación Scheffel	Visitantes/Año	6229.0	2010	P			8,046.00		8,046.00
					P(a)			8,046.00		8,046.00
					A				0.00	

Details

Means of verification: Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.

Observations: Registro del: Libro de Registros Fundación Scheffel.

Meio de Verificação: Informe Semestral a partir do 2º ano do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2019
1.3	Visitantes en la Casa Schmitt Presser	Visitantes/Año	5220.0	2010	P			6,742.00		6,742.00
					P(a)			6,742.00		6,742.00
					A				0.00	

Details

Means of verification: Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.

Observations: Registro del: Libro de Registros da Casa Schmitt Presser.

Meio de Verificação: Informe Semestral a partir do 2º ano do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2019
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Visitantes en la Casa Lar das Meninas	Visitantes/Año	0.0	2010	P			6,000.00		6,000.00
					P(a)			6,000.00		6,000.00
					A				0.00	

Details

Means of verification: Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.

Observations: Registro del: Libro de Registros Casa Lar das Meninas.

Meio de Verificação: Informe Semestral a partir do 2º ano do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2019
1.5	Visitantes del Parcão	Visitantes/Año	32500.0	2010	P			49,484.00		49,484.00
					P(a)			49,484.00		49,484.00
					A				0.00	

Details

Means of verification: Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.

Observations: Registro del: Libro de Registros del Parcão.

Meio de Verificação: Informe Semestral a partir do 2º ano do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Desarrollo Económico Sostenible del Municipio Promovido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2019
2.1	Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Sectorial (PES) 1	Empresas	0.0	2010	P			20.00		20.00
					P(a)			20.00		20.00
					A				0.00	

Details

Means of verification: Fuente: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo (PMNH) / Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDETUR)

Observations: Informe Semestral de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2019
2.2	Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Setorial (PES) 2	Empresas	0.0	2010	P			40.00		40.00
					P(a)			40.00		40.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.2	Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Setorial (PES) 2	Empresas	0.0	2010	A				0.00	
Details										
Means of verification: Fuente: Prefectura Municipal de Novo Hamburgo (PMNH) / Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDETUR)										
Observations: Informe Semestral de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 3: Criminalidad Juvenil en los Barrios Carenciados Controlada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2019
3.1	Tasa de homicidios en los barrios de Canudos y Santo Afonso.	Homicidios/ 100mil habitantes	89.0	2010	P			62.00		62.00
					P(a)			62.00		62.00
					A				0.00	
Details										
Means of verification: Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP) - Oficina de Gestión Integrada-Municipal - OGI-M (*)										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Revitalização Urbana - Requalificação da Sub-Bacia do Arroio Pampa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	Infraestrutura viária e pavimentação da Avenida Alcântara implantada	Km	P		0		0
			P(a)	0	0.9	0	1,954,000
			A	0	0.9	0	1,954,000
1.2	Famílias Reassentadas	Famílias	P	0	0	0	0
			P(a)	0	23	0	184,000
			A	0	23	647,000	831,000
1.3	Ciclovias implantadas	Km	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.4	Margens do Arroio Pampa restauradas (revegetação e muro de contenção)	Km	P		0		0
			P(a)	0	0.3	0	613,000
			A	0	0.3	0	613,000
1.5	Urbanização da Vila Kliping Concluída	m2	P		0		0
			P(a)	8,701	10,000	3,037,000	3,625,000
			A	7,315	8,614	2,852,000	3,440,000
1.6	Urbanização da Vila Getúlio Vargas Concluída	m2	P		0		0
			P(a)	0	0	0	59,000
			A	0	0	0	59,000
1.7	Urbanização da Vila Palmeira	m2	P		0		0
			P(a)	374	374	5,116,000	5,116,000
			A	374	374	328,000	328,000

Component Nbr. 2 Revitalização Urbana - Revitalização da Área Central da Cidade

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	Infraestrutura dos cabos elétricos da iluminação pública enterrada e aérea - instalada	Km	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.2	Passeios Públicos Implantados	Km	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.3	Praças Construídas	Praças	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.4	Vias Implantadas	Km	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.5	Ciclovias Implantadas	Km	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 Revitalização Urbana - Consolidação do Parque Municipal Henrique Luís Roessler - Parcão

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
5.1	Edifício do Centro Educacional Ambiental Construído	Edifício	P		0		0
			P(a)	1	1	630,630	630,630
			A	0	0	3,000	3,000
5.2	Área do Parque com Vallas	Hectáres	P		0		0
			P(a)	54	54	1,541,540	1,541,540
			A	6.1	6.1	0	0
5.3	Ciclovias Construídas (perto do parque e das calçadas públicas)	Km	P		0		0
			P(a)	1.7	1.7	248,060	248,060
			A	1	1	0	0
5.4	Equipamentos Públicos Construídos (banheiros, Vestiários e Etc)	Equipamentos	P		0		0
			P(a)	100	10	756,770	770,770
			A	9	9	355,000	369,000

Component Nbr. 6 Desenvolvimento Econômico Local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
6.1	Projeto Urbanístico do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) - Elaborado	Projeto	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
6.2	Pólo de Inovação Criativa Hamburgtech instalado	Polo	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
6.3	Plano do Distrito Industrial Elaborado (Projetos Básicos, urbanismo e executivo)	Plano	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
6.4	Plano de Comunicação e Marketing do DEL	Plano	P		0		0
			P(a)	1	1	126,000	141,000
			A	0.37	0.37	21,000	36,000
6.5	Plano Estratégico Integrado de Comércio, Turismo e Serviços	Plano	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
6.6	Plano para Dinamização do Setor de TI - Concurso	Plano	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
6.7	Plano para Reconcepção de Cursos Profissionalizantes e de Capacitação	Plano	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
6.8	Plano para Reestruturação Organizacional da SEDETUR e Capacitação Técnica	Plano	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 7 Prevenção da Violência - Ações para o Fortalecimento Institucional para a Prevenção da Violência

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
7.1	Jovens Atendidos no Projeto para Jovens nos Bairros Canudos e Santo Afonso	Jovens	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	600	600	88,000	88,000
7.2	Plano Municipal de Segurança Pública - Elaborado	Plano	P		0		0
			P(a)	1	1	94,000	107,000
			A	1	1	40,000	53,000
7.3	Fórum Municipal de Segurança para a Validação e Seguimento do Plano Constituído	Fórum	P		0		0
			P(a)	1	1	107,000	107,000
			A	1	1	41,000	41,000

Component Nbr. 8 Prevenção da Violência - Ações de Prevenção Social da Violência

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
8.1	Projeto de Apoio sócio-educativo técnico-profissional, recreativo, desportivo e de formação em valores para Jovens Elaborado	Projeto	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	1	1	277,000	277,000
8.2	Projeto de Formação de Mulheres/Mães de Família como Agentes de Mudanças em Relação a Violência Elaborado	Projeto	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
8.3	Projeto de Fortalecimento de Serviços de Solução de Conflitos - Elaborados	Projeto	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	1	1	0	0

Component Nbr. 9 Prevenção da Violência - Gestão da Informação e Conhecimento para a Prevenção da Violência

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
9.1	Observatório de Crime e de Violência - Implantado	Crime information systems (#)	P		0		0
			P(a)	1	1	167,000	200,000
			A	1	1	118,000	151,000
9.2	Informe do Observatório - Elaborado	nº de Informes	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	1	1	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 10 Administração do Programa / Estudos e Projetos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
10.1	Sistema de Gestão das Informações	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
10.2	Planta dos Valores Atualizada	Planta	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	308,000	308,000
10.3	Plano de Transporte e Mobilidade Elaborado	Plano	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
10.4	Projetos Executivos de Revitalização Urbana Executado	Projetos	P		0		0
			P(a)	1	2	835,000	1,210,000
			A	1	2	323,000	698,000

Other Cost

	Administração do Programa / Estudos e Projetos	P				
		P(a)			3,205,970	3,274,970
		A			298,000	367,000

Total Cost

	Total Cost	P			0	0
		P(a)			15,864,970	20,301,000
		A			5,712,000	10,135,030

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Paseos Públicos Implantados	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Praças Revitalizadas	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Edifício Histórico - Casa Lar das Meninas Restaurado	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Famílias Reassentadas	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Equipamentos Públicos Construídos (banheiros, Vestuários e Etc)	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Ciclovias Implantadas	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Ciclovias Implantadas	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Paseos Públicos Implantados	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Praças Revitalizadas	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro	03/27/2017	03/27/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
			Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.		
Output	Interseção da Avenida Alcântara com a Avenida do Município Implantada	Modify Output	Modificação de acordo com alteração contratual, adicionalmente destacamos que a nova Prefeita eleita em outubro de 2016 solicitou nova prorrogação do contrato por mais 02 anos, o que permitirá a execução de uma das obras previstas para o Programa (revitalização do Centro Urbano), e recuperação das ações do componente de Desenvolvimento Econômico Local. Nesse PMR foram retiradas ações previstas no Centro Histórico Hamburgo Velho e Corredor Cultural. A prorrogação do contrato permitirá avanço nas ações do componente de Prevenção à Violência.	03/27/2017	03/27/2017
