

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1019	Chief of Operations Validation Date	03/24/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/14/17
Last Update	03/17/17	Country Representative Validation Date	04/17/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	San Francisco-Mocoa Alternate Road Construction Project - Phase I	Loan Number	2271/OC-CO
Executing Agency	Instituto Nacional de Vias	Sector/Subsector	TR-VPR - TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS
Team Leader	PINTO AYALA,ANA MARIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	COLOMBIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Partially Unsatisfactory		

Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1019	53,000,000	53,000,000	150,000,000	0	203,000,000	53,000,000	43,920,267.2	82.87%	9,079,732.8
Aggregated	53,000,000	53,000,000	150,000,000	0	203,000,000	53,000,000	43,920,267.2	82.87%	9,079,732.8

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

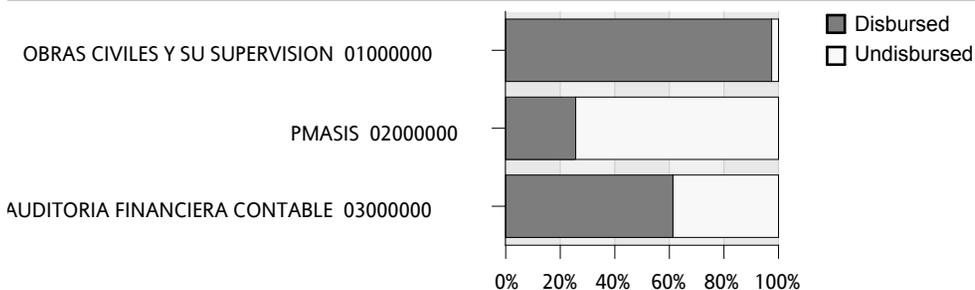

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Condiciones de eficiencia, conservación ambiental y seguridad del corredor vial Pasto - Mocoa mejoradas, mediante la construcción de la Variante San Francisco - Mocoa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Número de días al año con restricciones severas de circulación de la vía entre San Francisco y Mocoa, al tránsito seguro y continuo de pasajeros y carga	Días	183.0	2009	P		0.00
					P(a)		0.00
					A		

Details

Means of verification: Reportes de registros del estado y disponibilidad de la variante por parte del INVIAS, regionales Nariño y Putumayo.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Reducción del tiempo promedio de viaje entre San Francisco y Mocoa.	Horas	2.5	2009	P		1.50
					P(a)		1.50
					A		

Details

Means of verification: El INVIAS realizará reportes de conteos y registros de tiempos de viaje durante el primer año de operación de la variante

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.3	Reducción del costo promedio por Km de operación vehicular entre San Francisco y Mocoa	US\$/Km	105.0	2009	P		61.00
					P(a)		61.00
					A		

Details

Means of verification: Informe final de Evaluación de Costos del INVIAS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.4	Aumento de las áreas protegidas de la zona de influencia de la variante.	Ha	34600.0	2009	P		65,289.00
					P(a)		65,289.00
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: i) Resolución declaratoria de ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa - RFPCARM, ii) Acuerdo del Consejo Directivo de Corpoamazonía declarando el Distrito de Manejo Integral - DMI de Mocoa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.5	Reducción del número promedio de accidentes que se presentan al año actualmente entre San Francisco-Mocoa	No. accidentes/año	23.0	2009	P		12.00
					P(a)	12.00	12.00
					A		

Details

Means of verification: Reportes del registro mensual del número y severidad de accidentes, por parte de las oficinas del INVIAS en Mocoa (Putumayo)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras civiles y su supervisión

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1 Supervisión (Interventoría) de obras contratada y operando	Supervisión	P	0	2	1,528,250	11,142,636.22
		P(a)	1	6	1,615,000	11,142,636.28
		A	1	6	1,774,779.46	11,006,949.28
1.2 Frente de San Francisco construido	Roads (km)	P	5	21.9	14,351,294	79,730,233
		P(a)	4	7.12	8,215,000	77,069,343.98
		A	0	7.12	9,905,404	77,069,343.98
1.3 Frente Mocoa construido	Roads (km)	P	5	23.7	10,472,566	77,796,487
		P(a)	4	9.04	14,352,404.71	73,217,892.43
		A	0.22	9.04	9,488,975	72,933,057.29

Component Nbr. 2 Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado Sostenible - PMASIS

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1 Ordenamiento territorial consolidado	Plan	P	0	1	0	1,048,738
		P(a)	0	0	301,000	387,855.82
		A	0	0	0	387,855.82
2.2 Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Áreas de Protegidas, implementado	Plan	P	0	1	502,240	4,129,406.42
		P(a)		0	1,621,000	2,481,405.88
		A	0	0	778,474.93	2,416,521.6
2.3 Comunidad vinculada a la Protección de las Áreas Protegidas	Comunidad vinculada	P	0	1	196,862	1,288,678
		P(a)		0	539,000	381,598.91
		A	0	0	44,379.02	381,598.91
2.4 Plan de Operación Control y Vigilancia de las áreas protegidas implementado	Plan	P	0	1	176,680	2,713,305
		P(a)		0	1,014,000	172,731.43
		A	0	0	6,823.48	172,731.43

Other Cost

Gerencia del Proyecto Auditoria financiera y Contable	P			312,500	2,519,599.79
	P(a)			234,000	1,989,240.97
	A			220,554.3	1,953,777.53

Total Cost

Total Cost	P			27,540,392	180,369,083.43
	P(a)			27,891,404.71	166,842,705.7
	A			22,219,390.19	166,321,835.84

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Plan de Operación Control y Vigilancia de las áreas protegidas implementado	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Plan de Operación Control y Vigilancia de las áreas protegidas implementado	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Comunidad vinculada a la Protección de las Áreas Protegidas	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Frente Mocoa construido	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Ordenamiento territorial consolidado	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Supervisión (Interventoría) de obras contratada y operando	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Áreas de Protegidas, implementado	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Frente de San Francisco construido	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Ordenamiento territorial consolidado	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Frente de San Francisco construido	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Supervisión (Interventoría) de obras contratada y operando	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Frente Mocoa construido	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Comunidad vinculada a la Protección de las Áreas Protegidas	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Áreas de Protegidas, implementado	Modify Output	No se incluyeron las metas de 2017 y 2018, debido a que el 2 de noviembre del 2016 el Gobierno de Colombia solicitó la cancelación parcial de los recursos no desembolsados, por lo cual las actividades inicialmente programadas para estos años no se realizarán en el marco del contrato de préstamo.	03/17/2017	03/17/2017
