
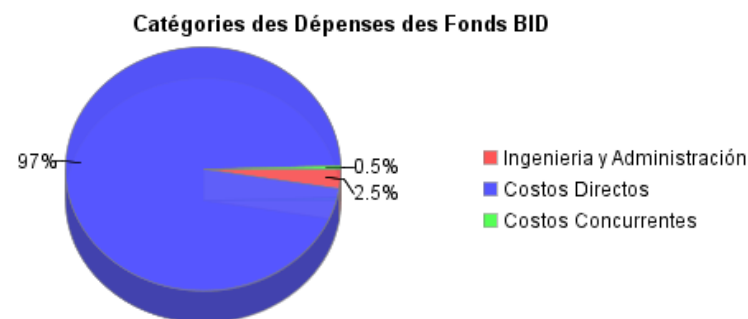
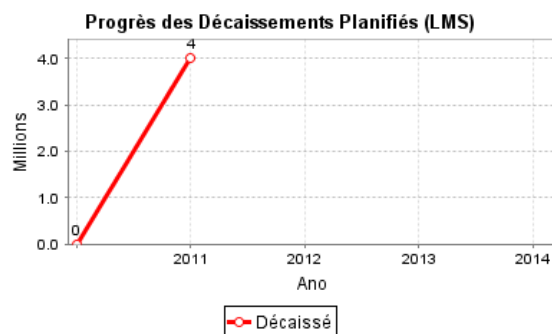



## Rapport Résumé

| Données Générales         |                                                                           | Fonds Disponibles (US\$)    |                | Coût Total et Source de Financement |                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Agence d' Exécution (EA): | ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO                            |                             |                |                                     |                |
| Secteur:                  | WATER AND SANITATION                                                      |                             |                |                                     |                |
| Numéro(s) de Prêt(s):     | 2343/OC-AR                                                                | Montant Courant Approuvé:   | 200.000.000,00 | Initial BID:                        | 200.000.000,00 |
| Étape:                    | Approved                                                                  | Montant Décaissé à ce Jour: | 4.000.000,00   | Courant BID:                        | 200.000.000,00 |
| Type d' Opération:        | INV - Investissement                                                      | % Décaissé:                 | 2,00           | Pari Passu:                         | 80,00          |
| Opération(s) Connexe(s):  | AR-X1017, AR-T1077                                                        | Solde:                      | 196.000.000,00 | Cofinancement/Pays:                 | 50.000.000,00  |
| Sous-Type de l'Opération: | CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects) |                             |                | Estimation Initiale:                | 250.000.000,00 |
|                           |                                                                           |                             |                | Période d'Amortissement (mois):     | 234            |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet  | Reformulation                                         | Validation                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: | B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 30-abr-2012 |
|                                                         |                                                       | Validé par le Représentant: 10-may-2012     |

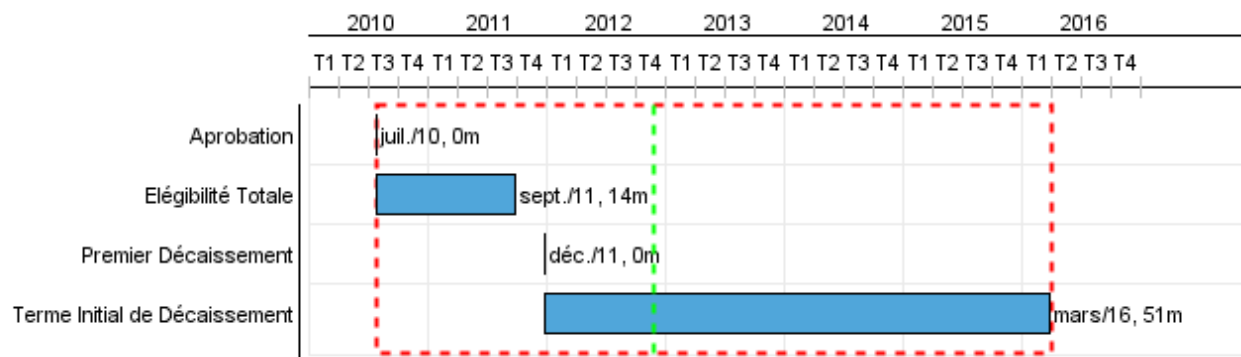

## Progrès Cumulé à 2011

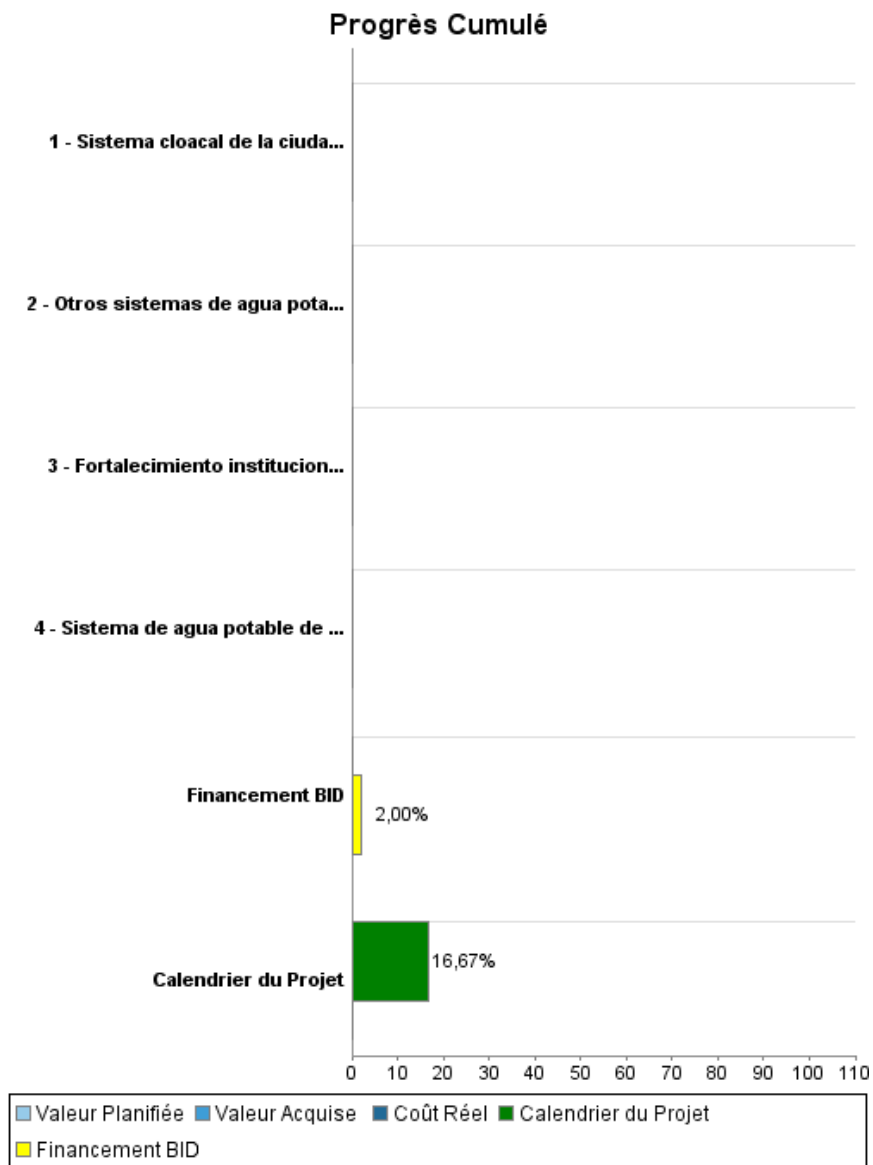

## Résultats

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Résultat:</b> | Sistema cloacal de la ciudad de San Juan mejorado |
|------------------|---------------------------------------------------|

| Indicateur                                                         | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |   | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015       | Fin du Projet |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas               | Hogares         | 54,650.00     | 2009                | P | 54,650.00 | 77,050.00 | 87,950.00 | 97,750.00 | 102,360.00 | 112.150,00    |
|                                                                    |                 |               |                     | A | 54,650.00 |           |           |           |            |               |
| Incremento en agua residual tratada en lagunas de estabilización   | l/seg           |               | 2009                | P | 164.00    | 257.00    | 350.00    | 430.00    | 465.00     | 515,00        |
|                                                                    |                 |               |                     | A |           |           |           |           |            |               |
| Agua residual tratada a nivel secundario y cumpliendo con normas   | l/seg           | 100.00        | 2009                | P |           | 410.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500,00        |
|                                                                    |                 |               |                     | A | 100.00    |           |           |           |            |               |
| Biosólidos tratados y dispuestos de forma ambientalmente apropiada | ton/día         |               | 2009                | P |           | 8.50      | 10.00     | 10.00     | 10.00      | 10,00         |
|                                                                    |                 |               |                     | A |           |           |           |           |            |               |

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Résultat:</b> | Sistema de agua potable de la ciudad de Salta mejorado |
|------------------|--------------------------------------------------------|

| Indicateur                                                    | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |   | 2011   | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | Fin du Projet |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados | Hogares         |               | 2009                | P |        | 41,225.00 | 42,257.00 | 64,300.00 | 64,300.00 | 64.300,00     |
|                                                               |                 |               |                     | A |        |           |           |           |           |               |
| días del año fuera de norma por turbiedad                     | días            | 90.00         | 2009                | P |        |           |           |           |           | 0,00          |
|                                                               |                 |               |                     | A | 90.00  |           |           |           |           |               |
| Días del año con producción restringida                       | días            | 154.00        | 2009                | P |        |           |           |           |           | 0,00          |
|                                                               |                 |               |                     | A | 154.00 |           |           |           |           |               |
| Producción media sostenible                                   | m3/seg          | 243.00        | 2009                | P | 557.00 | 557.00    | 557.00    | 557.00    | 557.00    | 557,00        |
|                                                               |                 |               |                     | A | 243.00 |           |           |           |           |               |

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

| Description                                                      | Unité de Mesure | Physique |      |                 |            | Financier |      |                |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|-----------------|------------|-----------|------|----------------|-----------------------|
|                                                                  |                 | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié  | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP             |
| <b>Sistema cloacal de la ciudad de San Juan</b>                  |                 |          |      |                 |            |           |      |                |                       |
| Sistema cloacal de la ciudad de San Juan construido              | sistemas        |          |      |                 | 1,00       |           |      |                | 80.000.000,00         |
| <b>Sistema de agua potable de la ciudad de Salta</b>             |                 |          |      |                 |            |           |      |                |                       |
| Sistema de agua potable de la ciudad de Salta intervenido        | Sistemas        |          |      |                 | 1,00       |           |      |                | 20.000.000,00         |
| <b>Administración, seguimiento y costos financieros</b>          |                 |          |      |                 |            |           |      |                |                       |
| <b>Fortalecimiento Institucional</b>                             |                 |          |      |                 |            |           |      |                |                       |
| Fortalecimiento institucional implementado                       | Fortalecimiento |          |      |                 | 1,00       |           |      |                | 5.000.000,00          |
| <b>Otros sistemas de agua potable y saneamiento intervenidos</b> |                 |          |      |                 |            |           |      |                |                       |
| Otros sistemas de agua potable y saneamiento intervenidos        | Sistemas        |          |      |                 | 1,00       |           |      |                | 110.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                 |          |      |                 |            |           |      |                | <b>215.000.000,00</b> |
