





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Prefeitura do Município São Bernardo do Campo		
Sector: TRANSPORT-URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE		
Número da Operação: 2888/OC-BR	Atual: 125.000.000,00	Original BID: 125.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 125.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 50,00
Operação Relacionada: BR0400, RG-P1478, BR-T1276	Saldo: 125.000.000,00	Cofinanciamento/País: 125.000.000,00
Subtipo de Operação: GOM - Global of Multiple Works Operation		Original Estimado: 250.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 27-sep-2013

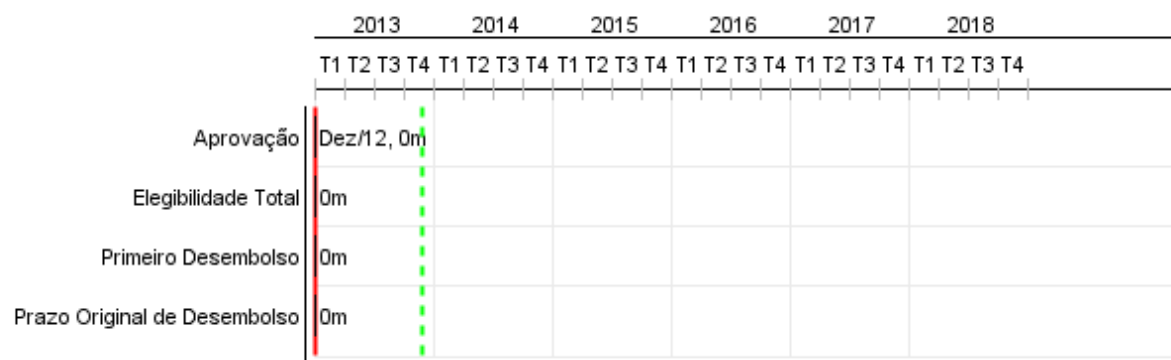

Progresso Acumulado até 2013

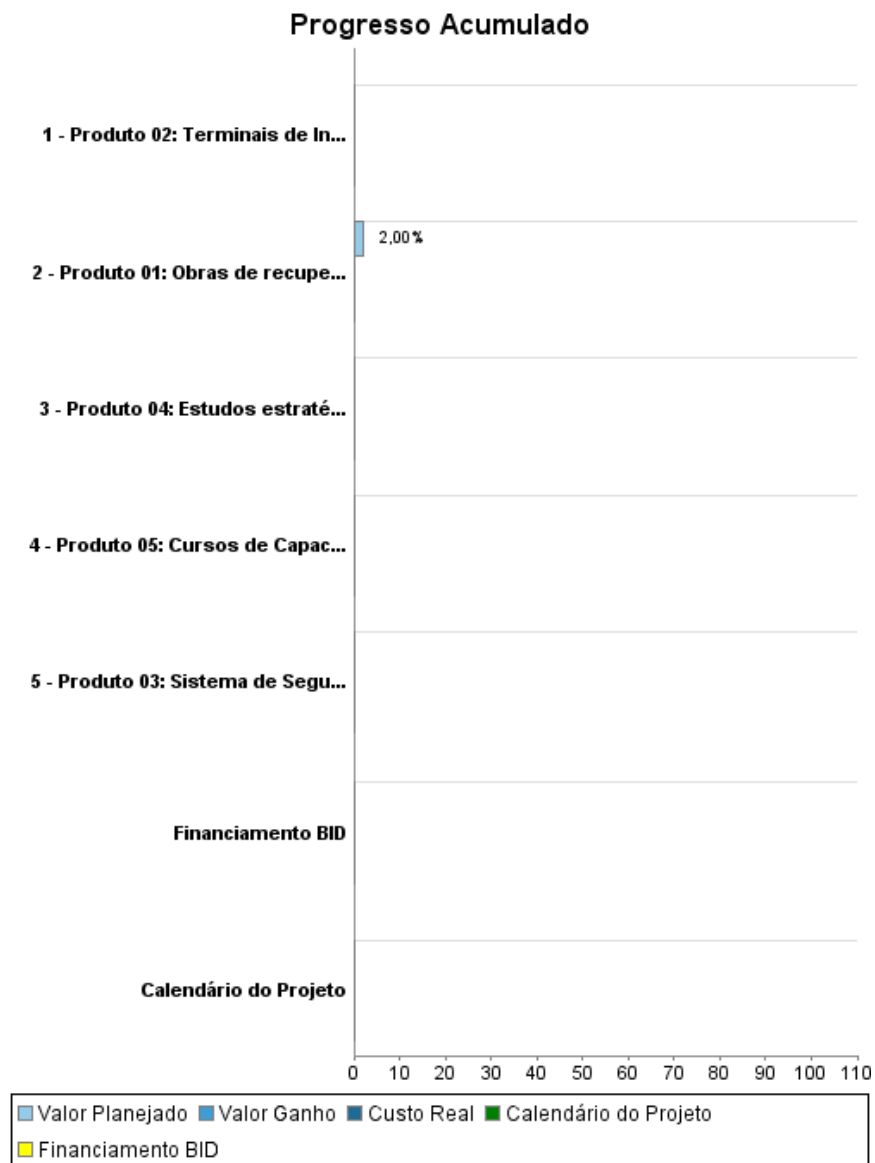

Resultados

Resultado: Corredores de Transporte Coletivo

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
ISU - Índice de satisfação do usuário de transporte público	reclamação	1,00	2010	P A	1,00
IRA - Índice de Reclamações por atrasos.	reclamações	1,00	2010	P A	1,00
TVM - Tempo médio de viagem dos usuários de transporte público	minutos	20,00	2010	P A	15,00
VSM - Velocidade média do Sistema	Km/h	13,50	2010	P A	17,00
QPT - Quantidade de passageiros transportados	Mil Passageiros	100,00	2010	P A	103,00
IPK - Índice de Passageiros por Km	Passageiros/Km	2,20	2010	P A	2,70

Resultado: Segurança Viária

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
IAT - Índice de acidentabilidade no Trânsito	Acidentes/ 10 mil veículos	208,00	2010	P A	193,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 02: Obras Civas									
Produto 01: Obras de recuperação viária executadas.	metros				43.300,00	2.000.000,00			100.000.000,00
Produto 02: Terminais de Integração viários recuperados.	terminais				4,00				46.658.613,00
Produto 03: Sistema de Segurança Viária do Município reabilitado.	Sistema				1,00				15.487.242,00
Componente 03: Fortalecimento Institucional									
Produto 04: Estudos estratégicos ao Fortalecimento da Gestão Municipal	Estudos				11,00				1.500.000,00
Produto 05: Cursos de Capacitações a Técnicos das Secretarias de Planejamento e Ambiental, ministrados.	Técnicos				60,00				600.000,00
Componente 01: Engenharia, Administração e Custos									
Produto 06: Administração, Supervisão e outros custos	N/A					1.000.000,00			85.754.145,00
TOTAL						3.000.000,00			250.000.000,00
